

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
-------------------------------------	--

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	4
Fecha	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
---------------------------------	--

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre de 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00			\$	-
Acto Administrativo de asignación	Resolución 1832 de 2023				
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	VEINTE (20) MESES				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS	
---	--

Informe N°	4	Periodo comprendido entre el	1 de junio de 2024	y el	30 de junio de 2024
------------	---	------------------------------	--------------------	------	---------------------

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
------------------	-----------------------------------

Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.	Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato N°:	358 DE 2023	Contrato N°:	078 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO EVOLET	Contratista:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
Plazo Inicial:	VEINTE MESES	Plazo Inicial:	VEINTE MESES
Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024	Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024
Fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025	Nueva fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025
Valor Inicial:	\$ 32.473.928.569,00	Valor Inicial:	\$ 1.280.412.030,00
Valor Anticipo:	(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).	Valor Anticipo:	No tiene anticipo
Forma de Pago	El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.	Forma de Pago	El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado:	\$ -	Valor pagado:	\$ -
Nombre del Supervisor	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPR, LEGAL MICHELLE PROAÑO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo del 30%					Anticipo		No tiene anticipo
Acta Parcial No. 1			\$ -		Acta Parcial No. 1		
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$	32.473.928.569,00		SALDO POR EJECUTAR		\$ 1.280.412.030,00

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE	
--------------------------	--

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0.00%	0.00%	0.00%	% Programado	0.00%	0.00%	0.00%
% Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	% Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%
Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%	Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
----------------------------	--

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Durante el mes de junio de 2024, el contratista de obra inicia con las actividades de fase previa a la construcción del proyecto. Estas actividades abarcan acciones administrativas como la presentación de la cronología de tramites correspondientes a la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana y los permisos para la construcción del helipuerto ante la Aeronáutica Civil. El 19 de junio del 2024, el contratista de obra, realiza la solicitud para la expedición de la licencia de construcción en modalidad de obra nueva para el predio con matrícula inmobiliaria No 120-19401. El día 4 de junio de 2024 es entregado a interventoría el concepto técnico de viabilidad PEMP del sector antiguo de Popayán, el cual fue aprobado por la junta de patrimonio el pasado 18 de abril, según resolución 20241900037254. La interventoría como proceso de seguimiento de la solicitud de permiso temporal de ocupación ante la Alcaldía de Popayán confirmó que el 6 de junio de 2024, con el número de radicado 20241110238781, la Administración Municipal aprobó la solicitud presentada por el Consorcio Evolut E-V-C358-23-15-24, identificado con radicado 20241150190762 y técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto. Cabe destacar que, en este mes, se han iniciado las obras pre-construccionas indispensables para el inicio de la ejecución del proyecto, las cuales se intensificarán una vez obtenga la licencia de construcción. Dichas obras pre-construccionas abarcan las siguientes actividades: Cerramiento lateral colindante con la facultad de medicina de la Universidad del Cauca, cerramiento frontal hacia el parqueadero del Hospital, cerramiento y protección de fachada del servicio de oncología, reubicación de redes de alcantarillado pluvial como de redes sanitarias existentes y construcción del campamento.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
---	--

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
-------------------------------------	--

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	4
Fecha	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
---------------------------------	--

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre de 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00			\$	-
Acto Administrativo de asignación	Resolución 1832 de 2023				
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	VEINTE (20) MESES				

** Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias*



ADECUACION DE ACCESO ZONA POSTERIOR DEL HOSPITAL




ADECUACION DE ACCESO ZONA POSTERIOR DEL HOSPITAL




ADECUACION DE ACCESO ZONA POSTERIOR DEL HOSPITAL



CERRAMIENTO LATERAL CONTIGUA A LA FACULTAD DE MEDICINA

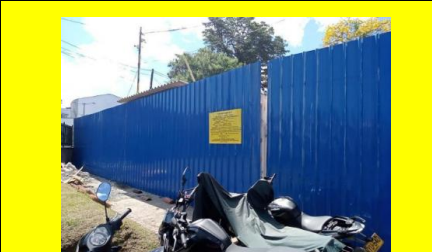

CERRAMIENTO FRONTAL HACIA EL PARQUEADERO PRINCIPAL

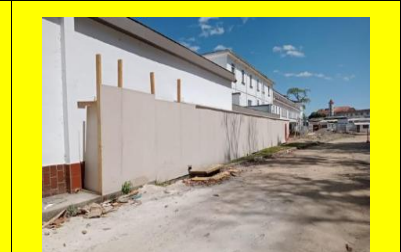

CERRAMIENTO Y PROTECCION DE FACHADA SERVICIO ONCOLOGIA



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en e mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS	
--	--

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS	
---	--

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	NA	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	NA	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	8-abr
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	8-abr

Elaborado por:	
----------------	--

Revisor por:

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						
RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023						
Informe No.	4					
Fecha	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024					
Departamento	CAUCA					
Municipio	POPAYAN					
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E					
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"					
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre de 2023					
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023					
COFINANCIACION	MSPS		ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00				\$ -
Acto Administrativo de asignación	Resolución 1832 de 2023					
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial						
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES					
Plazo de Ejecución Final:	VEINTE (20) MESES					
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias						
Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ	Nombre: JUAN FRANCISCO MORA OBANDO			Fecha de Elaboración:		1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION	Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			Pag. 1		
