

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10 DICIEMBRE	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10 (PERIODO DICIEMBRE DE 2024)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10
CONSORCIO INTERSALUD PZ

	
Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M. Representante legal Consortio Intersalud PZ

DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	8
2.1. Localización.....	9
2.2. Justificación.....	10
2.3. Características del Proyecto.....	11
3.1. Contrato de Obra.....	12
3.2. Póliza del Contrato de Obra.	12
3.3. Contrato de Interventoría.....	13
3.4. Pólizas de Interventoría.....	14
4.1. Gestión Administrativa.....	15
4.1.1 Personal de Interventoría	15
4.1.2 Personal del contratista de obra.	15
4.1.3. Comités de obra.	16
4.1.4 Correspondencia Cruzada.....	18
4.2. Gestión Técnica	22
4.2.1 Avance de obra	22
4.3. Gestión Financiera	50
4.4. Gestión Socioambiental.....	53
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	68
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA	70
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE MUESTRAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA	71
8. CONCLUSIONES	75

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.	9
Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo vigas y viguetas	23
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C1.....	23
Ilustración 4. Disposición de concreto vigas y viguetas.....	24
Ilustración 5. Disposición concretos cabezal 1 Y 2	25
Ilustración 6. Disposición de concreto cabezal 3 y 4	25
Ilustración 7. Disposición concreta PW3	26
Ilustración 8. Disposición concreta PW5	27
Ilustración 9. Disposición de concreto PW9	28
Ilustración 10. Disposicion acero de refuerzo losa de cimentación	28
Ilustración 11. Disposición concretos foso ascensor	29
Ilustración 12. Localización vigas cimentación y viguetas	30
Ilustración 13. Localización ejes de pantallas y columnas	31
Ilustración 14. Disposición de refuerzo de pantalla PW1, piso 1	34
Ilustración 15. Disposición de refuerzo de pantalla PW6, piso 1	34
Ilustración 16. Disposición de refuerzo de pantalla PW7, piso 1	35
Ilustración 17.Disposición de refuerzo de pantalla PW8, piso 1	36
Ilustración 18. Disposición de refuerzo de pantalla PW9, piso 1	37
Ilustración 19. Acero corrugado de pantallas	40
Ilustración 20. Acero corrugado viguetas	42
Ilustración 21. Acero corrugado losa de cimentación	43
Ilustración 22. Armado Acero de refuerzo	45
Ilustración 23. Fundición losa de cimentación.....	47

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Ilustración 24. Acero de refuerzo pantallas	49
Ilustración 25. Salud ocupacional visitantes.....	59
Ilustración 26.Disposición y utilización chalecos	61
Ilustración 27.Disposicion botiquín reglamentario	62
Ilustración 28. Disposición de camillas	63
Ilustración 29. Disposición y empleo adecuación senderos peatonales y vehiculares temporales.....	64
Ilustración 30. Disposición y empleo señal reglamentaria.....	65
Ilustración 31.Disposición y empleo señal informativa	66
Ilustración 32. Disposición y empleo señal preventiva	67
Ilustración 33. Capacitaciones personal operativo mes DICIEMBRE.....	70

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra.....	12
Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra	13
Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra	13
Tabla 4. Contrato de Interventoría	14
Tabla 5. Pólizas de Interventoría	14
Tabla 6. Personal de Interventoría.....	15
Tabla 7. Personal del contratista de obra.....	16

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Tabla 8. Actas de comité	16
--------------------------------	----

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.	13
Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría	14
Anexo 3. Planillas personal Interventoría.....	15
Anexo 4. Actas de comités técnicos DICIEMBRE de 2024	18
Anexo 5. Trazabilidad de correspondencia Cruzada.....	21
Anexo 6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024.	51
Anexo 7. Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024.....	51
Anexo 8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024	51
Anexo 9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024.....	51
Anexo 10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024	51

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Anexo 11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE 2024.	51
Anexo 12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE 2024.	52
Anexo 13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024.	52
Anexo 14. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 2024.	52
Anexo 15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 2024.	52
Anexo 16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 12 de DICIEMBRE 2024.	52
Anexo 17. Informe mensual de DICIEMBRE de 2024 del contratista de obra.....	70
Anexo 18. Resultados resistencia concreto CONTRATISTA	75
Anexo 19. Resultados resistencia concreto INTERVENTORIA.....	75

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del mes de DICIEMBRE de 2024, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	CONSORCIO INTER-SALUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km², el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fué intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO INTERSALUD PZ
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. (\$1.280.412.030) incluido iva.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030

Tabla 4. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-mayo-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	\$256.082.406,00

Tabla 5. Pólizas de Interventoría

Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo de DICIEMBRE de 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Gerardo Muñoz
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniera eléctrica	Carolina Gonzalez
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Wilber Asmet Restrepo P.
Abogado	José Alexander Romero
Contador publico	Edwin Micolta Mondragón

Tabla 6. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Gerente Consorcio Evolet	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	José Geovaire Ausecha
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Estiven Daniel Chilito
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Malene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Julio Cesar Maya
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Arquitecta Apoyo técnico	Laura Valentina Callejas
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria

Tabla 7. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron CINCO (5) comités técnicos.

COMITÉ	FECHA
31	2-12-2024
Acta de reunión	6-12-2024
Reunión ministerio	18-12-2024
32	13-12-2024
33	20-12-2024


Tabla 8. Actas de comité

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Las actas de comité realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del mes de DICIEMBRE se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

El 4 y 6 de diciembre de 2024 se realizaron una mesas técnicas con el Ministerio de salud y protección social para realizar la revisión de los ítems no previstos. En la cual participo contratista de obra, secretaria de salud Depto e interventoria.



DESCRIPCION	UNID	CANT	DESP. %	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PLATON DE DIAMETRO 1.50 MT ESCALAZON MECANICAMENTE (INCLUYE DISEÑO DE CANTALLO, CONCRETO TIENDE Y PUNTO DE SUBARMATE)					
MANO DE OBRA					
OTROS					
TOTAL					2,800,000.00

El 6 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una mesa técnica con el propósito de revisar los ítems no previstos surtidos hasta la fecha. En dicha reunión estuvieron presentes entidad, contratista de obra, Secretaria de Salud Departamental e interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

El 18 de diciembre de 2024, se realizó una mesa de trabajo en el Ministerio de salud y protección social, con el fin de revisar los Apus no previstos del proyecto. A dicha reunión asistieron el contratista, la secretaría de salud y la interventoría. Debido a la premura en la convocatoria, la entidad no pudo contar con acompañamiento.

Anexo 4. Actas de comités técnicos DICIEMBRE de 2024

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el mes de DICIEMBRE.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO
10/12/2024	CIPZ-078-112-2024	REVISIÓN DOCUMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
12/12/2024	CIPZ-078-113-2024	BALANCE CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
13/12/2024	CIPZ-078-114-2024	OBSERVACIONES A FLUJO DE CAJA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
13/12/2024	CIPZ-078-115-2024	REVISION INFORME MENSUAL MANEJO DEL ANTICIPO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
14/12/2024	CIPZ-078-116-2024	APROBACION BALANCE PRESUPUESTAL CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
14/12/2024	CIPZ-078-117-2024	SOLICITUD INFORMACION CUARTO DE BOMBAS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
16/12/2024	CIPZ-073-118-2024	REMISION INFORME MENSUAL MES OCTUBRE 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSI-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
19/12/2024	CIPZ-078-119-2024	PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
20/12/2024	CIPZ-078-120-2024	RENDIMIENTOS ANTICIPO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
23/12/2024	CIPZ-078-121-2024	SOLICITUD RESPUESTA OFICIOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET -
24/12/2024	CIPZ-078-122-2024	REMISION RENDIMIENTOS ANTICIPO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET -
26/12/2024	CIPZ-078-123-2024	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO. 22024141900050568	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JAMES HERNANDO CORREA GRIJALBA SECRETARIOS SECCIONAL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
2/12/2024	NA	2/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSIONES
2/12/2024	NA	2/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RADICADO PROVISIONAL ACUEDUCTO
3/12/2024	N.A	3/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DISEÑO SUBESTACION Y APANTALLAMIENTO
3/12/2024	EV-C358-23-0193-24	3/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	AJUSTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
3/12/2024	EV-C358-23-0195-24	3/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CIMENTACION
5/12/2024	EV-C358-23-0196-24	5/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION FUNDICION
7/12/2024	EV-C358-23-197-24	7/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 09 AL 14 DICIEMBRE 2024
12/12/2024	N.A	12/12/2024	ENTIDAD HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO BALANCE DE OBRA CONTRATO N°358 DE 2023
12/12/2024	EV-C358-23-0199-24	12/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION FUNDICION
14/12/2024	EV-C358-23-201-24	14/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DOCUMENTOS LICENCIA DE CONSTRUCCION Y BALANCE PRESUPUESTAL
14/12/2024	EV-C358-23-202-24	14/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

16/12/2024	EV-C358-23-203-24	16/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE DE PERSONAL EN OBRA
17/12/2024	EV-C358-23-204-24	17/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE INSPECTOR SST
18/12/2024	EV-C358-23-205-24	18/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME EVOLET NOVIEMBRE
19/12/2024	EV-C358-23-0208-24	19/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION FUNDICION
19/12/2024	NA	19/12/2024	SUBGERENTE JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO
19/12/2024	NA	19/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	FACTIBILIDAD PROVISIONAL ENERGIA
21/12/2024	EV-C358-23-0210-24	21/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROGRAMACION ACTIVIDADES
21/12/2024	EV-C358-23-211-24	21/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 23 AL 28 DICIEMBRE 2024
23/12/2024	EV-C358-23-212-24	23/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 358
26/12/2024	EV-C358-23-213-24	26/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
26/12/2024	EV-C358-23-214-24	26/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DISEÑOS ELECTRICOS
27/12/2024	EV-C358-23-215-24	27/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio cipz-078-115-2024 - informe mensual de anticipo
28/12/2024	EV-C358-23-216-24	28/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el mes de DICIEMBRE de 2024, el contratista de obra continuó con las actividades de armado de aceros de la losa de cimentación inferior, de la losa superior de cimentación, las vigas de cimentación A, B, 4, 6, 7, 8, , los arranques aceros de las columnas C1, los arranques de las pantallas, PW3 (A8), PW5 (E8), PW9 (8 C-D), los arranques de la grada principal y la grada de emergencia, de las viguetas, VT8, VT9, VT10, VT11, VT12, VT13, VT14,VT15,VT16.

Se instaló en concreto de la losa de cimentación inferior y superior, los dados de la cimentación TIPO 1 (2 C-D), (3 C-D), (4 C-D), (6 C-D), (7 C-D), (8 C-D), TIPO 2 (A7),(E4), (E6), (E7), (E8), (G7), (G8), TIPO 3 (A 2 -3), (E 2-3), TIPO 4 (A8), de las vigas de cimentación A, B, C, D, E, F, G, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y viguetas de cimentación VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6, VT7, VT8, VT9, VT10, VT11, VT12, VT13, VT14,VT15,VT16.

DISPOSICION DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION Y VIGUETAS DE CIMENTACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

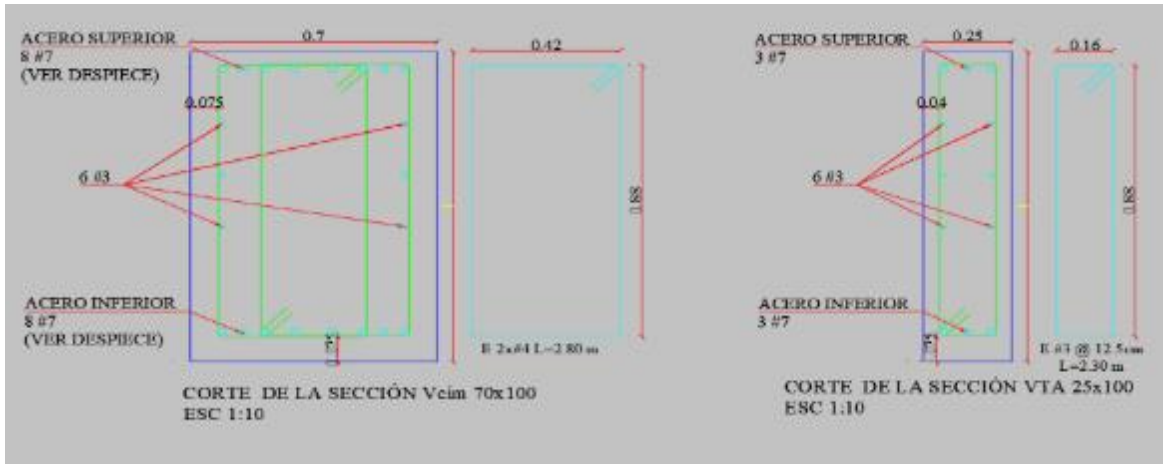


Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo vigas y viguetas

DISPOSICION DE REFUERZO PARA COLUMNAS. PISO 1 NIVEL 0+000 A 0+3.70

- COLUMNA C1

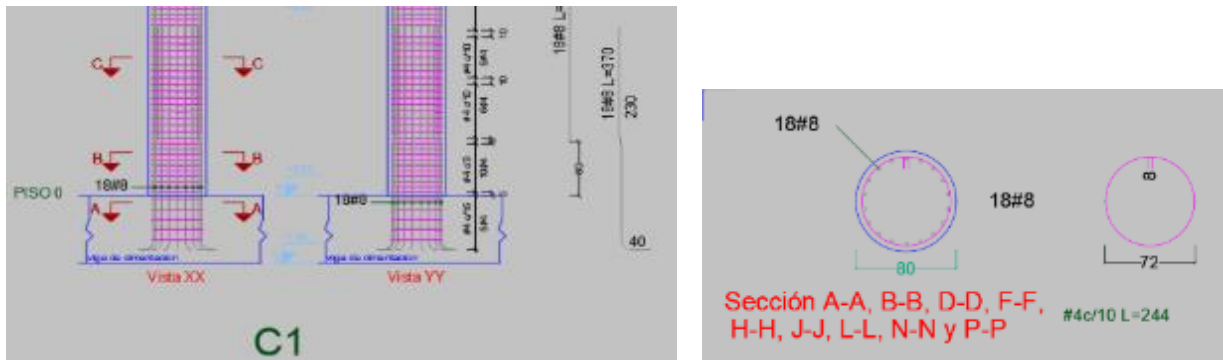


Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C1

Se realizó la fundición de la losa de cimentación inferior cuyo espesor es de 0.30 mts, con concreto de 4000 psi, agregado máximo de 1/2, en las zonas de los dados que soportan las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, se utilizó concreto de 4000 psi con agregado máximo 3/8".

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Se fundieron los dados, las vigas de cimentación con concreto de 4000 psi, agregado máximo de 1/2".

Se fundió la losa de cimentación superior cuyo espesor es de 0.10 mts con concreto de 4000 psi, agregado máximo de 1/2".

DISPOSICION DE CONCRETOS VIGAS DE CIMENTACION Y VIGUETAS DE CIMENTACION

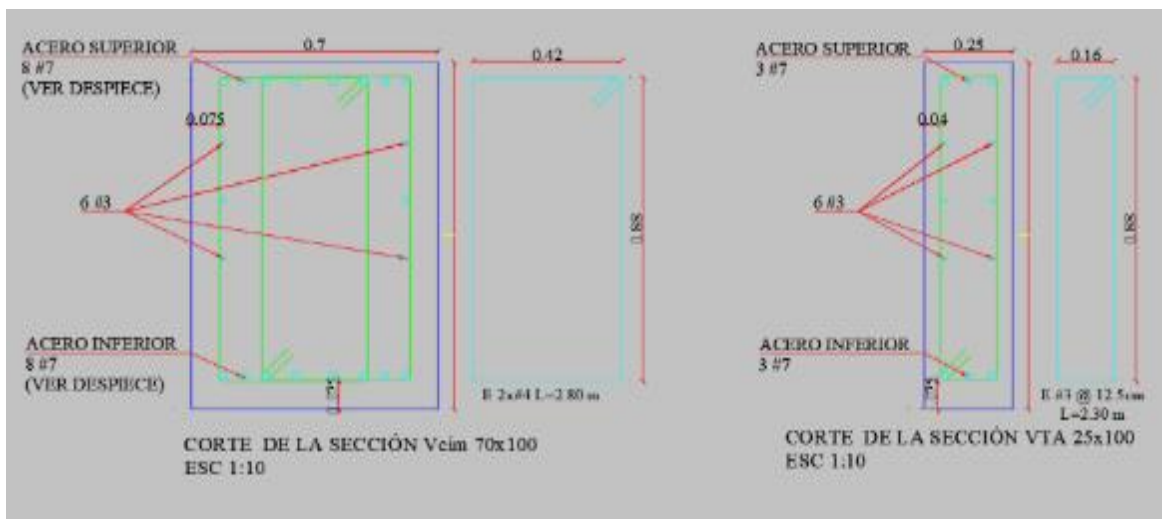


Ilustración 4. Disposición de concreto vigas y viguetas

DISPOSICION DE CONCRETOS CABEZALES DE CIMENTACION

CABEZAL 1

CABEZAL 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

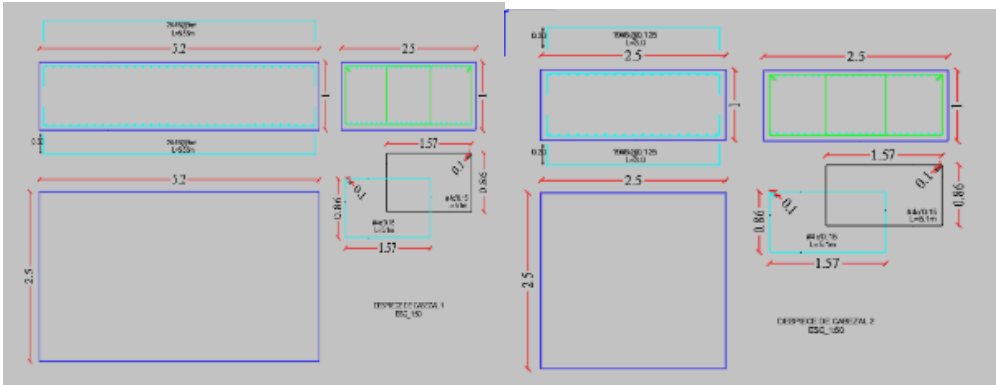


Ilustración 5. Disposición concretos cabezal 1 Y 2

• CABEZAL 3

CABEZAL 4

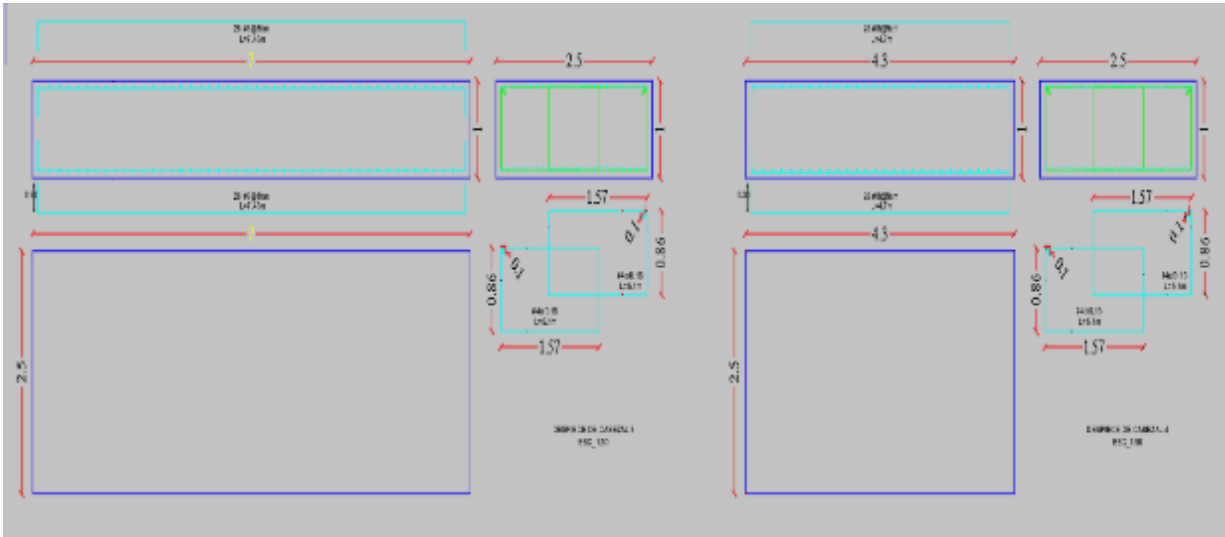


Ilustración 6. Disposición de concreto cabezal 3 y 4

• PANTALLA PW3

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1




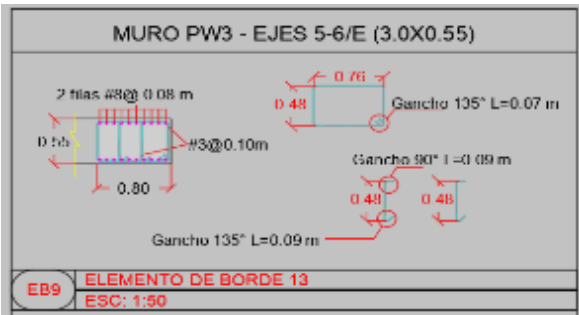


Ilustración 7. Disposición concreta PW3

- PANTALLA PW5

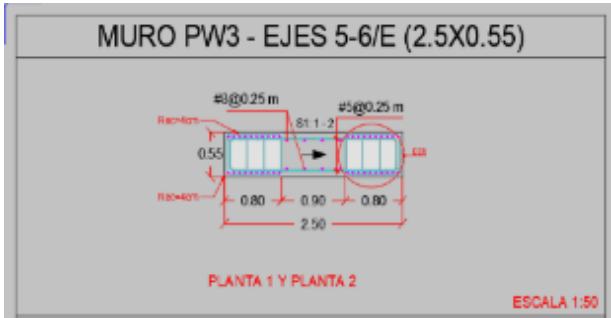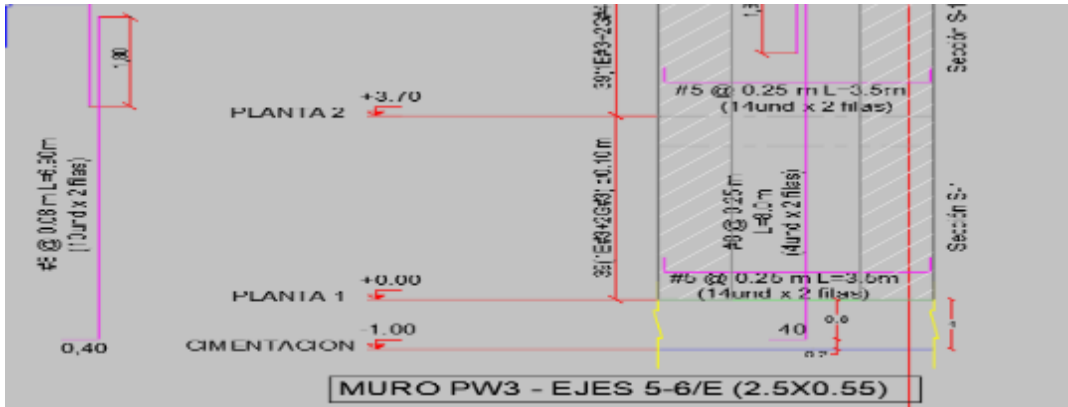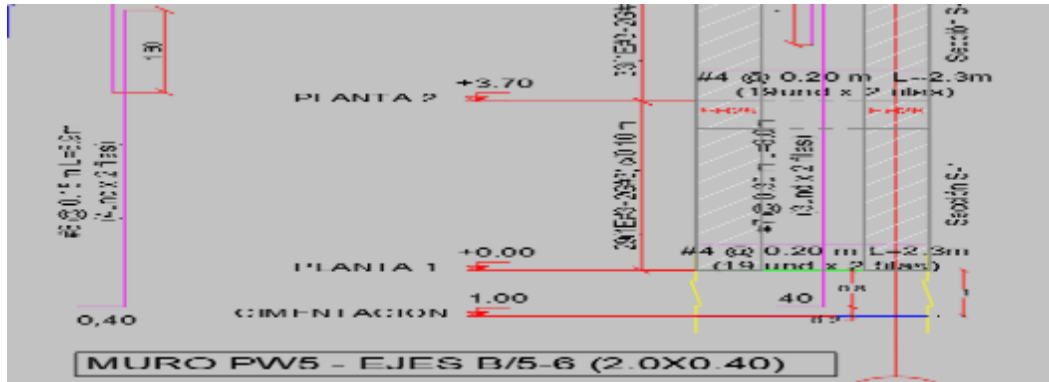

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1



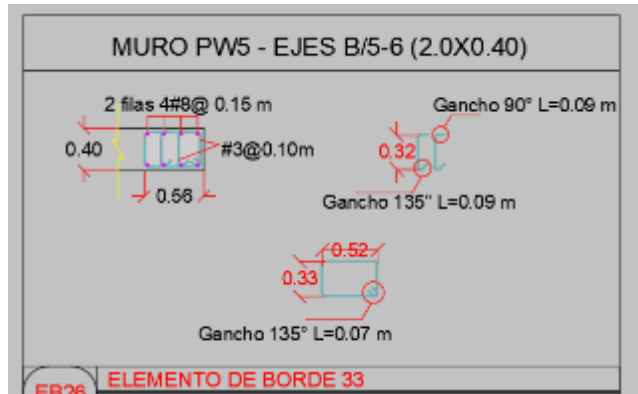


Ilustración 8. Disposición concreta PW5

- PANTALLA PW9

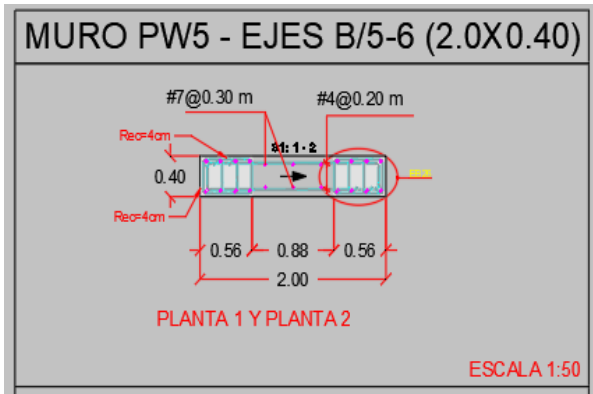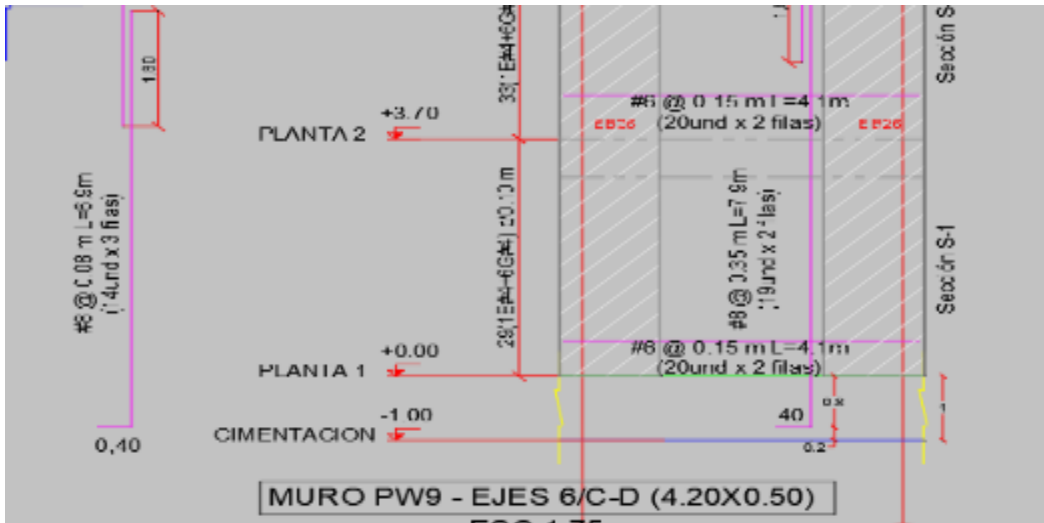

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

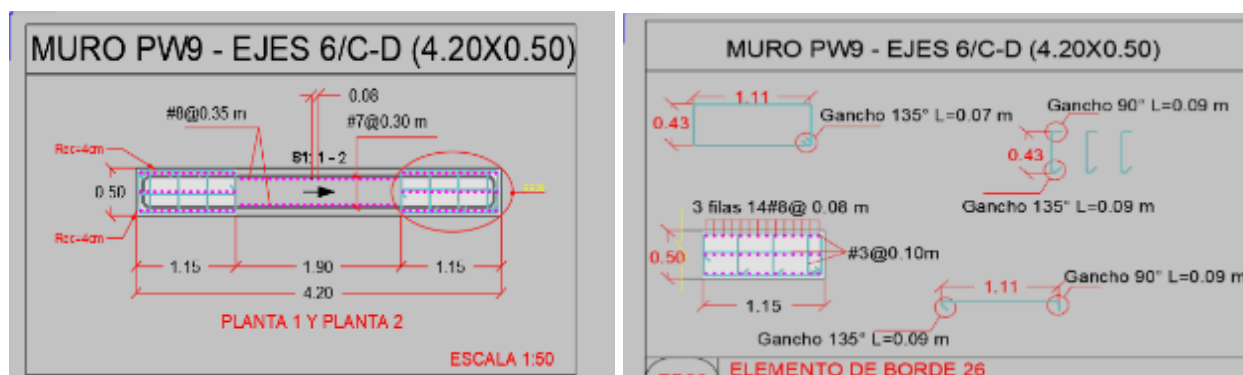


Ilustración 9. Disposición de concreto PW9

DISPOSICION ACERO DE LA LOSA DE CIMENTACION

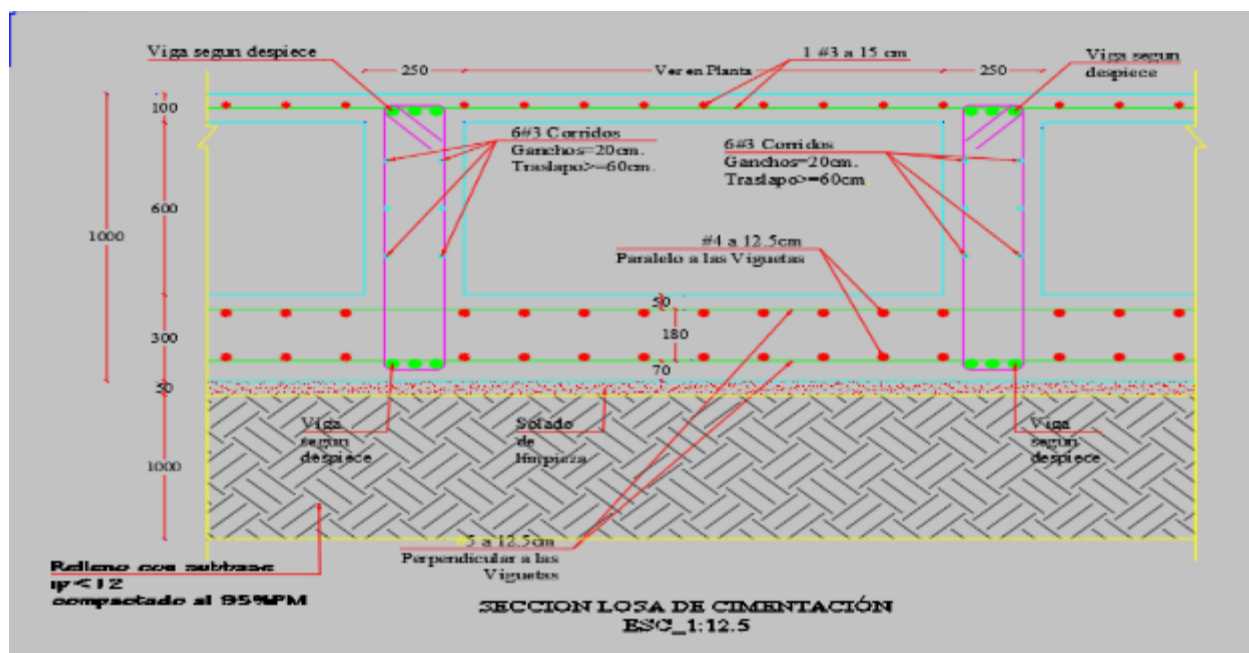


Ilustración 10. Disposicion acero de refuerzo losa de cimentación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

CONSORCIO
INTERSAUD PZ



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1

DISPOSICION DE CONCRETOS FOSO DEL ASCENSOR

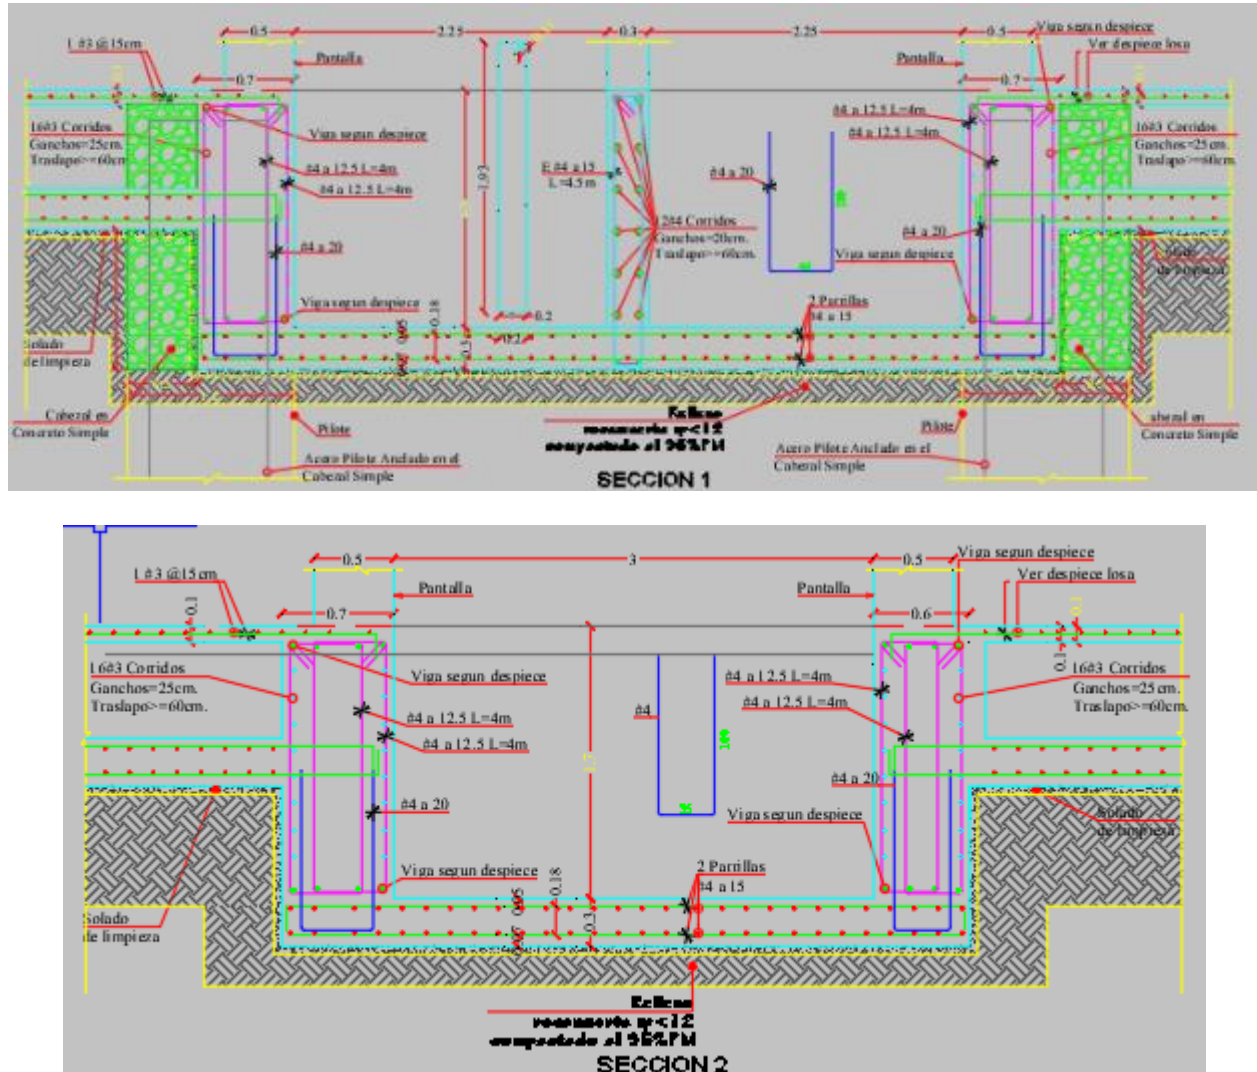


Ilustración 11. Disposición concretos foso ascensor

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1

LOCALIZACION DE VIGAS DE CIMENTACION Y VIGUETAS

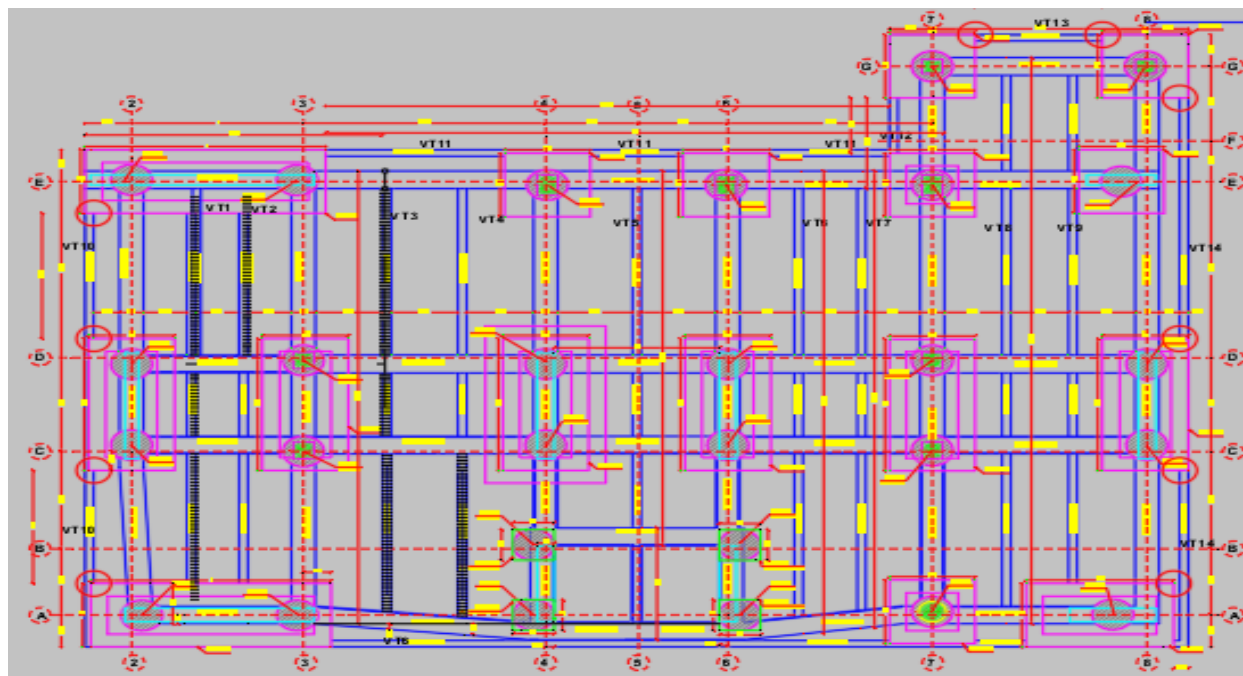


Ilustración 12. Localización vigas cimentación y viguetas

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1

LOCALIZACION DE COLUMNAS Y PANTALLAS

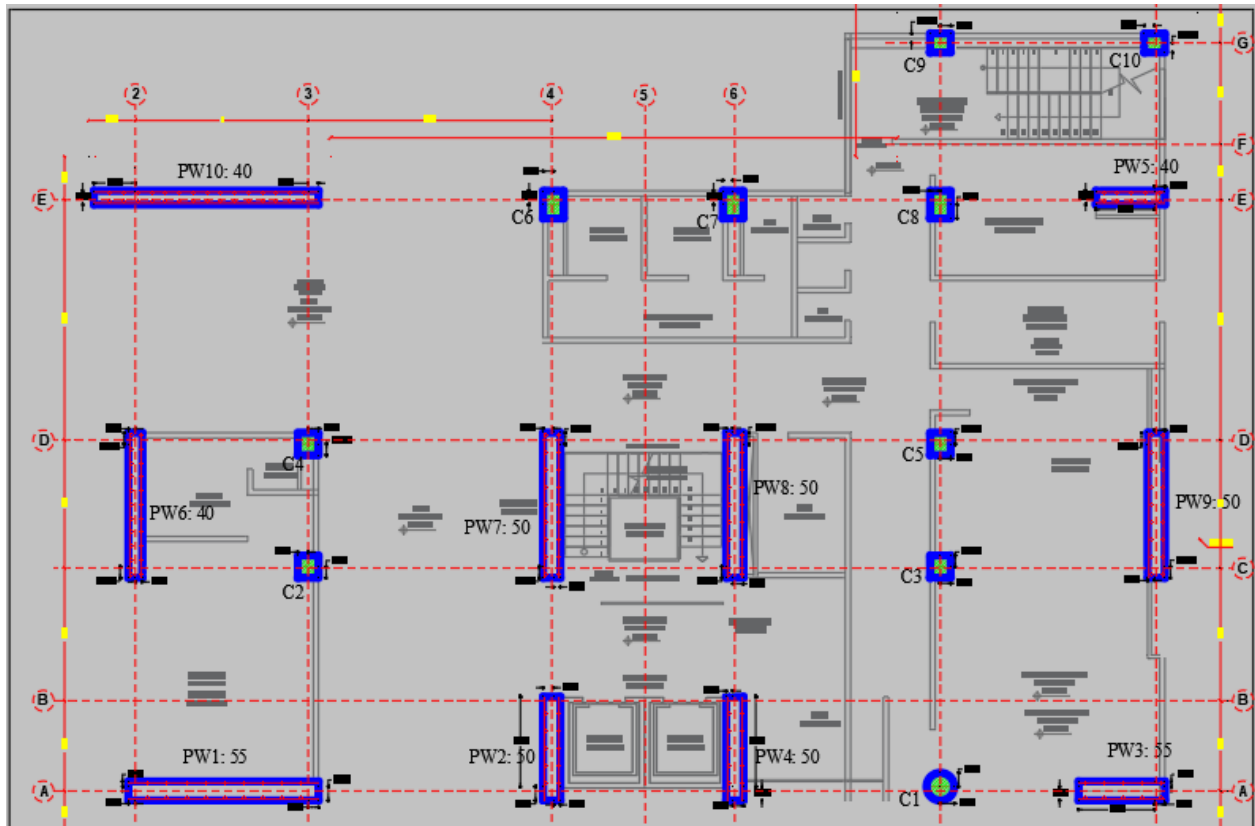


Ilustración 13. Localización ejes de pantallas y columnas

ACERO ESTRUCTURAS

CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa

Conforme al diseño estructural para la cimentación, previo al vaciado de los concretos que conforman todas las estructuras de la cimentación, se armó la estructura de refuerzo para los dados, las vigas, las viguetas, la losa, los arranques de las pantallas, los

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

arranques de las columnas, los arranques de las gradas principales y las gradas de emergencia, el foso del ascensor.

Las vigas de cimentación tienen de refuerzo 8 varillas No 7 dispuestas en la parte superior y 8 varillas No 7 en la parte inferior, 3 varillas No 3 en cada cara lateral, estribo No 4 en doble disposición, separados 0.125 mts.

Las viguetas de cimentación tienen de refuerzo 3 varillas No 7 dispuestas en la parte superior y 3 varillas No 7 en la parte inferior, 3 varillas No 3 en cada cara lateral, estribo No 3 separados 0.125 mts.

La pantalla PW3 tienen de acero principal 40 varillas No 8 dispuestas en 2 filas de 10 cada una, para cada elemento de borde, en la zona intermedia 8 varillas No 8 dispuestas en 2 filas de 4 cada una.

La pantalla PW4 tienen de acero principal 60 varillas No 8 dispuestas en 3 filas de 10 cada una, para cada elemento de borde, en la zona intermedia 10 varillas No 6 dispuestas en 2 filas de 5 cada una.

La pantalla PW5 tienen de acero principal 16 varillas No 8 dispuestas en 2 filas de 4 cada una, para cada elemento de borde, en la zona intermedia 6 varillas No 7 dispuestas en 2 filas de 3 cada una.

La pantalla PW9 tienen de acero principal 84 varillas No 8 dispuestas en 3 filas de 14 cada una, para cada elemento de borde, en la zona intermedia 38 varillas No 8 dispuestas en 2 filas de 19 cada una.

La columna C1 tiene de refuerzo principal 18 varillas No 8.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1


La losa inferior de la cimentación tiene de refuerzo principal varilla No 5 cada 0.15 mts el acero secundario es No 4 cada 0.125 mts, en doble parrilla.

La losa superior de la cimentación tiene de refuerzo principal varilla No 3 cada 0.15mts en ambos sentidos, parilla sencilla.

Posterior a la fundición de los concretos de las estructuras de la cimentación, se procedió a continuar con la instalación de los aceros estructurales de las pantallas PW1, PW6, PW7, PW8, PW9, en los que corresponde al nivel 0+000 al nivel 0+320.

DISPOSICION DE REFUERZO DE PANTALLAS PISO 1 NIVEL 0+000 A 0+3.70

- PANTALLA PW1

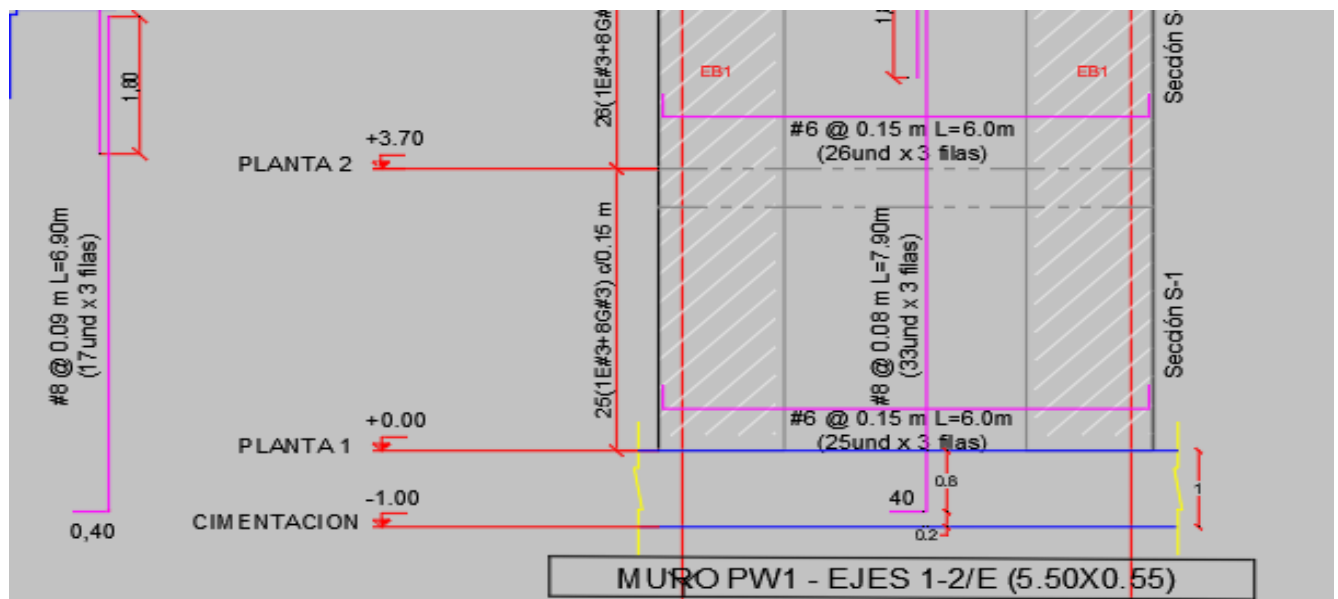

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

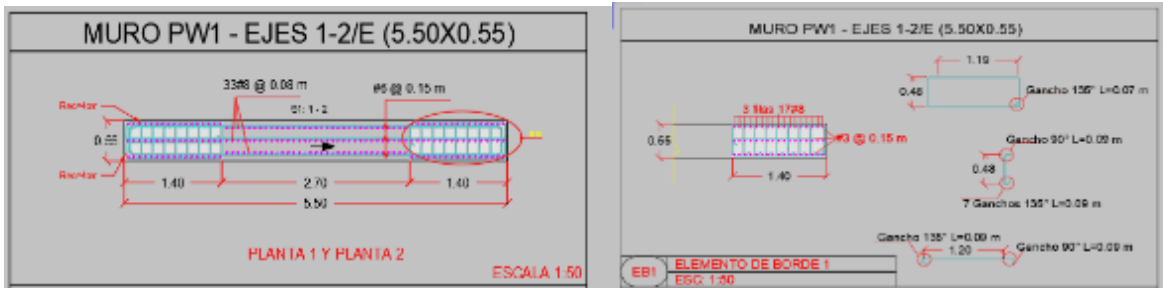


Ilustración 14. Disposición de refuerzo de pantalla PW1, piso 1

- PANTALLA PW6.

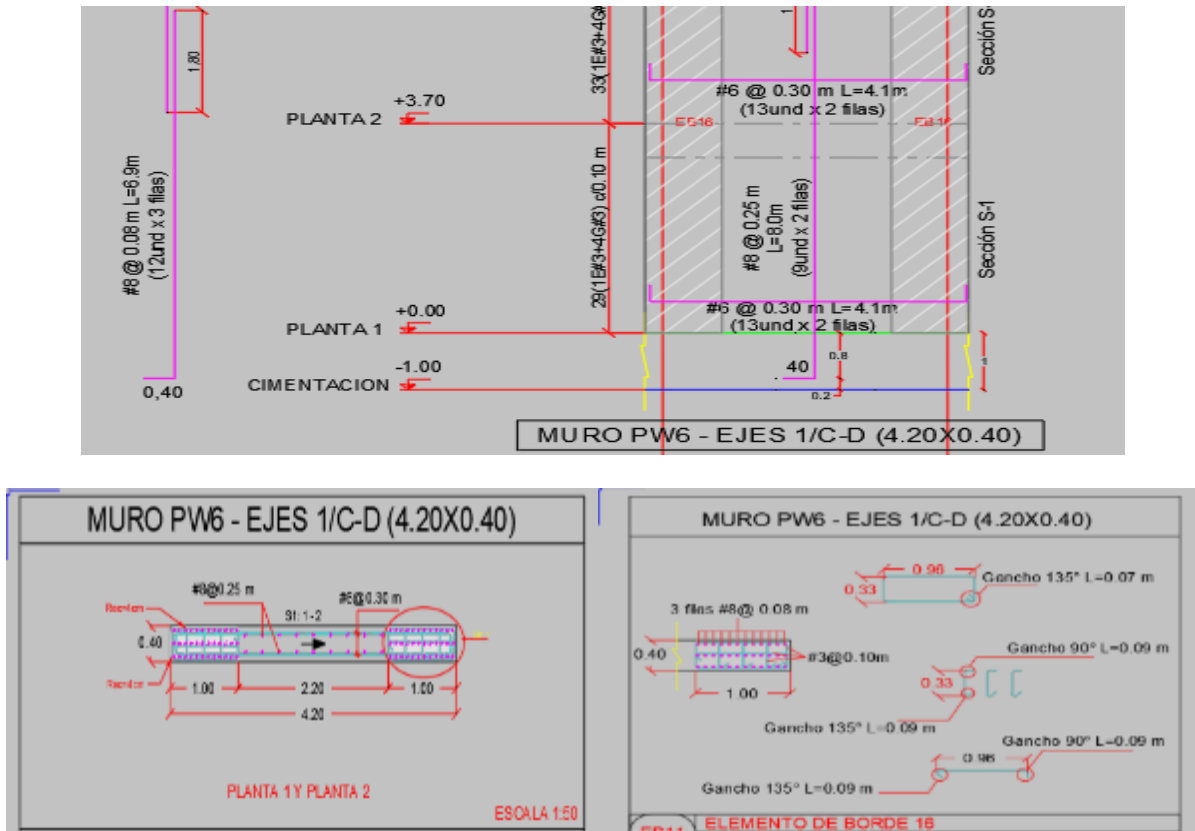


Ilustración 15. Disposición de refuerzo de pantalla PW6, piso 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- PANTALLA PW7

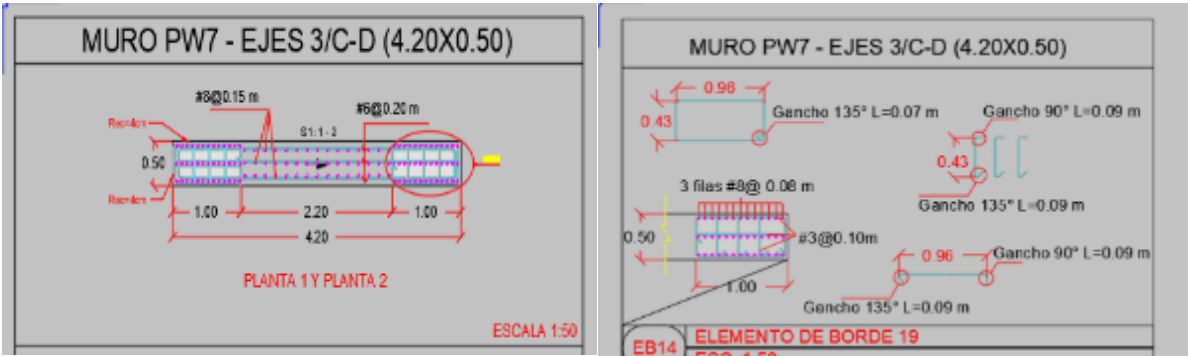
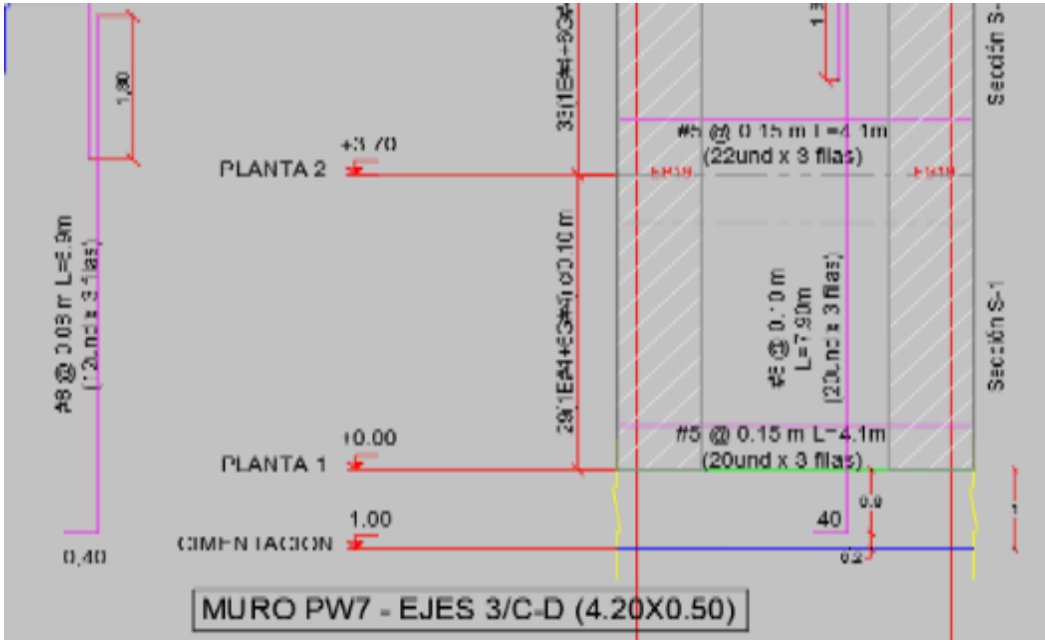


Ilustración 16. Disposición de refuerzo de pantalla PW7, piso 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- PANTALLA PW8

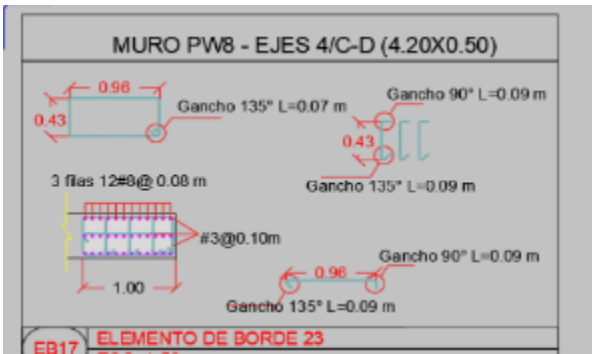
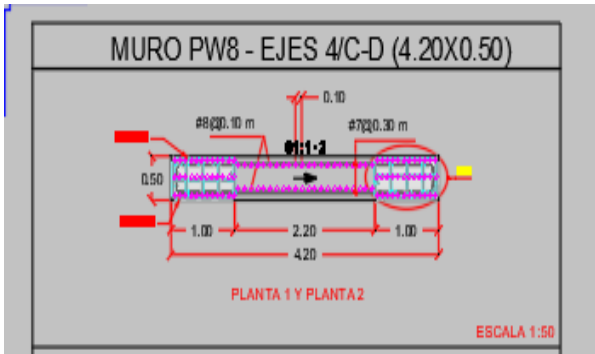
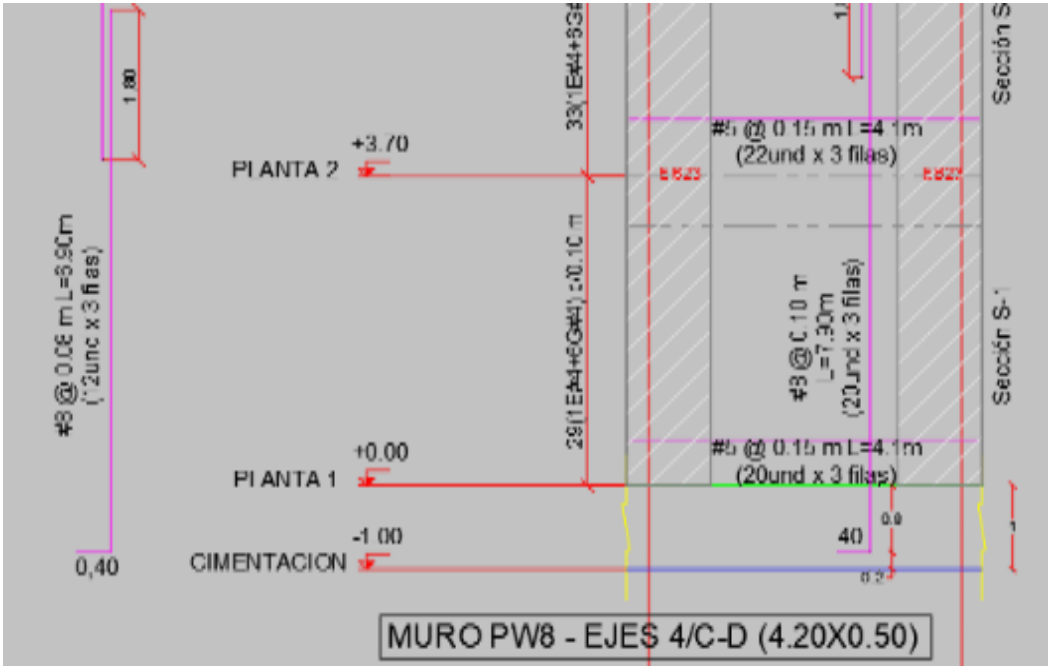


Ilustración 17. Disposición de refuerzo de pantalla PW8, piso 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- PANTALLA PW9

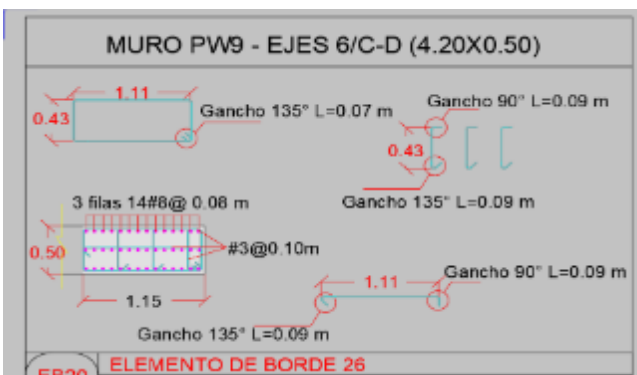
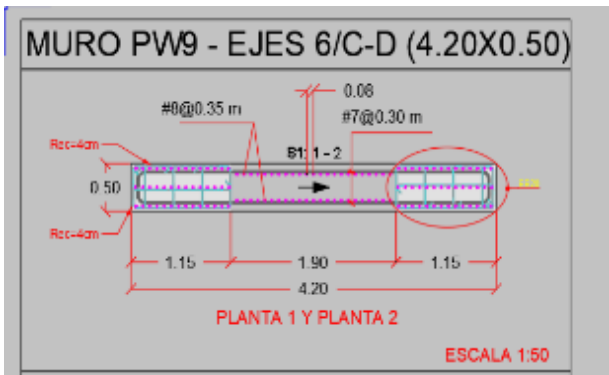
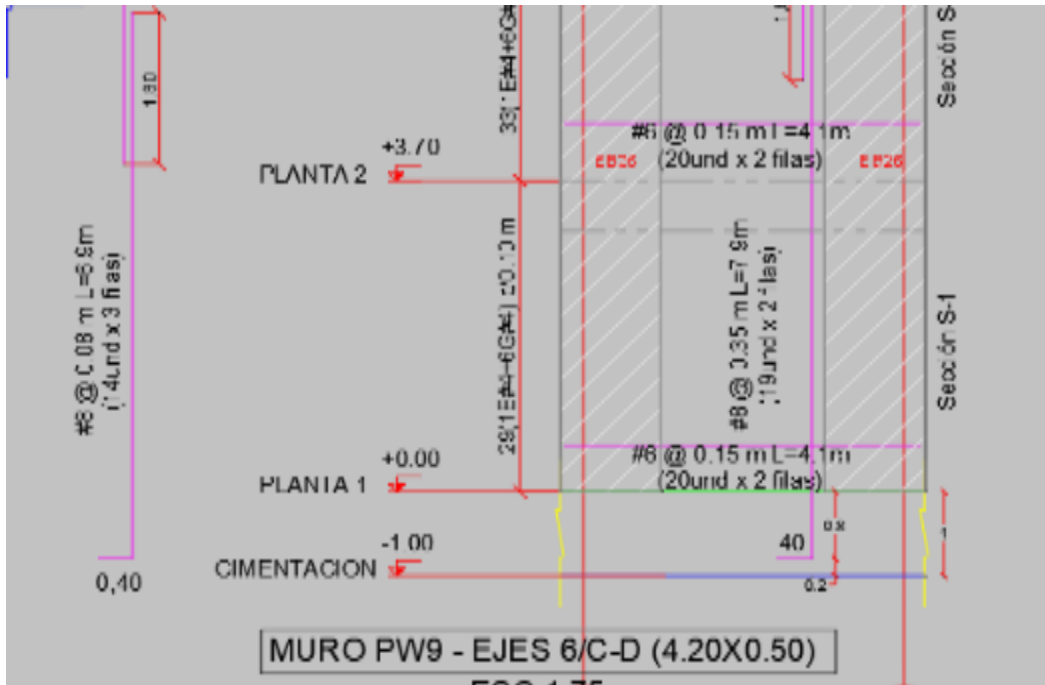


Ilustración 18. Disposición de refuerzo de pantalla PW9, piso 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

▪ **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa CIMIENTO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, B, C, D, E, F, G, 2, 3, 4, 6, 7, 8, con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de cimentación es de 0.70 mts de ancho por 1.0 mts de espesor.

▪ **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE CIMENTACION.**

Se instaló en concreto de 28 Mpa la losa de cimentación inferior, cuyo espesor es de 0.30 mts, con agregado máximo de ½".

▪ **CONSTRUCCIÓN LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN DE 0,7 MT DE ALTURA, CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR 0,10 MT Y VIGUETAS DE 0,25X0,6 MT.**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, de la losa de cimentación aligerada que está conformada por la losa superior de 0.10 mts de espesor y las viguetas de 0.30 mts de ancho por 0.70 mts de espesor, agregado máximo de ½", viguetas de cimentación VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6, VT7, VT8, VT9, VT10, VT11, VT12, VT13, VT14, VT15, VT16.

▪ **CONSTRUCCION DE ZAPATAS (CABEZALES) EN CONCRETO.**

Se instaló concreto de 28 Mpa para zapatas (cabezales) en concreto, de los dados de la cimentación TIPO 1 (2 C-D), (3 C-D), (4 C-D), (6 C-D), (7 C-D), (8 C-D) cuya dimensión es de 5.2 x 2.5 x 1.0 mts, TIPO 2 (A7),(E4), (E6), (E7), (E8), (G7), (G8) cuya dimensión es de 2.5 x 2.5 x 1.0 mts, TIPO 3 (A 2 -3), (E 2-3) cuya dimensión es de 7.0 x 2.5 x 1.0 mts, TIPO 4 (A8) cuya dimensión es de 4.3 x 2.5 x 1.0 mts, el concreto utilizado tenía un agregado máximo de 3/8".

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Para los concretos de la losa de cimentación se elaboraron muestras para realizar ensayos de resistencia a la compresión.

Para los concretos de las vigas, dados y viguetas se elaboraron muestras para realizar ensayos de resistencia a la compresión.

Para los concretos de la losa superior de la cimentación, se elaboraron muestras para realizar ensayos de resistencia a la compresión.

ACERO ESTRUCTURAS

- **PANTALLAS ACERO CORRUGADO $F_y=420$ MPa**

Posterior a la fundición de los concretos de las estructuras de la cimentación, se dio continuidad a la instalación de los aceros estructurales de los elementos de borde y de las zonas intermedias de las pantallas PW1, PW6, PW7, PW8, PW9, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
	
CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa PANTALLAS	

Ilustración 19. Acero corrugado de pantallas

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa VIGUETAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa LOSA SUPERIOR DE CIMENTACION

Ilustración 20. Acero corrugado viguetas

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1



Ilustración 21. Acero corrugado losa de cimentación



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa VIGUETAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



CIMENTACIÓN CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE CIMENTACION

Ilustración 22. Armado Acero de refuerzo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



FUNDICION CONCRETO DE 28 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1

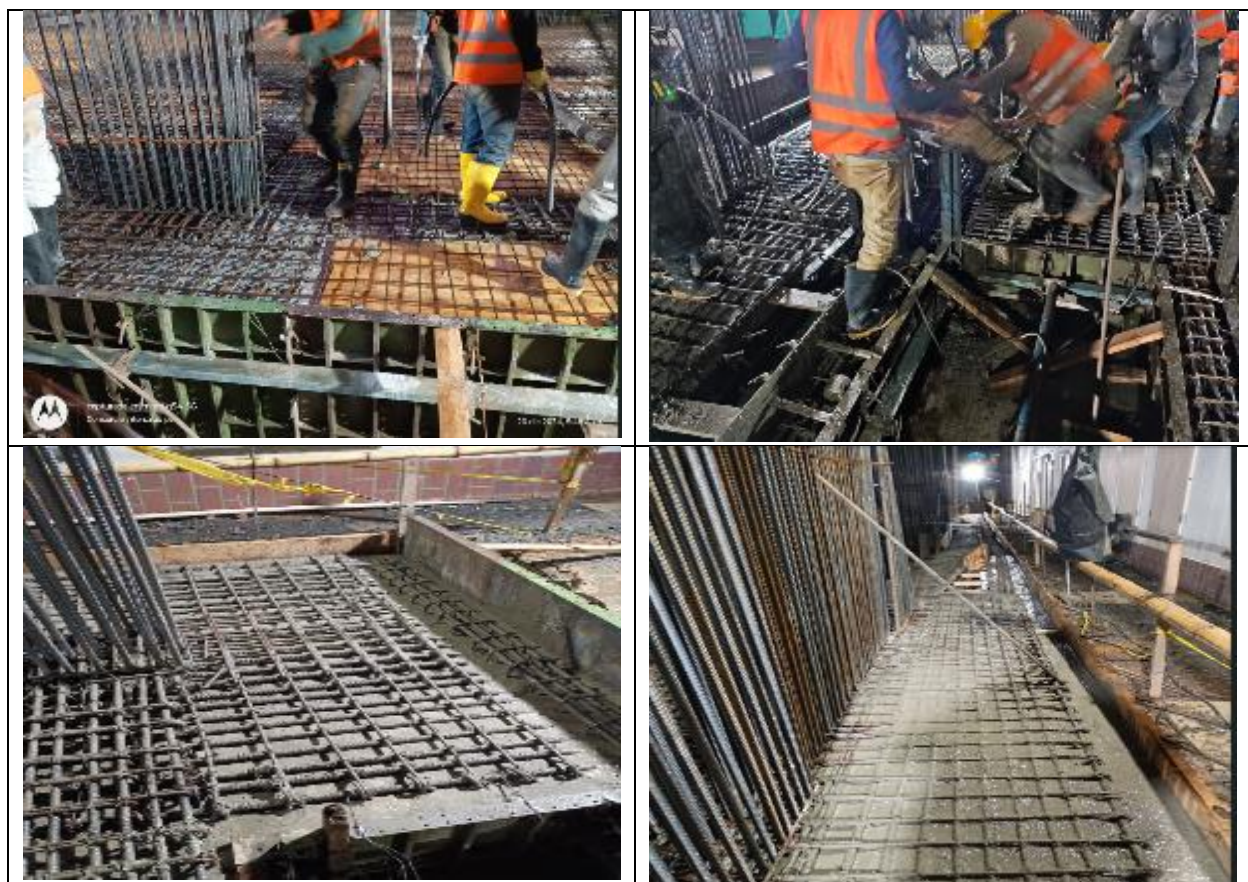

CIMENTACIÓN CONCRETO DE 28 Mpa PARA CABEZALES DE CIMENTACION

Ilustración 23. Fundición losa de cimentación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



CIMENTACIÓN CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA ALIGERADA DE CIMENTACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



ACERO ESTRUCTURAL PANTALLAS ACERO CORRUGADO $F_y=420$ MPa

Ilustración 24. Acero de refuerzo pantallas

BALANCE ECONOMICO DE AVANCE DE OBRA.

El contrato de obra presenta un avance económico acumulado al 31 de DICIEMBRE del 11.41% frente un avance programado del 10.13%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el mes de diciembre fue del 2.02% frente a un avance programado del 2.01%.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	\$109,503,404	0.33%	\$363.707.100	1.12%
30-09-2024	\$858,324,856	2.16%	\$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	\$1.948.435.571	6.00%	\$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	\$2.636.884.000	8.12%	\$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	\$3.299.608.964	10.13%	\$3.705.275.250	11.41%
AVANCE	\$652.724.964	2.01%	\$655.973.357	2.02%

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo \$9742178571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 31 de diciembre de 2024, la información suministrada por el contratista de obra sobre el manejo del anticipo, no ha cambiado.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS por un valor de \$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al ítem de materiales en el plan de inversión.

Anexo 6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024.

2. Ferretería GyJ por un valor de \$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al ítem de materiales en el plan de inversión.

Anexo 7. Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024.

3. URIEL PALTA AMA por un valor de \$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al ítem de transporte en el plan de inversión.

Anexo 8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024

4. UBANER PEREZ por un valor de \$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al ítem de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024

5. PEDRO ROMO por un valor de \$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al ítem de alquiler de equipos en el plan de inversión.

Anexo 10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de \$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al ítem de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

7. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de \$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE 2024.

8. FERRETERÍA FERROESTACIÓN por un valor de \$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024.

9. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de \$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 14. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 2024.

10. FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S por un valor de \$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 2024.

11. DIANA CAROLINA VIVAS por un valor de 133.865.096 m/cte. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 12 de DICIEMBRE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VLRO PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO EN FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 85,500,000	\$ 2,073,000	2.42%	\$ 83,427,000
2	TRANSPORTE	\$ 105,400,000	\$ 2,138,400	2.03%	\$ 103,261,600
3	MATERIALES	\$ 7,205,599,277	\$ 7,134,454,460	99.01%	\$ 71,144,817
4	MANO DE OBRA	\$ 2,345,679,294	\$ 1,731,343,620	73.81%	\$ 614,335,674
TOTAL		\$ 9,742,178,571	\$ 8,870,009,480		\$ 872,169,091

Se deja constancia, a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha realizado la entrega del informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al segundo mes. Cabe destacar que, al término del mes de DICIEMBRE las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

El 20 de diciembre mediante oficio CIPZ-078-0120-2024 se solicitó al contratista de obra el envío de los rendimientos financieros adeudados, en caso tal de haberse realizado se solicitó el envío de los comprobantes de pago. Posteriormente, el contratista el 23 de diciembre allegó mediante oficio EV-C358-23-212-24 los rendimientos financieros correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2024. En este sentido, esta interventoría remitió a la entidad mediante oficio CIPZ-078-0122-2024 del 24 de diciembre los rendimientos solicitados.

4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del mes de DICIEMBRE de 2024, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

I. PROGRAMA 1: APROVECHAMIENTO FORESTAL

En el marco del proyecto, el contratista identificó cinco especies arbóreas frutales cuya tala resultaba necesaria debido a su interferencia con la ubicación planificada. Por esta razón, gestionó el trámite correspondiente ante la Corporación Regional del Cauca (CRC). Como respuesta favorable, esta entidad emitió el 10 de julio de 2024 la Resolución No. DTC 700, mediante la cual otorgó el permiso para la tala de las especies mencionadas. Dicho documento fue anexado en su momento. Cabe resaltar que estas actividades ya fueron realizadas por el contratista de obra en meses anteriores, por lo cual, en el mes de DICIEMBRE no se requirieron acciones respecto a este programa.

II. PROGRAMA 2: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORNIDARIOS, ORGÁNICO, RECICABLES, PELIGROSOS Y ESCOMBROS

- DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES PLÁSTICAS CON TAPA 1 JUEGO DE 4 RECIPIENTES EN CADA FRENTE DE LA OBRA DEBIDAMENTE ETIQUETADAS INSTALADAS BAJO TECHO PROVISIONAL

Para la disposición en obra de los residuos sólidos el contratista dispone de recipientes plásticos con tapa, de diferentes colores lo cual permite la clasificación del tipo de residuo a depositar, ubicados bajo techo, tal como se evidencia en registro fotográfico adjunto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1



- DISPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA SITIOS INTERNOS DE DISPOSICIÓN TEMPORAL DE RESIDUOS KIT 4 ESTACIONES

El contratista informa que se encuentra contratada esta señalización, pero aún no ha sido entregada.

- PUNTO ECOLOGICO CON ESTRUCTURA EN GUADUA Y TECHO EN LAMINA DE ZINC

Dentro de la obra el contratista ha dispuesto de contenedores de basuras", en estibas y debidamente techado donde se separan residuos aprovechables en obra hierro y madera, dos puntos ecológicos en obra con canecas negra, blanca y roja, Tal como se evidencia en registro fotográfico anexo al informe.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1



- TRANSPORTE Y RETIRO DE RESIDUOS - RCD SUSCEPTIBLES Y NO SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO

En cuanto al manejo de los Residuos de la demolición y la construcción En el mes de DICIEMBRE no se realizó retiro de material RCD.

III. PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS


- DISPOSICIÓN DE TELERAS Y SU ESTRUCTURA DE APOYO Y SOSTENIMIENTO CERRAMIENTO MATERIALES.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Como se evidencia en el informe en este periodo y debido a que el proyecto no lo ha requerido el contratista no ha ejecutado acciones frente a esta acción

- SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS AL SALIR DE LA OBRA. (MANGUERAS, HIDROLAVADORA, AGUA, PLATAFORMAS DE APOYO, SISTEMA COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS ETC.)

Tal como se evidencia en el registro fotográfico adjunto al informe se está implementando el lavado de llantas de los vehículos al salir de la obra, con una hidro lavadora industrial junto con dos mangueras, de 30 y 50 metros respectivamente, destinadas al sistema de lavado de llantas. Este equipo contribuye a minimizar la contaminación por polvo y barro en las áreas circundantes.

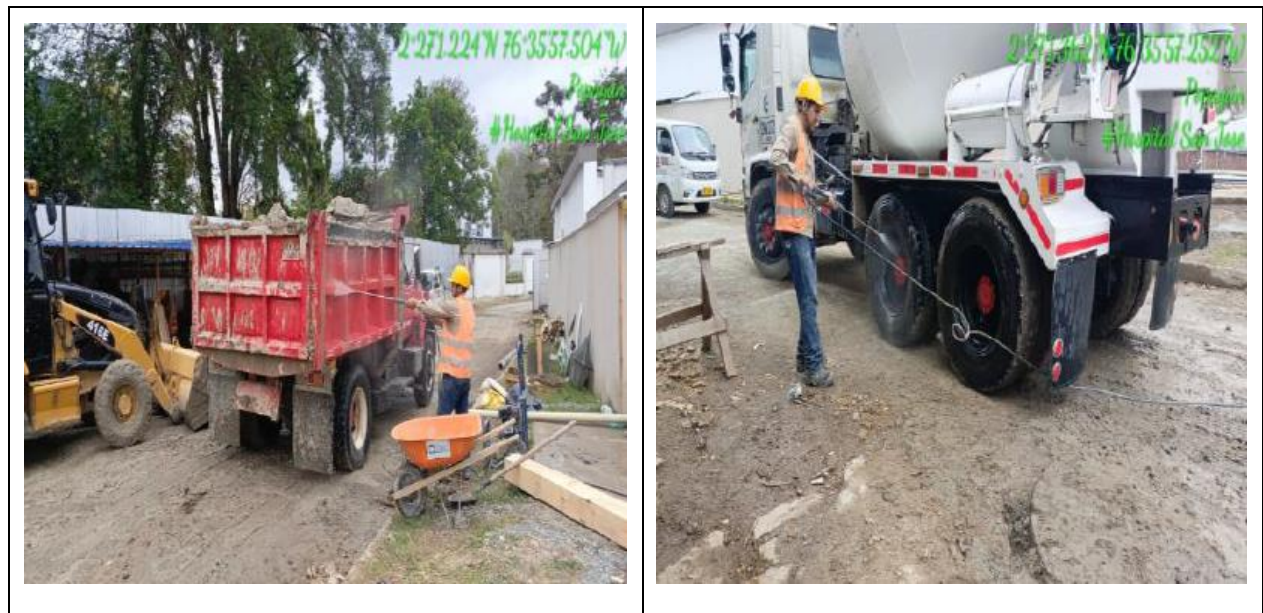

- TELERAS POLIETILENO NEGRO, CALIBRE 4 Y ANCHO DE 4 M PARA CUBRIR MATERIALES EN ALMACENAJE

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Se evidencia el empleo de polietileno negro en obra, para proteger el material como las excavaciones antes del proceso de compactación.



- AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS DESNUDAS (AGUA, MANGUERAS ASPERSORES BALDES ETC.)

Como se evidencia en el informe en este periodo y debido a que el proyecto no lo ha requerido el contratista no ha ejecutado acciones frente a esta acción

- HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

IV. PROGRAMA 4 PARA LA PROTECCION DEL SUELO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Dentro de las actividades que contempla este programa y como se evidencia en el informe en este periodo no se relacionan acciones frente a este componente por parte del contratista.

V. PROGRAMA 5 SALUD OCUPACIONAL VISITANTES

- DISPOSICION Y EMPLEO DE CASCO DE SEGURIDAD BLANCO PARA VISITANTES.



Ilustración 25. Salud ocupacional visitantes

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- DISPOSICION Y UTILIZACIÓN DE CHALECOS PARA DIRECTOR, INGENIEROS, RESIDENTES, MAESTROS SEGÚN DISEÑO.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 10

Documento
Versión 1



Ilustración 26. Disposición y utilización chalecos

- DISPOSICION DE BOTIQUIN REGLAMENTARIO.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

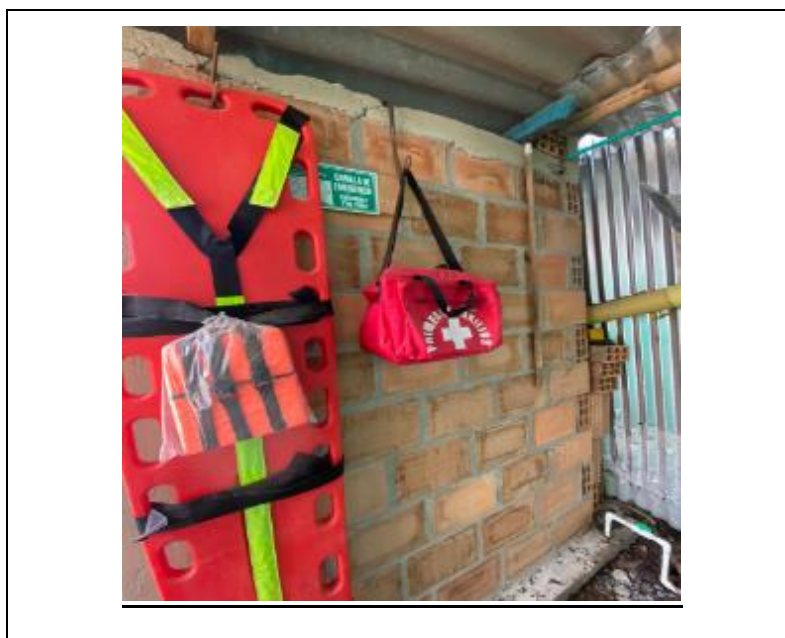


Ilustración 27. Disposición botiquín reglamentario

- DISPOSICION DE CAMILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1



Ilustración 28. Disposición de camillas

- **DISPOSICION DE ARNÉS Y LÍNEAS DE VIDA PARA TRABAJOS EN ALTURA**

Debido a que durante este periodo no se llevaron a cabo trabajos que requirieran el desempeño de actividades en altura, no fue necesario el uso de arnés y línea de vida.

VI. PROGRAMA 6. REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

El día 26 de septiembre del presente año, se realizó la reunión de socialización del proyecto con la comunidad. En el periodo comprendido desde esa fecha hasta la actualidad, no se han programado ni realizado reuniones adicionales. Se informa que se tiene prevista una reunión de seguimiento con la comunidad.

VII. PROGRAMA 7. SEÑALIZACIÓN-CERRAMIENTO- SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Con respecto al programa en cuestión, se comunica que las actividades detalladas a continuación han fueron ejecutadas:

- ✓ Cerramiento en laminas superboard 8mm doble cara con frescasa con estructura en madera. altura 2,35 mt, apoyos en concreto cada 1,20 mt.
- ✓ Aislamiento de ventanas de 1,8mtx1,2mt con board doble cara de 6mm y 8mm e icopor intermedio e=2cm.
- DISPOSICION Y EMPLEO SEÑALIZACIÓN VIAL Y ADECUACIONES TEMPORALES DE SENDEROS PEATONALES Y ACCESOS VEHICULARES.
- CERRAMIENTO EN LAMINA GALVANIZADA



Ilustración 29. Disposición y empleo adecuación senderos peatonales y vehiculares temporales

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- **DISPOSICIÓN Y EMPLEO SEÑAL REGLAMENTARIA**



Ilustración 30. Disposición y empleo señal reglamentaria

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- **DISPOSICIÓN Y EMPLEO SEÑAL INFORMATIVA**

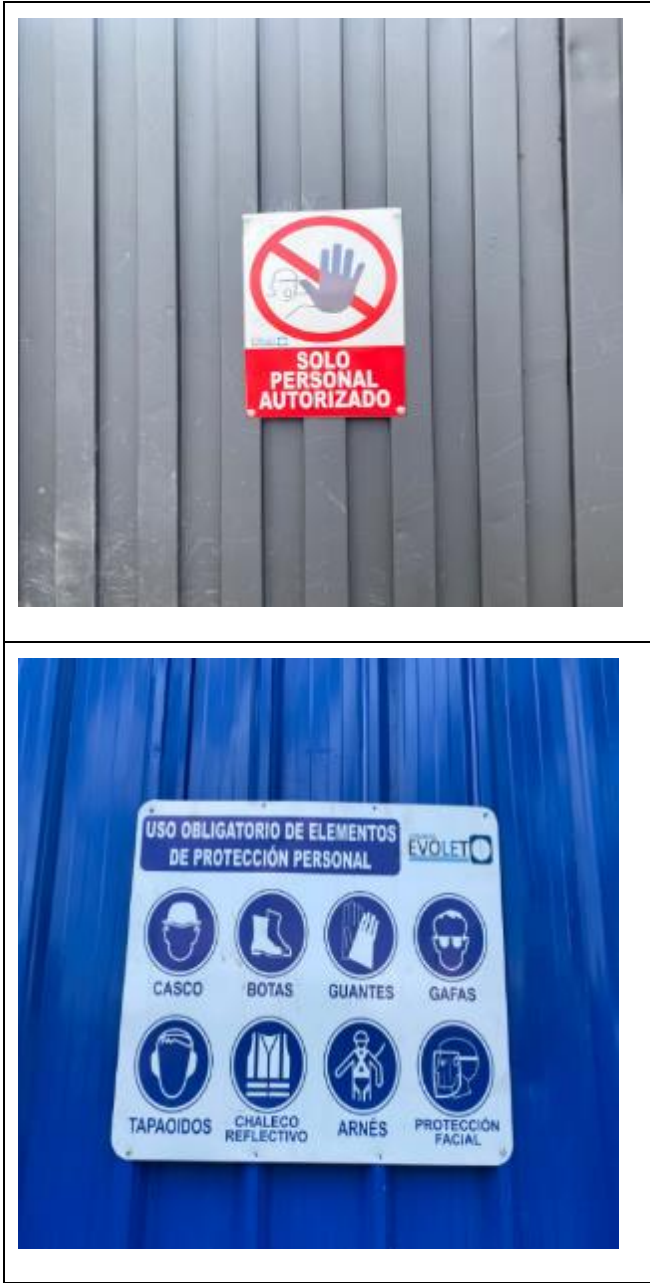


Ilustración 31. Disposición y empleo señal informativa

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

- **DISPOSICIÓN Y EMPLEO SEÑAL PREVENTIVA**



Ilustración 32. Disposición y empleo señal preventiva

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Decreto 1072 de 2015, que compila las disposiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, se establece que los empleadores deben garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades laborales, incluyendo aquellas que se realicen en espacios confinados.

El artículo 2.2.4.6.1 del mencionado decreto define un espacio confinado como aquel que no está diseñado para la ocupación continua de personas y que tiene limitaciones de acceso o salida, así como condiciones que pueden ser peligrosas para la salud y seguridad de los trabajadores. Adicionalmente, el Resolución 0491 de 2020 establece los lineamientos para la identificación y control de riesgos en el trabajo en espacios confinados. Esta resolución exige que se implemente un programa específico para la gestión segura de estos trabajos, el cual debe incluir:

- **Capacitación:** Los trabajadores deben recibir formación adecuada sobre los riesgos asociados a los espacios confinados y las medidas preventivas necesarias.
- **Certificación:** Es obligatorio contar con un certificado que valide la capacitación recibida por los trabajadores antes de permitirles realizar labores en sitios confinados.
- **Planificación:** Se debe elaborar un plan de trabajo que contemple procedimientos seguros para el ingreso, permanencia y salida del personal en estos espacios.
- **Monitoreo:** Se requiere realizar mediciones constantes del ambiente dentro del espacio confinado para asegurar condiciones seguras durante la ejecución del trabajo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Por lo tanto, es imperativo que se cuente con el certificado correspondiente para cada trabajador asignado a labores en sitios confinados. Esto no solo garantiza el cumplimiento legal, sino también la protección integral de los colaboradores, el cual no se relaciona en el presente informe.

Además, es importante que en el informe se adjunte relación completa del personal asignado a la obra, detalle de los Elementos de Protección Personal -EPP entregados a cada trabajador, especificando tipo, cantidad y fecha de entrega. Certificados o documentos que respalden la capacitación recibida por el personal en el uso adecuado de los EPP.

De acuerdo con lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en su artículo 57, es responsabilidad del empleador llevar un registro actualizado del personal contratado y garantizar su afiliación al sistema general de seguridad social. Esta obligación es crucial no solo para cumplir con la normativa legal, sino también para proteger los derechos laborales de los trabajadores.

Como parte del desarrollo de esta actividad, el contratista realiza capacitaciones al personal administrativo y operativo en lo referente a su programa de SST.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1



Ilustración 33. Capacitaciones personal operativo mes DICIEMBRE

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el mes de DICIEMBRE de 2024.

Anexo 17. Informe mensual de DICIEMBRE de 2024 del contratista de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE MUESTRAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el mes de diciembre de 2024, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de pilotes, los cuales presentaron resultados que son objeto de la siguiente evaluación.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA

Los resultados corresponden a muestras de concreto de los pilotes C2 y E4.

RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	RESISTENCIA	RESISTENCIA MINIMA	Evolución	Promedio	RESISTENCIA PROMEDIO
PSI /Mpa	DIAS	PSI /Mpa	PSI /Mpa	%	%	PSI /Mpa
4000/27.58	73	3876/26.7	3600/24.08	96.9	100.75	4029.75/27.78
4000/27.58	73	3911/27.0	3600/24.08	97.78		
4000/27.58	28	4018/27.7	3600/24.5	100.5		
4000/27.58	56	4314/29.7	3600/24.5	107.8		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Los resultados corresponden a muestras de concreto de los pilotes C6 y C7.

RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	RESISTENCIA	RESISTENCIA MINIMA	Evolución	Promedio	RESISTENCIA PROMEDIO
PSI /Mpa	DIAS	PSI /Mpa	PSI /Mpa	%	%	PSI /Mpa
4000/27.58	55	4041/27.86	3600/24.08	101.0	104.55	4181.75/28.84
4000/27.58	55	3915/27.0	3600/24.08	97.9		
4000/27.58	14	4246/29.3	3600/24.5	106.15		
4000/27.58	28	4525/31.2	3600/24.5	113,133		

Se revisa el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c —

Para determinar si el concreto se considera satisfactorio se revisa el aparte C.5.6.3.3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c .

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión SATISFACE el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión SATISFACE el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se procede a revisar el aparte C.5.6.3.4

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión SATISFACE el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión SATISFACE el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se revisa el aparte C.5.6.4.4., no se dan las condiciones para que se deba aplicar el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c , sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se revisa el aparte C.5.6.5., no se dan las condiciones para que se deba aplicar el aparte C.5.6.5.1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Al revisar la normatividad establecida por la NSR 10 en su capítulo C, se puede concluir que los concretos de los pilotes C2, E4, C6 Y C7 SON SATISFACTORIOS.

Anexo 18. Resultados resistencia concreto CONTRATISTA

Anexo 19. Resultados resistencia concreto INTERVENTORIA

8. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de diciembre de 2024, se tiene un avance físico estimado acumulado del 11.41%, frente a un acumulado programado del 10.13%.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el mes de diciembre de 2024, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el mes de diciembre de 2024, se realizó la instalación de aceros de la losa de cimentación inferior, vigas de cimentación, losa de cimentación superior, los arranques de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, de las pantallas PW1, PW2,

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 10	Documento Versión 1

PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, de las gradas principales y de las gradas de emergencia.

La instalación de concretos de 4000 psi para la losa de cimentación inferior, vigas de cimentación, losa de cimentación superior.

Los resultados de resistencias a la compresión conforme a la normatividad de la NSR10 presentan una conclusión de aceptabilidad de los concretos.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando.

Ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

El contratista de obra ha realizado capacitaciones regulares al personal de obra sobre los riesgos inherentes por las labores desarrolladas en el proyecto.

**ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL - CONTRATISTA DE
OBRA**



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-44-101279178	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 04 2024	22 03 2024			00:00	22 11 2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO 8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO

PÓLIZA APROBADA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	23/03/2026	\$6,494,785,713.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	23/11/2028	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/03/2024	23/03/2026	\$9,742,178,570.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$3,247,392,856.90	\$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA PÓLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA DESDE 22/11/2025	VIGENCIA HASTA 22/11/2030	SUMA ASEGURADA \$3,247,392,856.90
--	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ **21,108,053,569.85	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-40-101051477	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 04 2024	22 03 2024		00:00	22 11 2030		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO:
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E
OFICINA JURIDICA

23 ABR 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS
VIGENCIAS DE ESTA PÓLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,623,696,428.45	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO				COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101051477		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 04 2024			22 03 2024			00:00	22 11 2030			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO EVOLET								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4		
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA			TELÉFONO: 3043935212	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5		
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142			CIUDAD: POPAYAN, CAUCA		TELÉFONO: 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101279178		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 03 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 11 2030		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO EVOLET		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 3043935212	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 8234508	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO

CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

IDENTIFICACION

19289121-3

10301884-2

900552695-1

PARTICIPACION

45.00

45.00

10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101051477		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 03 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 11 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO EVOLET		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 3043935212	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 8234508	
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225433A

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
PASTO						PASTO						41		41-44-101279178		0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OFICINA JURIDICA
12 9 DIC 2023
Sergio
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	27/12/2025	\$6,494,785,713.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/08/2028	\$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	27/12/2025	\$9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	* SI AMPARO 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *169,046,816.00	\$ *****25,000.00	\$ **32,123,645.00	\$ *****201,195,461.00	\$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

LULIETHHERNANDEZ

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
PASTO						PASTO						41		41-40-101051477		0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 BN 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-6
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	\$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	\$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	\$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

IDENTIFICACION PARTICIPACION
19289121-3 45.00
10301884-2 45.00
900552695-1 10.00

12 9 DIC 2023
PÓLIZA APROBADA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **27,080,142.00	\$ *****25,000.00	\$ ***5,149,977.00	\$ *****32,255,119.00	\$ ****1,623,696,428.45	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

LULIETHHERNANDEZ

1

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA**

COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESIÓN**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO INTERSALUD PZ**
DIRECCIÓN: **CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**
TELÉFONO: **3016192419**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E**
BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E**

IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**
IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	22/05/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	22/11/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	22/11/2030	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL"

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***576,185,413.50	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO \$ *****0
--	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	CLAVE 5932	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E
---	---------------	-----------------	--

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGIOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES. POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/vea_digitalclient/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADERO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD-ASPX>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CADB25790606F5785B

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187

ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA	POPAYAN DELEGADA	COD AGENCIA	435	RANGO	47							
TIPO DE MOVIMIENTO	EXPEDICION	TIPO DE IMPRESION	IMPRESION	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
				01	02	2024	01	02	2024			
				FECHA DE EMISION			FECHA DE IMPRESION					
NOMBRE	CONSORCIO INTERSALUD PZ			DATOS DEL AFIANZADO			IDENTIFICACION			NIT	901.794.710-6	
DIRECCION	CL 11 A A 16 BRR SAN CAMILO			CIUDAD			POPAYAN, CAUCA			TELEFONO		3016192419
ASEGURADO	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E											
BENEFICIARIO	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E											
				IDENTIFICACION			NIT	891.580.002-5				
				IDENTIFICACION			NIT	891.580.002-5				

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMFAROS

CONTRATO
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
01/02/2024	01/04/2026	256,032,406.00
01/02/2024	01/10/2028	64,020,601.50
01/02/2024	01/12/2029	256,032,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

---OBJETO DE LA GARANTIA---

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA AL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA JURIDICA

ID. 1. FEB 2024

\$ 5,046,275,413.50
\$ 14,225,570

PÓLIZA APROBADA

BOLETO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ

CLAVE

%PART

100.00

GASTOS EXPEDICION

\$ **15,000.00**

IVA

\$ ***805,708**

TOTAL A PAGAR

\$ ***5,046,279**

NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO. USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

DE ACUERDO CON EL ART. 1088 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAB257906CAF6725D

CLIENTE



(415)7701861000019(8020)00000000070004351957628

FIRMA TOMADOR

ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORIA

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	INTERSALUDPZ@GMAIL.COM	POPAYAN-CAUCA	3016192419

Clave: 9480338677

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/01/15	8	\$1,400	\$272,900
2025/01/16	9	\$1,600	\$273,100
2025/01/17	10	\$1,700	\$273,200
2025/01/20	13	\$2,300	\$273,800
2025/01/21	14	\$2,400	\$273,900
2025/01/22	15	\$2,600	\$274,100
2025/01/23	16	\$2,800	\$274,300
2025/01/24	17	\$2,900	\$274,400
2025/01/27	20	\$3,400	\$274,900
2025/01/28	21	\$3,600	\$275,100

Periodo Pensión: 2024-12

Periodo Salud: 2024-12

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	3	\$272,900
ARL SURA		3	\$272,900
SUBTOTAL			\$272,900
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$272,900

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2024-12	2024-12			9480338677	Y	2025/01/07		8

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,900,000		\$271,500	\$0	\$0			\$271,500
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,900,000		\$271,500	\$0	\$0			\$271,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,900,000		\$271,500	\$0	\$0			\$271,500
1	CC	1061817104	ORDÓÑEZ ANGELICA																	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500							
2	CC	76313467	PERAFAN JESUS																	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500							
3	CC	1061791956	PROAÑO MICHELLE																	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500							
Total Afiliados(3)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,900,000		\$271,500	\$0	\$0			\$271,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2024-12	2024-12			9480338677	Y	2025/01/07		8

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$271,500	\$1,400	\$272,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	3	\$271,500	\$1,400	\$272,900
TOTAL					3	\$271,500	\$1,400	\$272,900



**ANEXO 4. ACTA DE COMITE DE OBRA DICIEMBRE
2024**

"Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E."



ACTA DE COMITÉ N°31							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024							
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023							
DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN			
02	12	2024	03:00 P.M.	3:40 P.M.			
ASISTENTES							
NOMBRE		CARGO/ENTIDAD	NOMBRE		CARGO/ENTIDAD		
Carlos Córdoba		Contratista de Obra Consortio Evolet.	Michelle Vannessa Proaño		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Claudia Gaviria		Contratista de Obra Consortio Evolet	Jesús Edinson Perafan		Residente de interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Yolanda López		Coordinadora Infraestructura HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Gerardo Cruz Jiménez		Supervisión HUSJ					
TEMAS TRATADOS							
TEMAS			RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
				SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la documentación contractual proporcionada y compromisos adquiridos por las partes.							
2. Con respecto a la solicitud de aprobación de ítems no previstos y el balance remitido a la Secretaría de Salud Departamental, la supervisión ha comunicado que la Secretaría ha establecido como requisito que toda la documentación sea escaneada en mejor calidad y enviada en formato digital para facilitar su revisión. Por lo tanto, una vez concluida la presente reunión, la supervisión, en coordinación con el contratista, llevará a cabo el envío de la información solicitada.			Contratista Supervisión	X		02/12/2024	
3. En cuanto a los servicios provisionales de agua y energía eléctrica. Para la provisional de acueducto fue necesario obtener la autorización previa de la entidad para gestionar la matrícula correspondiente al suministro de agua potable. Se informa que, en cumplimiento de los compromisos, la entidad contratante ha procedido a entregar al contratista el número de matrícula mediante oficio. Una vez entregado el oficio por parte de la entidad, el contratista procedió a realizar el radicado en el Acueducto y Alcantarillado de Popayán. En virtud de su seguimiento, la interventoría solicita al contratista de obra copia del oficio emitido por parte de la entidad autorizando la matricula y el radicado de la provisional ante el acueducto. Para la provisional de energía, se tenía que el martes 12 de noviembre del presente fue radicada dicha solicitud. sin			Contratista	X		02/12/2024	

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”






embargo, el contratista de obra manifiesta que, por parte de la Compañía Energética de Occidente fue solicitado un levantamiento adicional, el cual el día de hoy se encuentra surtido por su parte y se radicará la solicitud el día de mañana 3 de diciembre del presente. En este sentido, la interventoría solicita copia del radicado con su respectiva documentación.	Contratista	X		03/12/2024	
4. Respecto a la definición de los equipos y distribución en las áreas de fisioterapia y laboratorios. La supervisión menciona que, la información será entregada por parte del Ingeniero David Leandro Lemos apoyo eléctrico a la supervisión. Por otra parte, manifiesta estar de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, acerca de dejar los pases correspondientes para garantizar el paso de las redes en la losa de cimentación. Sin embargo, enfatiza que, si en el plazo de 15 días no se encuentra resuelto el tema por parte de la entidad, se construirá conforme a los diseños iniciales.	Entidad HUSJ	X		13/12/2024	
5. En cuanto a la entrega oportuna de los procesos constructivos solicitados al contratista de obra, este último se compromete el día de mañana a remitir el proceso constructivo correspondiente a la cimentación, con fechas estimadas de fundición.	Contratista	X		03/12/2024	
6. Respecto a la entrega de los ajustes a los diseños de los componentes del proyecto, el contratista ha indicado que, en lo concerniente al componente eléctrico, se han realizado reuniones de trabajo con el equipo eléctrico de la interventoría para analizar las modificaciones necesarias al diseño. Como resultado de estas reuniones, se ha alcanzado un acuerdo general, el cual será formalizado el 3 de diciembre a través de un documento que incluirá la justificación correspondiente para su posterior aprobación por parte de la interventoría.	Contratista	X		03/12/2024	
7. El contratista de obra menciona que, por parte de su equipo hidrosanitario que, tras un análisis de las condiciones actuales en el sistema de suministro de agua del Hospital San José, indicaron que lo más recomendable es que el edificio proyectado a construir opere con su sistema de acueducto independiente. En este aspecto, la Ingeniera Yolanda López coordinadora de Infraestructura del hospital manifiesta estar de acuerdo con dicha apreciación y precisa que, por funcionamiento, altura, capacidad y cota de servicio la recomendación para el edificio a construir es que tenga su sistema de suministro independiente. Por otro lado, respecto el suministro de agua potable para el nuevo edificio, se especificó que el presupuesto del contrato de obra vigente no contempla la construcción de un tanque de almacenamiento. Por lo tanto, se solicita al	Contratista	X		13/12/2024	

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



contratista que remita un informe técnico en el que se justifique la necesidad de implementar un sistema de suministro de agua independiente. Esta información será fundamental para que la coordinación de infraestructura pueda evaluar la viabilidad de dicha propuesta y, en caso de ser aprobada, servirá como sustento para su presentación ante el Ministerio de Salud y Protección Social.					

	CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023 Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024	
OBJETO DE LA REUNION: Comité 31		FECHA: 2 diciembre 2024

Vo.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	YOLANDA LOPEZ C.	HUSJ	COORD. INFRA	mantenimiento@hospita- lsan/josergp@co.	
2	GERARDO CRUZ J.	HUSJ	APOYO SUPERVISION	GerardoCruzJ1974 @gmail.com	
3	Claudia GARCIA	C. Evolet	Contl y P. adm.	cicarguluzi@gmail.com	
4	Michelle V. Pardo M.	C. Intersalud Pz	Rep legal	intersaludpz@gmail.com	
5	José Alejandro Paredes L.	C. Intersalud Pz	Residente Lct	residenciainterventoria@equal com.	
6	Carlos A. Condo J.	Consorcio Evolet	Contratista	Consorcioevole t@gmail.com	
7	Ángelica Ordóñez Cortes	C. Intersalud Pz	Apoio técnico Interventoria	residenciainterventoriahsj@ gmail.com	
8					
9					
10					
11					
12					
13					

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



ACTA DE COMITÉ N°32							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024							
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023							
DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN			
13	12	2024	03:00 P.M.	4:00 P.M.			
ASISTENTES							
NOMBRE		CARGO/ENTIDAD	NOMBRE		CARGO/ENTIDAD		
Carlos Alberto Córdoba		Contratista de Obra Consortio Evolet.	Michelle Vannessa Proaño		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Claudia Gaviria		Contratista de Obra Consortio Evolet	Jesús Edinson Perafan		Residente de interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Gerardo Cruz Jiménez		Supervisión HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
David Leandro Lemus		Apoyo Supervisión HUSJ					
TEMAS TRATADOS							
TEMAS			RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
				SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la documentación contractual proporcionada y compromisos adquiridos por las partes.							
2. En relación al punto uno del acta de comité 31 que dice <i>“Con respecto a la solicitud de aprobación de ítems no previstos y el balance remitido a la Secretaría de Salud Departamental, la supervisión ha comunicado que la Secretaría ha establecido como requisito que toda la documentación sea escaneada a color y enviada en formato digital. Por lo tanto, una vez concluida la presente reunión, la supervisión, en coordinación con el contratista, llevará a cabo el envío de la información solicitada.”</i> Se aclara que, él envío de la documentación a secretaria de salud dpto. tuvo como propósito que esta entidad realizara la revisión y verificación de estos, para así posteriormente emitir un concepto al respecto.							
3. En cuanto a los servicios provisionales de agua y energía eléctrica. Para la provisional de acueducto fue necesario obtener la autorización previa de la entidad para gestionar la matrícula correspondiente al suministro de agua potable. Se informa que, en cumplimiento de los compromisos, la entidad contratante procedió a entregar al contratista el número de matrícula mediante oficio. Sin embargo, en el marco del comité se informó que, por parte de la entidad por error involuntario se entregó al contratista una matrícula la cual no correspondía, de lo cual ya fue subsanado. Una vez entregado el oficio con matrícula vigente por parte de la entidad, el contratista procedió a realizar el radicado en el							






Acueducto y Alcantarillado de Popayán. En este sentido, la interventoría solicita al contratista de obra copia del oficio emitido por parte de la entidad autorizando la matrícula y el radicado de la provisional ante el acueducto. Para la provisional de energía, el contratista de obra informa que la solicitud fue radicada 3 de diciembre del presente. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el acta anterior, el contratista se compromete a entregar hoy mismo copia del comprobante de radicación y de la documentación adjunta.	Contratista	X		03/12/2024	
4. Respecto a la definición de los equipos y distribución en las áreas de fisioterapia y laboratorios. Con el área de fisioterapia, el contratista comunica que se ha completado la definición del espacio, gracias a la recepción de la información solicitada a la Coordinadora del área. En consecuencia, se puede considerar que el requerimiento para el segundo piso, destinado al área de rehabilitación, ha sido atendido. Se deja constancia de que, ante la reiterada solicitud de información por parte del contratista e interventoría respecto a la definición de los laboratorios y la ausencia de respuesta por parte de la entidad, se procederá a la construcción de acuerdo con los planos iniciales. En consecuencia, tanto el contratista como la interventoría del proyecto quedarán exentos de cualquier responsabilidad futura derivada de esta decisión. La supervisión manifiesta que, se compromete a entregar la información solicitada anteriormente el 16 de diciembre del presente.	Entidad HUSJ	X		16/12/2024	
5. En relación con los ajustes a los diseños del componente eléctrico, se informa que, si bien el contratista se comprometió a entregar la justificación correspondiente el 3 de diciembre, dicha documentación fue recibida y evaluada por el equipo eléctrico de la interventoría. A raíz de las observaciones realizadas, se programó una reunión entre ambos equipos para el día de hoy a fin de subsanar las observaciones. Por otra parte, la supervisión sugiere que, de aquí en adelante, no se realice ninguna optimización o ajuste a los diseños a menos de que se requieran por norma.	Contratista Interventoría	X		27/12/2024	
6. En relación al análisis de las condiciones actuales en el sistema de suministro de agua del Hospital San José, de lo cual se indicó que lo más recomendable es que el edificio proyectado a construir opere con su sistema de acueducto independiente.		X			

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



Con el objetivo de respaldar la propuesta de implementación de un sistema de suministro de agua independiente, el contratista se compromete a entregar a la Coordinadora de Infraestructura, la ingeniera Yolanda López, un informe técnico en el cual se presente la necesidad de implementar un sistema de suministro de agua independiente. Dicho informe será sometido a evaluación.	Contratista			27/12/2024	
7. La supervisión menciona que, a raíz de la mesa de seguimiento con el ministerio de salud y protección social en Bogotá, se presentó un requerimiento por parte de este, de presentar el día de hoy los ajustes al balance, los cuales deben ser aprobados por la interventoría y posteriormente remitir a secretaria de salud dpto. para su concepto. En virtud de lo anterior, se adquiere el compromiso por parte del contratista e interventoría de remitir la información el día de hoy.	Contratista Interventoría	X		13/12/2024	

	CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023 Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024	
OBJETO DE LA REUNION: COMITE 32		FECHA: 13/12/24

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	David Andres Luis	HUSJ	Profesional Planificación	david.andres.luis @gmail.com	
2	Claudia V. Gavine.	Consorcio Evolut	ing. Civil y Pto	claudia.v.gavine@gmail.com	
3	José A. PARRA	Ingeniería	Residente		
4	Carlos A. Córdoba	Consorcio Evolut.	Contratista	consorcioevolut @gmail.com	
5	GERARDO CRUZ J	HUSJ	SPOJO SUPERVISOR	gerardocruzj@ hotmail.com	
6	Angélica Ordoñez Cortés	C. Intersalud PZ	Interventoria	residenciainterventoriahsj@ gmail.com	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”







ACTA DE COMITÉ N°33							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024							
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023							
DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN			
20	12	2024	03:00 P.M.	4:00 P.M.			
ASISTENTES							
NOMBRE		CARGO/ENTIDAD	NOMBRE		CARGO/ENTIDAD		
Carlos Alberto Córdoba		Contratista de Obra Consortio Evolet.	Michelle Vannessa Proaño		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Juan Francisco Mora		Subgerente Adm y financiero HUSJ	Jesús Edinson Perafan		Residente de interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Gerardo Cruz Jiménez		Supervisión HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Yolanda Lopez C.		Coordinadora Infraestructura HUSJ	Andrés Fabian Talaga Sandoval		Consultor		
David Leandro Lemus		Apoyo Supervisión HUSJ					
TEMAS TRATADOS							
TEMAS			RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
				SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se realiza la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría como comité de seguimiento e información como resultado de la mesa técnica llevada a cabo el 10 de diciembre en el ministerio de salud y protección social, en la ciudad de Bogotá.							
2. La supervisión inicia la reunión mencionando que la acompaña el ingeniero Andrés Fabian Tálaga quien es la persona que realizo los diseños de consultoría del proyecto y quien realizó el ajuste estructural, donde cada ajuste cuenta con su memorial de responsabilidad. Cabe resaltar que dicho ajuste no tuvo ningún costo para la entidad ni al proyecto. Durante la mesa técnica llevada a cabo el 10 de diciembre, los profesionales del Ministerio manifestaron que no autorizaban el uso de los recursos del proyecto para el pago de ítems no previstos. Sin embargo, la supervisión y las demás partes involucradas consideran necesaria la inclusión de estos ítems, basándose en las justificaciones previamente presentadas, avaladas por la interventoría y revisadas por la supervisión y la Secretaría de Salud Departamental del Cauca. Esta posición del Ministerio genera inquietud entre todos los actores del proyecto. La supervisión recordó que el proyecto inicialmente no contaba con la licencia de construcción ni con los permisos necesarios. Según las obligaciones contractuales del contratista de obra, en el numeral 4 se establece que: “De requerirse ajustes a los estudios y diseños y/o actividades complementarias para la obtención de los							



<i>permisos, autorizaciones y licencias, estarán bajo su responsabilidad y son requisito indispensable para el inicio de ejecución de la obra”.</i> En cumplimiento de esta disposición, para tramitar la licencia de construcción se presentó el proyecto ante la Curaduría Urbana N°2, donde se recibieron observaciones que conllevaron a realizar complementos y ajustes estructurales. Inicialmente, el proyecto contemplaba pilotes de 15 metros de profundidad y un diámetro de 1.00 metro, con un método constructivo manual. Sin embargo, el método constructivo fue modificado a mecánico, de acuerdo con los lineamientos del estudio de suelos complementario solicitado por la Curaduría Urbana N°2. Este cambio generó la necesidad de incluir ítems no previstos. Dichos ítems fueron revisados y avalados por la interventoría y la supervisión, y posteriormente remitidos a la Secretaría de Salud Departamental, donde también recibieron su aprobación al encontrarse debidamente justificados. Para cada ítem no previsto, se realizó un estudio de mercado en la zona y los análisis de precios unitarios se elaboraron con base en dicha información. Las observaciones de la curaduría, requeridas para la expedición de la licencia de construcción, llevaron a la implementación de un sistema constructivo mecánico que contempla pilotes de 9 metros de profundidad y 1.20 metros de ancho. Este cambio, comparado con el diseño inicial, representó un ahorro significativo para el proyecto. Ante este ahorro, el Ministerio ha planteado que el recurso excedente sea reintegrado de manera inmediata. No obstante, se considera necesario que el contratista realice un balance completo, incorporando todos los diseños y ajustes, antes de proceder con el reintegro. Es importante señalar que los recursos asignados al proyecto mediante resolución por la E.S.E. Hospital Universitario San José no presentan restricciones jurídicas explícitas que prohíban la generación de ítems no previstos. La única restricción contemplada en dicha resolución es que cualquier sobre costo que exceda el presupuesto contractual deberá ser asumido por la entidad, siempre que no se altere la función arquitectónica del proyecto.				
---	--	--	--	--

	CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023 Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024	
OBJETO DE LA REUNION: Acta de Comité 33		FECHA: 20/12/2024

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Michelle Varrero Pardo Muraz	consorcio Intersalud PZ	Rep legal	intersaludp2@gmail.com	
2	Didier Ivan Golondrini	Secretaria de Salud del Cauca	Profesional Universitario	didiergolondrino.sald@cauca.gov.co	
3	Andrés Fabian Tolosa S.	Consultoría	Consultor.	af889@gmail.com	
4	YOCANDA LOPEZ C.	HUSJ	coord. INFRA.	mantenimiento@hospi pital.sajoseipuj.co	
5	Juan Francisco Hora O	Hospital Univ. Sajosa	Subgerente	subgerencia@Hospital.sajosa.gov.co	
6	Jeani Alfaro	Interventoría	Residente	residenciainterventoria@HUSJ	
7	Carlos A. Caicedo	Consorcio Erolat	Contratista	consorcioerolat@gmail.com	
8	David Inés	HUSJ	Plum.	hustsa.hen@HUSJ	
9	Angélica Ordóñez Cortés	Consorcio Intersalud PZ	Apoyo técnico Interventoría	residenciainterventoria@HUSJ@gmail.com	
10					
11					
12					
13					

**ANEXO 5. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA
CRUZADA**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024	
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: _____ dic-24

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA									
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION	RESPUESTA A OFICIO O SOLICITUD
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A		
10/12/2024	CIPZ-078-112-2024	REVISIÓN DOCUMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X	29 DE OCTUBRE 2024	
12/12/2024	CIPZ-078-113-2024	BALANCE CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
13/12/2024	CIPZ-078-114-2024	OBSERVACIONES A FLUJO DE CAJA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
13/12/2024	CIPZ-078-115-2024	REVISION INFORME MENSUAL MANEJO DEL ANTICIPO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
14/12/2024	CIPZ-078-116-2024	APROBACION BALANCE PRESUPUESTAL CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
14/12/2024	CIPZ-078-117-2024	SOLICITUD INFORMACION CUARTO DE BOMBAS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
16/12/2024	CIPZ-073-118-2024	REMISION INFORME MENSUAL MES OCTUBRE 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR			X		

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024	
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: _____ dic-24

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA									
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION	RESPUESTA A OFICIO O SOLICITUD
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A		
19/12/2024	CIPZ-078-119-2024	PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
20/12/2024	CIPZ-078-120-2024	RENDIMIENTOS ANTICIPO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA			X		
23/12/2024	CIPZ-078-121-2024	SOLICITUD RESPUESTA OFICIOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET -			X		
24/12/2024	CIPZ-078-122-2024	REMISION RENDIMIENTOS ANTICIPO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET -			X		
26/12/2024	CIPZ-078-123-2024	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO. 22024141900050568	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JAMES HERNANDO CORREA GRIJALBA SECRETARIOS SECCIONAL CAUCA			X		

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024									
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"									
	CONSORCIO INTERSALUD PZ									
MES:		dic-24								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION	RESPUESTA A OFICIO O SOLICITUD
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A		
2/12/2024	NA	2/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSIONES			X		
2/12/2024	NA	2/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RADICADO PROVISIONAL ACUEDUCTO			X		
3/12/2024	N.A	3/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DISEÑO SUBESTACION Y APANTALLAMIENTO			X		
3/12/2024	EV-C358-23-0193-24	3/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	AJUSTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			X		
3/12/2024	EV-C358-23-0195-24	3/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CIMENTACION			X		
5/12/2024	EV-C358-23-0196-24	5/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION FUNDICION			X		
7/12/2024	EV-C358-23-197-24	7/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 09 AL 14 DICIEMBRE 2024			X		
12/12/2024	N.A	12/12/2024	ENTIDAD HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO BALANCE DE OBRA CONTRATO N°358 DE 2023			X		
12/12/2024	EV-C358-23-0199-24	12/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION FUNDICION			X		
14/12/2024	EV-C358-23-201-24	14/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DOCUMENTOS LICENCIA DE CONSTRUCCION Y BALANCE PRESUPUESTAL			X		

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024									
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"									
	CONSORCIO INTERSALUD PZ									
MES:		dic-24								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION	RESPUESTA A OFICIO O SOLICITUD
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A		
14/12/2024	EV-C358-23-202-24	14/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DICIEMBRE 2024			X		

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024									
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"									
	CONSORCIO INTERSALUD PZ									
MES:		dic-24								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION	RESPUESTA A OFICIO O SOLICITUD
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A		
16/12/2024	EV-C358-23-203-24	16/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE DE PERSONAL EN OBRA			X		
17/12/2024	EV-C358-23-204-24	17/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE INSPECTOR SST					
18/12/2024	EV-C358-23-205 -24	18/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME EVOLET NOVIEMBRE			X		
19/12/2024	EV-C358-23-0208-24	19/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION FUNDICION			X		
19/12/2024	NA	19/12/2024	SUBGERENTE JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	X				
19/12/2024	NA	19/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	FACTIBILIDAD PROVISIONAL ENERGIA			X		
21/12/2024	EV-C358-23-0210-24	21/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROGRAMACION ACTIVIDADES			X		
21/12/2024	EV-C358-23-211-24	21/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 23 AL 28 DICIEMBRE 2024			X		
23/12/2024	EV-C358-23-212-24	23/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 358			X		
26/12/2024	EV-C358-23-213-24	26/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS			X		

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024									
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"									
	CONSORCIO INTERSALUD PZ									
MES:		dic-24								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION	RESPUESTA A OFICIO O SOLICITUD
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A		
26/12/2024	EV-C358-23-214-24	26/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DISEÑOS ELECTRICOS					
27/12/2024	EV-C358-23-215-24	27/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio cipz-078-115-2024 - informe mensual de anticipo					cipz-078-115-2024
28/12/2024	EV-C358-23-216-24	28/12/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA SEMANA DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025					

ANEXO 6. AUTORIZACION DESEMBOLO GEOACOPIO



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 10

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	19/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	19/11/2024	Fecha de Pago:	20/11/2024
Proveedor:	901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		Teléfono:	
Tipo de Retención:	Regimen Común			Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716684

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
---------	--------	-------	-------

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,684,722.00	0.00	0	309,684,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,684,722.00		0.00
	Totales		309,684,722.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	309,684,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		309,684,722.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722.00	
						309,684,722.00	309,684,722.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 10

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	Tpo Clas Cta SCta Obj Ord SOrd Aux Recu 4 0 201 21	MANO DE OBRA		309,684,722.00	-309,684,722.00
		TOTALES		309,684,722.00	-309,684,722.00

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por
--	--	---------------

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	PG - Pagado	OP_559572-	\$309,684,722.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

**ANEXO 7. AUTORIZACION
DESEMBOLDO GYJ**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
4	BANCOLOMBI A - CH - 83600001613	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	PG - Pagado	OP_553618-	\$315,150,621.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:34:33.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Elaborado por

**ANEXO 8. AUTORIZACION
DESEMBOLSO UBANER PEREZ**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655291 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553620 del 02/11/2024 13:44:56, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
3	BANCOLOMBI A - CH - 86872111028	1431278	AMA PALTA URIEL	PG - Pagado	OP_553620-	\$2,138,400.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:10.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 3

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	05/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	05/11/2024	Fecha de Pago:	05/11/2024
Proveedor:	1431278 -	AMA PALTA URIEL		Teléfono:	
Tipo de Retención:	Regimen Simplificado			Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 TRANSPORTE-17591717

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553620	05/11/2024	2,138,400.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,138,400.00	0.00	0	2,138,400.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,138,400.00		0.00
	Totales		2,138,400.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	2,138,400.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 3 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			1431278 -	AMA PALTA URIEL		2,138,400.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1431278 -	AMA PALTA URIEL	2,138,400.00	
						2,138,400.00	2,138,400.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 3

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	Tpo Clas Cta S Cta Obj Ord SOrd Aux Recu 4 0 301 21	TRANSPORTE		2,138,400.00	-2,138,400.00
		TOTALES		2,138,400.00	-2,138,400.00

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por
--	--	---------------

**ANEXO 9. AUTORIZACION DESEMBOLSO
PEDRO ROMO**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
2	BANCOLOMBI A - CH - 26128660444	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	PG - Pagado	OP_553619-	\$6,000,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 2

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	05/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	05/11/2024	Fecha de Pago:	05/11/2024
Proveedor:	1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	Teléfono:		
Tipo de Retención:	Regimen Simplificado	Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 MANO DE OBRA-17591721

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553619	05/11/2024	6,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	0.00	0	6,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		6,000,000.00		0.00
	Totales		6,000,000.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	6,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000.00	
25110501001	PROVEEDORES			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ		6,000,000.00
						6,000,000.00	6,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	Tpo Clas Cta S Cta Obj Ord SOrd Aux Recu 4 0 201 21	MANO DE OBRA		6,000,000.00	-6,000,000.00
		TOTALES		6,000,000.00	-6,000,000.00

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por
--	--	---------------

**ANEXO 10. AUTORIZACION
DESEMBOLSO FERROESTACION**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
5	BANCOLOMBI A - CH - 86885406965	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	PG - Pagado	.	\$2,073,600.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:45.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	05/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	05/11/2024	Fecha de Pago:	05/11/2024
Proveedor:	18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	Teléfono:		
Tipo de Retención:	Regimen Común	Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: OP_553976 17592109 ALQUILER MAQUINARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553976	05/11/2024	2,073,600.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,073,600.00	0.00	0	2,073,600.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,073,600.00		0.00
	Totales		2,073,600.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	2,073,600.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600.00	
25110501001	PROVEEDORES			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO		2,073,600.00
						2,073,600.00	2,073,600.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 5

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo Clas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 0 503 21	ALQUILER DE EQUIPOS		2,073,600.00	-2,073,600.00
		TOTALES		2,073,600.00	-2,073,600.00

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por JOHAN SEBASTIAN ARGUELLO VARGAS
--	--	--

**ANEXO 11. AUTORIZACION
DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
6	BANCOLOMBI A - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZA DORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554620-	\$182,907,980.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NUMERO : 6

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	07/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	07/11/2024	Fecha de Pago:	07/11/2024
Proveedor:	901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL	Teléfono:		
Tipo de Retención:	Regimen Común	Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612038

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
---------	--------	-------	-------

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
182,907,980.00	0.00	0	182,907,980.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		182,907,980.00		0.00
	Totales		182,907,980.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	182,907,980.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 6 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		182,907,980.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980.00	
						182,907,980.00	182,907,980.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 6

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL								Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
	Tpo	Clas	Cta	SCta	Obg	Ord	SOOrd	Aux	Recu			
977001-GENERICO ANTICIPOS	4	0	201						21	MANO DE OBRA		
											182,907,980.00	-182,907,980.00
										TOTALES	182,907,980.00	-182,907,980.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

**ANEXO 12. AUTORIZACION
DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
8	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	PG - Pagado	OP_555078-	\$5,293,804,984.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	07/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	07/11/2024	Fecha de Pago:	08/11/2024
Proveedor:	34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	Teléfono:		
Tipo de Retención:	Regimen Común	Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-ANTICIPO FERROESTACION-17612023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
---------	--------	-------	-------

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,293,804,984.00	0.00	0	5,293,804,984.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		5,293,804,984.00		0.00
	Totales		5,293,804,984.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	5,293,804,984.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA		5,293,804,984.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984.00	
						5,293,804,984.00	5,293,804,984.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	Tpo Clas Cta SCta Obg Ord SOrd Aux Recu 4 0 101 21	MATERIALES		5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00
		TOTALES		5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por
--	--	---------------

**ANEXO 13. AUTORIZACION DESEMBOLSO
COMERCIALIZADORA**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
7	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554617-	\$521,477,881.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:43.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

**ANEXO 14. AUTORIZACION DE PAGO
FJ CONSTRUCCIONES**



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
Nit: 830053812
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
ORDEN DE PAGO

Página: 1 de 1

NUMERO : 9

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	19/11/2024	Fecha de Registro de la Orden:	19/11/2024	Fecha de Pago:	20/11/2024
Proveedor:	901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL	Teléfono:		
Tipo de Retención:	Regimen Común	Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716664

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
---------	--------	-------	-------

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
577,407,941.00	0.00	0	577,407,941.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		577,407,941.00		0.00
	Totales		577,407,941.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	577,407,941.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 9 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		577,407,941.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941.00	
						577,407,941.00	577,407,941.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 9

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL											Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
	Tpo	Clas	Cta	S	Cta	Obg	Ord	S	Ord	Aux	Recu				
977001-GENERICO ANTICIPOS	4	0	201								21	MANO DE OBRA		577,407,941.00	-577,407,941.00
												TOTALES		577,407,941.00	-577,407,941.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
9	BANCOLOMBI A - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZA DORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_559571-	\$577,407,941.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:17:44.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

**ANEXO 15. AUTORIZACION
DESEMBOLSO URIEL PALTA**

Elaborado por

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	PG - Pagado	OP_559572-	\$309,684,722.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

**ANEXO 18. RESULTADOS RESISTENCIA
COMPRESION CONTRATISTA DE OBRA**



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASEN. TAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1185	7366	17	4	4-oct-24	<u>1-nov-24</u>	28	313,3	5	8171	391	5562	38,3	281	4000	27,6	139,0	21,6	Pilote A8 Hora de toma: 2:45 pm	Prenezlado Geacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1185	7367	18	4	17-oct-24	<u>31-oct-24</u>	14	138,4	4	8171	173	2456	16,9	211	3000	20,7	81,9	20,3	Solado eje 2-3 Hora de toma: 5:10 pm	Prenezlado Geacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1185	7368	19	4	18-oct-24	<u>1-nov-24</u>	14	255,4	4	8091	322	4578	31,6	211	3000	20,7	152,6	22,9	Solado eje 3-4 Hora de toma: 2:30 pm	Prenezlado Geacopio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1185	7369	20	4	23-oct-24	<u>31-oct-24</u>	8	206,6	4	8171	258	3666	25,3	211	3000	20,7	122,2	19,1	Solado foso ascensor hora de toma: 1:40 pm	Prenezlado Geacopio Mixer 004	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1185	7370	21	4	24-oct-24	<u>31-oct-24</u>	7	184,2	3	8252	228	3238	22,3	211	3000	20,7	107,9	22,9	Solado eje 6-7 Hora de toma: 1:08 pm	Prenezlado Geacopio Mixer 005	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1185	7371	22	4	25-oct-24	<u>1-nov-24</u>	7	217,6	3	8171	271	3862	26,6	211	3000	20,7	128,7	17,8	Solado eje 7-8 hora de toma: 11:35 am	Prenezlado Geacopio Mixer 006	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente



REVISÓ
Karen Sofia Mosquera Gomez
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO															FGLR-67	
NTC 673															Versión 06	
CLIENTE:		Consortio Evolet														
OBRA:		Nueva Torre Hospital Universitario San José														
LOCALIZACIÓN OBRA:		Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca														
CONTRATISTA:		N.A														
INTERVENTORÍA:		N.A														

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASEN. TAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1061	6689	102	4	1-oct-24	8-oct-24	7	216,6	3	8171	270	3844	26,5	281	4000	27,6	96,1	22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geocapio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6690	104	4	1-oct-24	15-oct-24	14	254,9	1	8659	300	4270	29,4	281	4000	27,6	106,8	22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geocapio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6691	108	4	1-oct-24	29-oct-24	28	300,8	5	8171	375	5338	36,8	281	4000	27,6	133,5	22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geocapio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6692	166	4	1-oct-24	26-nov-24	56	339,1	5	8577	403	5735	39,5	281	4000	27,6	143,4	22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geocapio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS

REVISÓ  KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ GEOTECNÓLOGO M.P. # 1951600791 CAU	APROBÓ  FERNANDO MUÑOZ FUENTES GERENTE TÉCNICO M.P. # 19516001294 CAU
---	---

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE:	Consortio Evolet
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA:	N.A
INTERVENTORÍA:	N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1006	6422	104	4	18-sep-24	<u>25-sep-24</u>	7	197,3	4	8171	246	3502	24,1	281	4000	27,6	87,6	21,6	Pilote A-2 Hora de toma: 6:25 pm	Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1006	6423	105	4	18-sep-24	<u>2-oct-24</u>	14	209,4	4	8171	261	3717	25,6	281	4000	27,6	92,9	21,6	Pilote A-2 Hora de toma: 6:25 pm	Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1006	6424	171	4	18-sep-24	<u>16-oct-24</u>	28	221,4	4	8012	282	4008	27,6	281	4000	27,6	100,2	21,6	Pilote A-2 Hora de toma: 6:25 pm	Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1006	6425	172	4	18-sep-24	<u>13-nov-24</u>	56							281	4000	27,6		21,6	Pilote A-2 Hora de toma: 6:25 pm	Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1011	6464	104	4	19-sep-24	<u>26-sep-24</u>	7	226,9	3	8171	283	4027	27,8	281	4000	27,6	100,7	22,9	Pilote D-2 Hora de toma: 4:35 pm	Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 553	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS. Concreto Tremi
1011	6465	105	4	19-sep-24	<u>3-oct-24</u>	14	300,2	4	8091	378	5381	37,1	281	4000	27,6	134,5	22,9	Pilote D-2 Hora de toma: 4:35 pm	Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 553	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS. Concreto Tremi
1011	6466	171	4	19-sep-24	<u>17-oct-24</u>	28	323,9	3	8171	404	5748	39,6	281	4000	27,6	143,7	22,9	Pilote D-2 Hora de toma: 4:35 pm	Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 553	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS. Concreto Tremi
1011	6467	172	4	19-sep-24	<u>14-nov-24</u>	56							281	4000	27,6		22,9	Pilote D-2 Hora de toma: 4:35 pm	Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 553	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS. Concreto Tremi
1021	6485	63	4	21-sep-24	<u>28-sep-24</u>	7	250,5	1	8252	310	4404	30,4	281	4000	27,6	110,1	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJJ 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1021	6486	58	4	21-sep-24	<u>5-oct-24</u>	14	271,6	5	8413	329	4682	32,3	281	4000	27,6	117,0	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJJ 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1021	6487	62	4	21-sep-24	<u>19-oct-24</u>	28	295,6	4	8252	365	5195	35,8	281	4000	27,6	129,9	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJJ 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 4

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE:	Consortio Evolet
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA:	N.A
INTERVENTORÍA:	N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1021	6488	73	4	21-sep-24	<u>16-nov-24</u>	56							281	4000	27,6		22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6548	59	4	24-sep-24	<u>1-oct-24</u>	7	179,2	2	8742	209	2973	20,5	281	4000	27,6	74,3	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geocapio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6549	64	4	24-sep-24	<u>8-oct-24</u>	14	219,5	4	8171	274	3897	26,9	281	4000	27,6	97,4	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geocapio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6550	71	4	24-sep-24	<u>22-oct-24</u>	28	222,0	4	8012	283	4018	27,7	281	4000	27,6	100,5	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geocapio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6551	83	4	24-sep-24	<u>19-nov-24</u>	56							281	4000	27,6		21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geocapio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1036	6562	42	4	25-sep-24	<u>2-oct-24</u>	7	208,0	5	8171	260	3692	25,5	281	4000	27,6	92,3	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1036	6563	43	4	25-sep-24	<u>9-oct-24</u>	14	271,1	4	8825	313	4456	30,7	281	4000	27,6	111,4	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1036	6564	44	4	25-sep-24	<u>23-oct-24</u>	28	315,7	4	8171	394	5604	38,6	281	4000	27,6	140,1	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1036	6565	45	4	25-sep-24	<u>20-nov-24</u>	56							281	4000	27,6		17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1050	6595	102	4	28-sep-24	<u>5-oct-24</u>	7	241,6	4	8742	282	4009	27,6	281	4000	27,6	100,2	25,4	Pilote G7 G8 D-3 Hora de toma: 12:15 pm	Premezclado Geocapio Mixer E13 WPK 579	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1050	6596	108	4	28-sep-24	<u>12-oct-24</u>	14	259,2	5	8091	327	4646	32,0	281	4000	27,6	116,2	25,4	Pilote G7 G8 D-3 Hora de toma: 12:15 pm	Premezclado Geocapio Mixer E13 WPK 579	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1050	6597	109	4	28-sep-24	<u>26-oct-24</u>	28	291,5	4	8012	371	5277	36,4	281	4000	27,6	131,9	25,4	Pilote G7 G8 D-3 Hora de toma: 12:15 pm	Premezclado Geocapio Mixer E13 WPK 579	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS

REVISÓ

KAREN SOFÍA MOSQUERA GÓMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE:	Consortio Evolet
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA:	N.A
INTERVENTORÍA:	N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1050	6598	169	4	28-sep-24	23-nov-24	56							281	4000	27,6		25,4	Pilote G7 G8 D-3 Hora de toma: 12:15 pm	Premezclado Geoacopio Mixer E13 WPK 579	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6689	102	4	1-oct-24	8-oct-24	7	216,6	3	8171	270	3844	26,5	281	4000	27,6	96,1	22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geoacopio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6690	104	4	1-oct-24	15-oct-24	14	254,9	1	8659	300	4270	29,4	281	4000	27,6	106,8	22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geoacopio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6691	108	4	1-oct-24	29-oct-24	28							281	4000	27,6		22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geoacopio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1061	6692	166	4	1-oct-24	26-nov-24	56							281	4000	27,6		22,9	Pilote E7 y C3 Hora de toma: 4:45 pm	Premezclado Geoacopio Mixer E8 ZNN 410	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1097	6875	T1 PA-8	4	4-oct-24	11-oct-24	7	247,5	4	8171	309	4393	30,3	281	4000	27,6	109,8	21,6	Pilote A8 Hora de toma: 2:45 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1097	6876	T1- P-C8	4	5-oct-24	11-oct-24	6	239,4	4	8091	302	4291	29,6	281	4000	27,6	107,3	21,6	Pilote C8 Hora de toma: 3:29 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1108	6920	T1- P-A4	4	6-oct-24	15-oct-24	9	278,2	5	8171	347	4938	34,0	281	4000	27,6	123,5	22,9	Pilote A4 Hora de toma: 2:10 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1108	6921	T1- P-B4	4	7-oct-24	15-oct-24	8	284,3	5	8332	348	4949	34,1	281	4000	27,6	123,7	22,9	Pilote B4 Hora de toma: 3:15 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1108	6922	T1- P-C4	4	8-oct-24	15-oct-24	7	239,2	3	8252	296	4205	29,0	281	4000	27,6	105,1	20,3	Pilote C4 Hora de toma: 4:25 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1128	7055	T1 PD-6	4	10-oct-24	17-oct-24	7	307,2	4	8252	380	5399	37,2	281	4000	27,6	135,0	24,1	Pilote D6	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1132	7060	7	4	4-oct-24	19-oct-24	15	252,7	3	8252	312	4442	30,6	281	4000	27,6	111,1	21,6	Pilote A8	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1132	7061	8	4	5-oct-24	19-oct-24	14	261,6	3	8171	326	4643	32,0	281	4000	27,6	116,1	21,6	Pilote C8	Premezclado Geoacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi

REVISÓ
Karen Sofía Mosquera G.
KAREN SOFÍA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1132	7062	9	4	6-oct-24	20-oct-24	14	304,5	5	8171	380	5405	37,3	281	4000	27,6	135,1	22,9	Pilote A4	Premezclado Geocapio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1132	7063	10	4	7-oct-24	21-oct-24	14	307,2	5	8171	383	5452	37,6	281	4000	27,6	136,3	22,9	Pilote B4	Premezclado Geocapio Mixer 004	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1132	7064	11	4	12-oct-24	19-oct-24	7	194,1	4	8171	242	3445	23,8	281	4000	27,6	86,1	24,1	Pilote C6	Premezclado Geocapio Mixer 005	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1132	7065	12	4	14-oct-24	21-oct-24	7	270,0	4	8413	327	4655	32,1	281	4000	27,6	116,4	24,1	Pilote D8	Premezclado Geocapio Mixer 006	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1136	7070	13	4	8-oct-24	22-oct-24	14	258,0	3	8091	325	4624	31,9	281	4000	27,6	115,6	20,3	Pilote C4 Hora de toma: 6:25 pm	premezclado Premec Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1145	7170	13	4	10-oct-24	24-oct-24	14	320,1	4	8012	407	5795	40,0	281	4000	27,6	144,9	24,1	Pilote D6 Hora de toma: 2:45 am	Premezclado Geocapio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1145	7171	14	4	17-oct-24	24-oct-24	7	113,5	6	8332	139	1975	13,6	211	3000	20,7	65,8	20,3	Solado eje 2-3 Hora de toma: 9:55 am	Premezclado Geocapio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente.
1153	7203	16	4	12-oct-24	26-oct-24	14	239,2	5	8171	299	4246	29,3	281	4000	27,6	106,2	24,1	Pilote C6 Hora de toma: 5:15 pm	Premezclado Geocapio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1153	7204	15	4	18-oct-24	25-oct-24	7	197,3	4	8091	249	3536	24,4	211	3000	20,7	117,9	22,9	Solado eje 3-4 Hora de toma: 2:30 pm	Premezclado Geocapio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente.

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera Gomez
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 4 de 4



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1036	6562	42	4	25-sep-24	<u>2-oct-24</u>	7	208,0	5	8171	260	3692	25,5	281	4000	27,6	92,3	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1036	6563	43	4	25-sep-24	<u>9-oct-24</u>	14	271,1	4	8825	313	4456	30,7	281	4000	27,6	111,4	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1036	6564	44	4	25-sep-24	<u>23-oct-24</u>	28	315,7	4	8171	394	5604	38,6	281	4000	27,6	140,1	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1036	6565	45	4	25-sep-24	<u>20-nov-24</u>	56	338,3	4	8171	422	6004	41,4	281	4000	27,6	150,1	17,8	Pilote E-6 hora de toma: 1:25 pm	Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente, concreto Tremi
1236	7688	35	4	21-oct-24	<u>19-nov-24</u>	29	218,8	5	8252	270	3845	26,5	211	3000	20,7	128,2	19,1	Solado eje 4-6 Hora de toma: 3:40 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1236	7689	36	4	23-oct-24	<u>20-nov-24</u>	28	230,3	3	8332	282	4009	27,6	211	3000	20,7	133,6	19,1	Solado foso del ascensor Hora de toma: 1:40 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1236	7690	37	4	6-nov-24	<u>20-nov-24</u>	14	276,4	4	8252	342	4859	33,5	281	4000	27,6	121,5	20,3	Losa Foso del Ascensor Hora de toma: 11:24 am	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1253	7772	38	4	24-oct-24	<u>21-nov-24</u>	28	228,5	4	8091	288	4096	28,2	211	3000	20,7	136,5	22,9	Solado eje 6-7 Hora de toma: 1:08 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1253	7773	39	4	25-oct-24	<u>22-nov-24</u>	28							211	3000	20,7		17,8	Solado eje 7-8 hora de toma: 11:35 am	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera Gomez
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muroz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO														FGLR-67	
NTC 673														Versión 06	
CLIENTE:		Consortio Evolet													
OBRA:		Nueva Torre Hospital Universitario San José													
LOCALIZACIÓN OBRA:		Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca													
CONTRATISTA:		N.A													
INTERVENTORÍA:		N.A													



O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (Kv)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1021	6485	63	4	21-sep-24	28-sep-24	7	250,5	1	8252	310	4404	30,4	281	4000	27,6	110,1	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1021	6486	58	4	21-sep-24	5-oct-24	14	271,6	5	8413	329	4682	32,3	281	4000	27,6	117,0	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1021	6487	62	4	21-sep-24	19-oct-24	28	295,6	4	8252	365	5195	35,8	281	4000	27,6	129,9	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1021	6488	73	4	21-sep-24	16-nov-24	56	327,1	3	8252	404	5750	39,6	281	4000	27,6	143,7	22,5	Pilote E-3 hora de toma: 9:30 am	Premezclado de Premec Mixer TJT 601	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6548	59	4	24-sep-24	1-oct-24	7	179,2	2	8742	209	2973	20,5	281	4000	27,6	74,3	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6549	64	4	24-sep-24	8-oct-24	14	219,5	4	8171	274	3897	26,9	281	4000	27,6	97,4	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6550	71	4	24-sep-24	22-oct-24	28	222,0	4	8012	283	4018	27,7	281	4000	27,6	100,5	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS
1029	6551	83	4	24-sep-24	19-nov-24	56	243,0	4	8171	303	4314	29,7	281	4000	27,6	107,8	21,0	Pilote # 1 E4 Hora de toma: 10:25 am	Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofísica SAS

REVISÓ <i>Karen Sofia Mosquera G.</i> KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ GEOTECNÓLOGO M.P. # 19516000791 CAU	APROBÓ <i>Fernando Muroz Fuentes</i> FERNANDO MUROZ FUENTES GERENTE TÉCNICO M.P. # 19516001294 CAU
--	--

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO		FGLR-67
NTC 673		Versión 06
CLIENTE:	Consortio Evolet	
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José	
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca	
CONTRATISTA:	N.A	
INTERVENTORÍA:	N.A	

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1212	7508	31	4	25-oct-24	11-nov-24	17	247,4	4	8171	309	4390	30,3	211	3000	20,7	146,3	17,8	Solado eje 7-8 hora de toma: 11:35 am	Premezclado geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1212	7509	32	4	12-oct-24	9-nov-24	28	254,9	3	8171	318	4525	31,2	281	4000	27,6	113,1	20,3	Pilote C6	Premezclado Geoacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1212	7510	33	4	14-oct-24	11-nov-24	28	309,4	5	8012	394	5600	38,6	281	4000	27,6	140,0	24,1	Pilote D8 Hora de toma: 4:40 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi

REVISÓ  KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ GEOTECNÓLOGO M.P. # 1951600791 CAU	APROBÓ  FERNANDO MUÑOZ FUENTES GERENTE TÉCNICO M.P. # 19516001294 CAU
---	---

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO		FGLR-67
NTC 673		Versión 06
CLIENTE:	Consortio Evolet	
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José	
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca	
CONTRATISTA:	N.A	
INTERVENTORÍA:	N.A	

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1199	7462	27	4	8-oct-24	6-nov-24	29	266,2	3	8171	332	4725	32,6	281	4000	27,6	118,1	20,3	Pilote C4 Hora de toma: 4:25 pm	Premezclado Premex Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1199	7463	28	4	10-oct-24	7-nov-24	28	342,2	4	8171	427	6074	41,9	281	4000	27,6	151,8	24,1	Pilote D6 Hora de toma: 10:55 am	Premezclado Geoacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1199	7464	29	4	23-oct-24	6-nov-24	14	215,2	4	8252	266	3782	26,1	211	3000	20,7	126,1	19,1	Solado foso ascensor Hora de toma: 1:40 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1199	7465	30	4	24-oct-24	7-nov-24	14	185,9	4	8012	237	3364	23,2	211	3000	20,7	112,1	2,7	Solado eje 6-7 Hora de toma: 1:08 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 004	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ GEOTECNÓLOGO M.P. # 1951600791 CAU	APROBÓ FERNANDO MUÑOZ FUENTES GERENTE TÉCNICO M.P. # 19516001294 CAU
--	--

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO														FGLR-67
NTC 673														Versión 06
CLIENTE:	Consortio Evolet													
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José													
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca													
CONTRATISTA:	N.A													
INTERVENTORÍA:	N.A													

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASER TAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1199	7462	27	4	8-oct-24	6-nov-24	29	266,2	3	8171	332	4725	32,6	281	4000	27,6	118,1	20,3	Pilote C4 Hora de toma: 4:25 pm	Premezclado Premex Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1199	7463	28	4	10-oct-24	7-nov-24	28							281	4000	27,6		24,1	Pilote D6 Hora de toma: 10:55 am	Premezclado Geocapio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Concreto Tremi
1199	7464	29	4	23-oct-24	6-nov-24	14	215,2	4	8252	266	3782	26,1	211	3000	20,7	126,1	19,1	Solado foso ascensor Hora de toma: 1:40 pm	Premezclado Geocapio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1199	7465	30	4	24-oct-24	7-nov-24	14							211	3000	20,7		2,7	Solado eje 6-7 Hora de toma: 1:08 pm	Premezclado Geocapio Mixer 004	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A.
INTERVENTORÍA: N.A.

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (N)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1294	8187	T7 06/11/2024	4	06-nov-24	05-dic-24	29	305,5	4	8252	378	5370	37,0	281	4000	27,6	134,2	20,3	Losa Foso del Ascensor Hora de toma: 11:24 am	Premezclado Geocopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO																		FGLR-67		
NTC 673																		Versión 06		
CLIENTE:		Consortio Evolet																		
OBRA:		Nueva Torre Hospital Universitario San José																		
LOCALIZACIÓN OBRA:		Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca																		
CONTRATISTA:		N.A																		
INTERVENTORÍA:		N.A																		
O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1193	7375	23	4	5-oct-24	2-nov-24	28	371,6	4	8012	473	6728	46,4	281	4000	27,6	168,2	21,6	Pilote C8 Hora de toma: 3:29 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1193	7376	24	4	6-oct-24	3-nov-24	28	309,5	4	8091	390	5547	38,2	281	4000	27,6	138,7	22,9	Pilote A4 Hora de toma: 2:10 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 002	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1193	7377	25	4	7-oct-24	4-nov-24	28	332,7	4	8171	415	5905	40,7	281	4000	27,6	147,6	22,9	Pilote B4 Hora de toma: 4:15 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 003	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1193	7378	26	4	21-oct-24	4-nov-24	14	207,6	4	8171	259	3684	25,4	211	3000	20,7	122,8	22,9	Solado eje 4-6 Hora de toma: 1:40 pm	Premezclado Geoacopio Mixer 004	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
 Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet


OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José


LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (Kv)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
24	212	T17	4	20-dic-24	17-ene-25	28	352,2	3	7933	453	6439	44,4	281	4000	27,6	161,0	20,3	Losa Superior Hora de toma 9:40 am	Premezclado Geocopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
24	213	T20	4	11-ene-25	18-ene-25	7	263,5	4	8091	332	4724	32,6	281	4000	27,6	118,1	60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm	Premezclado Geocopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
24	214	T19	4	09-ene-25	17-ene-25	8	295,9	4	8091	373	5305	36,6	281	4000	27,6	132,6	60,0	PW2 - 4 - 7 - 8 C3 - 5 - 6 - 7 Nivel 1 Hora de toma 10:00 pm	Premezclado Geocopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
 GEOTECNÓLOGO
 M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
 GERENTE TÉCNICO
 M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
 ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
 Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet


OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José


LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (Kv)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
14	148	T13	4	14-dic-24	13-ene-25	30	301,1	5	8012	383	5451	37,6	281	4000	27,6	136,3	21,6	Vigas Cabezales 2.3 Hora de toma 7:44 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	149	T14	4	14-dic-24	13-ene-25	30	304,1	4	8171	380	5398	37,2	281	4000	27,6	134,9	20,3	Vigas Cabezales 3.4 Hora de toma 9:20 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	150	T15	4	14-dic-24	13-ene-25	30	314,4	4	8171	392	5581	38,5	281	4000	27,6	139,5	20,3	Vigas Cabezales 4.6 Hora de toma 10:14 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	151	T16	4	14-dic-24	13-ene-25	30	329,5	4	8252	407	5791	39,9	281	4000	27,6	144,8	21,6	Vigas Cabezales 6.8 Hora de toma 11:30 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	152	T18	4	07-ene-25	14-ene-25	7	272,9	3	8252	337	4797	33,1	281	4000	27,6	119,9	60,0	Pantallas 1-6-10 Columna 1-12-4-9 Nivel 1 Hora de toma 3:08 pm		Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
 GEOTECNÓLOGO
 M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
 GERENTE TÉCNICO
 M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
 ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (Kv)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1355	8340	T8	4	09-dic-24	17-dic-24	8	253,6	5	8659	299	4248	29,3	281	4000	27,6	106,2	20,3	Losa inferior - ejes 2-6, D-E Hora de toma 4:55 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1355	8341	T9	4	09-dic-24	17-dic-24	8	283,7	4	8171	354	5035	34,7	281	4000	27,6	125,9	21,6	Losa inferior - ejes 2-8, D-G Hora de toma 7:18 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1355	8342	T10	4	09-dic-24	17-dic-24	8	200,1	5	8171	250	3551	24,5	281	4000	27,6	88,8	22,4	Losa inferior - ejes 6-8, A-D Hora de toma 10:02 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1355	8343	T11	4	09-dic-24	17-dic-24	8	262,7	4	8252	325	4618	31,8	281	4000	27,6	115,4	20,3	Losa inferior - ejes 2-4, A-D Hora de toma 12:13 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
1355	8344	T12	4	09-dic-24	17-dic-24	8	279,3	4	8252	345	4910	33,9	281	4000	27,6	122,7	20,3	Vigas foso del ascensor A,B,4,5,6 Hora de toma 1:27 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (Kv)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASEN. TAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
2	35	T17	4	20-dic-24	07-ene-25	18	338,8	4	8091	427	6073	41,9	281	4000	27,6	151,8	20,3	Losa Superior Hora de toma 9:40 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
2	36	T8	4	09-dic-24	07-ene-25	29	292,7	5	8171	365	5196	35,8	281	4000	27,6	129,9	20,3	Losa Inferior Ejes 2-6, D-E Hora de toma 4:55 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
2	37	T9	4	09-dic-24	07-ene-25	29	341,6	4	8171	426	6063	41,8	281	4000	27,6	151,6	21,6	Losa Inferior Ejes 2-8, D-G Hora de toma 7:18 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
2	38	T10	4	09-dic-24	07-ene-25	29	248,9	5	8012	317	4507	31,1	281	4000	27,6	112,7	22,4	Losa Inferior Ejes 6-8, A-E Hora de toma 10:02 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
2	39	T11	4	09-dic-24	07-ene-25	29	307,4	5	8171	384	5457	37,6	281	4000	27,6	136,4	20,3	Losa Inferior Ejes 2-4, A-D Hora de toma 12:13 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
2	40	T12	4	10-dic-24	07-ene-25	28	328,0	4	8171	409	5823	40,1	281	4000	27,6	145,6	20,3	Vigas Foso del Ascensor A,B,4,5,6 Hora de toma 1:27 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

www.geofisica.com.co

e-mail:info@geofisica.com.co

REVISÓ

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A.
INTERVENTORÍA: N.A.

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (N)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
1294	8187	T7 06/11/2024	4	06-nov-24	05-dic-24	29	305,5	4	8252	378	5370	37,0	281	4000	27,6	134,2	20,3	Losa Foso del Ascensor Hora de toma: 11:24 am	Premezclado Geocopio Mixer 001	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

Página 1 de 1



**ANEXO 19. RESULTADOS RESISTENCIA
COMPRESION INTERVENTORIA**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-269
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
1501	PILOTE C2 - E4	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	N/S	6	15.1	30.2	11913	177.9	2.221	24-sep-24	6-dic-24	73	468.5	TIPO 5	268.5	3820	26.34	95.5						
1502					15.0	30.4	12033	176.7	2.244	24-sep-24	6-dic-24	73	472.3	TIPO 5	272.5	3876	26.7	96.9						
1503					15.2	30.4	12004	180.3	2.194	24-sep-24	6-dic-24	73	486.1	TIPO 5	275.0	3911	27.0	97.8						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-269
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO													4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2		
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES	
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DÍAS			Kg/cm²	PSI	Mpa			
1504	PILOTE C6 - C7	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	N/S	6	15.1	30.1	12552	177.9	2.348	12-oct-24	6-dic-24	55	495.6	TIPO 5	284.1	4041	27.86	101.0		
1505					15.1	30.4	12470	177.9	2.310	12-oct-24	6-dic-24	55	469.9	TIPO 5	269.3	3831	26.4	95.8		
1506					15.0	30.3	12464	176.7	2.332	12-oct-24	6-dic-24	55	477.0	TIPO 5	275.2	3915	27.0	97.9		

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-269
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			3000	PSI	21	Mpa	210	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
1507	SOLADOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	N/S	6	15.0	30.2	12554	176.7	2.356	17-oct-24	6-dic-24	50	588.7	TIPO 5	339.7	4832	33.31	161.1						
1508					15.0	30.3	12603	176.7	2.358	17-oct-24	6-dic-24	50	477.2	TIPO 5	275.4	3917	27.0	130.6						
1509					15.1	30.4	12471	177.9	2.310	17-oct-24	6-dic-24	50	480.2	TIPO 5	275.3	3915	27.0	130.5						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-269
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

										RESISTENCIA DE DISEÑO			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2		
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONE	
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DÍAS			Kg/cm²	PSI	Mpa			
1510	LOSA DE CIMENTACIÓN FOSO	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	N/S	6	15.1	30.4	13298	179.1	2.443	6-nov-24	6-dic-24	30	536.3	TIPO 5	305.4	4344	29.95	108.6		
1511					15.1	30.4	13249	179.1	2.438	6-nov-24	6-dic-24	30	486.8	TIPO 5	277.2	3943	27.2	98.6		
1512					15.1	30.3	13355	177.9	2.478	6-nov-24	6-dic-24	30	498.3	TIPO 5	285.6	4063	28.0	101.6		

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------
