

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

ENTIIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 (PERIODO AGOSTO DE 2024)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
CONSORCIO INTERSALUD PZ**

	
Elaboró: Diego Ernesto Bravo Residente de Interventoría	Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M. Representante legal Consortio Intersalud PZ

Agosto 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	6
2.1.	Localización	7
2.2.	Justificación.	8
2.3.	Características del Proyecto.	9
3.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	10
3.1.	Contrato de Obra.	10
3.2.	Póliza del Contrato de Obra.....	10
3.3.	Contrato de Interventoría.	11
3.4.	Pólizas de Interventoría.	12
4.	GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.....	12
4.1.	Gestión Administrativa	12
4.1.1.	Personal de Interventoría	12
4.1.2.	Comités de obra.....	13
4.1.3.	Correspondencia Cruzada	14
4.1.4.	Trazabilidad de documentación y trámites	14
4.2.	Gestión Técnica.....	25
4.2.1.	Avance de obra	25
4.3.	Gestión Financiera.....	40
4.4.	Gestión Socioambiental	41
5.	GESTION SST.....	42
6.	GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA	45
7.	CONCLUSIONES	45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. Fuente: Google Earth.....	7
Ilustración 2. Niveles de excavación de cimentación del proyecto	17
Ilustración 3. Reporte Personal Operativo obra	18
Ilustración 4. Visita universidad del cauca 27 de agosto 2024	24
Ilustración 5. Visita universidad del Cauca 28 de agosto 2024	25
Ilustración 6. Conexión red pluvial universidad tubería 27"	28
Ilustración 7. Compactación de rellenos para red alcantarillado sanitario	29
Ilustración 8. Áreas de trabajo	31
Ilustración 9. Cerramiento y protección de ventanas	32
Ilustración 10. Reubicación de redes hidráulicas	34
Ilustración 11. Retiro de sobrantes	35
Ilustración 12. Capacitaciones personal administrativo y operativo contratista de obra	44

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra	10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra	11
Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra	11
Tabla 4. Contrato de Interventoría	11

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Tabla 5. Pólizas de Interventoría	12
Tabla 6. Personal Interventoría.....	13
Tabla 7. Actas de comité	13

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad civil – Contratista de Obra...	11
Anexo 2. Pólizas de Cumplimiento - Interventoría	12
Anexo 3. Actas de comités técnicos agosto	14
Anexo 4. Trazabilidad de Correspondencia Cruzada	14
Anexo 5. Detalle de permisos y licencias requeridas para la construcción del proyecto	16
Anexo 6. Concepto técnico para redes de acueducto HUSJ.....	17
Anexo 7. Niveles de excavación de cimentación HUSJ	17
Anexo 8. Concepto técnico SGA-12340-2024	21
Anexo 9. Concepto viabilidad técnica curaduría.....	23
Anexo 10. Informe mensual de contratista obra agosto	45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del mes de agosto de 2024, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que CONSORCIO EVOLET cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas generales incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada se referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km². Se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las tierras bajas de la costa.



*Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.
Fuente: Google Earth*

Ahora bien, el municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central. limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física mediante la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos mcte (\$32.473.928.569)
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad civil – Contratista de Obra

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO INTERSALUD PZ
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos mcte (\$1.280.412.030) incluido iva.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso N°108 del 1 febrero de 2024 por valor de \$1.280.412.030.

Tabla 4. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	Vigencia	
	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-mayo-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030

Tabla 5. Pólizas de Cumplimiento Interventoría

Las pólizas del contratista de obra y la interventoría relacionada anteriormente se encuentran como anexo en el presente informe.

Anexo 2. Pólizas de Cumplimiento - Interventoría

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo de agosto de 2024.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1. Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Morillo
Residente de Interventoría	Diego Ernesto Bravo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Inspector de Obra	Gerardo Muñoz
Ingeniera Auxiliar Técnica Interventoría	Angélica Ordoñez Cortes
Profesional Seguridad y salud en el trabajo	Wilber Asmet Restrepo P.
Abogado Jurídico	José Alexander Romero

Tabla 6. Personal Interventoría

4.1.2. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron (4) comités técnicos.

COMITÉ	FECHA
16	02-08-2024
17	05-08-2024
18	09-08-2024
19	16-08-2024
20	26-08-2024

Tabla 7. Actas de comité

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Las actas de comité realizados en el durante el periodo comprendido se anexa en el presente informe.

Anexo 3. Actas de comités técnicos agosto

Los diferentes comités técnicos del mes de agosto se llevan a cabo con la presencia del contratista de obra, interventoría y entidad contratante, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en las instalaciones del campamento de obra donde el contratista dispone de sus oficinas. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

4.1.3. Correspondencia Cruzada

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoría a la firma contratista durante el mes de agosto.

Anexo 4. Trazabilidad de Correspondencia Cruzada

4.1.4. Trazabilidad de documentación y trámites

Con oficio EV-C358-23-103-24 del 03 de agosto de 2024, el contratista de obra presenta Informe de Actividades Planeadas para la semana comprendida entre 5 de agosto 2024 – 10 de agosto 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024

Documento
Versión 1

Actividades Planificadas	
Fecha	Actividad
Lunes 5/08/2024	• Instalación de paneles de superboard para ventanas. • Reubicación de red de acueducto de 3". • Instalación de brocales. • Perforación de recámaras de inspección.
Martes 6/08/2024	• Instalación de paneles de superboard para ventanas. • Reubicación de red de acueducto de 3". • Instalación de Brocales. • Perforación de recámaras de inspección. • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino.
CONTACTO 3043935212 - 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM	
CONSORCIO EVOLET NTT 901784507-4	
Miércoles 7/08/2024	• Reubicación de red de acueducto de 3". • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino.
Jueves 8/08/2024	• Instalación de paneles de superboard para ventanas. • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino.
Viernes 9/08/2024	• Instalación de paneles de superboard para ventanas. • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino.
Sábado 10/08/2024	• Instalación de paneles de superboard para ventanas. • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino.

Con oficio EV-C358-23-104-24 del 06 de agosto de 2024, el contratista de obra remite Contrato de fiducia para el manejo del anticipo, para su revisión y/o aprobación por parte de interventoría.

Bajo oficio EV-C358-23-107-24 del 09 de agosto de 2024, el contratista de obra remite el proceso constructivo para la cimentación del proyecto.

Mediante EV-C358-23-0108-24 del 10 de agosto de 2024, el contratista de obra presenta Informe de Actividades Planeadas para la semana comprendida entre 12 de agosto 2024 – 17 de agosto 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Actividades Planificadas	
Fecha	Actividad
Lunes 12/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero
Martes 13/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero
Miércoles 14/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero
 CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM	
CONSORCIO EVOLET NIT 901784507-4	
Jueves 15/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller.
Viernes 16/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller.
Sábado 17/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero. - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller.

El día 12 de agosto de 2024 mediante oficio CIPZ-078-059-2024 interventoría da respuesta a solicitud de la oficina de control interno del Hospital San José, en la que solicitaron un informe detallado donde se relacionen los permisos que se requieren para la construcción del proyecto, entregándose el detalle del estado de cada uno de los requerimientos con sus respectivos documentos soporte de permisos o licencias.

Anexo 5. Detalle de permisos y licencias requeridas para la construcción del proyecto

Con oficio EV-C358-23-109-24 del 13 de agosto de 2024, el contratista de obra remite el informe mensual No. 5 para el periodo del 01 al 31 de julio del 2024.

A través del oficio EV-C358-23-110-24 del 14 de agosto de 2024, el contratista de obra remite el concepto técnico para la red de acueducto, como soporte para justificar y garantizar el suministro continuo del agua potable al hospital.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Anexo 6. Concepto técnico para redes de acueducto HUSJ

Con oficio EV-C358-23-111-24 del 15 de agosto de 2024, el contratista de obra remite los niveles de construcción de la cimentación del proyecto.

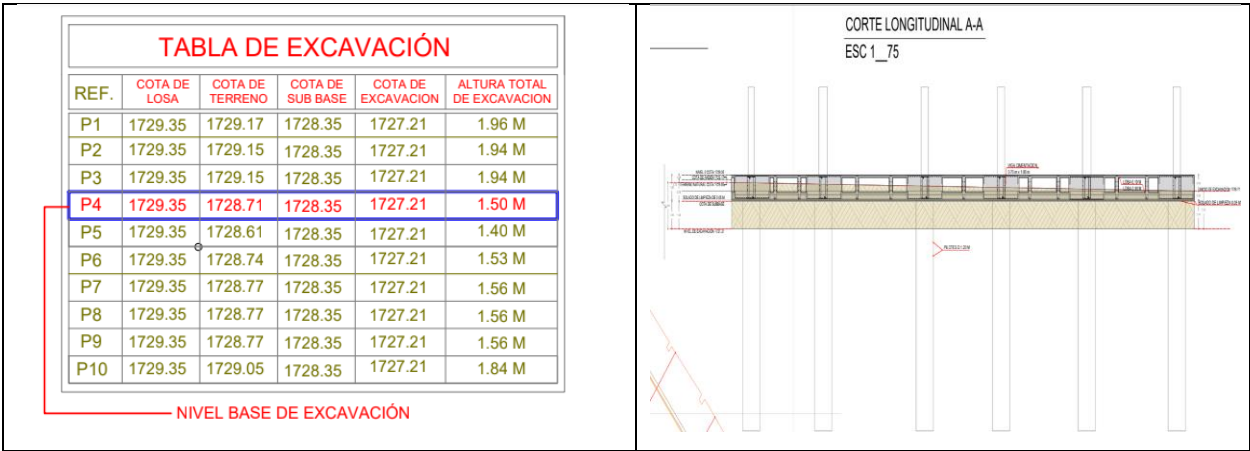


Ilustración 2. Niveles de excavación de cimentación del proyecto

Anexo 7. Niveles de excavación de cimentación HUSJ

Bajo oficio EV-C358-23-111-24 del 15 de agosto de 2024, el contratista de obra remite la relación del personal de obra vinculado al proyecto, el cual se encuentra debidamente afiliado al sistema de Seguridad social.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

ASUNTO: Reporte personal obra.

Remitimos la relación del personal de obra vinculado al proyecto, el cual se encuentra debidamente afiliado al sistema de Seguridad social.

NOMBRE	CADULA	CARGO	EPS	ARL
JAIME PALACIO LOSANO	13.845.561	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	SURA
FERNEY MARTINEZ MONTILLA	5.073.943	AYUDANTE OBRA	COOSALUD	SURA
IVAN ARTEMIO ESPAÑA SOLARTE	15.814.588	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA
JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76.334.379	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA
JOSE LUISI MARCANO GONZALES	8.757.119	AYUDANTE OBRA	COOSALUD	SURA
JULIAN MAURICIO FIGUEROA MONTENEGRO	1.058.932.896	AYUDANTE OBRA	NUEVA EPS	SURA

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
GERENTE CONSORCIO EVOLET - NIT: 901784507-4

ANEXOS
 Anexo Documentación del personal
 Elaboró: PSST: JCMAYA

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM

Ilustración 3. Reporte Personal Operativo obra

El día 16 de agosto de 2024 mediante oficio CIPZ-078-062-2024 interventoría en seguimiento a los acuerdos establecidos durante el comité de obra realizado el 9 de Agosto del presente año, interventoría solicita al contratista, el estado actual de los trámites para la instalación de los servicios provisionales de energía y acueducto, necesarios para la ejecución del proyecto con objeto "Construcción del Edificio para el Servicio de Consulta Externa, Procesos de Innovación-Investigación y Procesos Administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.", con el fin de dar seguimiento oportuno y garantizar la agilidad en la ejecución de las actividades relacionadas con dichos servicios.

Con oficio EV-C358-23-0114-24 del 17 de agosto de 2024, el contratista de obra presenta Informe de Actividades Planeadas para la semana comprendida entre 20 de agosto 2024 – 24 de agosto 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	

Actividades Planificadas <table><tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th></tr><tr><td>Martes 20/08/2024</td><td> • Trazado del área de cimentación para excavación • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr></table>  CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM CONSORCIO EVOLET NIT 901784507-4 <table><tr><td>Miércoles 21/08/2024</td><td> • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Jueves 22/08/2024</td><td> • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr></table>	Fecha	Actividad	Martes 20/08/2024	• Trazado del área de cimentación para excavación • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"	Miércoles 21/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"	Jueves 22/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"	<table><tr><td>Miércoles 21/08/2024</td><td> • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Jueves 22/08/2024</td><td> • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Viernes 23/08/2024</td><td> • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Sábado 24/08/2024</td><td> • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21" </td></tr></table> Cordialmente,  CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ GERENTE CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4	Miércoles 21/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"	Jueves 22/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"	Viernes 23/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"	Sábado 24/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"
Fecha	Actividad																
Martes 20/08/2024	• Trazado del área de cimentación para excavación • Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																
Miércoles 21/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																
Jueves 22/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																
Miércoles 21/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																
Jueves 22/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																
Viernes 23/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																
Sábado 24/08/2024	• Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. • Techado para amarre de acero • Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. • Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"																

Con oficio EV-C358-23-115-24 del 17 de agosto de 2024, el contratista de obra remite los documentos del operario de la excavadora marca Hitachi, que ingresará a partir del próximo martes 20 de agosto para ejecutar labores de excavación mecánica e instalación de subbase para cimentación del proyecto.

El día 17 de agosto de 2024 mediante oficio CIPZ-078-064-2024 interventoría remite las observaciones al informe mensual de avance para el mes de julio, entregado por el contratista, con el fin de que sean subsanadas para dar trámite ante la entidad.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	

ASUNTO: Reporte personal de obra.

Remitimos la los documentos del operario de la excavadora marca Hitachi, que ingresará a partir del próximo martes 20 de agosto para ejecutar labores de excavación mecánica e instalación de subbase para cimentación del proyecto.

NOMBRE	CADULA	CARGO	EPS	ARL
HAROLD ALBERTO RIVERA BOJORGE	76.316.409	OPERADOR	ASMETSALUD	SURA

Cordialmente.



CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
GERENTE CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4

ANEXOS
Anexo Documentación del personal
Elaboró: PSST- JCMAYA

Con oficio EV-C358-23-116-24 del 21 de agosto de 2024, el contratista de obra remite el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición.

Mediante oficio EV-C358-23-0118-24 del 24 de agosto de 2024, el contratista de obra presenta Informe de Actividades Planeadas para la semana comprendida entre 26 de agosto 2024 – 31 de agosto 2024

Actividades Planificadas <table><tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th></tr><tr><td>Lunes 26/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Martes 27/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero </td></tr></table> CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM  CONSORCIO EVOLET NIT 901784507-4 <table><tr><td></td><td> - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Miércoles 28/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr></table>	Fecha	Actividad	Lunes 26/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"	Martes 27/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero		- Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"	Miércoles 28/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"	<table><tr><td>Miércoles 28/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Jueves 29/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Viernes 30/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr><tr><td>Sábado 31/08/2024</td><td> - Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21" </td></tr></table> Cordialmente,  CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ GERENTE CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4	Miércoles 28/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"	Jueves 29/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"	Viernes 30/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"	Sábado 31/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"
Fecha	Actividad																		
Lunes 26/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		
Martes 27/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero																		
	- Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		
Miércoles 28/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		
Miércoles 28/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		
Jueves 29/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		
Viernes 30/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		
Sábado 31/08/2024	- Actividades de Campamento para obreros: Baños personal de obra, zona de cambio obreros y casino. - Techado para amarre de acero - Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller. - Excavaciones profundas para verificación de tuberías adyacentes a la red pluvial de gres de 21"																		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Gestión Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)

El día 09 de agosto de 2024 con oficio EV-C358-23-105-24 contratista remite gestiones realizadas ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) con relación al Programa de manejo ambiental de Residuos de Construcción y Demolición RCD y entrega comunicación SGA-12340-2024 por la cual la CRC emite concepto técnico en calidad de Favorable para el desarrollo del proyecto, estableciendo: “que la actividad de la construcción del edificio objeto del contrato No. 358 de 2023, no genera problemas de carácter ambiental” y “que la Corporación otorga concepto TÉCNICO FAVORABLE para el desarrollo del proyecto, ya que se garantiza las condiciones técnicas definidas en la resolución 472 de 2017 modificada por la resolución 1257 de 2021”


Concluye así la CRC que acoge el programa de manejo ambiental RCD y en consecuencia hace el proceso de inscripción como gran generador para el consorcio EVOLET.

Anexo 8. Concepto técnico SGA-12340-2024

Gestión licencia de construcción con curaduría urbana 2

El día 01 de agosto de 2024 atendiendo la solicitud de interventoría CIPZ-078-058-2024, el contratista con oficio EV-C358-23-101-24 remite la documentación técnica radicada a la Curaduría Urbana No 2, correspondiente a planos arquitectónicos y estructurales.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

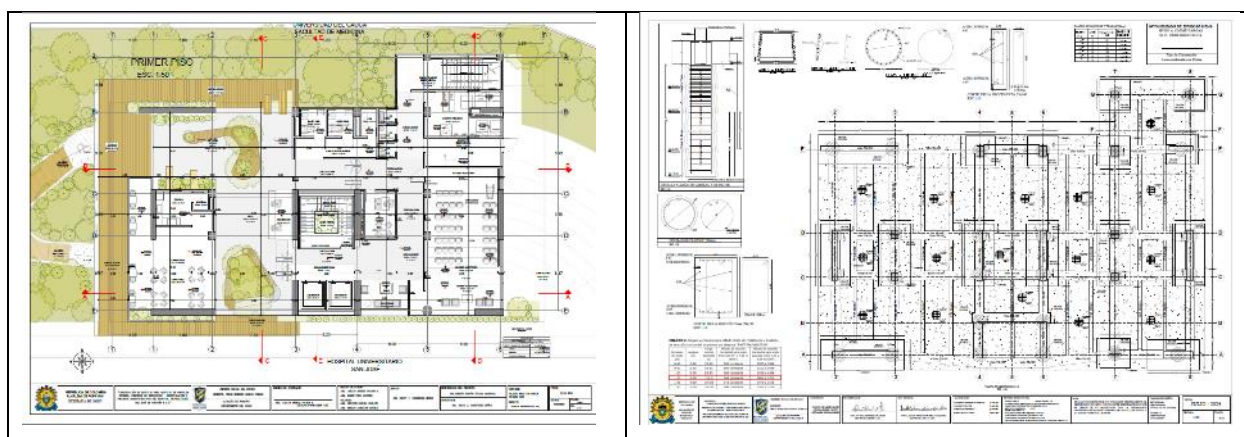

Mediante comunicación de la curaduría urbana 2, del 01 de agosto de 2024 se informa que: certifica la existencia de la solicitud de licencia de construcción No. 19001-2-24-0204 del 19 de junio del 2024, la cual el día 29 de julio del 2024 cumplió con la documentación que compone la legal y debida forma; que se adelantó la revisión arquitectónica, encontrando que los diseños se ajustan a la resolución de aprobación del anteproyecto, por lo que se considera que el trámite se encuentra adelantando en un 90%, y a hoy se gestiona el proceso simultáneamente desde lo técnico y administrativo, encontrándose en trámite lo referente a la liquidación de expensas y elaboración del formato de delineación urbana para el respectivo pago del impuesto de delineamiento urbano liquidado por el Municipio de Popayán, y notificación a vecinos colindantes al proyecto objeto de la solicitud por correo certificado.

Atendiendo la solicitud radicada en curaduría con número CU2242110 del 24 de julio 2024; el día lunes 12 de agosto de 2024 mediante oficio CD-CU2-100-24-0507 la Curaduría Urbana 2 de Popayán expresa que frente al trámite de la licencia de construcción, se gestiona simultáneamente a la revisión adelantada desde lo técnico y administrativo, lo referente a la liquidación de expensas y elaboración del formato de delineación urbana para el respectivo pago del impuesto de delineamiento urbano

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

liquidado por el Municipio de Popayán, como también el proceso de notificación a vecinos colindantes al predio del proyecto.

Anexo 9. Concepto viabilidad técnica curaduría

Gestión Acta de Vecindad

El día 15 de agosto de 2024 la facultad de medicina de la Universidad del Cauca por medio de correo electrónico, hace llegar al contratista EVOLET, el inventario consolidado y las hojas de vida de los equipos de los diferentes laboratorios de la facultad. Esta información se pidió con el fin de conocer e identificar y tener el estado actual de aquellos equipos susceptibles de afectación en su calibración debido a posibles vibraciones y ruido causado por las actividades de obra del proyecto, enfatizando en las labores de cimentación, para las cuales se proyectan perforaciones para construcción de pilotes. Ya con la información allegada, antes mencionada, se establecerá visita a la facultad de medicina para proceder a efectuar y dar término a la respectiva acta de vecindad de equipos.

El día martes 27 de agosto 2024 se realiza visita a la facultad de medicina de la Universidad del Cauca con el fin de realizar el acta de vecindad de los equipos de los diferentes laboratorios de la facultad. Esta reunión la atiende la señora secretaria de la facultad, pero es pertinente que esté presente la Ing. Biomédica encargada y responsable de los equipos de los laboratorios, pero en este día no se encuentra disponible, por lo que se la cita para el día de mañana miércoles 28 de agosto y así se pueda definir y aclarar la pertinencia y posible afectación real de los equipos, con la persona realmente encargada de los mismos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1



Ilustración 4. Visita universidad del cauca 27 de agosto 2024

El miércoles 28 de agosto 2024 se realiza visita a la facultad de medicina de la Universidad del Cauca con el fin de realizar el acta de vecindad de los equipos de los diferentes laboratorios de la facultad contando con la presencia de la Ing. Biomédica Emilce Sánchez. Evaluando y revisando el listado de equipos y sus hojas de vida enviados por la facultad de medicina, se identifican equipos faltantes, equipos que no corresponden, equipos que ya no están en funcionamiento, equipos que se les debe completar información, etc, por lo que para la correcta elaboración del acta se debe conocer y detallar la totalidad de equipos con sus características correspondientes, estado de mantenimiento y registro fotográfico detallado que lo identifique claramente; situación por la cual es necesario hacer recorrido de valoración, identificación y toma de información con la ing. Biomédica, conocedora y a cargo de todos los equipos. Este recorrido se programa para el próximo día martes 03 de septiembre 2024 a las 8:30 am.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1



Ilustración 5. Visita universidad del Cauca 28 de agosto 2024

4.2. Gestión Técnica

4.2.1. Avance de obra

Durante el mes de agosto de 2024, el contratista de obra continúa con las actividades de fase previa a la construcción del proyecto. Estas actividades abarcan acciones administrativas y técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.

En este mes de agosto se continúa con: Reubicación de tubería hidráulica PVC 3" RDE 21 con sus respectivas conexiones y derivaciones, cierre de ventanas de fachada del hospital, construcción de recámara pluvial para empalme de tubería 21" proveniente de la facultad de medicina de la universidad del Cauca, a nueva red pluvial de 27", instalación de brocales para recamaras pluviales, adecuación y construcción de espacios de trabajo cubiertos como comedor y baños para trabajadores, zona de cambio obreros y casino, techado para amarre de acero, Construcción del almacenamiento de materiales

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

en la zona del Chiller, Excavaciones profundas para retiro de tubería pluvial de gres de 21"

Para llevar a cabo estas actividades, la interventoría considera esencial adherirse rigurosamente a los procedimientos de construcción establecidos, realizar un control exhaustivo sobre las acciones del contratista encargado de la obra, y proporcionar un seguimiento y apoyo oportunos al contratista para asegurar la correcta realización de las tareas asignadas.

Reubicación de redes de alcantarillado pluvial

Como complemento a la construcción para la reubicación de la red de alcantarillado pluvial, el contratista realiza empalme de tubería pluvial de 21" proveniente de la facultad de medicina de la Universidad del Cauca, a la nueva red pluvial de 27", mediante una recamara, acorde a los diseños establecidos. Para esta recamara se efectúa excavaciones, fundición de solado, empalme de tubería, colocación de acero de refuerzo, instalación de formaleta, fundición del cuerpo cilíndrico de la recamara con concreto premezclado e instalación de brocal.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024

Documento
Versión 1

Excavaciones para recamara de red pluvial



Empalme de tuberías pluviales y se observa la colocacion y amarre de acero de refuerzo de recamara



Fundicion de recamara pluvial con concreto premezclado

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	



Instalacion escalerilla en varilla corrugada 5/8"



Instalacion de brocales

Ilustración 6. Conexión red pluvial universidad tubería 27"

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Reubicación de redes de alcantarillado sanitario

Para la red de alcantarillado sanitario se realiza complemento de los rellenos efectuados con material limo arcilloso.



Rellenos compactados mecánicamente para red de alcantarillado sanitario nuevo

Ilustración 7. Compactación de rellenos para red alcantarillado sanitario

Construcción de áreas de trabajo de obra

El contratista efectúa la adecuación y construcción de los espacios de trabajo como el comedor y baños para trabajadores, zona de cambio de obreros y casino, techado para amarre de acero, Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024

Documento
Versión 1



Actividades para construcción de espacios de trabajo



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1



Ilustración 8. Áreas de trabajo

Cerramiento y protección de ventanas fachada contigua al proyecto.

La fachada lateral del Hospital San José, en cuyo interior se encuentran ubicadas las habitaciones y área de UCI, esta contigua al espacio de obra del nuevo edificio, razón por la cual se considera directa la afectación de la obra, ocasionando problemas de ruido y de polvo. Ante tal eventualidad se toma la decisión de sellar y aislar las ventanas correspondientes a primero y segundo piso, con la instalación de doble lamina de súper

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

board con icopor al medio. Mitigando así los efectos del ruido. Del polvo y dándole además protección extra a las ventanas.



Cierre de ventanas en fachada de hospital con laminas de super board e icopor, para proteger y minimizar el ingreso de polvo y ruido, actividad que se termino el día viernes 02 de agosto

Ilustración 9. Cerramiento y protección de ventanas

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

Reubicación de redes hidráulicas

La entrada hidráulica existente para el hospital San José, es en tubería metálica de 3", está instalada por el costado de la fachada lateral izquierda y corre paralela a la misma a una distancia de 1,60 m aproximadamente. En este recorrido va surtiendo otras tuberías que ingresan al hospital. Por su ubicación interfiere con la construcción de la cimentación de la nueva torre del Hospital, por lo que se opta por reubicarla igualmente paralela a la fachada del hospital pero más cerca de la misma, de tal forma que permita realizar todas las nuevas conexiones y no interfiera de ninguna manera con el proyecto.



Instalacion de nueva tuberia PVC presion 3" RDE 21 al costado del edificio del hospital San Jose

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1



Instalacion de tuberias y accesorios de conexon para darle el recorrido y pocision a la tuberia hidraulica PVC de 3".



Instalacion de puntos y elementos de conexion

Ilustración 10. Reubicación de redes hidráulicas

Retiro de materiales sobrantes

Se efectúa el retiro de materiales sobrantes de excavaciones y demoliciones.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1



Ilustración 11. Retiro de sobrantes

Demoliciones

Se encuentran en sitio de obra estructuras o elementos que requieren ser demolidos y retirados, permitiendo así la adecuación de las áreas de trabajo y desarrollo de actividades previas al inicio de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1



Demolición de placas de concreto rígido

Cortes de piso en costados del perímetro de ubicación de edificio

Excavaciones para retiro de tubería existente de alcantarillado pluvial

Se realizó excavación para el retiro de la tubería existente de gres, localizada entre las recamaras P1 y P5, para la prevención de asentamiento del terreno por fallo de la tubería al momento de realizar la carga al suelo por la construcción de la edificación.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024

Documento
Versión 1



Excavaciones para retiro de tubería de Grees 21"

Mejoramiento del terreno con material granular tipo sub base compactado al 95% del Proctor modificado.

Se realizó el relleno con material granular tipo subbase, de la zanja resultante del retiro de la tubería de grees localizada entre las recamara P1 y P5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

	
	
Mejoramiento del terreno con material granular tipo sub base compactado al 95% del Proctor modificado	

Aislamiento con cubrimiento de ventanas en paneles de superboard.

Se terminaron los aislamientos de las ventanas del costado nororiental del Hospital Universitario San José, donde se instalaron en total 50 paneles en superboard de 6mm en la parte interna, 8 mm en la parte externa con una lámina de icopor intermedia de

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

2cm. Estos paneles quedaron sujetos a la fachada con anclajes en aluminio y chazos metálicos.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

4.3. Gestión Financiera

Con oficio EV-C358-23-104-24 del 06 de agosto de 2024, el contratista de obra remite Contrato de fiducia para el manejo del anticipo, para su revisión y/o aprobación por parte de interventoría.

Así mismo para el 15 de agosto de 2024 ya se tiene por parte del contratista el plan de inversión del anticipo.

En relación con el contrato de fiducia y el plan de inversión del anticipo, la interventoría presentó el día jueves 15 de agosto observaciones al contrato de fiducia mediante oficio CIPZ-078-063-2024. Por otra parte, se comunicó al contratista que el plan de inversión del anticipo presentado requiere mayor detalle, dado que resulta demasiado general. En consecuencia, se le ha solicitado al contratista que desglose y especifique las actividades o ítems de dicho plan. Una vez el contratista haya subsanado estas observaciones, el plan de inversión será remitido a la entidad contratante.

Al término del mes de agosto las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, quedando por evaluar sus costos, acorde a precios contractuales y precios no previstos concertados y autorizados, una vez se termine la totalidad de ellas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

4.4. Gestión Socioambiental

En el mes de agosto la interventoría en atención a las obligaciones contractuales inmersas en los documentos técnicos, y una vez recibido el Plan de Manejo Ambiental-PMA, por parte del contratista, remitió observaciones a este documento

consistentes en:

1. En atención a la solicitud presentada por el contratista en el oficio EV-C358-23-091-24, esta interventoría, mediante oficio CIPZ 078-061-2024 del 15 de agosto de 2024, pidió al contratista determinar la ubicación exacta de los puntos donde deberán plantarse los árboles contemplados en la Resolución DTC-7002024 de la CRC, y de no tener clara esta información, remitir solicitud la Corporación Regional del Cauca, para que sea esta quien determine una zona alternativa para la implementación de la medida compensatoria.
2. Mediante oficio CIPZ 078-062-2024 del 16 de agosto de 2024, esta interventoría solicito al contratista información acerca del estado actual de los trámites para la instalación de los servicios provisionales de energía y acueducto, necesarios para la ejecución del proyecto con objeto "Construcción del Edificio para el Servicio de Consulta Externa, Procesos de Innovación-Investigación y Procesos Administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E." Con el fin de dar seguimiento oportuno y garantizar la agilidad en la ejecución de las actividades relacionadas con dichos servicios.
3. El 17 de agosto de 2024 a través del oficio CIPZ 078-064-2024, en el cual se da revisión y observaciones al Informe mensual No 5 del periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio de 2024, el cual fue presentado por el contratista por medio del oficio No EV-C358-23- 0109-24, en este oficio se remiten observaciones al contratista destacando

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

dentro de estas la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como de la implementación del componente de gestión ambiental.

4. El día 28 de agosto por parte de esta interventoría se dio acompañamiento al contratista a reunión con la facultad de medicina de la Universidad del Cauca, donde se socializo la hoja de vida de cada uno de los equipos, en el marco del proceso de Actas de vecindad.

5. En respuesta al oficio recibido el 17 de junio del presente año, en el cual se presentaron correcciones al Plan de Calidad y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, esta interventoría mediante oficio CIPZ- 078-067-2024 del 30 de agosto de 2024 reitera al contratista las observaciones expuestas en el oficio CIPZ-078-046-2024 del 11 de julio de 2024.

5. GESTION SST

En el contexto de las obras que se mencionan en el informe, redes pluviales, redes sanitarias y redes de agua potable, es importante considerar la normativa colombiana relacionada con los trabajos en sitios confinados. Según el Decreto 1072 de 2015, que compila las disposiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, se establece que los empleadores deben garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades laborales, incluyendo aquellas que se realicen en espacios confinados.

El artículo 2.2.4.6.1 del mencionado decreto define un espacio confinado como aquel que no está diseñado para la ocupación continua de personas y que tiene limitaciones de acceso o salida, así como condiciones que pueden ser peligrosas para la salud y seguridad de los trabajadores. Adicionalmente, el Resolución 0491 de 2020 establece los lineamientos para la identificación y control de riesgos en el trabajo en espacios

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

confinados. Esta resolución exige que se implemente un programa específico para la gestión segura de estos trabajos, el cual debe incluir:

- **Capacitación:** Los trabajadores deben recibir formación adecuada sobre los riesgos asociados a los espacios confinados y las medidas preventivas necesarias.
- **Certificación:** Es obligatorio contar con un certificado que valide la capacitación recibida por los trabajadores antes de permitirles realizar labores en sitios confinados.
- **Planificación:** Se debe elaborar un plan de trabajo que contemple procedimientos seguros para el ingreso, permanencia y salida del personal en estos espacios.
- **Monitoreo:** Se requiere realizar mediciones constantes del ambiente dentro del espacio confinado para asegurar condiciones seguras durante la ejecución del trabajo.

Por lo tanto, es imperativo que se cuente con el certificado correspondiente para cada trabajador asignado a labores en sitios confinados. Esto no solo garantiza el cumplimiento legal, sino también la protección integral de los colaboradores, el cual no se relaciona en el presente informe.

Además, es importante que en el informe se adjunte relación completa del personal asignado a la obra, detalle de los Elementos de Protección Personal -EPP entregados a cada trabajador, especificando tipo, cantidad y fecha de entrega. Certificados o documentos que respalden la capacitación recibida por el personal en el uso adecuado de los EPP.

De acuerdo con lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en su artículo 57, es responsabilidad del empleador llevar un registro actualizado del

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

personal contratado y garantizar su afiliación al sistema general de seguridad social. Esta obligación es crucial no solo para cumplir con la normativa legal, sino también para proteger los derechos laborales de los trabajadores.

Como parte del desarrollo de esta actividad, el contratista realiza capacitaciones al personal administrativo y operativo en lo referente a su programa de SST



Ilustración 12. Capacitaciones personal administrativo y operativo contratista de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el mes de agosto de 2024.

Anexo 10. Informe mensual de contratista obra agosto

7. CONCLUSIONES

El contratista deberá estar al día y presentar oportunamente a interventoría, los listados actualizados del personal en obra y los documentos que acrediten sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social.

Se recomienda al contratista que todo informe, acta, memoria, balance o documento descriptivo, ya sea de carácter de obra o administrativo o de gestiones para el proyecto se realice de forma detallada, explicativa y bien descriptiva de lo que contenga, de modo que se desglose en cada uno de los detalles pertinentes, que permitan una comprensión completa, su optima verificación, análisis e identificación de implicaciones que permitan tomar decisiones.

Se sugiere que todo el personal de obra se encuentre capacitado y sea responsable del manejo, manipulación y disposición de residuos sólidos generados en los diferentes espacios de trabajo. Se cuenta con varios puntos de recolección y disposición plenamente identificados, de tal forma que se almacene adecuadamente las basuras

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 06 AGOSTO 2024	Documento Versión 1

hasta el momento de su disposición final, teniendo así la obra en óptimas condiciones de higiene.
