

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13 – FEBRERO 26 A MARZO 25 DE 2025	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 13 (PERIODO FEBRERO 26 A MARZO 25 DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 13
CONSORCIO INTERSALUD PZ

	
Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M. Representante legal Consortio Intersalud PZ

MARZO 25 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	8
2.1. Localización.....	9
2.2. Justificación.....	10
2.3. Características del Proyecto.....	11
3.1. Contrato de Obra.....	12
3.2. Póliza del Contrato de Obra.	12
3.3. Contrato de Interventoría.....	13
3.4. Pólizas de Interventoría.....	14
4.1. Gestión Administrativa.....	15
4.1.1 Personal de Interventoría	15
4.1.2 Personal del contratista de obra.	15
4.1.3. Comités de obra.	16
4.1.4 Correspondencia Cruzada.....	18
4.2. Gestión Técnica.....	24
4.2.1 Avance de obra	24
4.3. Gestión Financiera	71
4.4. Gestión Socioambiental.....	78
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	96
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA	117
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE MUESTRAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.....	118
8. CONCLUSIONES	125

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.	9
Ilustración 2. Visita viceministro	18
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C1	26
Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5	27
Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C3.	28
Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.	29
Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.....	30
Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.	31
Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2	32
Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.	33
Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.	34
Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.	35
Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.	36
Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.	37
Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.	38
Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.	39
Ilustración 17. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.	40
Ilustración 18. Detalle losa de entrepiso	41
Ilustración 19. Detalle joist VT 01.....	41

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Ilustración 20. Detalle joist VT 02.....	42
Ilustración 21. Detalle joist VT 03.....	42
Ilustración 22. Detalle joist VT 04.....	43
Ilustración 23. Detalle joist VT 05.....	43
Ilustración 24. Detalle joist VT 06.....	44
Ilustración 25. Detalle joist VT 07.....	44
Ilustración 26. Detalle joist VT 08.....	45
Ilustración 27. Detalle joist VT 09.....	45
Ilustración 28. Disposición de vigas joist.....	46
Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A N +11.50.....	47
Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A' N +11.50.....	47
Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga B N +11.50.....	48
Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga C N +11.50.....	49
Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +11.50	50
Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +11.50.....	51
Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +11.50.....	52
Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1' (B-E) N +11.50	52
Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +11.50.....	53
Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +11.50.....	53
Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +11.50.....	54

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +11.50	54
Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +11.50.....	55
Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +11.50.....	55
Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +11.50.....	56
Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 5 ' (B-E) N +11.50	56
Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5' ' (B-E) N +11.50	57
Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +11.50.....	57
Ilustración 47. Acero corrugado de pantallas	65
Ilustración 48. Acero corrugado de columnas	66
Ilustración 49. Acero de refuerzo Vigas Joist.....	67
Ilustración 50. Acero corrugado vigas de entrepiso	68
Ilustración 51. Fundición losa de cimentación	69
Ilustración 52. Concreto para columnas.....	70

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra	12
Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra.....	13
Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra.....	13
Tabla 4. Contrato de Interventoría	14
Tabla 5. Pólizas de Interventoría	14

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Tabla 6. Personal de Interventoría.....	15
Tabla 7. Personal del contratista de obra.	16
Tabla 8. Actas de comité	16

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.....	13
Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.....	14
Anexo 3. Planillas personal Interventoría.....	15
Anexo 4. Actas de comité técnico del 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025	18
Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.	24
Anexo 6. Comprobante rendimientos financieros mes febrero 2025	74
Anexo 7. Informe mensual del periodo del 26 febrero al 25 de marzo de 2025 del contratista de obra.....	117
Anexo 8. Resultados resistencia concreto CONTRATISTA.....	125
Anexo 9. Resultados resistencia concreto INTERVENTORÍA	125

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE FEBRERO A 25 DE MARZO DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	CONSORCIO INTERSAUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km², el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO INTERSALUD PZ
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. (\$1.280.412.030) incluido iva.
Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030

Tabla 4. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-mayo-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	\$256.082.406,00

Tabla 5. Pólizas de Interventoría

Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE FEBRERO al 25 DE MARZO DE 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Augusto Guzmán Enriquez
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniera eléctrica	Carolina Gonzalez
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixa Angulo Agudelo.
Jurídico.	José Alexander Romero
Contador publico	Edwin Micolta Mondragón

Tabla 6. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Gerente Consorcio Evolet	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	José Geovaire Ausecha
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastian Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Malene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Lorena Falla Falla
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Arquitecta Apoyo técnico	Laura Valentina Callejas
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria

Tabla 7. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron dos (2) comités técnicos y dos (2) Reuniones técnicas

COMITÉ	FECHA
41	28-02-2025
42	07-03-2025
Mesa técnica Presencial Ministerio	13-03-2025
Visita viceministro	14-03-2025

Tabla 8. Actas de comité

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

El 13 de marzo del presente, se realizó una mesa técnica presencial en el ministerio de salud y protección social, donde se hablo acerca de los ítems no previstos, de lo cual, el contratista debía presentar un balance de obra incluyendo los NP con sus debidas justificaciones técnicas y financieras. Durante la mesa técnica tanto el contratista, interventoría y entidad quedaron con el compromiso de enviar el balance con su respectiva documentación para el 17 de marzo del presente, compromiso que se cumplió y se radico mediante oficio CIPZ-078-0178-2025 ante la entidad contratante.

El 14 de marzo del presente, se recibió visita por parte del viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios Jaime Urrego a las instalaciones de la obra. Donde se presentó un panorama de avance en ejecución y como estaba compuesta la capacidad instalada para el edificio proyectado.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



Ilustración 2. Visita viceministro

Anexo 4. Actas de comité técnico del 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO
4/03/2025	CIPZ-078-166-2024	RESPUESTA OFICIO INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
5/03/2025	CIPZ-078-167-2024	RESPUESTA MESA TECNICA MINISTERIO DE SALUD	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
5/03/2025	CIPZ-078-168-2024	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
5/03/2025	CIPZ-078-169-2024	RESPUESTA REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO VIAS PROVISIONALES 20 FEBRERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
6/03/2025	CIPZ-078-170-2024	RESPUESTA ACLARACION SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
6/03/2025	CIPZ-078-171-2024	RESPUESTA A OFICIO 104 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TASACIÓN PRESUNTA MULTA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
7/03/2025	CIPZ-073-172-2024	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL - INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
14/03/2025	CIPZ-078-173-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0299-25 EVOLET – USO DE RED MEDIA TENSION AÉREA EN PREDIOS DEL HUSJ PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
14/03/2025	CIPZ-078-174-2024	Cumplimiento de solicitud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
14/03/2025	CIPZ-078-175-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0299-25 EVOLET – USO DE RED MEDIA TENSION AÉREA EN PREDIOS DEL HUSJ PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/03/2025	CIPZ-078-176-2024	CONVOCATORIA A REUNIÓN – USO DE RED DE MEDIA TENSION EN PREDIOS DEL HUSJ.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
15/03/2025	CIPZ-078-177-2024	OBSERVACIONES AL PMA – INFORMES MENSUALES DE DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

17/03/2025	CIPZ-078-178-2024	RESPUESTA A OFICIO DE LA ENTIDAD 30/01/2025 EN RELACIÓN AL OFICIO No. 2024232002016871 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
20/03/2025	CIPZ-078-179-2024	REMISION INFORME MENSUAL FEBRERO 2025 CONTRATO N°358 2023 - CONTRATO N°078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
21/03/2025	CIPZ-078-180-2024	INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
21/03/2025	CIPZ-078-181-2024	SOLICITUD DE MEJORAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/03/2025	CIPZ-078-182-2024	REMISIÓN COMPROBANTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO FEBRERO 2025 CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
25/03/2025	CIPZ-078-183-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0315-25 Y REITERACION DE OFICIO EV-C358-23-0299-25 , SOLICITUD PUNTO DE CONEXIÓN ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
26/03/2025	CIPZ-078-184-2024	ENTREGA ACTA PARCIAL N°1 DE OBRA - CONTRATO N° 358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
27/03/2025	CIPZ-078-185-2024	REMISIÓN OFICIO ENTIDAD 25 MARZO 2025, CANCELACION FUNDICIÓN	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
27/03/2025	CIPZ-078-186-2024	REMISIÓN OFICIO EV-C358-23-0288-25 – SOLICITUD MEMORIAS DE CALCULO RED CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
28/03/2025	CIPZ-078-187-2024	RESPUESTA OFICIO 25 MARZO 2025 – SOLICITUD DE COMPROBANTES Y RECIBOS DEL USO DEL ANTICIPO PRESUPUESTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
28/03/2025	CIPZ-078-188-2024	REMISION OFICIO REQUERIMIENTO 25 MARZO 2025 - SOLICITUD DE COMPROBANTES Y RECIBOS DEL USO DEL ANTICIPO PRESUPUESTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
28/03/2025	CIPZ-078-189-2024	COMPROMISOS MESA TECNICA RED DE MEDIA TENSION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
3/03/2025	EV-C358-23-288-24	3/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD MEMORIAS DE CALCULO
3/03/2025	EV-C358-23-290-24	3/02/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-0153- 2025 / MANTENIMIENTO VIAS PROVISIONALES.
4/03/2025	EV-C358-23-291-24	4/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración Solicitud de detalles constructivos de los equipos de aire acondicionado - Oficio EV-C358-23- 0270-25
4/03/2025	N.A	4/03/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	MESA TECNICA MINISTERIO DE SALUD
4/03/2025	EV-C358-23-292-24	4/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS SG-SST
5/03/2025	N.A	5/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
5/03/2025	EV-C358-23-289-24	5/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Reubicación de redes eléctricas y de datos instaladas a una altura inferior a 4.20 metros en la zona del parqueadero frontal.
6/03/2025	EV-C358-23-295-24	6/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Programacion de actividad de bacheo en la via de acceso a la obra- zona de ingreso al parqueadero posterior el hospital universitario san jose
7/03/2025	EV-C358-23-297-24	7/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Informacion de fundicion
7/03/2025	EV-C358-23-0298-25	7/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
8/03/2025	EV-C358-23-0299-25	8/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Uso de red de media tensión aérea en predios del HUSJ para conexionarme del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

8/03/2025	EV-C358-23-0300-25	8/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Liberación del piso No. 1 para inicio de instalación de redes Hidrosanitarias.
14/03/2025	N.A	14/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al Oficio EV-C358-23-0299-25 sobre Uso de Red de Media Tensión en Predios del HUSJ
17/03/2025	EV-C358-23-0302-25	17/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-0152-2025 REMISION OFICIO SUPERVISION 18 FEBRERO Y SOLICITUD DE INFORMACION
17/03/2025	EV-C358-23-0304-25	17/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficios con radicado CIPZ-078-0168-2025 del 05 de marzo de 2025 y CIPZ-078-0177-2025 del 15 de marzo de
18/03/2024	EV-C358-23-0303-25	18/03/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Observaciones a los Diseños Eléctricos del Hospital San José de Popayán.
12/03/2024	EV-C358-23-0306-25	12/03/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de prorrogas al contrato N°358 2023
14/03/2024	EV-C358-23-0307-25	14/03/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Acta parcial de obra N°1 Consorcio Evolet - Periodo 22/03/2024 al 14/03/2025
17/03/2025	N.A	17/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Presunto incumplimiento
20/03/2025	EV-C358-23-308-25	20/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión soporte de consignación de rendimientos financieros correspondientes al mes de febrero 2025.
20/03/2025	EV-C358-23-0309-25	20/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de informe No. 4 de fiducia.
21/03/2025	EV-C358-23-0311-25	21/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
21/03/2025	EV-C358-23-0310-25	21/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Informacion de fundicion

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

22/03/2025	EV-C358-23-0310-25	22/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Actividad mejoramiento de vía de acceso a la obra.
25/03/2025	N.A	25/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de explicacion sobre la cancelacion de la fundicion de concretos previstas para hoy y reprogramacion de la misma
25/03/2025	EV-C358-23-0315-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración Oficio No. EV-C358-23-0299-25 y solicitud punto de conexión eléctrico.
25/03/2025	EV-C358-23-0314-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Actividad de fundición de columnas y pantallas piso No. 3.
25/03/2025	EV-C358-23-0312-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA	Cancelación de fundición de losa de entrepiso No. 3.
25/03/2025	EV-C358-23-313-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME MENSUAL No. 13 - PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025.
25/03/2025	N.A	25/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE COMPROBANTES Y RECIBOS DEL USO DEL ANTICIPO PRESUPUESTAL
26/03/2025	EV-C358-23-0319-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD	REPORTE PERSONAL OBRA
26/03/2025	EV-C358-23-0320-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de losa de entrepiso No. 3.
26/03/2025	EV-C358-23-0321-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
26/03/2025	EV-C358-23-0322-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-0160-2025
25/03/2025	EV-C358-23-0318-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud autorización inicio de actividad de mampostería

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

27/03/2025	EV-C358-23-0323-25	27/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
28/03/2025	EV-C358-23-0324-25	28/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
31/03/2025	EV-C358-23-0326-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
31/03/2025	EV-C358-23-0327-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA
31/03/2025	N.A	31/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE CONVOCATORIA A REUNION CON LOS INGENIEROS HUGO COSME Y GERMAN POLO
31/03/2025	EV-C358-23-0329-24	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0188- 2025 - solicitud de comprobantes y recibos del uso del anticipo presupuestal
31/03/2025	EV-C358-23-0330-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficio CIPZ-078-0181-2025
31/03/2025	EV-C358-23-0328-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-189-2025

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025, el contratista de obra terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso N +7.60 y la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso N+7.60.

El 27 de febrero se realizó el suministro e instalación de los concretos con resistencia mínima de 4000 psi, para las vigas y losa del entrepiso N+7.60, se controló que el

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

asentamiento fuera de 7 pulgadas mas o menos 1 pulgada, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.

Del 28 de febrero al 7 de marzo se realizó la verificación de la instalación de los aceros conforme a los diseños estructurales aprobados por curaduría, cumplieran en calibre, cantidad, longitud, posición y espaciamiento de las pantallas de entrepiso N+7.60 A N+11.00 PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, de las columnas C1, C2, C4, C5.

Se instaló y verificó la verticalidad y la localización y la escuadra de las formaletas de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW9, PW10, de las columnas C1, C2, C4, C5.

El 8 de marzo se realizó el suministro e instalación de los concretos autocompactantes con resistencia mínima de 400 psi para las pantallas del entrepiso N+7.60 A N+11.00, PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW9, PW10, las columnas del entrepiso N+7.60 A N+11.00, C1, C2, C4, C5, se realizaron ensayos de asentamiento, se tomaron muestras para ensayos de resistencia a la compresión de los concretos

Del 9 al 25 de marzo se realizó la instalación de formaleta para las vigas y losa del entrepiso N+11.00, se revisó que la losa y las vigas cumplieran con los niveles de diseño establecidos en los planos estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Del 9 al 25 de marzo se instaló el acero de refuerzo de las vigas y losa del entrepiso N+11.00 el cual fue revisado que cumpliera en calibre, cantidad, longitud, posición, espaciamiento de acuerdo con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

El 20 de marzo se completó el acero de refuerzo de las columnas del entrepiso N+7.60 a N+11.00, C3, C6, C7, C8, C9, C10. Los cuales fueron verificados en calibre, cantidad,

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

longitud, posición, espaciamiento de acuerdo con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

El 21 de marzo se realizó el suministro e instalación de concreto autocompactante de resistencia mínima 4000 psi, se realizaron ensayos de control de asentamiento, se tomaron muestras para ensayos de resistencia a la compresión, de la pantalla PW8, y de las columnas C3, C6, C7, C8, C9, C10 del entrepiso N+7.60 a N+11.00.

Tomaron muestras de concreto para resistencias a la compresión de cada jornada de fundiciones.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N 7.60 A N +11.50

- COLUMNA C1**

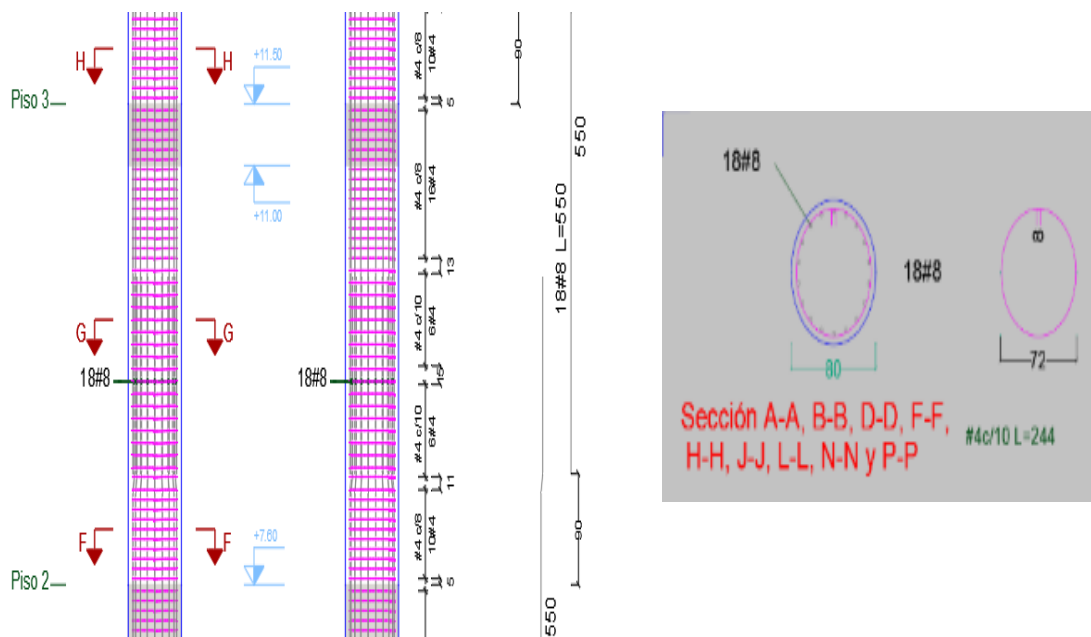


Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"



Documento
Versión 1

The drawing illustrates the reinforcement details for a reinforced concrete column. The longitudinal section on the left shows the column's height between floors 'Piso 2' and 'Piso 3'. It includes load points F, G, and H, and reinforcement details for 10#7 and 10#6 bars. The cross-sectional view on the right shows a square column with 10#7 bars at the corners and 10#6 bars in the middle. Dimensions include a total height of 530 and a section length of 490.

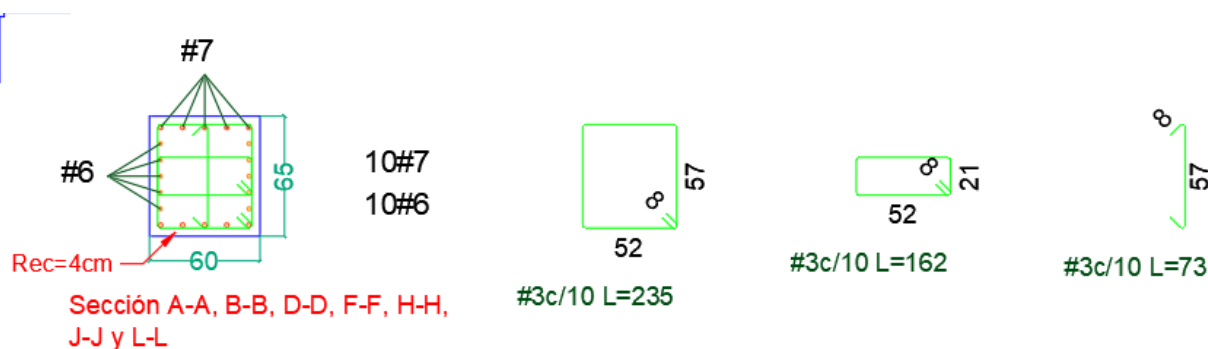


Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

• COLUMNA C3


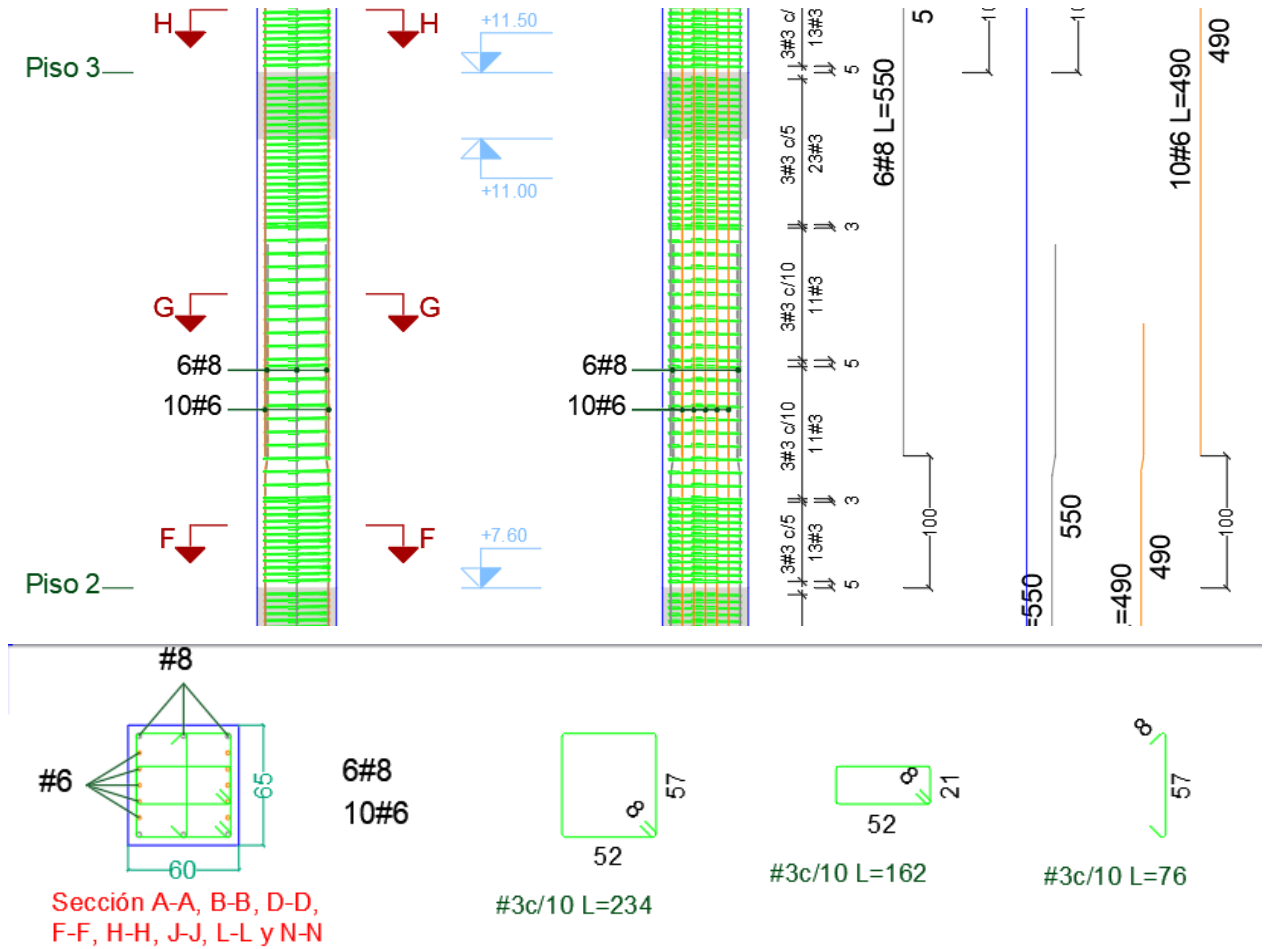


Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	CONSORCIO INTERSAUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- COLUMNA C6 , C7 y C8

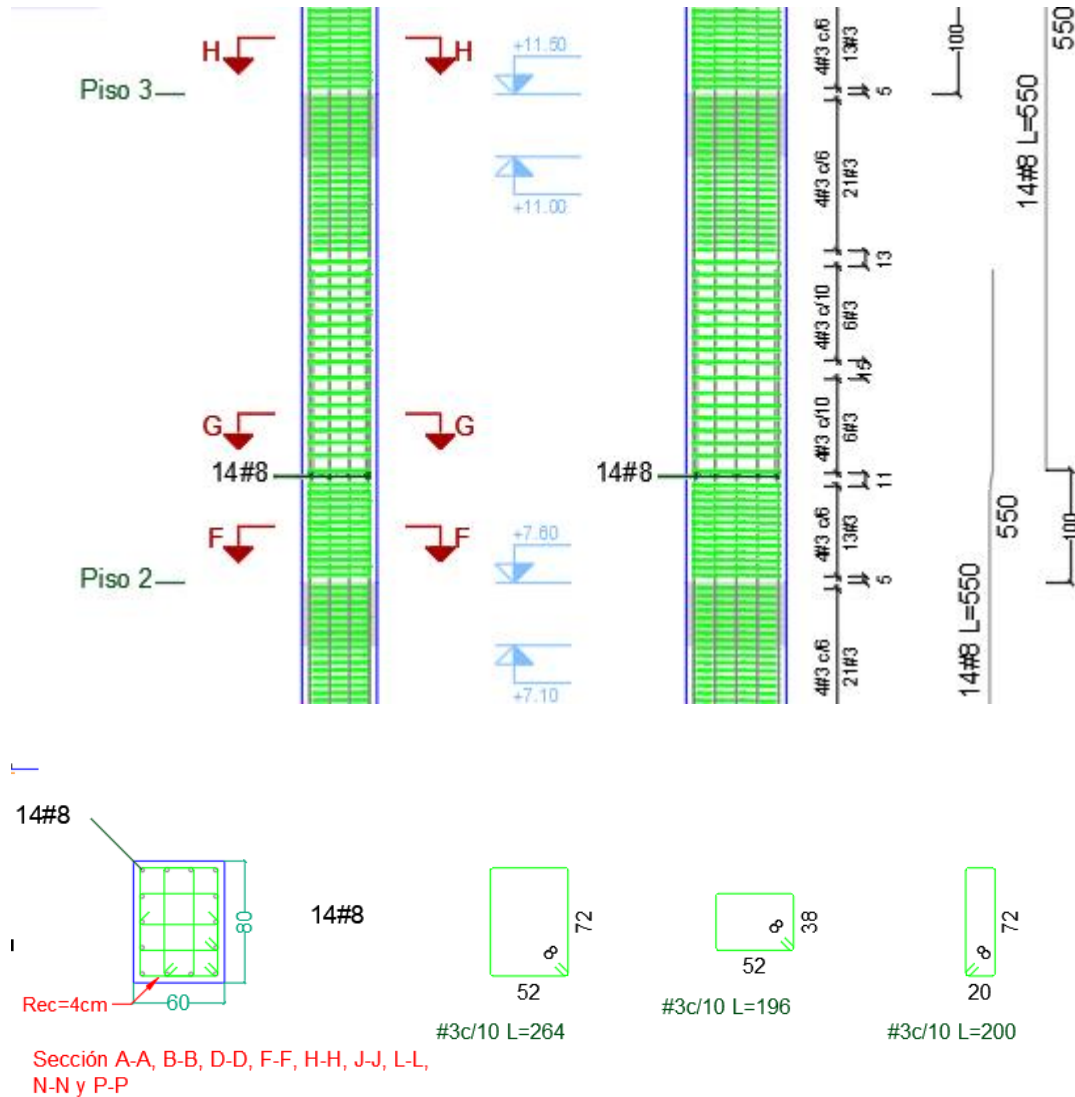

#8

Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.



Documento
Versión 1

[illegible]

Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW1

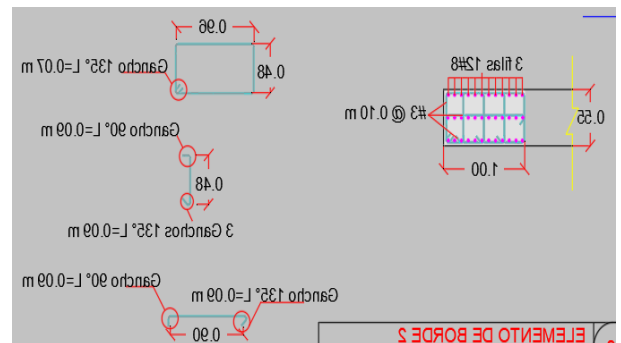
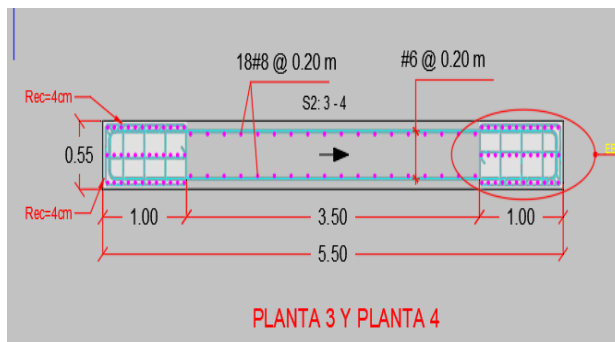


Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW2


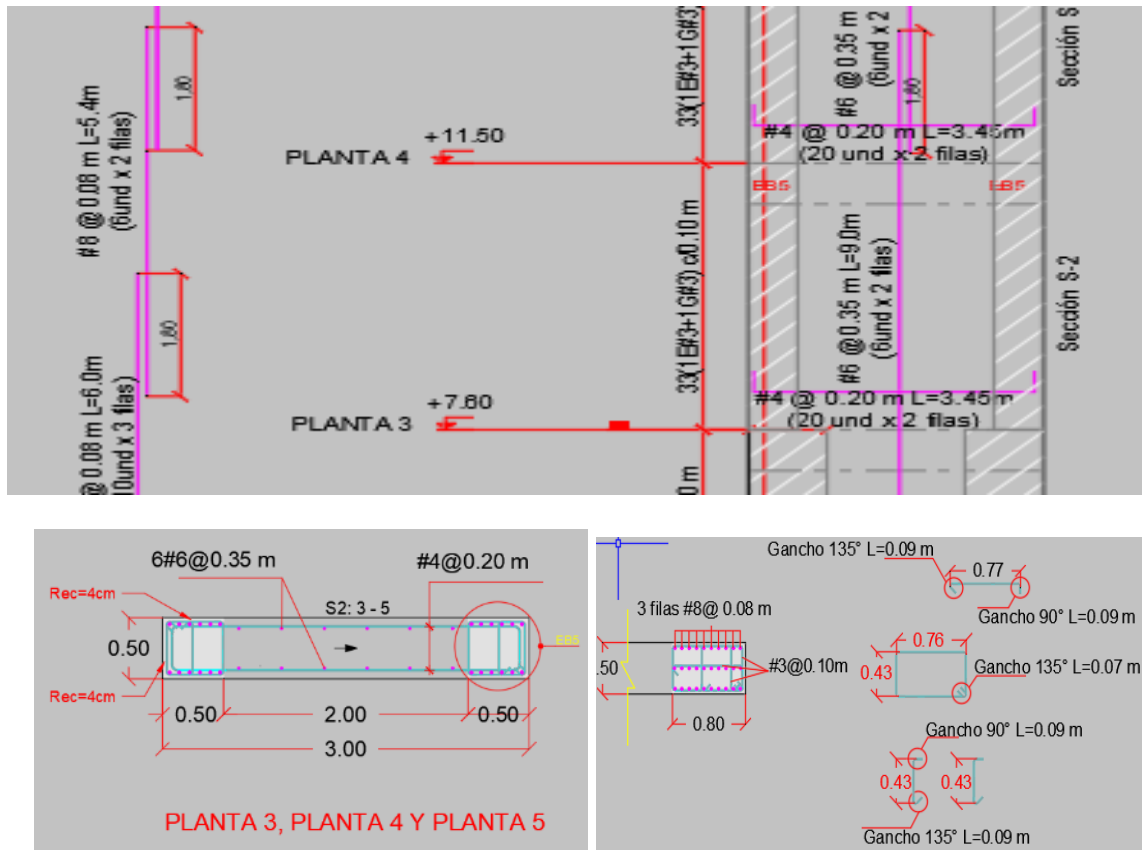


Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

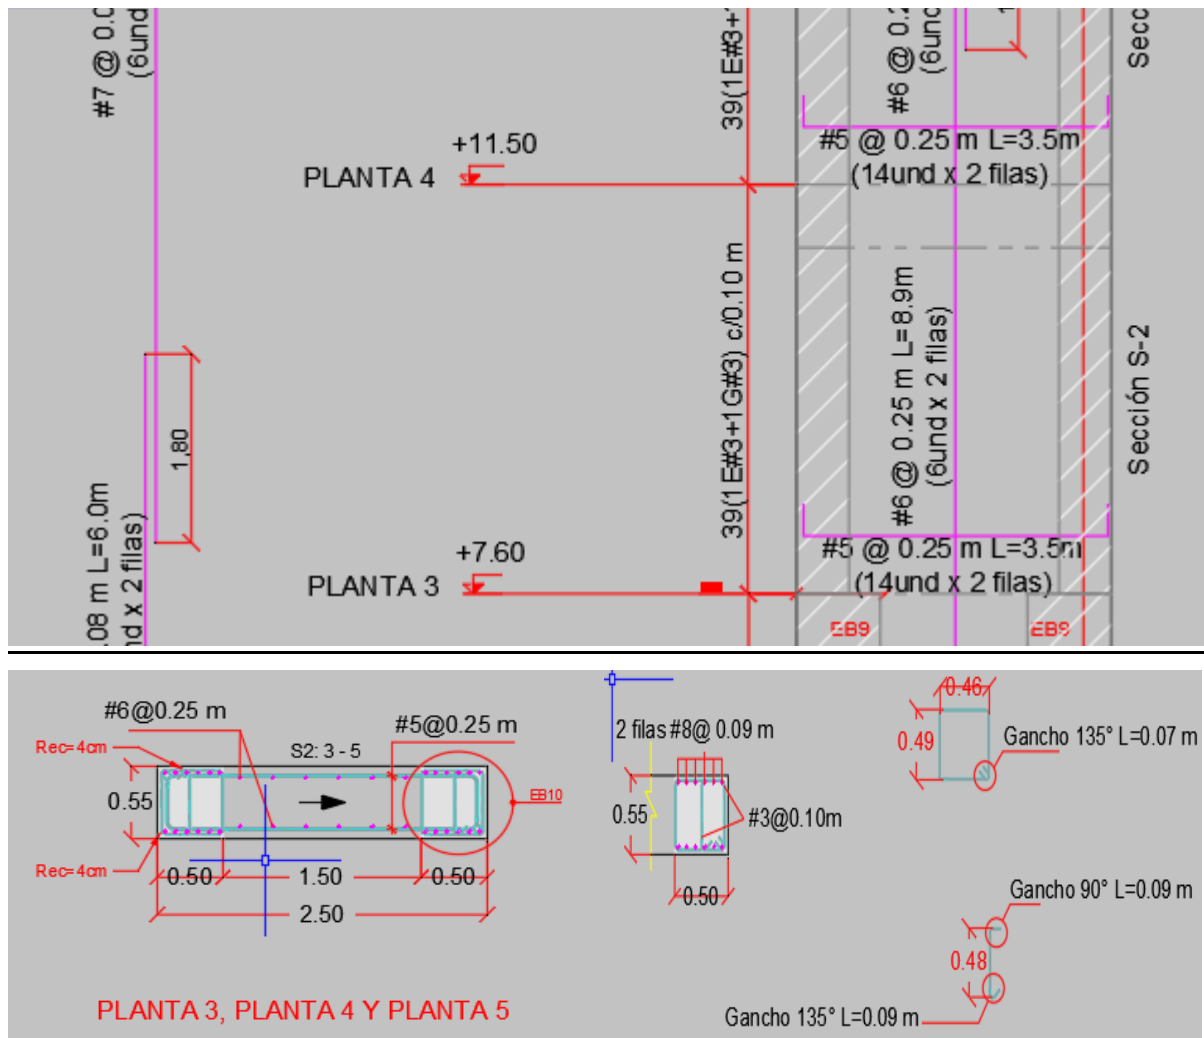

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW4**

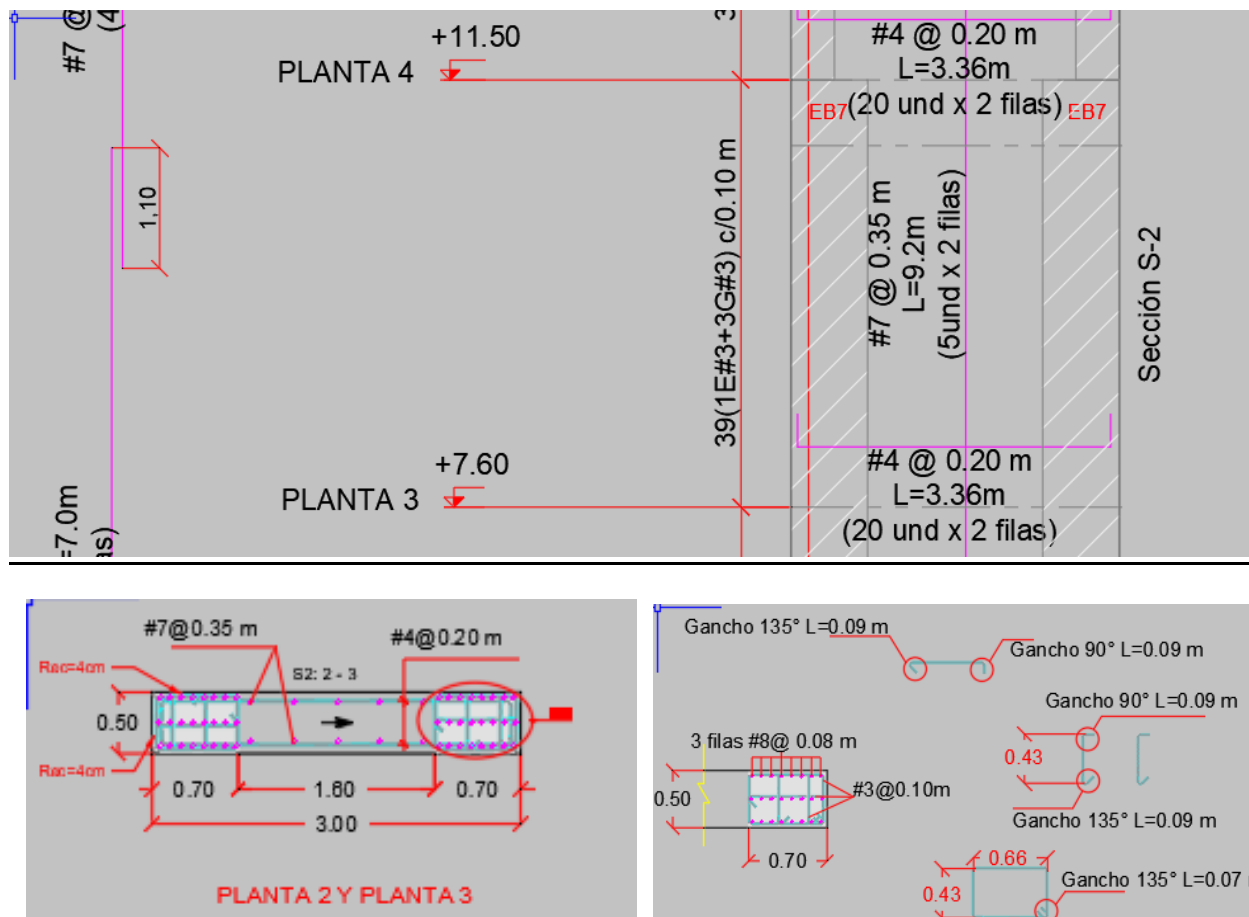


Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW5

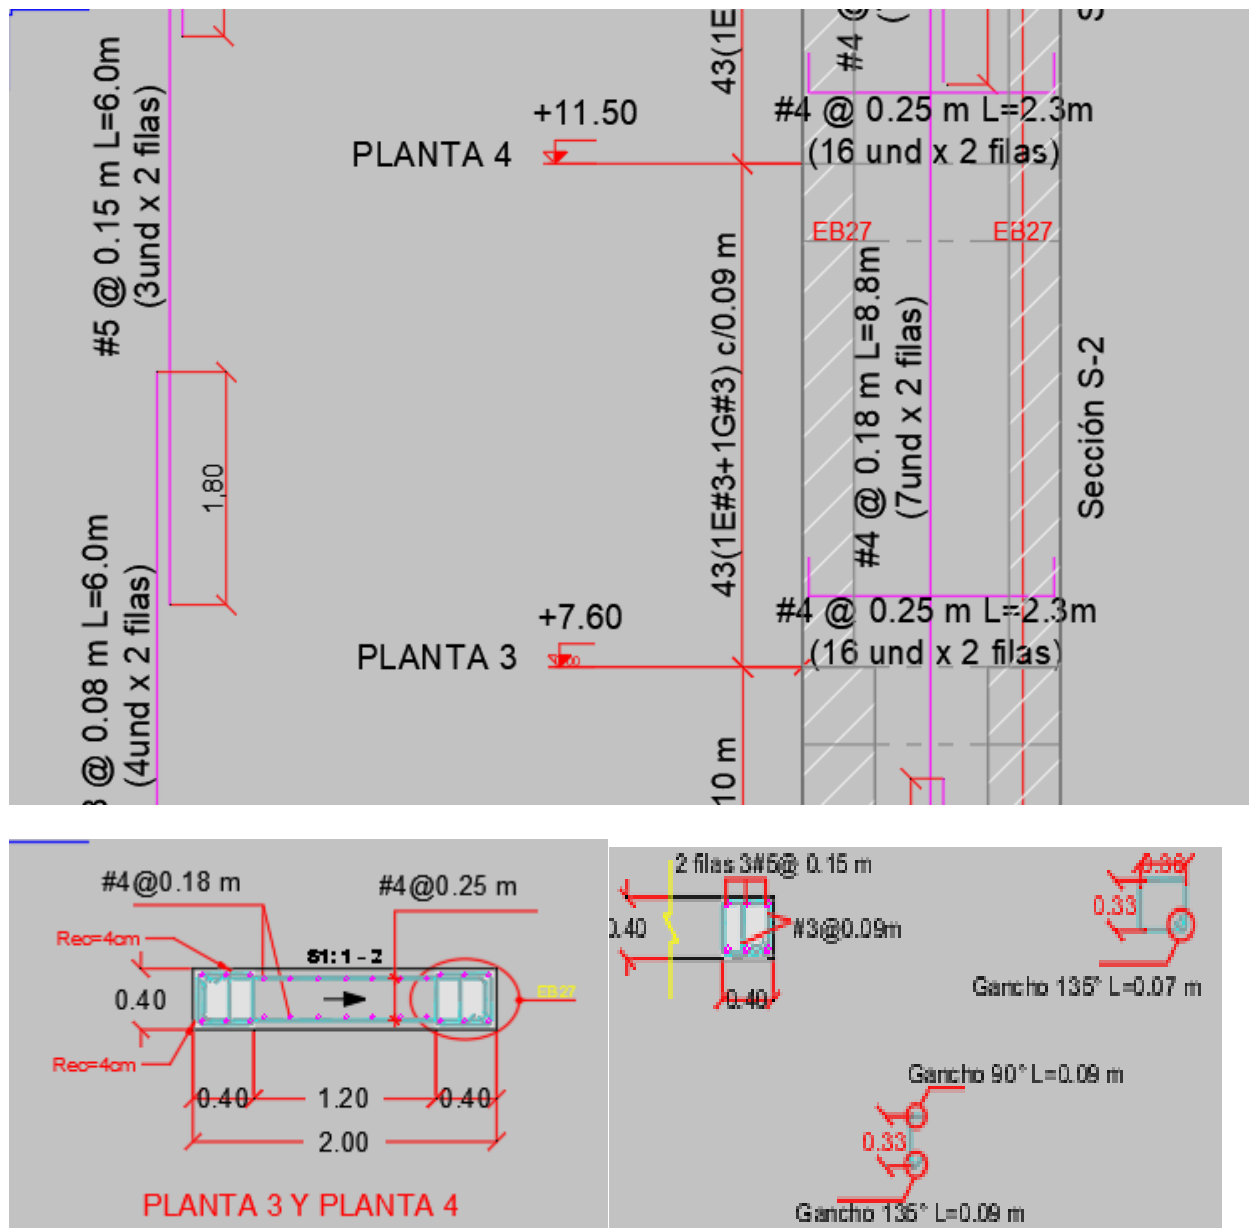


Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW6

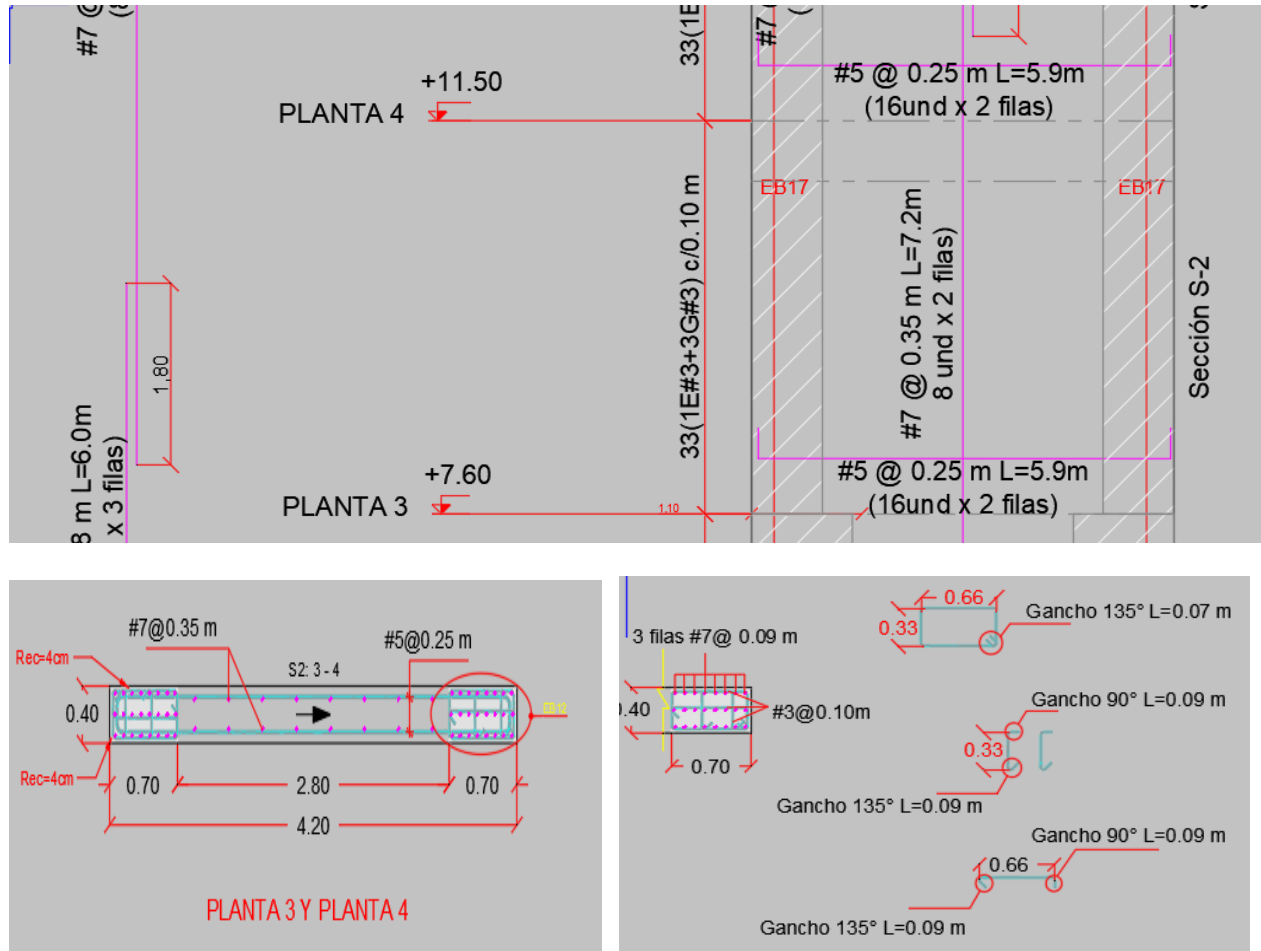


Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW7

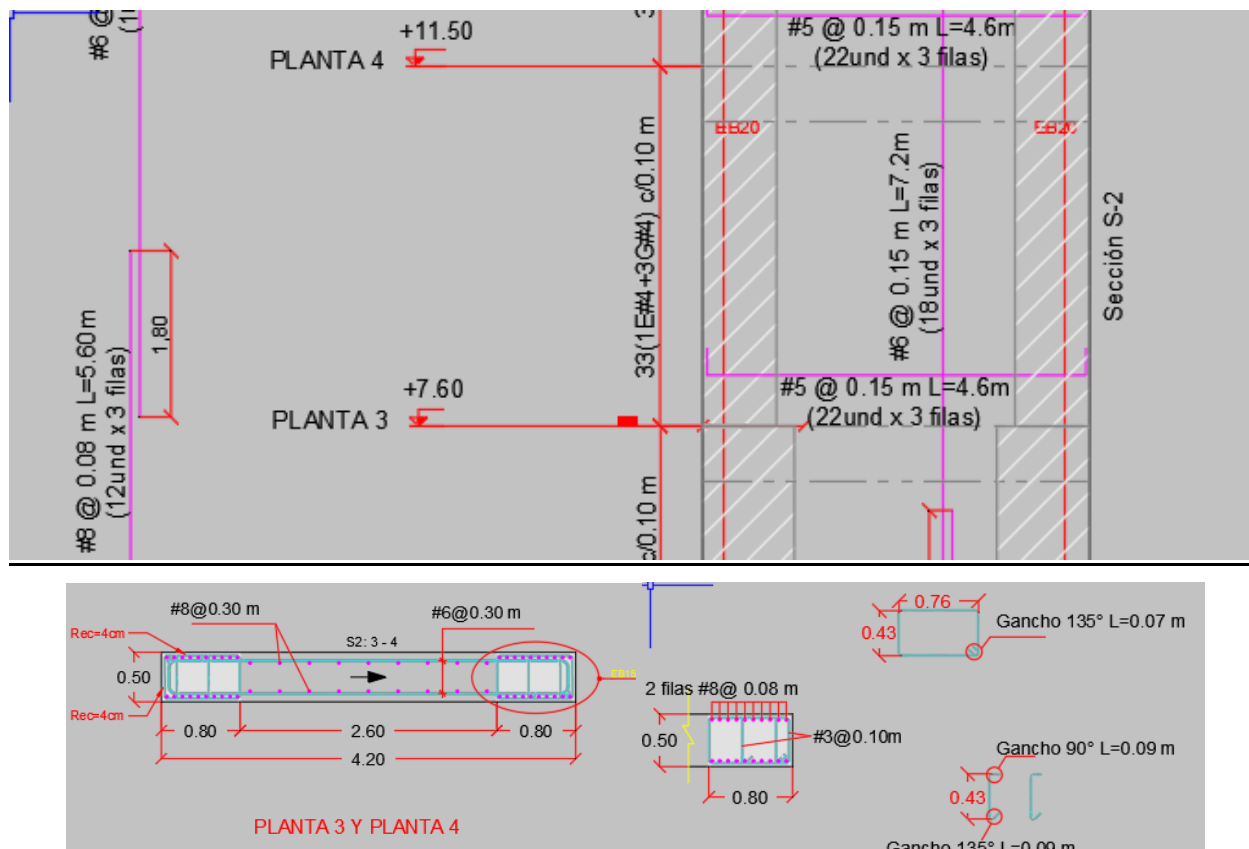


Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW8

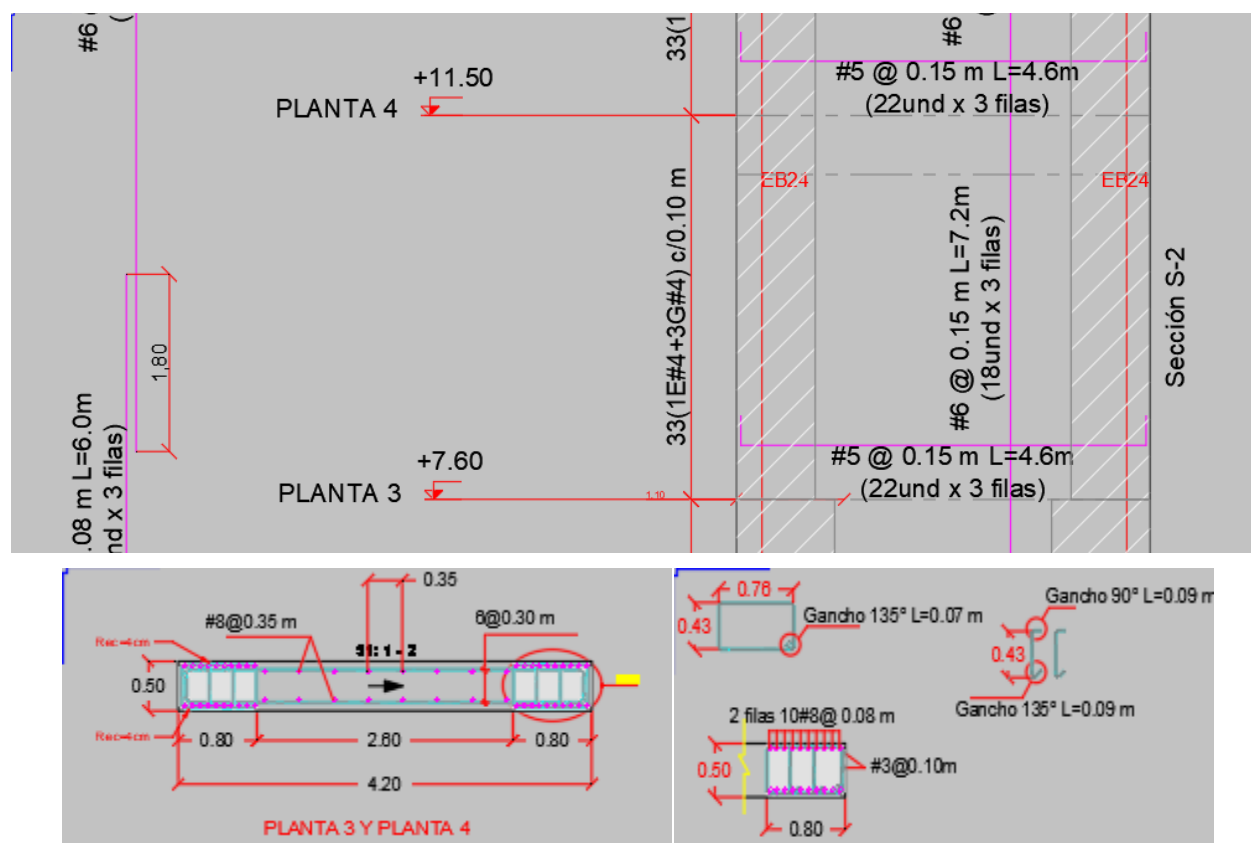


Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW9**

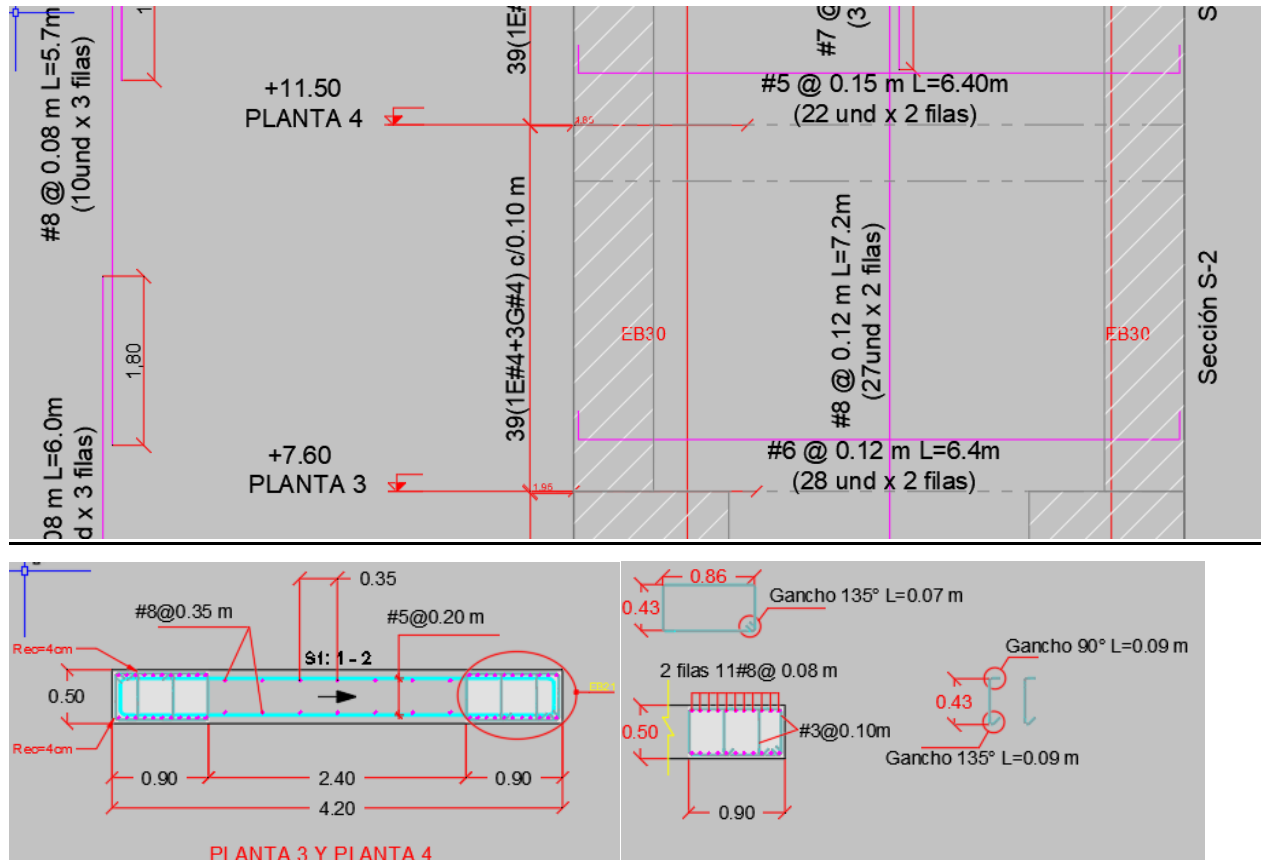


Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- PANTALLA PW10

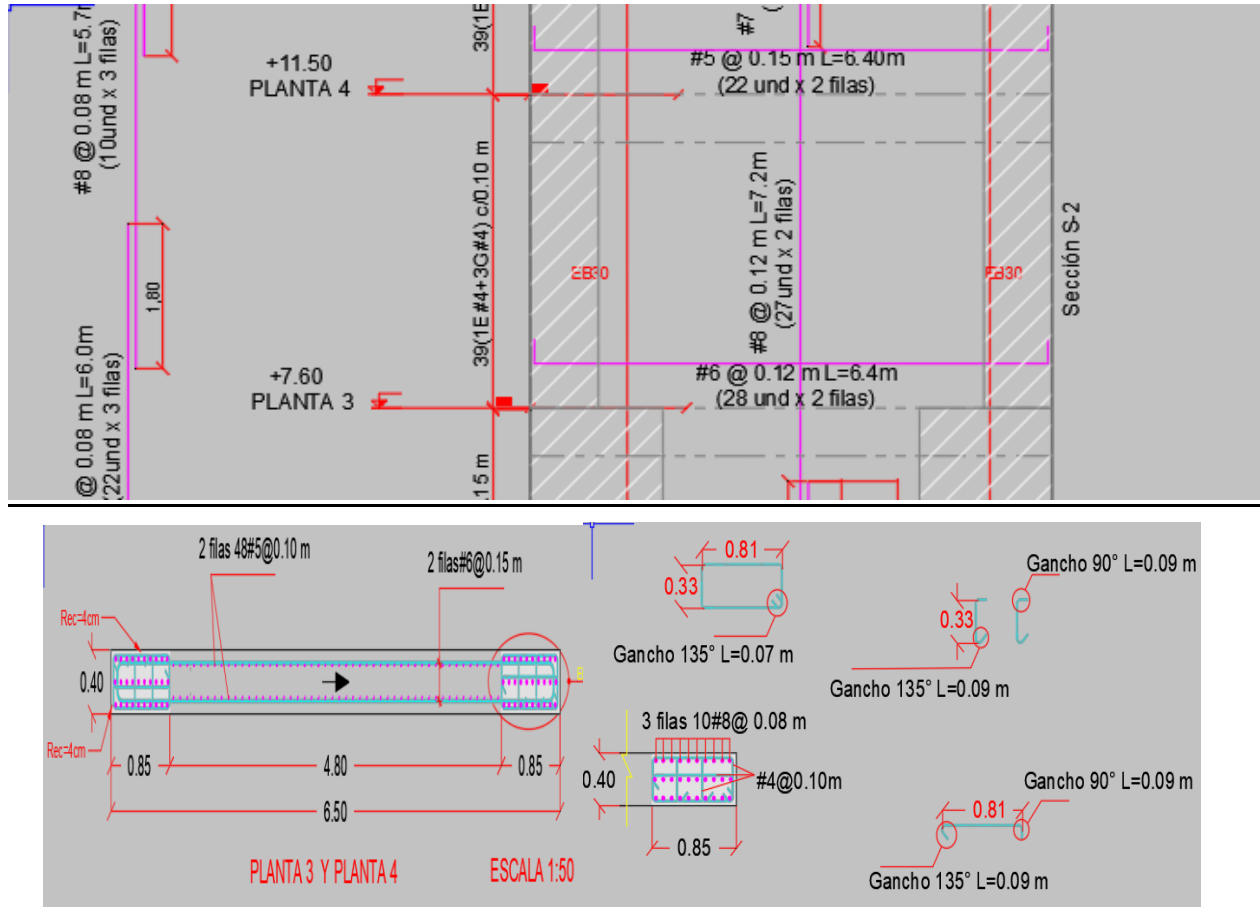


Ilustración 17. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +11.50

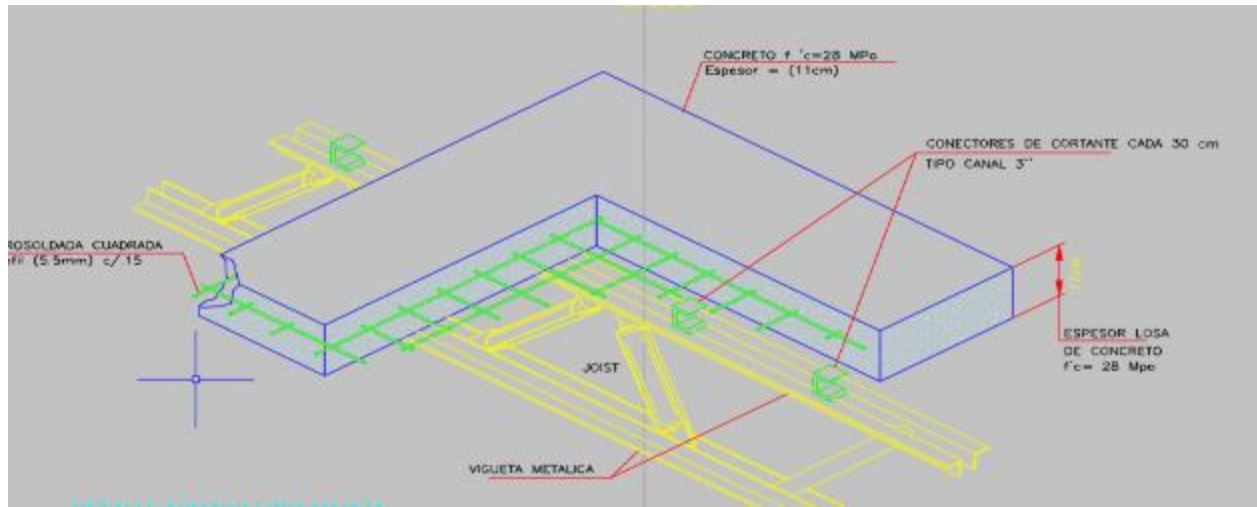

RESUMEN DE LA LOSA	
ITEM	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR DE LA LOSA (cm)	11.0
Malla de retracción para la placa: Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 -Doble	

Ilustración 18. Detalle losa de entrepiso

DETALLE VIGA TEC VT 01 ENTREPISO N +11.50

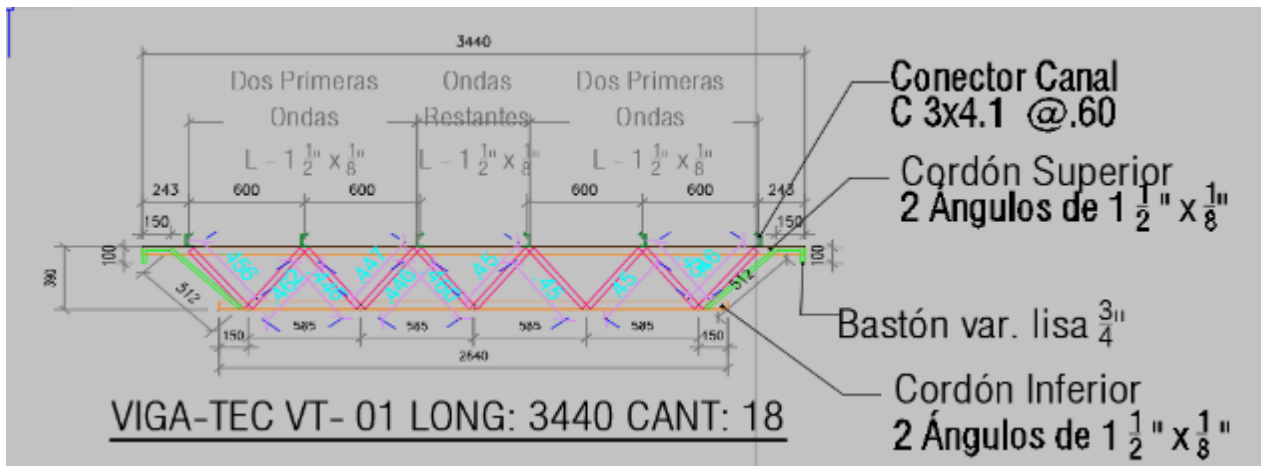


Ilustración 19. Detalle joist VT 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO N +11.50

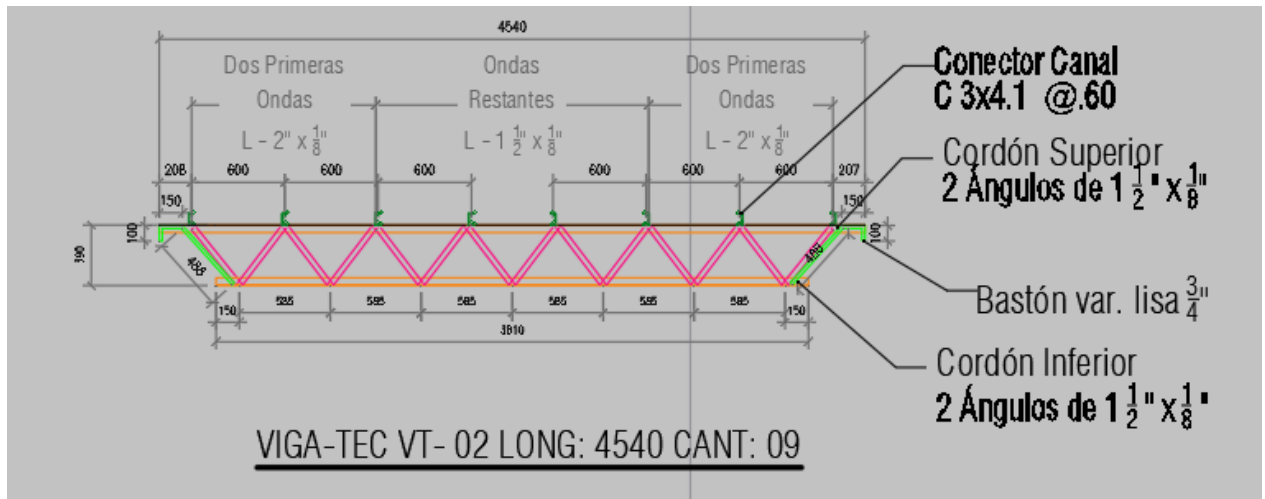


Ilustración 20. Detalle joist VT 02.

DETALLE VIGA TEC VT 03 ENTREPISO N +11.50

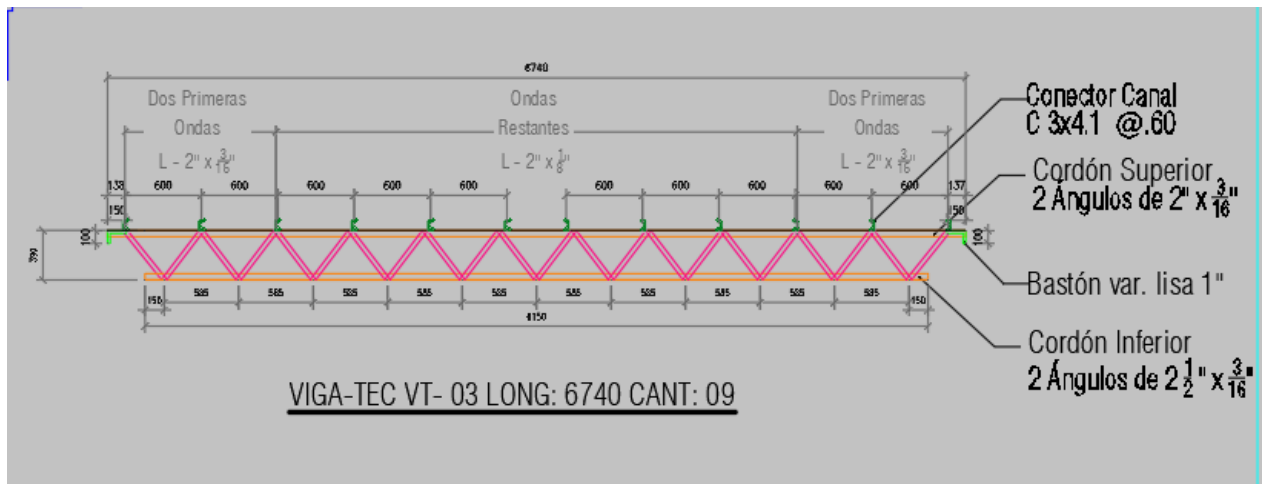


Ilustración 21. Detalle joist VT 03.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”



Ilustración 23. Detalle joist VT 05.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO N +11.50

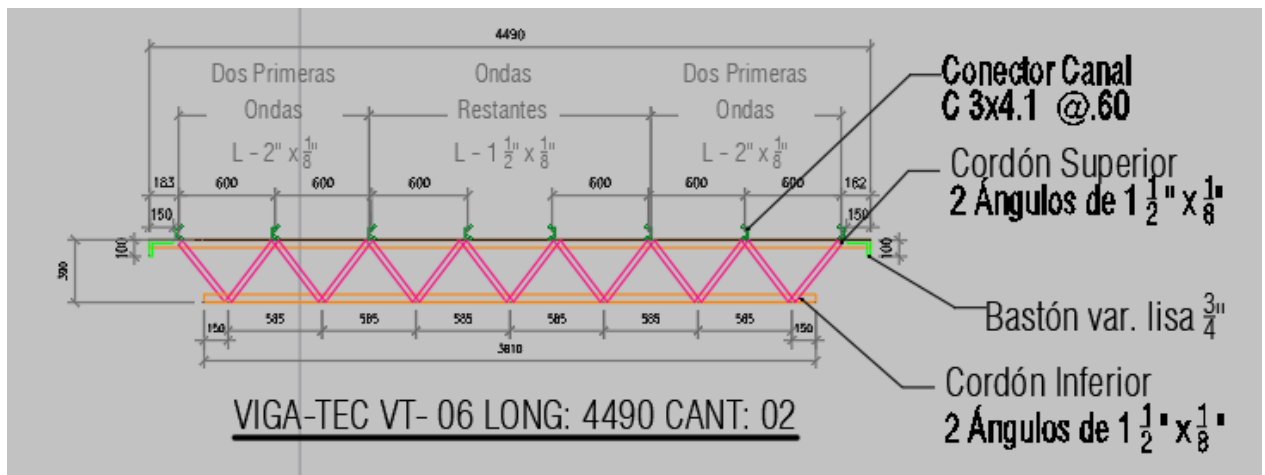


Ilustración 24. Detalle joist VT 06.

DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO N +11.50

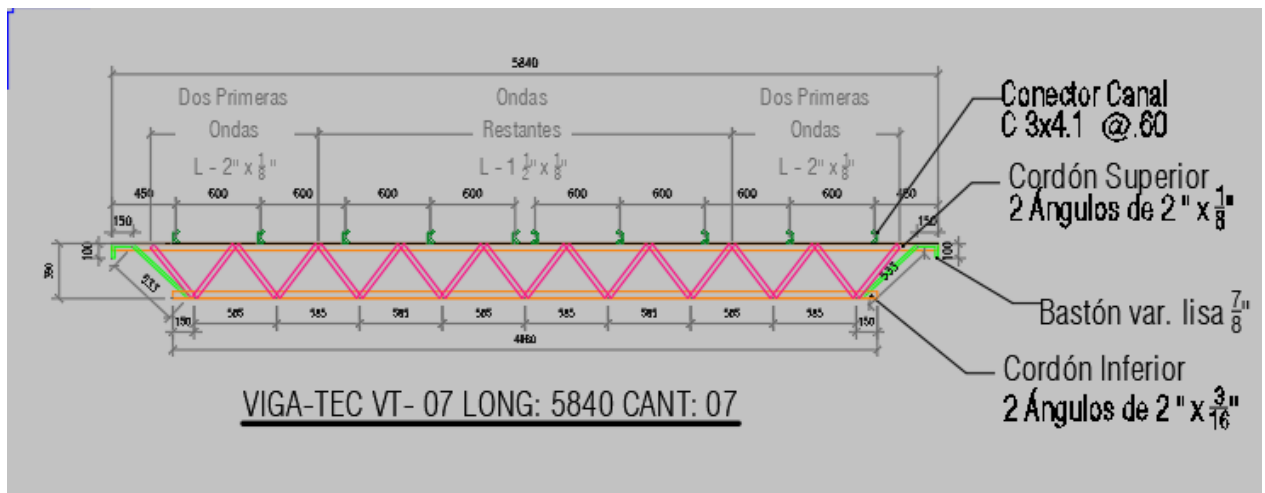


Ilustración 25. Detalle joist VT 07.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO N +11.50

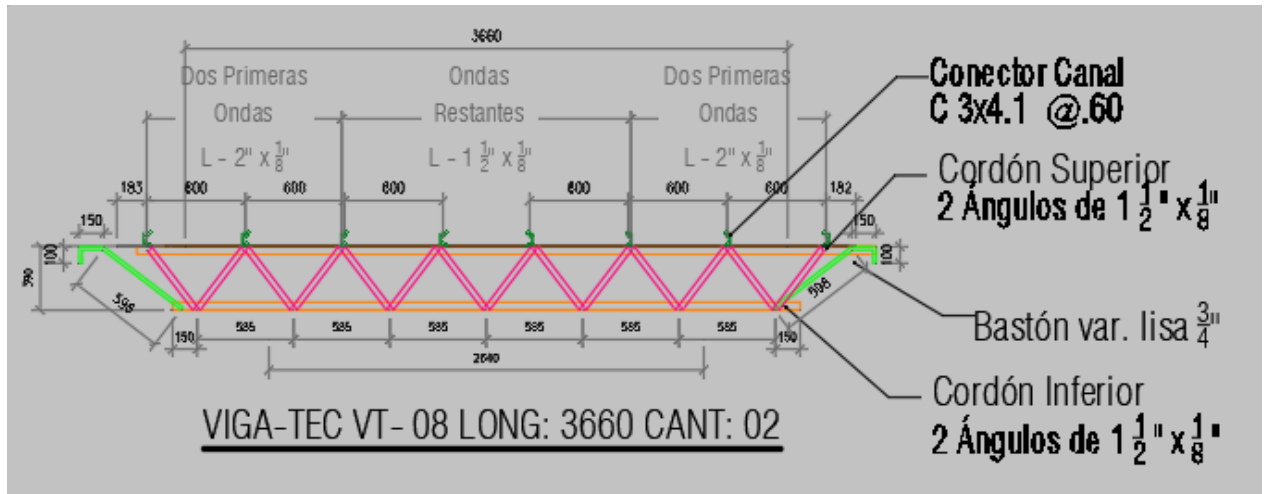


Ilustración 26. Detalle joist VT 08

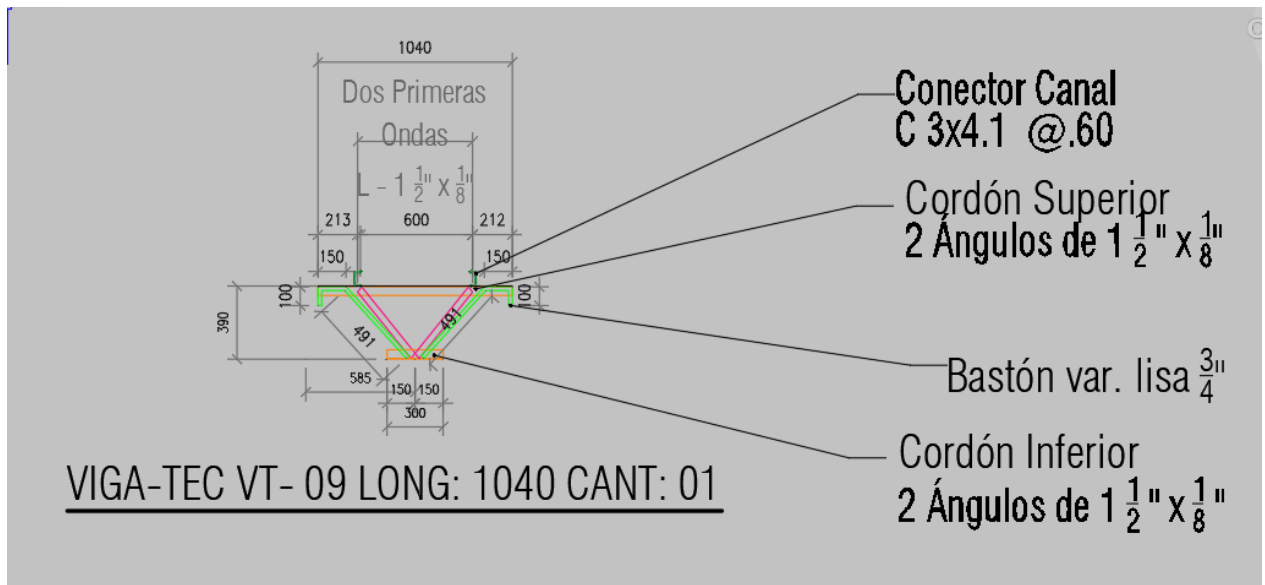


Ilustración 27. Detalle joist VT 09

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

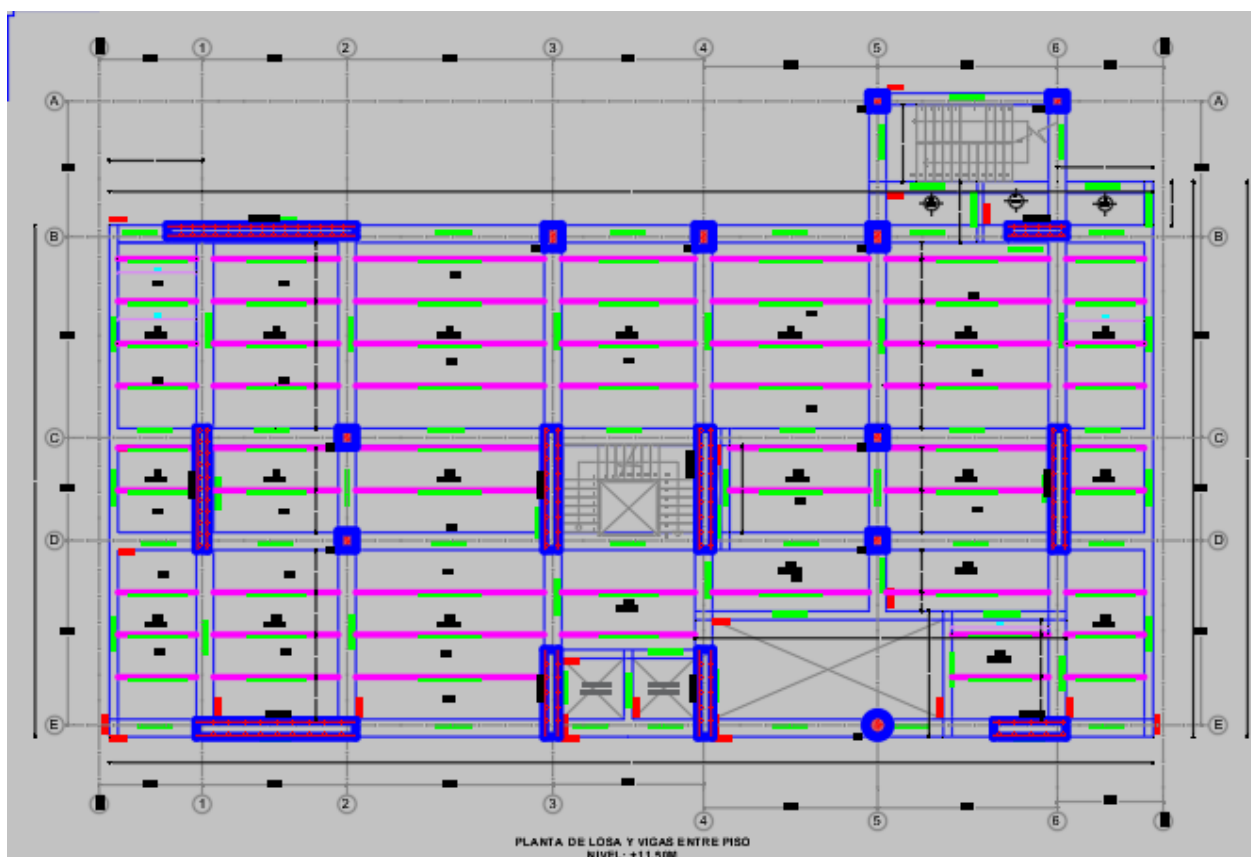


Ilustración 28. Disposición de vigas joist

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

DETALLE VIGAS ENTREPISO N +11.50

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6) N +11.50

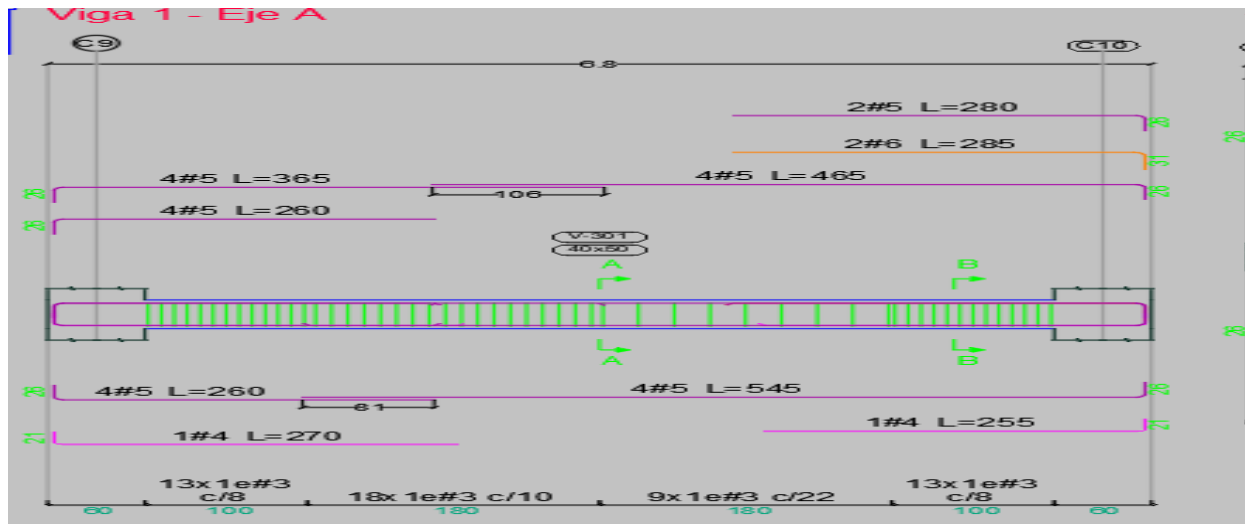


Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A N +11.50.

- DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6) N +11.50

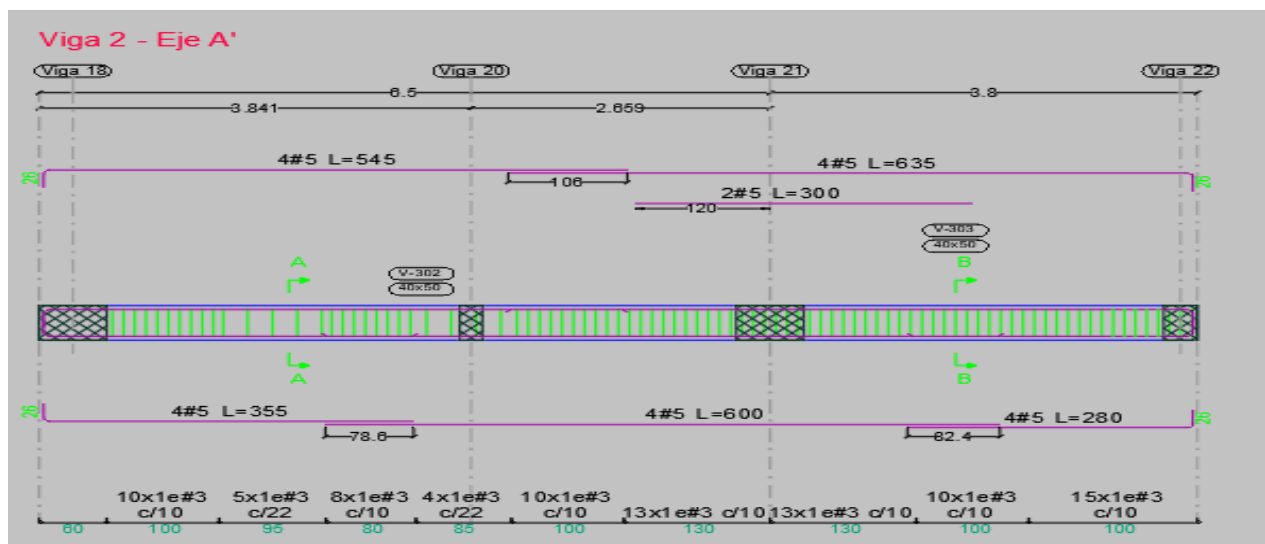


Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A' N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6') N +11.50

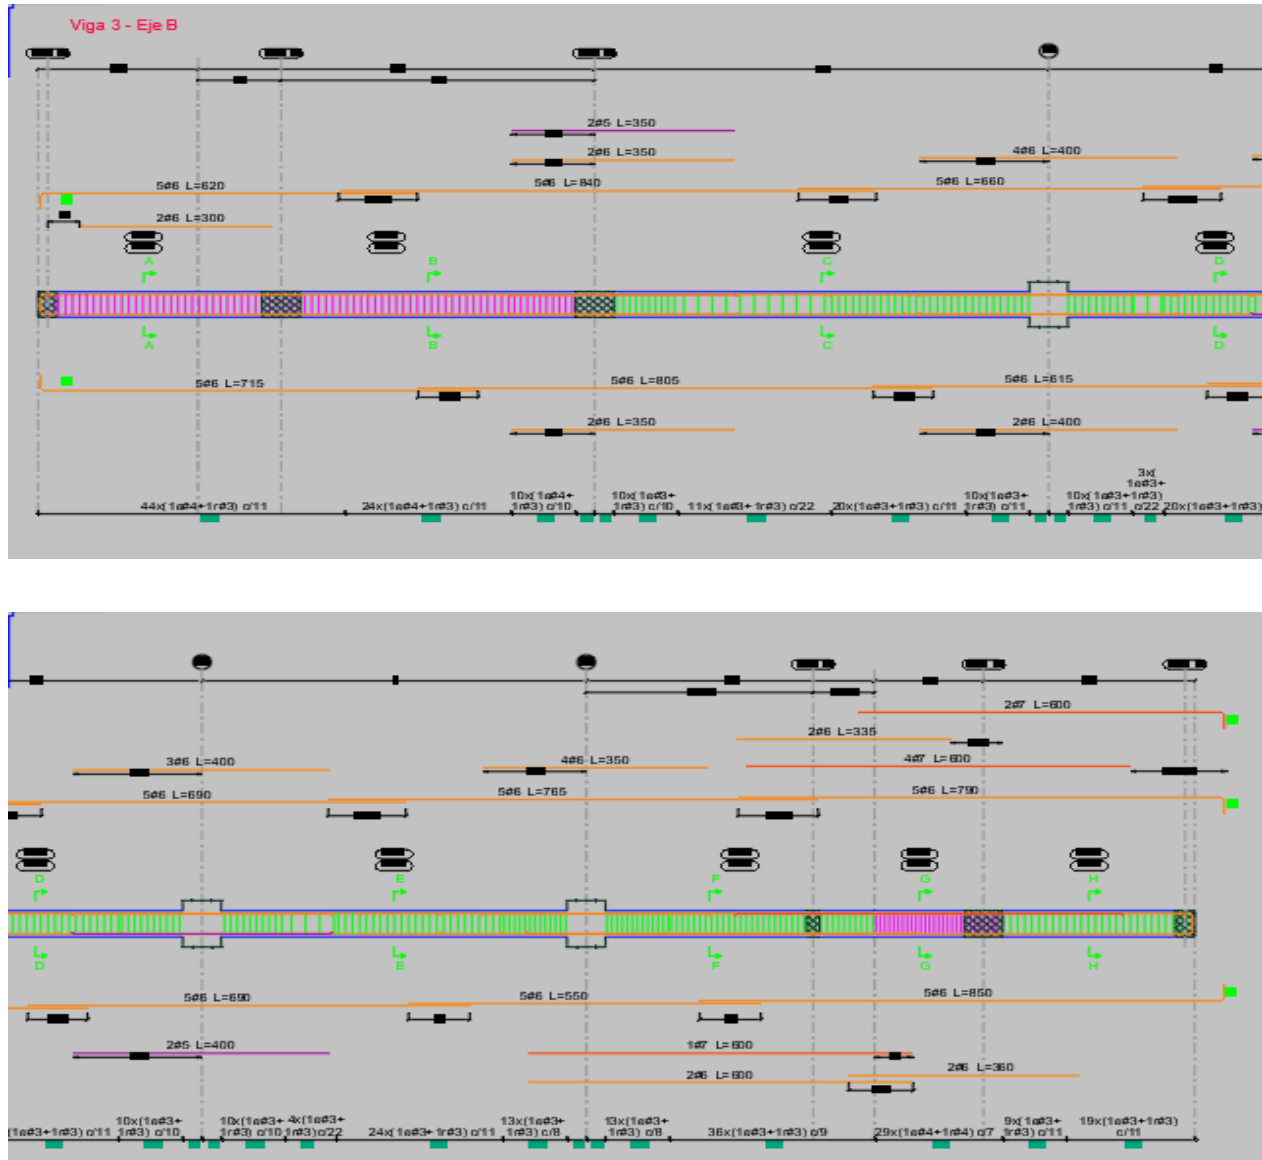


Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga B N +11.50.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1' -6') N +11.50

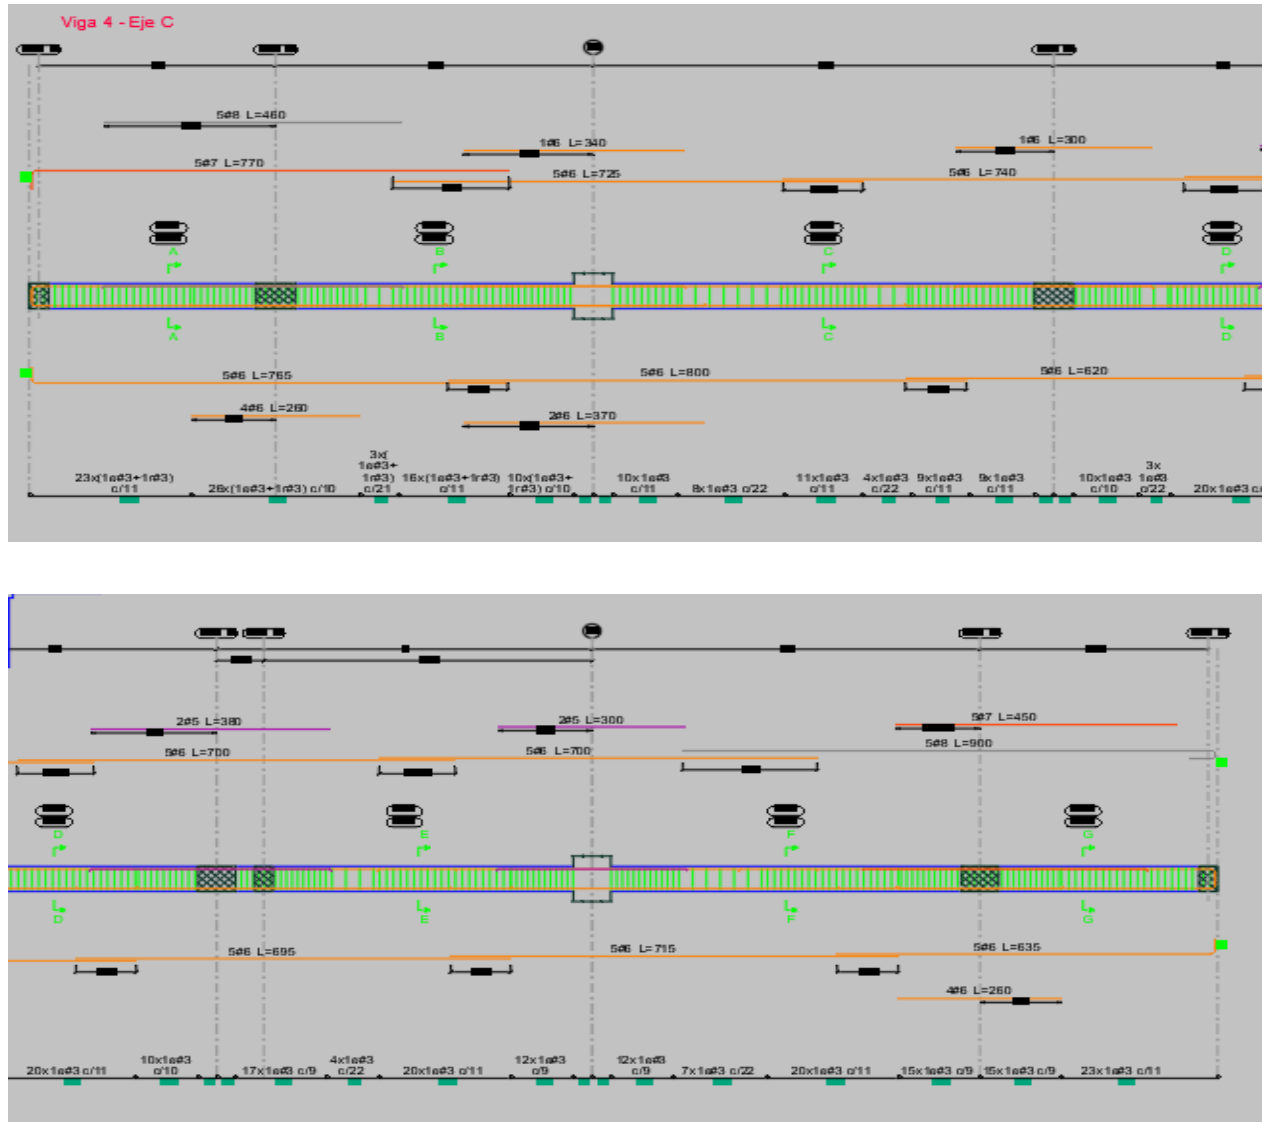


Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga C N +11.50.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA D (1' - 2) N +11.50

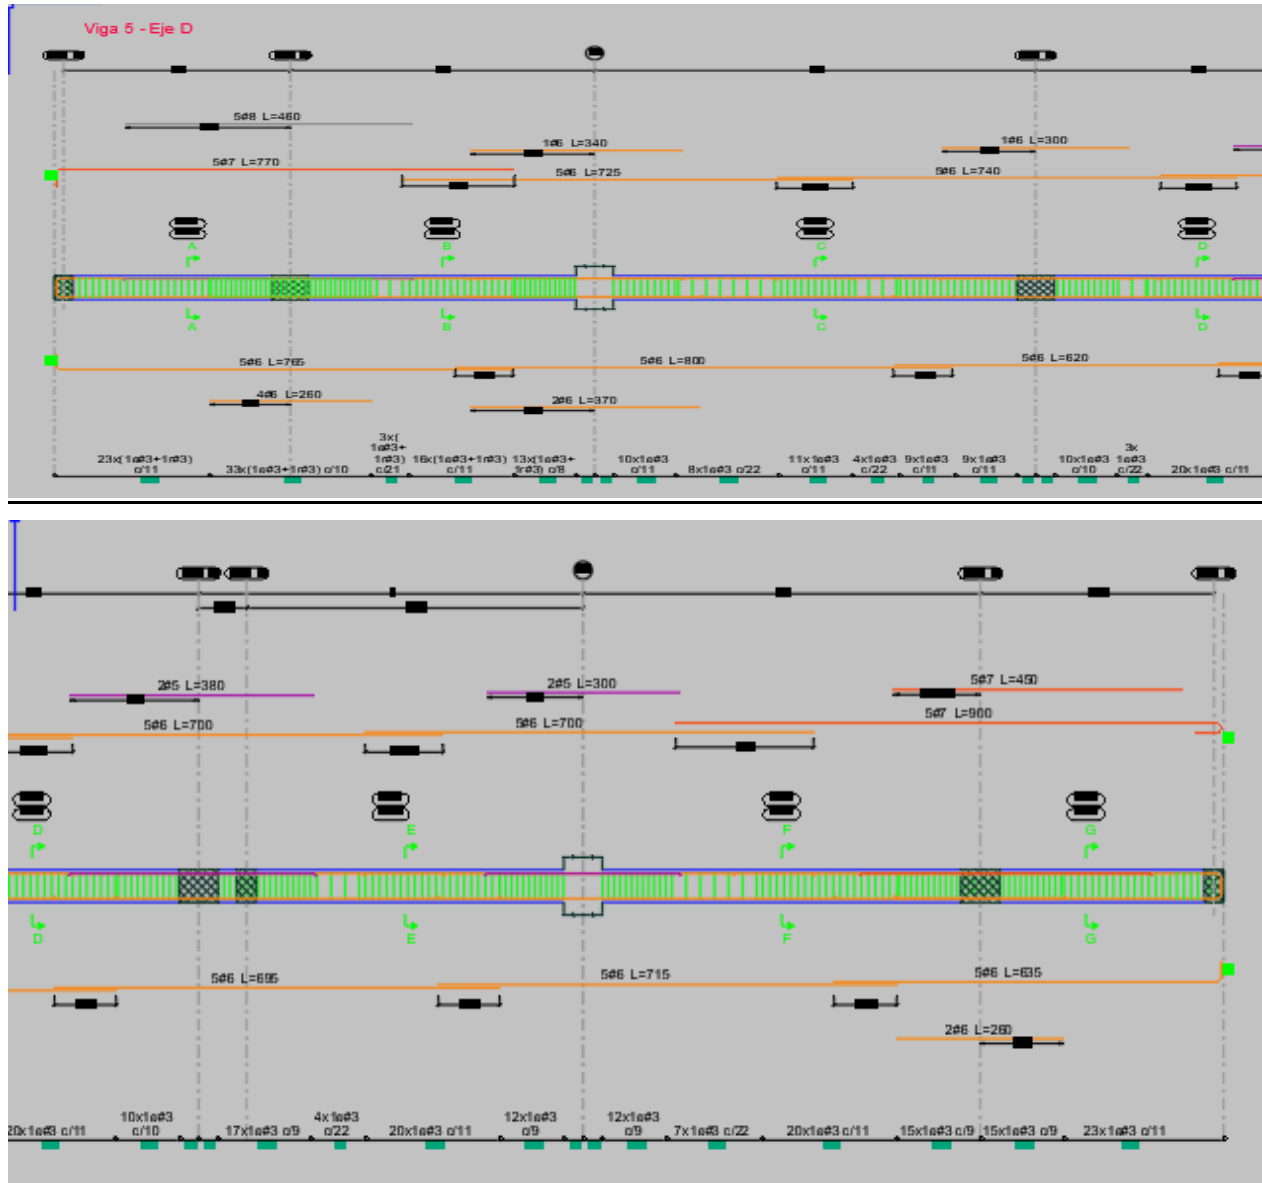


Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	CONSORCIO INTER-SALUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6') N +11.50


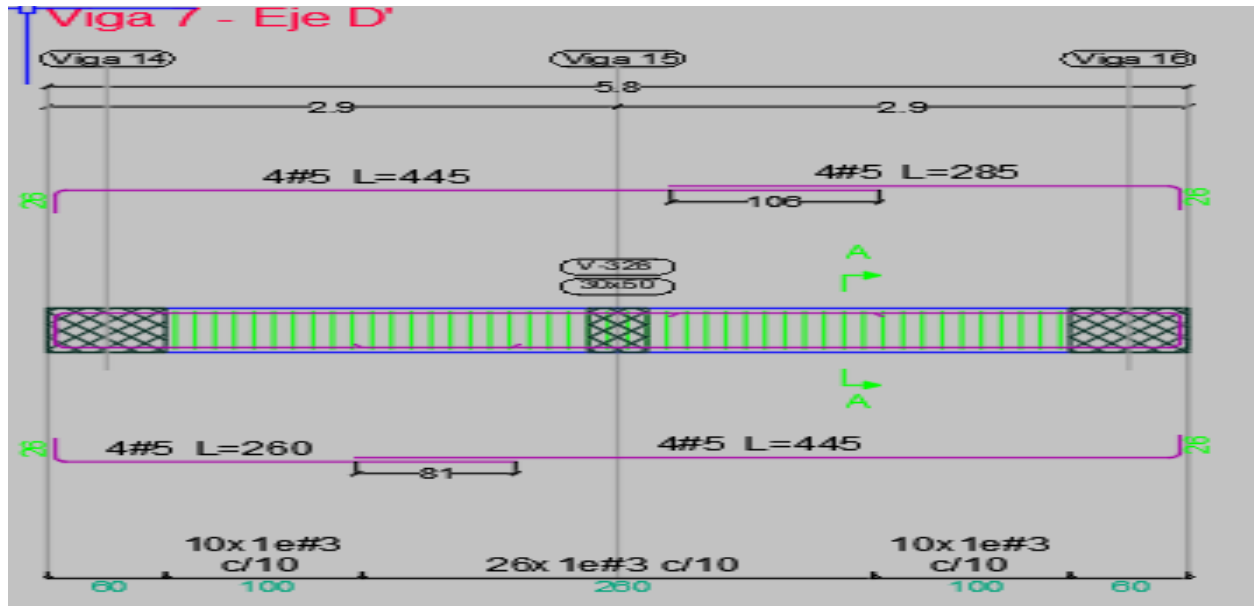


Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +11.50.

- DETALLE REFUERZO VIGA E (1' - 6') N +11.50

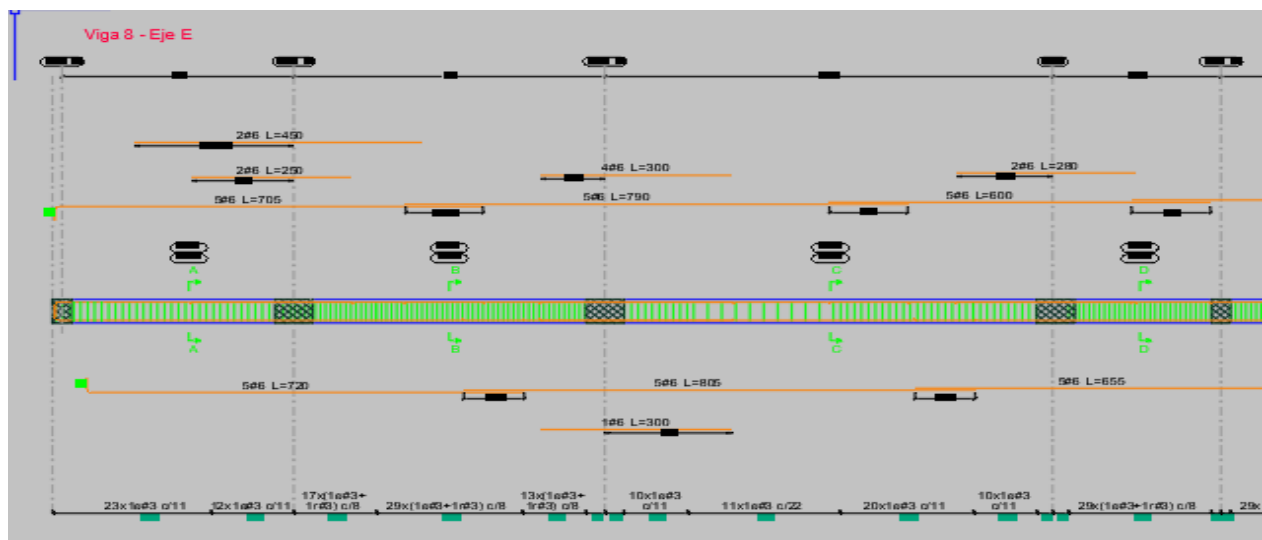

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

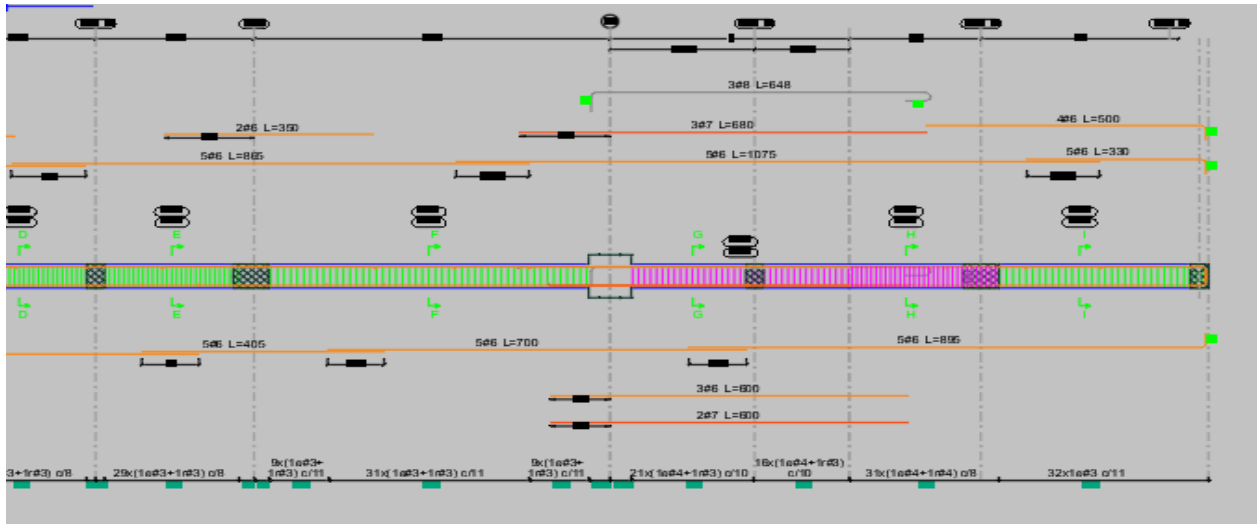


Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +11.50

• DETALLE REFUERZO VIGA 1' (B-E) N +11.50

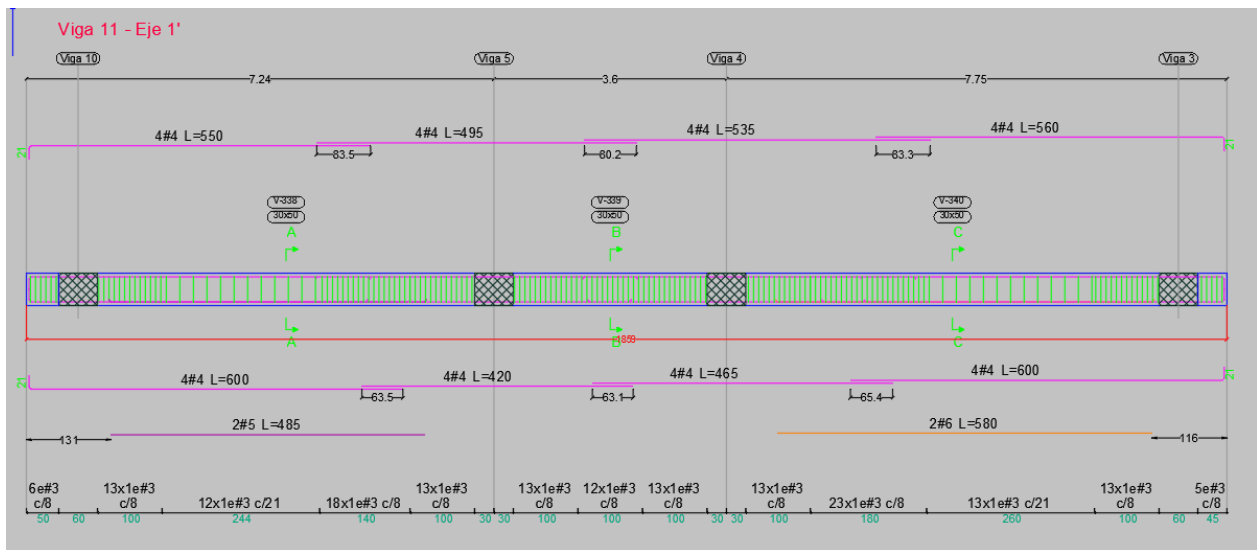


Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1' (B-E) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E) N +11.50**

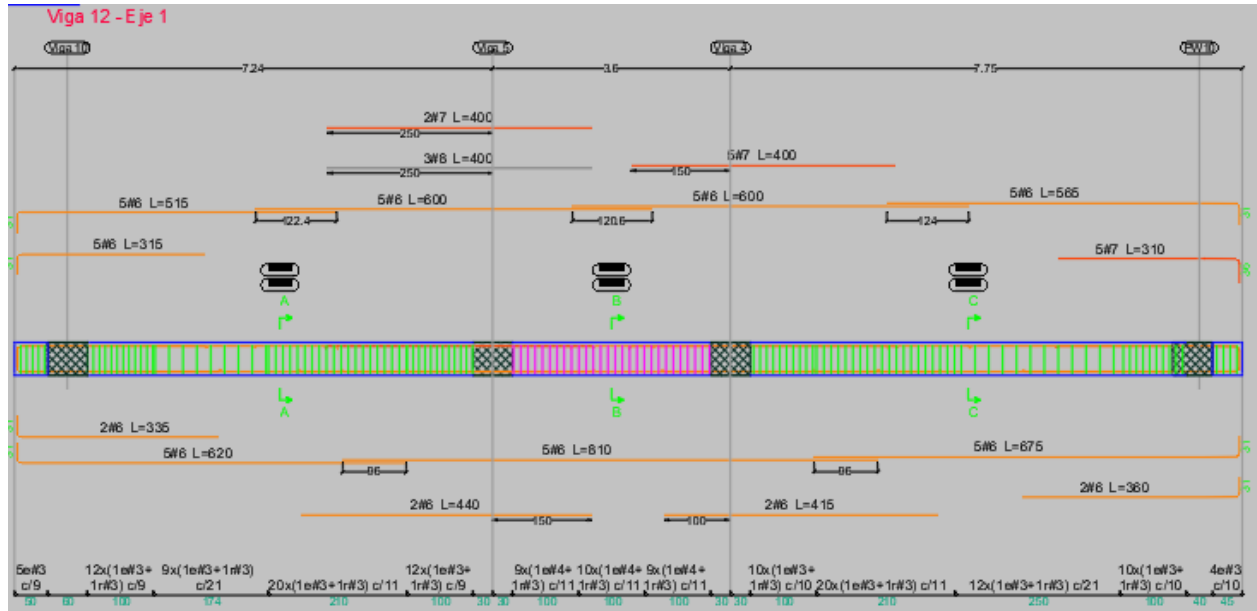


Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +11.50

- DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E) N +11.50**

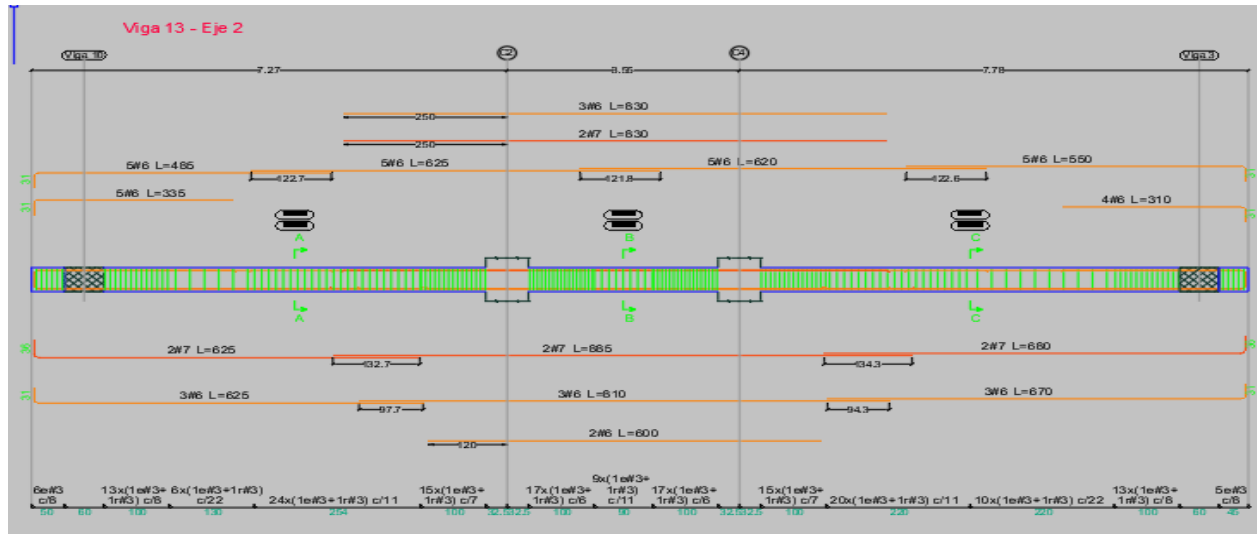


Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	CONSORCIO INTER-SALUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E) N +11.50

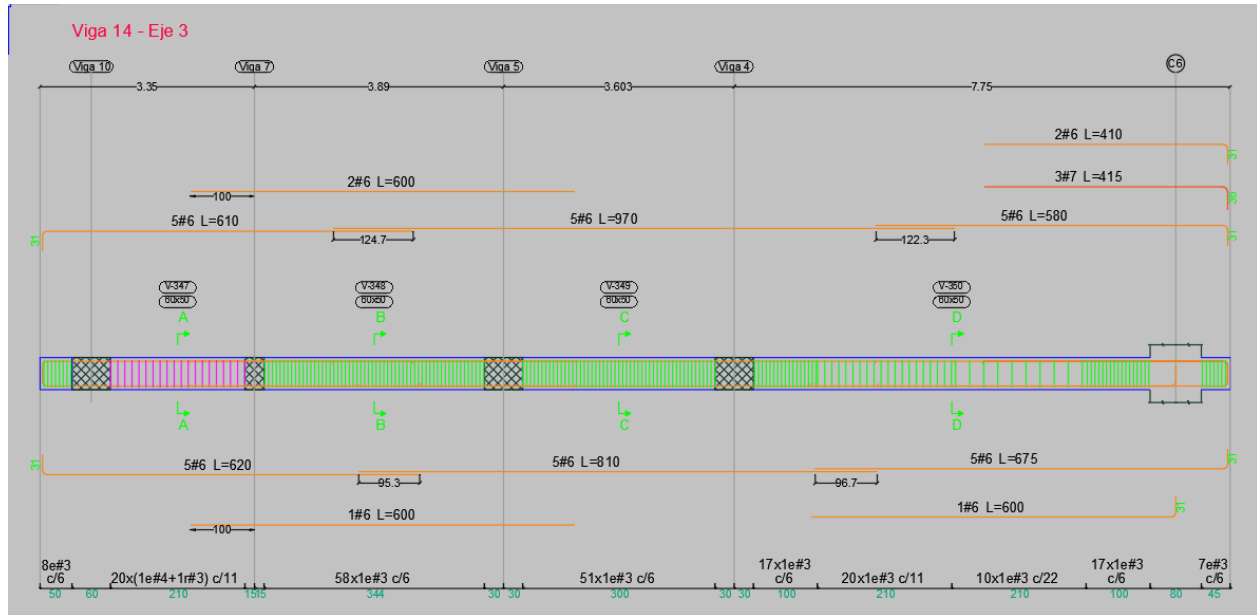


Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +11.50

- DETALLE REFUERZO VIGA 3' (B-E) N +11.50

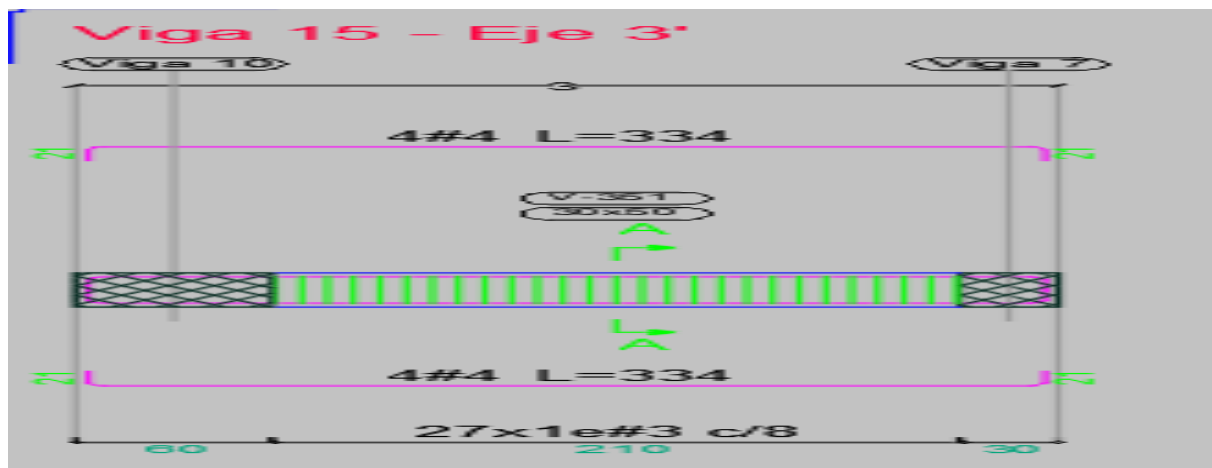


Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E) N +11.50**

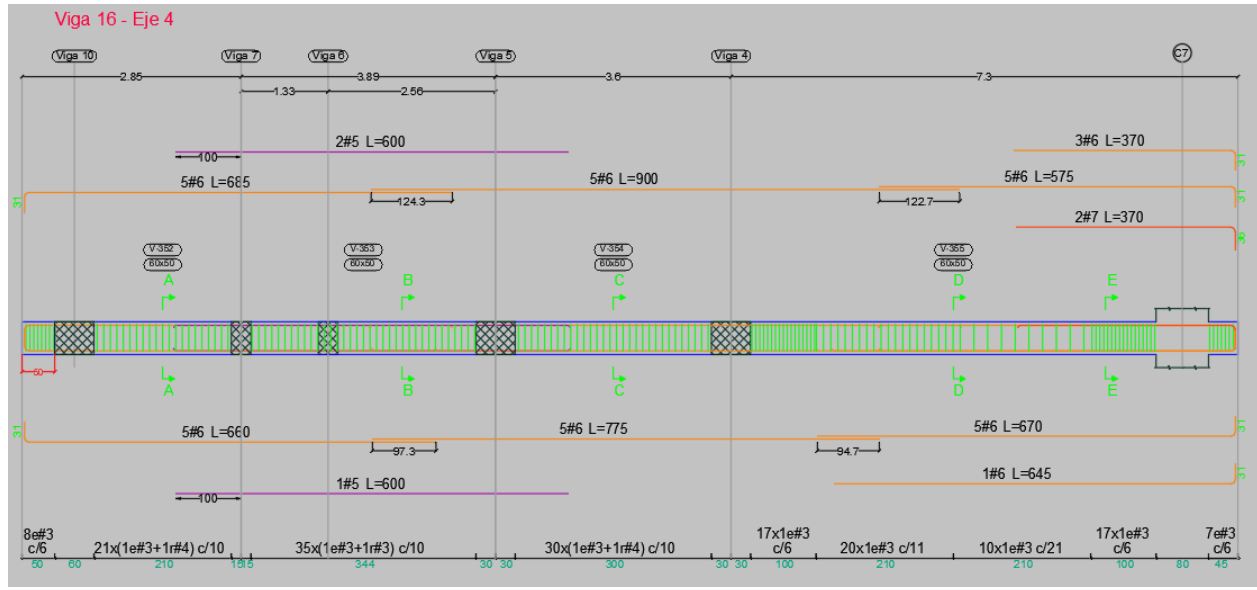


Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +11.50

- DETALLE REFUERZO VIGA 4' (C-D)**

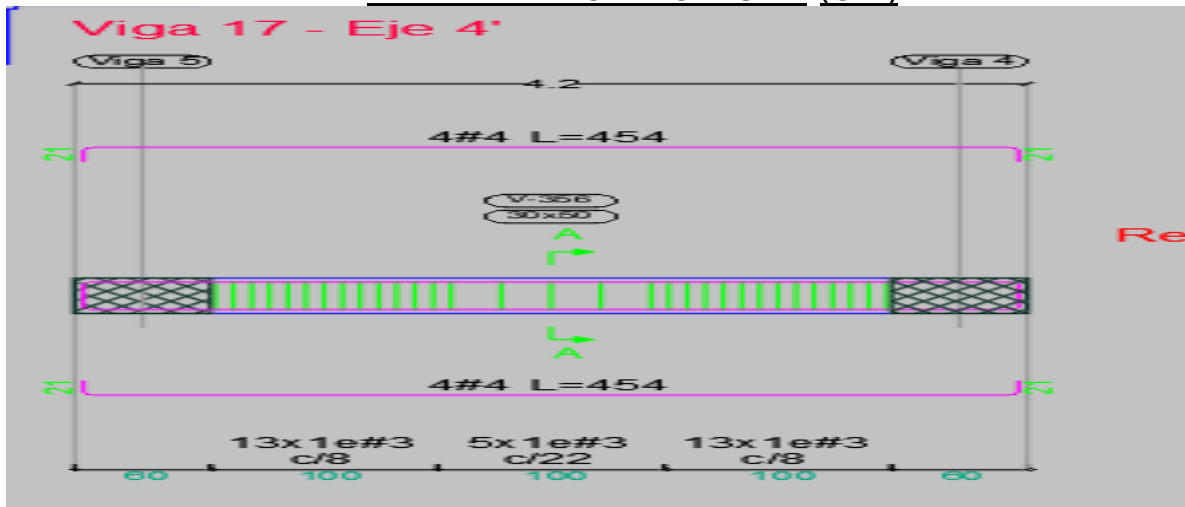


Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E) N +11.50

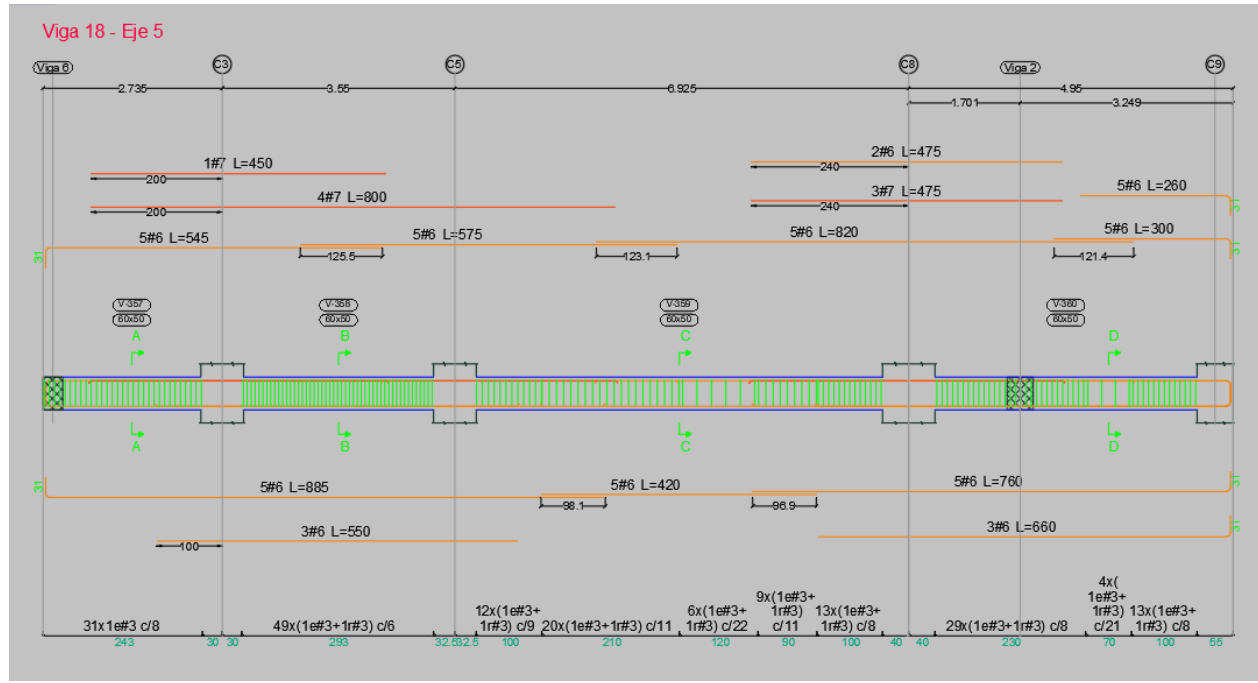


Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +11.50

• DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E) N +11.50

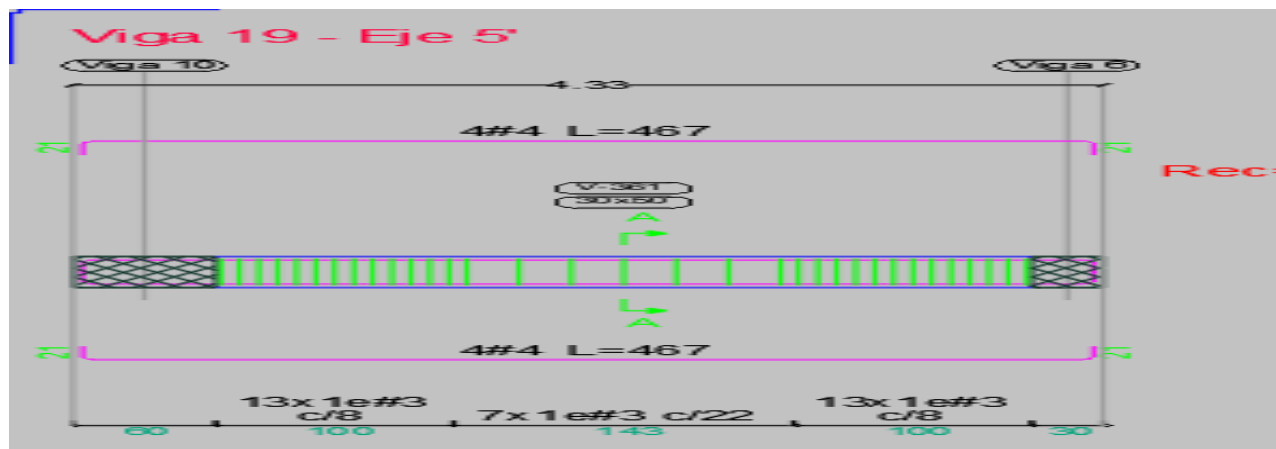


Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA 5" (B-E) N +11.50**

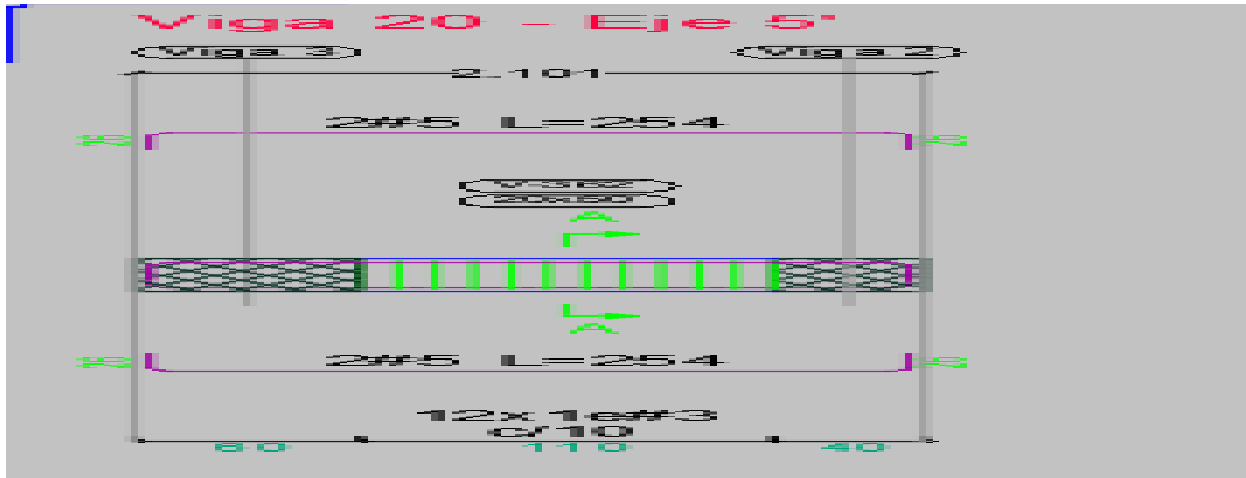


Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5' ' (B-E) N +11.50

- DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E) N +11.50**

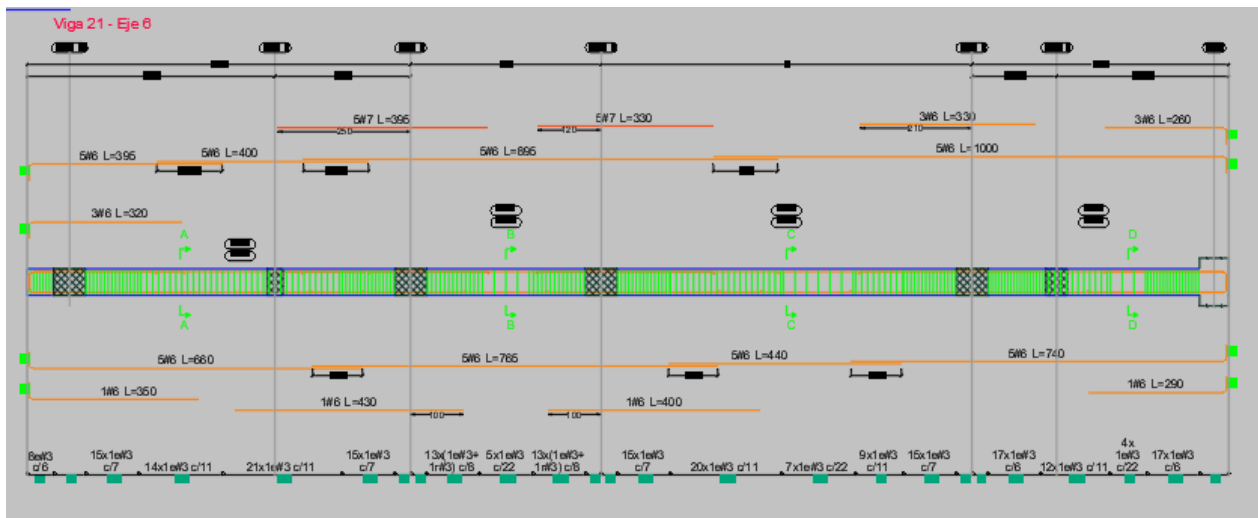


Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +11.50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA 6' (A-E) N +11.50

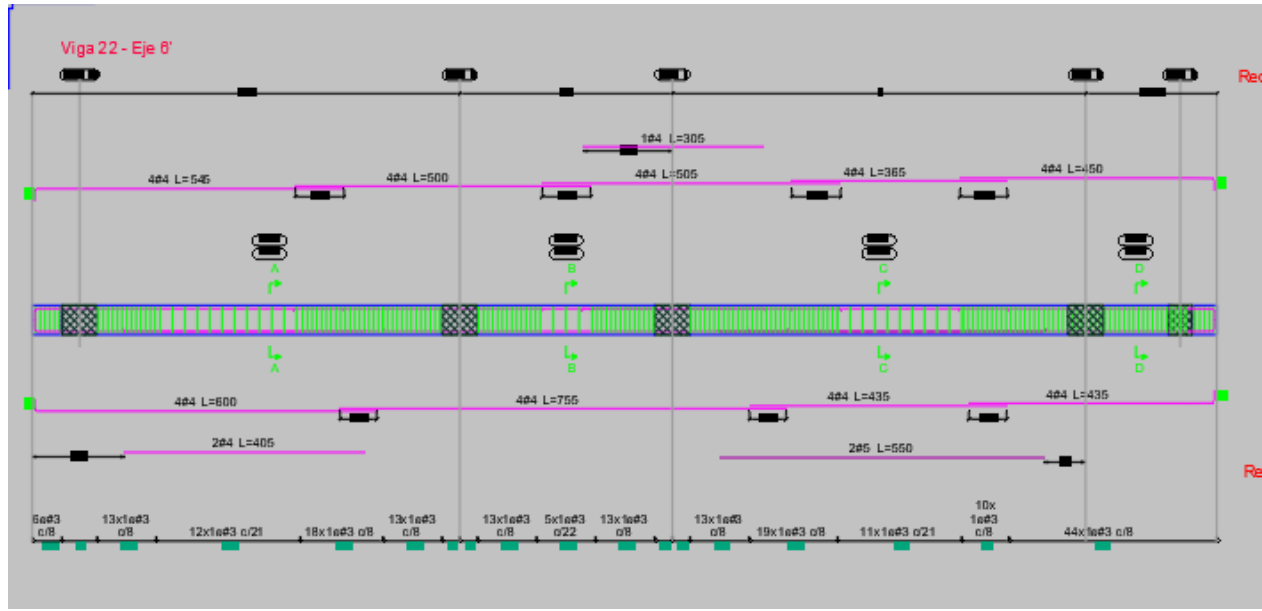


Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga 6' (A-E) N +11.50

ACERO ESTRUCTURAS

REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 2 filas, acero transversal de varilla No 6 espaciado .20 mts dispuesto en dos filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

acero transversal de varilla N°4 dispuesto en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.

- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°5 dispuestas en 2 filas, refuerzo transversal en varilla No 5 espaciados 0.25 mts en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.25 mts, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 7 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas con espaciamiento 0.15 mts, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo transversal varilla No 6 en 2 filas espaciados 0.15 mts, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varillas No 6 en 3 filas espaciadas 0.12 mt, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1" en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de $1 \frac{1}{2} \times 1/8$, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de $1 \frac{1}{2} \times 1/8$, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de $1 \frac{1}{2} \times 1/8$, con bastón de refuerzo en varilla lisa $\frac{3}{4}$ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +11.50

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5 y 6, en la parte inferior varilla No 5 y 6, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.<

REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+7.60 A N +11.50

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

▪ **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D, D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

▪ **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso N +11.50, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 3

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 3.

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 3.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 3.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 3.

La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 3.

La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 3.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 3.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
	
ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa PANTALLAS	

Ilustración 47. Acero corrugado de pantallas

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1



ACERO DE REFUERZO $F_y=420$ Mpa COLUMNAS

Ilustración 48. Acero corrugado de columnas

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1



ACERO REFUERZO $F_y=420$ Mpa VIGAS JOIST

Ilustración 49. Acero de refuerzo Vigas Joist

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1



ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa VIGAS ENTREPISO

Ilustración 50. Acero corrugado vigas de entrepiso

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1



CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS

Ilustración 51. Fundición losa de cimentación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



Ilustración 52. Concreto para columnas

- BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de marzo de 2025 del 19.78% frente un avance programado del 19.06%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025 es de 3.58% frente a un avance programado del 2.86%.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	\$109,503,404	0.33%	\$363.707.100	1.12%
30-09-2024	\$858,324,856	2.16%	\$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	\$1.948.435.571	6.00%	\$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	\$2.636.884.000	8.12%	\$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	\$3.299.608.964	10.13%	\$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	\$4.715.214.428	14.52%	\$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	\$5.260.776.428	16.2%	\$5.260.776.428	16.2%
25-3-2025	\$6.189.530.785	19.06%	\$6.423.343.071	19.78%
AVANCE	\$928.754.357	2.86%	\$1.162.566.643	3.58%

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo \$9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de febrero de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

AUTORIZACIONES DE PAGO		
PROVEEDOR	VALOR/CONCEPTO	ITEM PLAN DE INVERSION
1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	\$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
2. FERRETERÍA GYJ	\$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
3. URIEL PALTA AMA	\$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo	Transporte
4. UBANER PEREZ	\$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
5. PEDRO ROMO	\$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo	Alquiler de equipos
6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN	\$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo.	Materiales
9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	\$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
11. DIANA CAROLINA VIVAS	\$133.865.096 m/cte	Mano de obra
12. SILOGISTICA	\$103.240.000 m/cte	Transporte
13. LA ALIANZA GROUP SAS	\$309.835.612 m/cte.	Mano de obra
14. UBANER PEREZ	\$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo	Mano de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 85,500,000.00	\$ 2,073,600.00	0.02%	\$ 83,426,400.00
2	TRANSPORTE	\$ 105,400,000.00	\$ 105,378,400.00	1.08%	\$ 21,600.00
3	MATERIALES	\$ 7,205,599,277.00	\$ 7,134,454,460.00	73.23%	\$ 71,144,817.00
4	MANO DE OBRA	\$ 2,345,679,294.00	\$ 2,315,679,293.00	23.77%	\$ 30,000,001.00
	TOTAL	\$ 9,742,178,571.00	\$ 9,557,585,753.00	98.11%	\$ 184,592,818.00

El contratista de obra hizo entrega del informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de febrero de 2025. De lo cual se realizó el envío a la entidad del comprobante de los rendimientos financieros correspondientes al mes de febrero por un valor de \$124.434,99 m/cte mediante oficio CIPZ-078-0182-2025 del 22 de marzo, conforme al oficio EV-C358-23-308-25 del 20 de marzo enviado por el contratista.


Anexo 6. Comprobante rendimientos financieros mes febrero 2025

Cabe destacar que, al término del periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°1, con fecha de corte al 14 de marzo de 2025 por un valor de \$4.113.300.273 correspondiente al 12.67% del valor contractual quedando un saldo por facturar de \$28.360.628.296, se realiza una amortización del anticipo por un valor de \$1.233.990.82, quedando pendiente por amortizar \$8.508.188.489

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 13	

CONTRATO DE OBRA 358-2023					
BALANCE CORTE 14-03-2025			BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR CONTRATO PPAL		\$ 32,473,928,569	VALOR ANTICIPO		\$9,742,178,571
VALOR CONTRATO ADICIONAL		-	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 32,473,928,569	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	\$1,233,990,082	
VALOR FACTURADO ACUMULADO	\$ 4,113,300,273		SALDO POR AMORTIZAR	\$8,508,188,489	
SALDO POR FACTURAR	\$ 28,360,628,296				
SUMAS IGUALES	\$ 32,473,928,569	\$ 32,473,928,569	SUMAS IGUALES	\$9,742,178,571	\$9,742,178,571

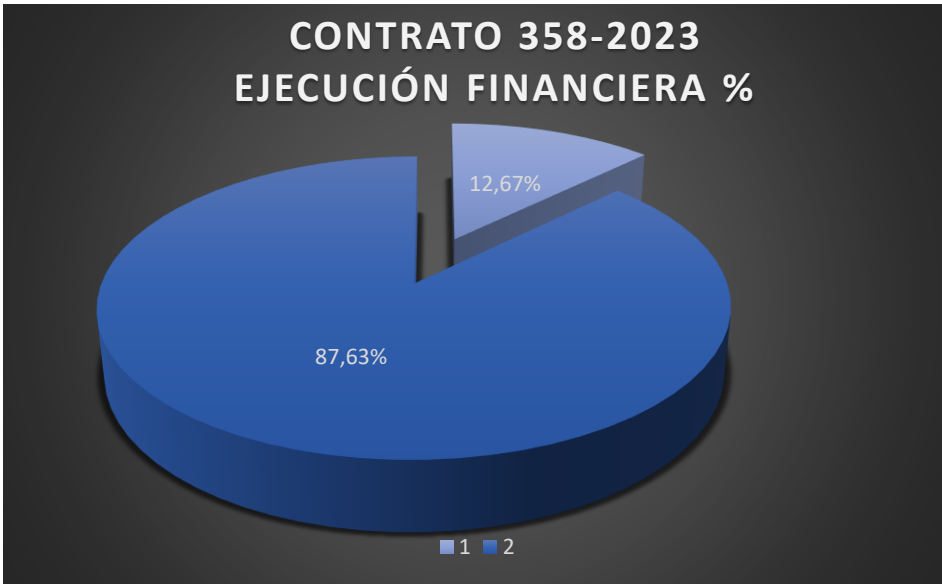

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".




INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

**Contrato de obra N°358 2023
Avance financiero**

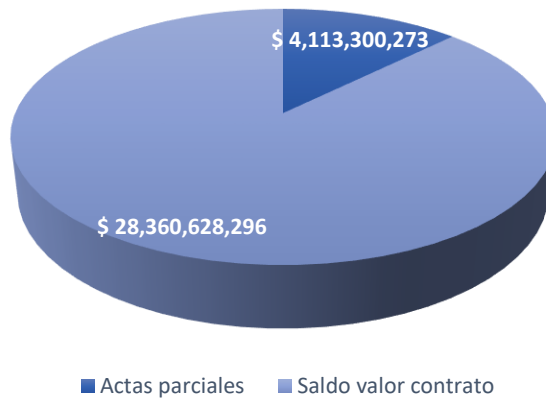


**Contrato de obra N°358 2023
Inversión del anticipo**

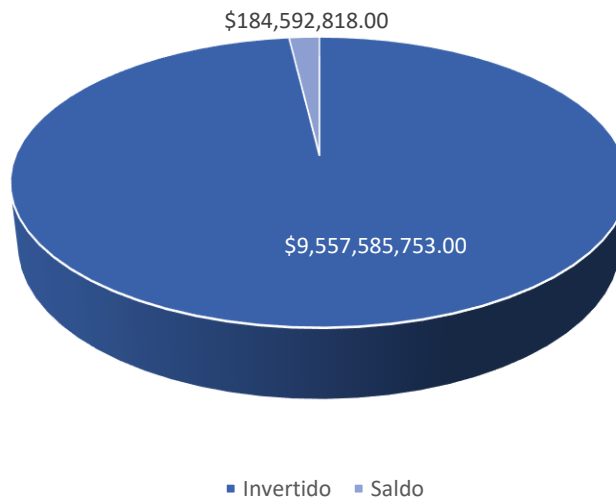

• **Desembolsado:**

\$ 9,742,178,571.00 m/cte

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 13	

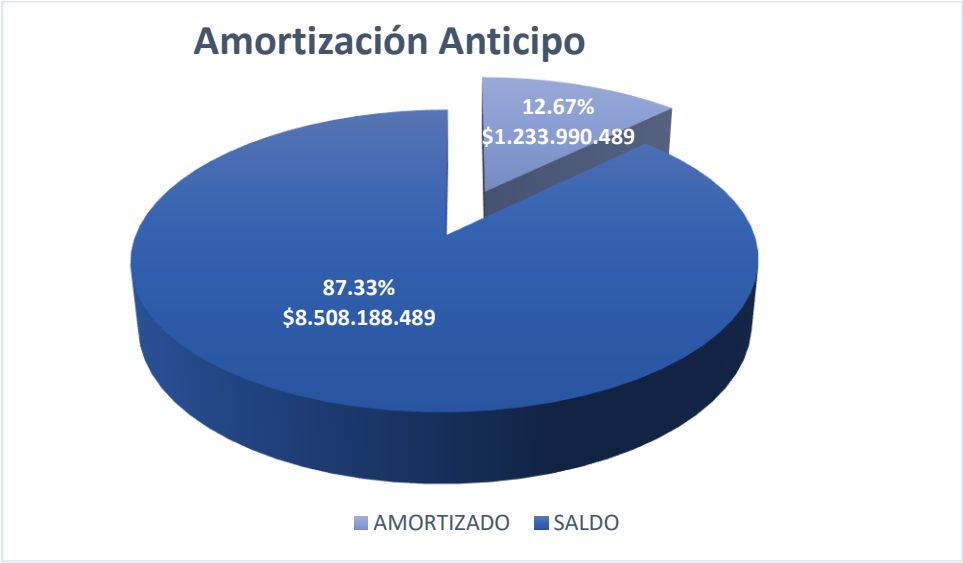

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024					
BALANCE CORTE 14-03-2025			BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR CONTRATO PPAL		\$ 1.280.412.030	VALOR ANTICIPO		\$0.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 1.280.412.030	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	\$0.00	
VALOR FACTURADO ACUMULADO	\$ 162.183.000		SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	
SALDO POR FACTURAR	\$1.118.229.030				
SUMAS IGUALES	\$ 1.280.412.030	\$ 1.280.412.030	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

PROGRAMA 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

De acuerdo con lo evidenciado, este programa se encuentra con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Las actividades registradas en el informe con la respectiva historicidad, adicional a las visitas de campo realizadas demuestran el cumplimiento de esta actividad a cabalidad durante la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Registro fotográfico compensación forestal.

 Arrayan No. 4 Coordenadas: 2°27'2" N 76°33'56" O	 Cucharro No. 2 Coordenadas: 2°27'1" N 76°35'56" O
 Cucharro No. 3 Coordenadas: 2°27'1" N 76°35'56" O	 Arrayán No. 5 Coordenadas: 2°26'60" N 76°35'56" O
 Cucharro No. 4 Coordenadas: 2°26'60" N 76°35'56" O	 Cucharro No. 5 Coordenadas: 2°27'3" N 76°35'55" O

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1



Cucharro No. 1

Coordenadas: 2°27'3" N 76°35'57"



Arrayán No. 1

Coordenadas: 2°27'3" N 76°34'57"



Arrayan No. 2

Coordenadas: 2°27'3" N 76°33'57"



Arrayán No. 3

Coordenadas: 2°27'3" N 76°35'57"



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

PROGRAMA 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Se observa la instalación y adecuación de puntos de acopio de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos.

Registro fotográfico de puntos de acopio residuos



Acopio de residuos peligrosos

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Se observa la instalación de 3 puntos ecológicos en toda la obra para la segregación de residuos sólidos.

Registro fotográfico de puntos ecológicos.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Se observa el cumplimiento de este programa por cuanto se hace riego para evitar dispersión de material particulado, se mantiene cubierto el material y se registra lavado periódico de llantas.

Registro fotográfico de lavado de llantas y prevención de dispersión de material particulado.

	
<i>Lavado de llantas volquetas</i>	<i>Lavado de llantas volquetas</i>
	
<i>Lavado de llantas volquetas</i>	<i>Lavado de llantas volquetas</i>

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



Teniendo en cuenta que la ejecución del programa se ha realizado bajo las condiciones planteadas en el PMA, se observa que tanto en la ficha de cumplimiento como en el cronograma de actividades la actividad de lavado de llantas y control de dispersión de material particulado mediante cubrimiento con polietileno no se ejecutará más. Debe aclararse si no es necesaria la ejecución de dichas actividades en lo que resta del proyecto bajo una justificación detallada de que las actividades de obra pendientes no generan material particulado que necesite cubrimiento ni entrada o salida de maquinaria con este tipo de material. De lo contrario ajustar la programación y los porcentajes de cumplimiento.

NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA
1	Cerramiento de materiales PMA 1.2.1	8	12,5%	12,5%	12,5%
2	Adquisición de telas de polietileno PMA 1.2.3	1	0%	0%	0%
3	Jornadas de lavado de llantas PMA 1.2.2	3	100%	100%	100%
4	Control de MP mediante aguas de riego PMA 1.2.4	3	100%	100%	100%
5	Entrega de herramientas pedagógicas al personal PMA 1.2.5	8	0%	0%	0%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

La ejecución de la mayoría de estas actividades ha sido ejecutada en periodos anteriores y su revisión obedece estrictamente a los profesionales de ingeniería civil toda vez que constituyen obras civiles sanitarias y de drenaje cuyo presupuesto quedó adjudicado en el PMA pero corresponde a un experto en el tema la revisión de su ejecución. A la fecha, dichas actividades fueron ejecutadas al 100% entre septiembre y noviembre del 2024.

Para efectos ambientales las actividades de: manutención de cobertura vegetal, jornadas de almacenamiento seguro de material excavado serán revisadas en el mes de abril teniendo en cuenta los ajustes que se le realizaron al PMA para este periodo.

PROGRAMA 5: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.

Se observa la utilización de indumentaria para el personal de obra y visitantes de acuerdo con sus funciones. También la presencia de botiquín tipo B, el cual fue adaptado con elementos de base, camilla, extintor vigente y elementos de protección personal, así como equipos de trabajo para seguridad y salud en el trabajo como arnés y líneas de vida.

Todos los elementos se encuentran en lugares asequibles para atender las necesidades a las cuales haya lugar.

En la programación entregada, toda la adquisición de los elementos mencionados aparece para el mes de noviembre de 2025. Debe ser ajustada a menos de que se planea adquirir nuevamente los elementos para esa fecha.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	CONSORCIO INTER-SALUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Registro fotográfico de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo.



Extintores, camilla, contenido de botiquín.



Personal en obra con indumentaria y EE.PP

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1



Eslinga en Y con absorbedor



Línea de vida 30M certificada



Camilla No.1



Camilla No.2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



Extintor vigente hasta junio de 2025.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Respecto a este programa, no se ha considerado la necesidad de realizar actividades toda vez que la obra transcurre en normalidad sin afectaciones a la comunidad ni impactos negativos considerables al ambiente durante el presente periodo de informe.

Se considera muy importante y pertinente haber aplicado la iniciativa de instalar un canal de atención a la comunidad para que alleguen sus PQRs dentro de la actualización del PMA. Observando la ficha de cumplimiento, se considera que esta debe ser ajustada a un 100% de ejecución en la actividad: *“instalación de punto de atención virtual de PQRs”* porque el canal fue abierto y dispuesto al público en general, ya mensualmente se realizaría el reporte del seguimiento a las PQRs que lleguen, consolidándose una nueva actividad de *“Meses de atención de PQRs”*. Se realizaría el seguimiento actuando bajo el principio de buena fe del contratista con los reportes de seguimiento de las PQRs recibidas en el correo dispuesto para tal fin.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



Señalética atención a PQRS

SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se observa actualización de señales de obra instaladas de prevención, e informativas. Se instaló una señal de fin de obra, y señalización en los puntos de acopio de material y residuos, de acuerdo con las observaciones realizadas anteriormente, mejorando la información para la circulación, el orden y la seguridad en la obra.

Registro fotográfico de señales preventivas e informativas en obra.



Señalización restrictiva, preventiva e informativa

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1



PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Este programa tuvo modificaciones teniendo en cuenta las condiciones reales y actuales de obra. Se dio paso a la actualización del PMA y con él, el plazo hasta el siguiente periodo de informe para ver las evidencias en campo y revisarlas en el informe.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

En este sentido, se espera que en el mes de abril se efectúen las actividades consolidadas y pendientes para estar al día con la ejecución del presente programa.

Actividades pendientes para el mes de abril:

- Protección de sumideros.
- Disposición y empleo de elementos para recolección y uso de agua lluvias.
- Mantenimiento de sumideros.
- Limpieza de vías afectadas.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE MARZO DE 2025

N° PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA
1	APROVECHAMIENTO FORESTAL.	10 árboles sembrados	100%	100%
2	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	48.49 ton (15% de 320.8 ton susceptibles de aprovechamiento)	A la espera de ajuste	A la espera de ajuste
		8 jornadas de aprovechamiento de material reciclable	75%	
		Instalación de puntos ecológicos y de acopio	100%	
		8 jornadas de entrega de residuos peligrosos a gestor	A la espera de inclusión	
3	ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL	Cerramiento de materiales	12.5%	30.43%
		Adquisición de telas de polietileno	0%	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

N° PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA
	EMISIONES ATMOSFÉRICAS.	Jornadas de lavado de llantas	100%	
		Control de material particulado mediante aguas de riego	100%	
		Entrega de herramientas pedagógicas al personal	0%	
4	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO.	Manutención de cobertura vegetal	0	48%
		Jornadas de almacenamiento seguro de material excavado	0	
		Control de aguas de escorrentía	100	
		Mejoramiento de terreno	100	
		Reubicación de alcantarillado sanitario NP 1.4 - NP 1.18 - 1.1.2 - 2.1 - NP 1.19 - 5.2.4 - 5.2.5 - NP 1.7 - 5.2.10 - NP 1.20 - NP 1.21 - NP 1.22	100	
		Actividades de alcantarillado pluvial NP 1.7 - NP 1.8	100	
5	SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES	Adquisición de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo	100	100

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

N° PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA
6	REUNIONES CON LA COMUNIDAD	Reuniones con la comunidad	50	A la espera de ajuste en el PMA.
		Entrega de volantes informativos	100	
		Instalación de punto de atención virtual de PQRS	100	
		Meses de atención de PQRS	8	
7	SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL	Cerramientos del proyecto y asilamiento de ventanas	100	50
		Adquisición de señalización vial, reglamentaria, restrictiva e informativa	100	
		Delimitación senderos peatonales y acceso vehicular.	0	
		Disposición y empleo de balizas	0	
		Mano de obra para clasificación de residuos sólidos.	0	
		Instalación de valla informativa.	100	
8	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.	Protección de sumideros	0	0
		Disposición y empleo de elementos para recolección y uso de agua lluvias	0	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

N° PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA
		Mantenimiento de sumideros.	0	
		Limpieza de vías afectadas.	0	

Los programas con menor porcentaje de ejecución son el 2, 3 y 8, sin embargo, se reconoce que el avance obedece al avance de la obra, es decir, el trabajo permanente en el PMA es notable y que la disminución en cumplimiento obedece a factores como actualización del PMA y reciente implementación de la misma, de modo que son necesarios algunos ajustes en la medición de cumplimiento para el programa 2 y 6 por ejemplo, y el periodo de transición de un mes para su cumplimiento para el programa 8, en este caso.

Se aclara que el hecho de que algunos programas o actividades estén implementados al 100% no quiere decir que deba de parar su seguimiento puesto que, en actividades como la señalética, por ejemplo, debe garantizarse que esta permanezca durante la total ejecución del proyecto. Cada una de las actividades requiere su continuo seguimiento de modo que no se descuide la atención a ninguna alteración que pueda ocurrir en el transcurso de la obra.

GESTIÓN SST - PMA

Se revisa la conformación de la brigada de emergencia, del COPASST y todas las observaciones realizadas subsanadas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- COPASST: Conformado por Jesús Albeiro Irua por parte de los trabajadores de EVOLET como vigía, Lorena Falla como inspectora SST y Carlos Alberto Pérez como representante del consorcio URBANER.
- Brigada de emergencia conformada por: Jesús Iruba (jefe de brigada), Guillermo León Escobar (Jefe de evacuación), Ubaner Pérez (brigada de primeros auxilios), Ricardo Bolaños (brigada contra incendios), Jose Revelo (personal de apoyo).

Se tiene al día la vinculación del personal al sistema de salud, pensión y riesgos.

Se observan las evidencias de las capacitaciones y tamizajes realizados y una buena implementación de indicadores para medición de avances y cumplimiento.

Listado de capacitaciones realizadas:

- Requisitos trabajo en alturas. Fecha: 20/02/25
- Capacitación inspección equipos alturas. Fecha: 28/2/25
- Cuidado de ojos y visión. Fecha: 6/03/25
- Protección respiratoria. Fecha: 13/03/25
- Prevención peligro biomecánico. 13/03/25
- Concepto incidente y accidente. Ruta de prevención. Educación en manejo de postura. Estiramiento muscular, calentamiento. 20/03/25
- Salud visual. Fecha: 20/03/25

Se presentan dos inducciones al trabajo, dos en febrero y una en marzo.

- Febrero 21 de 2025: Laura Patricia Moya y Fernando Calvache el 26 de febrero de 2025.
- Marzo 05 de 2025: Luis Ernesto Narváez, James Andrés Adrada, Wilmar Zambrano.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Se observan inspecciones de botiquín y camilla en formato como se había observado, así mismo, la entrega de EE. PP con registro en formato.

Los trabajadores cuentan con permiso de trabajo en alturas.

Se observó el reporte de un accidente laboral a la ARL, atendido correctamente.

No se presentan novedades frente a acoso laboral.

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 20 enero al 20 de febrero 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL		
No.	NORMATIVA	ASPECTO LEGAL
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales corresponden al pago del mes de Febrero 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9482587372	FEBRERO	03/03/2025	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL					
2	9482609036	FEBRERO	2025/03/03	11	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL					
3	9478220715	FEBRERO	3/02/2025	1	APORTES EN LINEA
4	479368865	FEBRERO	28/01/2025	1	APORTES EN LINEA
5	31486770	FEBRERO	12/02/2025	1	SOI
6	9479231335	FEBRERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
7	9479575138	FEBRERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
8	9479116856	FEBRERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
9	7954154550	FEBRERO	5/02/2025	1	SOI
10	9479235979	FEBRERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
11	9480002309	FEBRERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
12	9479285603	FEBRERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
13	9479924723	FEBRERO	3/02/2025	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION					
14	9482246907	FEBRERO	13/03/2025	1	APORTES EN LINEA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ					
15	9482518991	FEBRERO	03/03/2025	25	APORTES EN LINEA
16	INGRESOS	FEBRERO		3	COBERTURA 4/03/2025
17	RETIRO	FEBRERO		0	NO SE PRESENTA NOVEDAD
CONTRATISTA- TOPOGRAFIA					
19	9482661891	FEBRERO	2025/03/04	1	
CONTRATISTA- TOPOGRAFIA- INDEPENDIENTE					
20	9482661965	FEBRERO	4/03/2025	1	APRENDIZ
21	INGRESOS	FEBRERO		1	COBERTURA 21/02/2025
22				1	COBERTURA 25/02/2025
23				1	COBERTURA 08/03/2025
	RETIRO	FEBRERO			

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
TOTAL				46	

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
1	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76.334.379	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	COMFACAU CA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
2	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10.302.884	SANITAS	COLPENSION ES	SURA	N/A
3	CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES	34.328.843	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
4	JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ	1.061.725.247	NUEVA EPS	COLPENSION ES	SURA	N/A
5	JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ	76.310.636	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
6	LAURA VALENTINA CALLEJAS GAVIRIA	1.061.818.139	SANITAS	COLPENSION ES	SURA	N/A
7	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
8	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	LORENA FALLA FALLA	1.019.092.020	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
10	JULIO CESAR MAYA BASTIDAS	98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
11	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
12	ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ	34.533.693	SANITAS	PENS VEJ ACT	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO						
	SIN NOVEDAD					

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP						
13	PEREZ GOMEZ UBANER	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAU CA

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
14	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
15	LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
16	MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
17	ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES	1081595473	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
18	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
19	WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
20	WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
21	WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
22	RAUL LOZADA BERMEO	1117839679	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
23	CRISTIAN CAMILO MACA AVIRAMA	1002966961	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
24	DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
25	JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
26	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
27	CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
28	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
29	CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
30	JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
31	CARLOS ANDRES ROJAS GUTIERREZ	1007462733	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
32	ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
33	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
34	OBER FERNEY SANCHEZ SOL	1061761500	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
35	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
36	EMBER JAVID SIMALES BONILLA	1061744746	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

37	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
38	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS						
39	WILMAR ZAMRANO YANDI	1002849154	SANITAS	PORVENIR	SURA	5/03/2025
40	LUIS ERNESTO NARVAEZ ESPINOSA	10568074	SANITAS	PORVENIR	SURA	5/03/2025
41	JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ	1061017769	SANITAS	COLFONDOS	SURA	5/03/2025
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA TOPOGRAFIA						
42	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
43	NESDRY YELISSA NARVAEZ GALVIS	1.061.708.231	EMSSANAR	N/A	SURA	N/A
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO						
44	PABLO ERNESTO LASSO CALVACHE	1.061.781.142	ASMET SALUD	COLFONDOS	SURA	
45	FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
46	LAURA PATRICIA MOYA SOL	1.061.780.375	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
TOTAL 46						

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	6
Antiguo	39
Retiro	0
Personal flotante	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	46

Indicadores de cumplimiento:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:
FORMULA	$\frac{\text{Nº de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{\text{No de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los siguientes ingresos:

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	PEREZ GOMEZ UBANER	Ingreso	3
2	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	Ingreso	3
3	Consortio EVOLET	Ingreso	0

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP's mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal para los trabajadores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Entrega de dotación y EPP al personal
FORMULA	$\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP}}{\text{Numero de trabajadaores contratados}} \times 100 = 100\%$

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 6 ingresos y se registró en el formato de entrenamiento las inducciones correspondientes al periodo de los colaboradores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ, INGENIO TOPOGRAFICO y del Consorcio EVOLET.

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL EN EL MES					
No.	EMPRESA	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIF.	CARGO	FECHA
1	UBANER PEREZ GOMEZ	WILMAR ZAMRANO YANDI	1002849154	OBRERO	COBERTURA 4/03/2025
2		LUIS ERNESTO NARVAEZ ESPINOSA	10568074	OBRERO	COBERTURA 4/03/2025
3		JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ	1061017769	OBRERO	COBERTURA 4/03/2025
4	INGENIO TOPOGRAFICO	PABLO ERNESTO LASSO CALVACHE	1.061.781.142	COONTRATISTA	COBERTURA 21/02/2025
5		FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	COORDINADOR TA	COBERTURA 25/02/2025
6		LAURA PATRICIA MOYA SOL	1.061.780.375	COORDINADOR TA	COBERTURA 08/03/2025
4	Consorcio EVOLET.	SIN NOVEDAD			
Total					6

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Cobertura Inducción y reinducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes}}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

FORMULA	$\frac{\text{No. de Inducciones y reinucciones ejecutadas}}{\text{No. de Inducciones y reinucciones programadas}} \times 100 = 100\%$
----------------	---

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista cumple con la capacitacion relacionadas con el área SST, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET como respuesta mediante oficio EV-C358-23-0292-25 SST radicado el día 4 de marzo del 2025 a las solicitudes del documento actualizado, para el debido seguimiento.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitación del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten capacitación al mes}}{\text{No. de trabajadaores en el mes}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de capacitaciones ejecutadas}}{\text{No. de de capacitaciones programas}} \times 100 = 100\%$

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJAD ORES ASISTENTE S	No. TRABAJAD ORES PROGRAMA DOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	20/02/2025	Requisitos de trabajo en alturas	27	270	27/27*100 = 100%
1	28/02/2025	Capacitación relaciona con inspección de equipos para trabajos en alturas (arnés, eslinga, casco) Verificación de	25	25	27/27*100 = 100%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

		etiquetas del arnés, datos de fabricación			
2	06/03/2025	Cuidados de ojos y de la visión- estiramiento visual- dirigida al personal operativo	24	24	27/27*100 = 100%
3	13/03/2025	Protección respiratoria en la obra de construcción por exposición a polvo y químicos, clases de elementos de protección personal -estiramientos.	27	27	27/27*100 = 100%
4	13/03/2025	Prevención peligro biomecánico dirigida al personal administrativo	7	7	7/7*100 = 100%
5	20/03/2025	Concepto incidente y accidente prevención y ruta, educación de manejo de posturas, estiramiento muscular	29	29	29/29*100 = 100%
6	20/02/2025	Salud visual, dirigida al personal administrativo	11	11	11/11*100 = 100%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 13

Documento
Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No. 1 Capacitación relacionada con inspección de equipos para trabajos en alturas



Imagen No. 2. Pausas activas, estiramiento



Imagen No. 3. Protección respiratoria en la obra de construcción por exposición a polvo y químicos, clases de elementos de protección personal



Imagen No. 4. Capacitación Concepto incidente y accidente prevención y ruta



Imagen No. 5. Protección respiratoria en la obra de construcción por exposición a polvo y químicos, clases de elementos de protección personal



Imagen No. 6. Prevención peligro biomecánico dirigida al personal administrativo

FUENTE: CONSORCIO EVOLET

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

CONFORMACION COMITÉ PARITARIO DE SST.

La Interventoría verificó mediante respuesta enviada -oficio EV-C358-23-0292-25 SST radicado el día 4 de marzo del 2025, el acta de conformado el comité COPASST, quedando conformado así:

REGISTRO FOTOGRAFICO		
POR LO TANTO QUEDA CONFORMADO EL COMITÉ DE LA SIGUIENTE MANERA:		
Por parte de la empresa:		
NOMBRE	CARGO	CARGO COMITÉ
Claudia Gaviria	Ingeniera	presidente
Valentina Callejas	Arquitecta	suplente
Por parte de los trabajadores:		
NOMBRE	CARGO	CARGO COMITÉ
Carlos Alberto Perez	Oficial	Representante
Libni Ricardo Bolaños	Oficial	Suplente
Imagen No. 7. Conformación COPASST		
FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025		

Con un periodo de vigencia: 3 de enero del 2025 al 3 de enero del 2027.

Se verifica mediante el registro CE-SG-SST-07.1 ACTA DE REUNION COPASST-COCOLA, la reunión realizada el 4 de febrero del 2025 y la correspondiente al mes de marzo 5 del 2025, subsanando el tema que se encontraba pendiente en el informe anterior.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO		
POR LO TANTO QUEDA CONFORMADO EL COMITÉ DE LA SIGUIENTE MANERA:		
Por parte de la empresa:		
NOMBRE	CARGO	CARGO COMITÉ
Jose Revelo	Ingeniero administrativo	Presidente
Guillermo Escobar	Maestro	Suplente
Por parte de los trabajadores:		
NOMBRE	CARGO	CARGO COMITÉ
Ember Javid Simales	Oficial	Representante
Carlos Manuel Polo	Oficial	Suplente
Imagen No. 8. Conformación COCOLA		
FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025		

CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

La Interventoría verificó respuesta enviada -oficio EV-C358-23-0292-25 SST radicado el día 4 de marzo del 2025 de la elección y conformación del comité de convivencia laboral, mediante el registro CV-SG-SST-08.1 ACTA DE CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL quedando así:

Con un periodo de vigencia de dos años: 9 de enero del 2025 al 9 de enero del 2027.

Se verifica

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría solicita mediante oficio radicado el día 21 de enero del 2025 la autoevaluación de estándares mínimos y la certificación de la ARL. Se verifica la

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

documentación solicitada de autoevaluación de estándares del SGSST, se recibe respuesta mediante oficio EV-C358-23-0296-25 radicado el 7 de marzo del 2025 archivo "resultado de los estándares mínimos" reporte realizado al ministerio con un resultado de 100 %.

AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025			
No.	ORIGEN	EMPRESA	TIEMPO REPORTADO
1	ACCIDENTE LABORAL	UBANER PEREZ GOMEZ	1
2	INCAPACIDAD X A. T	CONSORCIO EVOLET	3 DIAS
3	ENFERMEDAD LABORAL	SIN NOVEDAD	0
4	INCAPACIDAD X A. L	SIN NOVEDAD	0
5	ENFERMEDAD COMUN	SIN NOVEDAD	0
6	PERMISOS	UBANER PEREZ GOMEZ	11 DIAS
7	INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS	SIN NOVEDAD	0
TOTAL, DE AUSENTISMO			14 DIAS

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Periodo del 20 de febrero al 20 de marzo 2025	
DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	46
Número de accidentes laborales durante el periodo	1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Periodo del 20 de febrero al 20 de marzo 2025	
DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	3+28=31
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	2
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	84
Frecuencia de Accidentalidad = = <u>No de accidentes de trabajo presentados en el mes</u> x100 No de trabajadores en el mes	1/46*100 =2.1%
Severidad de Accidentalidad = <u>No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes</u> *100 # de trabajadores en el mes	31+0/46*100=67.3%
Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000	2.1*67.3/1000 = 0,14
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	31+0/29*100 =106%

Tabla 9. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

Se evidencia mediante registros de entrenamiento código CV-SGSST-14-V1, la capacitación y actividad de pausas activas y estiramiento muscular como parte del proceso preventivo del peligro biomecánico asociados al riesgo osteomuscular en las áreas administrativas y operativas, hasta el momento no se presenta ninguna patología asociada, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Relación de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

- Inspección de EPP y equipos

En el desarrollo de estas actividades se cuentan con 36 personas certificadas para labor en alturas. Anexo No. 34 control del riesgo y 40 Afiliaciones.



El día 6 de marzo del 2025, por parte de la interventoría y el área SST, se contrata el acompañamiento del profesional S.O, bombero e instructor de trabajo en altura especialista en el tema de altura, se realiza reunión con el acompañamiento de la Inspectora SST Lorena Falla y Anggie Terán, donde se revisó los sistemas de acenso, descenso, líneas de vida, equipos TA, implementadas, se impartieron las observaciones a intervenir y corregir en obra sobre la instalación y puntos de sujeción de la línea de vida, armado y uso seguro de los andamios, áreas de restricción, medidas de prevención colectiva, importancia del uso de la malla contra caída, seguridad con los huecos, orden y aseo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Reporte de Incidente:

Se reporta un incidente ocurrido por caída de objetos, el día 10 de marzo a las 7: 50 am, donde se encontraban la ingeniera auxiliar residente (interventoría) desplazándose al interior de la obra en el área trasera de esta, en ese momento desde el piso 3 también se encontraban los trabajadores realizando actividades de retiro de formaleta de la pantalla ubicada en el costado noroccidental de la edificación, al momento de retirar el tensor de uno de los alineadores, de manera accidental este se le suelta de las manos y cae al primer nivel a una distancia cercana al lugar donde ella se iba desplazando, generando perforación de la teja se zinc del techo de la oficina SST contratista. Por parte del área SST se solicita investigación y la implementación de medidas de prevención y corrección efectivas.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Imagen No. 12 y 13. Orden y Aseo en Obra	
FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025- INVESTIRGACION DE INCIDENTES	

ORDEN Y ASEO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

De manera periódica se realizan jornadas de aseo con el fin de prevenir el riesgo locativo y de esta manera prevenir caídas de los colaboradores. Desde a la interventoría se solicita el orden y aseo durante la jornada laboral y en especial donde se desempeñan actividades de altura, mantener limpio y sin obstáculos los senderos peatonales, además de identificados.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Imagen No. 14 y 15. Orden y Aseo en Obra	
<i>FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025</i>	

SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Imagen No. 16, 17 y 18. Disposición de recipientes para recolección de residuos según su clasificación, Servicios de baños para el personal de obra		
FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025		

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Se evidencia el documento de plan de atención y preparación de emergencia correspondiente a la obra con los anexos correspondientes PON (Procedimiento operativo normalizado).

Los equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra
---	---	-------------------------------

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

BRIGADA DE EMERGENCIA

La Interventoría verificó la conformado la brigada de emergencia, solicitada mediante oficio CIPZ-078-0144-2025 con las observaciones identificadas en la documentación parcial del SG-SST enviada por el Consorcio EVOLET por correo electrónico el día de 5 febrero del 2025 a interventoría. Solicitud enviada inicialmente mediante el radicado CIPZ-078-0130-2025 enciado el 21 de enero 2025.

Indicadores de Cumplimiento:

	SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR	% Capacidad de respuesta
FORMULA	$\frac{\text{Numero de emergencias atendidas oportunamente}}{\text{Numero de emergencias presentadas}} \times 100 = N.A.$
INDICADOR	% de simulacros realizados
FORMULA	$\frac{\text{Numero de simulacros efectuados}}{\text{Numero de simulacros programados}} \times 100 = N.A$

INSPECCIONES.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, la programación del plan de trabajo SG-SST para este año, las inspecciones realizadas fueron: inspección equipos de emergencia y en oficina, las cuales se relacionan en el archivo anexo al

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Imagen No. 19, 20 y 21. Equipos y materiales de emergencia		
FUENTE: PROPIA- INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025		

informe. no se relaciona los registros de las inspecciones están pendientes las inspecciones en obra, EPP, de orden y aseo.

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025.

Anexo 7. Informe mensual del periodo del 26 febrero al 25 de marzo de 2025 del contratista de obra

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"



Documento
Versión 1

[illegible][illegible]

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"



Documento
Versión 1

[illegible][illegible][illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

En el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de losa de cimentación, columnas, pantallas y losas de entrepiso N°1(0.00+3.70), los cuales presentaron resultados que son objeto de la siguiente evaluación.

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de la losa superior de cimentación, de interventoría.

RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	RESISTENCIA	RESISTENCIA MINIMA	Evolución	Promedio	RESISTENCIA PROMEDIO
PSI /Mpa	DIAS	PSI /Mpa	PSI /Mpa	%	%	PSI /Mpa
4000/27.58	99	4282/29.52	3600/24.08	107.0	106.5	4257.25/29.37
4000/27.58	99	4215/29.1	3600/24.08	105.4		
4000/27.58	94	4257/29.35	3600/24.08	106.4		
4000/27.58	94	4275/29.5	3600/24.08	106.9		

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas entrepiso 1, de interventoría.

RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	RESISTENCIA	RESISTENCIA MINIMA	Evolución	Promedio	RESISTENCIA PROMEDIO
PSI /Mpa	DIAS	PSI /Mpa	PSI /Mpa	%	%	PSI /Mpa
4000/27.58	70	4112/28.35	3600/24.08	102.8	104.23	4169.33/28.75
4000/27.58	70	4145/28.6	3600/24.08	103.6		
4000/27.58	68	4120/28.41	3600/24.08	103.0		
4000/27.58	68	4139/28.5	3600/24.08	103.5		
4000/27.58	66	4152/28.63	3600/24.08	103.8		
4000/27.58	66	4348/30	3600/24.08	108.7		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de la losa superior de cimentación, del contratista de obra

RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	RESISTENCIA	RESISTENCIA MINIMA	Evolución	Promedio	RESISTENCIA PROMEDIO
PSI /Mpa	DIAS	PSI /Mpa	PSI /Mpa	%	%	PSI /Mpa
4000/27.58	28	6439/44.4	3600/24.08	161.00	161.00	6439/44.4

Al comparar los resultados del contratista de obra con los de la interventoría, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos mínimos para aceptación.

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas entrepiso 1, del contratista de obra.

RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	RESISTENCIA	RESISTENCIA MINIMA	Evolución	Promedio	RESISTENCIA PROMEDIO
PSI /Mpa	DIAS	PSI /Mpa	PSI /Mpa	%	%	PSI /Mpa
4000/27.58	8	4724/32.6	3600/24.08	118.1	131.2	5248,2/36.2
4000/27.58	14	5305/36.6	3600/24.08	132.6		
4000/27.58	14	5521/38.1	3600/24.08	138.0		
4000/27.58	15	5555/38.3	3600/24.08	138.9		
4000/27.58	16	5136/35.4	3600/24.08	128.4		

Al comparar los resultados del contratista de obra con los de la interventoría, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos mínimos para aceptación.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c .

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c , sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las apartes .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Anexo 8. Resultados resistencia concreto CONTRATISTA

Anexo 9. Resultados resistencia concreto INTERVENTORÍA

8. CONCLUSIONES

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de marzo de 2025 del 19.78% por valor de \$6.423.343.071 frente un avance programado del 19.06%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025 es de 3.58% frente a un avance programado del 2.86%.

Se presenta acta de cobro parcial No 1, por valor de \$4.113.300.273, correspondiente al 12.67% del valor contractual, con corte al 14 de marzo de 2025.

Se amortiza \$1.233.990.082 del anticipo del contratista de obra mediante el acta parcial de obra No 1.

El contrato de interventoría, factura en igual porcentaje por lo facturado del contrato de obra, por lo cual el acta parcial No 1 de es de \$162.183.000, con corte al 14 de marzo de 2025.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

En el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025, se realizó el suministro e instalación de aceros para el entrepiso N+7.60 al N+11.50 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10.

Se realizó la instalación de aceros para las vigas y losa del entrepiso N+11.50, así mismo se instaló los joist correspondientes.

Se realizó el suministro e instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, la losa y vigas de entrepiso N+7.60 al N+11.50

Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo en cuenta el procedimiento indicado en el aparte C.5.6. EVALUACION Y ACEPTACION DE CONCRETOS DE LA NSR 10

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando.

Ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 13	Documento Versión 1

Teniendo en cuenta que se presentó una actualización del PMA a la fecha, la cual se consideró apropiada, se tienen algunas actividades pendientes de seguimiento toda vez que es necesario el periodo de transición para implementarlas, entre esas se encuentran las actividades del programa "PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS".

En general, se concluye que la ejecución del PMA para el presente periodo transcurrió en condiciones normales sin generar impactos mayores al ambiente puesto que el contratista ha implementado las medidas necesarias para que las alteraciones al ambiente previstas en la ejecución del proyecto, sean mitigadas y tengan el menor efecto posible.

Se han acatado todas las observaciones realizadas en informes anteriores respecto del componente ambiental y del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo posible, entre otras cosas, un seguimiento más claro y una medición de cumplimiento mucho más eficiente.

Las actividades pendientes para realizar en el mes de abril quedaron consolidadas en cada uno de los programas, así como algunas observaciones para mejora en la medición de cumplimiento para informes posteriores.

**ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTA DE
OBRA**



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-44-101279178	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 04 2024	22 03 2024		00:00	22 11 2030		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO 8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO

PÓLIZA APROBADA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	23/03/2026	\$6,494,785,713.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	23/11/2028	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/03/2024	23/03/2026	\$9,742,178,570.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$3,247,392,856.90	\$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA PÓLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA DESDE 22/11/2025	VIGENCIA HASTA 22/11/2030	SUMA ASEGURADA \$3,247,392,856.90
--	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ **21,108,053,569.85	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-40-101051477	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 04 2024	22 03 2024		00:00	22 11 2030		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO:
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS
VIGENCIAS DE ESTA PÓLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IIVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,623,696,428.45	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO				COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101051477		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 04 2024			22 03 2024			00:00	22 11 2030			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO EVOLET						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4					
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA			TELÉFONO: 3043935212		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142			CIUDAD: POPAYAN, CAUCA		TELÉFONO: 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/03/2024	22/11/2030	\$1,623,696,428.45	\$1,623,696,428.45

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101279178		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 03 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 11 2030		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO EVOLET		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 3043935212	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10'N - 142		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 8234508	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO

CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

IDENTIFICACION

19289121-3

10301884-2

900552695-1

PARTICIPACION

45.00

45.00

10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101051477		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 03 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 11 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO EVOLET		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 3043935212	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 8234508	
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225433A

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101279178		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
29 12 2023			27 12 2023			00:00	27 08 2030			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EVOLET								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4			
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA			TELÉFONO: 3043935212		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			IDENTIFICACIÓN		NIT: 891.580.002-5				
DIRECCIÓN:		KR 6 NRO. 10 N - 142		CIUDAD:		POPAYAN, CAUCA		TELÉFONO		8234508	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OFICINA JURÍDICA
12 9 DIC 2023
Sergio
[Firma]

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	27/12/2025	\$6,494,785,713.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/08/2028	\$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	27/12/2025	\$9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	* SI AMPARO 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *169,046,816.00	\$ *****25,000.00	\$ **32,123,645.00	\$ *****201,195,461.00	\$ ***21,108,053,569.85	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



[Firma]
FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101051477		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 12 2023			27 12 2023			00:00	27 08 2030			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO EVOLET	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 BN 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-6
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	\$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	\$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	\$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

IDENTIFICACION PARTICIPACION
19289121-3 45.00
10301884-2 45.00
900552695-1 10.00

12 9 DIC 2023
PÓLIZA APROBADA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **27,080,142.00	\$ *****25,000.00	\$ ***5,149,977.00	\$ *****32,255,119.00	\$ ****1,623,696,428.45	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



José B. Hernández

FIRMA TOMADOR

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÔNICO
PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187

ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA		POPAYAN DELEGADA		COD AGENCIA		403 RAMA 47	
TIPO DE MOVIMIENTO		EXPEDICION		TIPO DE IMPRESION		IMPRESION	
				DIA		MES	
				01		02	
				AÑO		2024	
				DIA		MES	
				01		02	
				AÑO		2024	
				FECHA DE EXPEDICION		FECHA DE IMPRESION	
NOMBRE		CONSORCIO INTERSALUD PZ		DATOS DEL AFIANZADO			
DIRECCION		CL 11 # A 16 BRR SAN CAMILO		CIUDAD		POPAYAN, CAUCA	
				IDENTIFICACION		NIT	
				901.794.710-6			
				TELEFONO		3016192419	
ASEGURADO		HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E		DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO		HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E		IDENTIFICACION		NIT	
				891.580.002-5			
				IDENTIFICACION		NIT	
				891.580.002-5			
				AMFAROS			
CIRCO DE NEGOCIO		CONTRATO DE INTERVENTORIA					
DESCRIPCION		AMFAROS		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
CONTRATO							
		CUMPLIMIENTO		01/02/2024		01/04/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		01/02/2024		01/10/2028	
		CALIDAD DEL SERVICIO		01/02/2024		01/12/2029	
BENEFICIARIOS							
NIT 89180002		- HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E					
						SUMA ASEGURADA	
						756,082,406.00	
						64,020,601.50	
						256,032,406.00	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENIORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 076 DE 2024, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023".

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

HOSPITAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.U.
OFICINA JURÍDICA

FD-1 FEB 2024

REVISOR GERENTE O ASESOR JURIDICO

PÓLIZA APROBADA

NOME IN ITALIANO
 ERIC DEL SOCORPO VIVAS RODRIGUEZ

GASTOS EXPEDICION.
*****15,000.00

14

TOTAL A PAGAR

NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO

2007

VALOR ASEGURADO

[illegible]

DE ACUERDO CON EL ART. 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CURRERE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano • Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá • Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 • Celular: 312 342 8229 • Correo electrónico: defensordelconsumidor@gmail.com
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

FIRMA TOMADOR

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIO/93.- REGIMEN COMUN.- ACTIVIDAD ECONOMICA 6001.- ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA**

COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESIÓN**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO INTERSALUD PZ**
DIRECCIÓN: **CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**
TELÉFONO: **3016192419**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E**
BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E**

IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**
IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	22/05/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	22/11/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	22/11/2030	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL"

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***576,185,413.50	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	TOTAL PAGAR \$ *****0
---	----------------------------------	---	---------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	CLAVE 5932	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO PARTE
--	----------------------	------------------------	--

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIDAD ME SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES. POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/via_digital/client/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD-ASPX>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CADB25790606F5785B

CLIENTE

NOV 19 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

RECEIVED
NOV 19 1964
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

TO : DIRECTOR, FBI (100-371091)
FROM : SAC, NEW YORK (100-100000) (P)
SUBJECT: [Illegible]

[Extremely faint and mostly illegible body text consisting of several paragraphs of a memorandum format.]

RE: [Illegible]
[Illegible]
[Illegible]

RECEIVED
NOV 19 1964
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535



[Illegible text at the bottom left corner.]

ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1415205012	9484699724	Y	2025/04/03	2025/04/16	BANCOLOMBIA	13	\$399,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																													
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																				
1	CC	66785383	ANGULO AGUDELO AIXSA																		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0		\$0	\$0	No	\$99,100																	
2	CC	1061817104	ORDÓÑEZ CORTES ANGELICA																		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0		\$0	\$0	No	\$99,100																	
3	CC	76313467	PERAFAN LEDEZMA JESUS EDINSON																		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0		\$0	\$0	No	\$99,100																	
4	CC	1061791956	PROAÑO MUÑOZ MICHELLE VANNESSA		X																0		\$0	\$0		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0		\$0	\$0	No	\$99,100																	
Total Afiliados(4)																								\$0	\$0				\$0	\$0				\$0	\$0				\$0	\$0				\$0	\$0				\$0	\$0				\$5,694,000	\$396,400			\$0	\$0		\$396,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1415205012	9484699724	Y	2025/04/03	2025/04/16	BANCOLOMBIA	13	\$399,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$396,400	\$3,400	\$0	\$399,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$396,400	\$3,400	\$0	\$399,800
TOTAL				4	\$396,400	\$3,400	\$0	\$399,800

ANEXO 4. ACTAS DE COMITE TECNICO MARZO 2025

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



ACTA DE COMITÉ N°41							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024							
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023							
DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN			
07	03	2025	8:29 A.M.	9:30 A.M.			
ASISTENTES							
NOMBRE		CARGO/ENTIDAD	NOMBRE		CARGO/ENTIDAD		
Isabel Cristina Giraldo		Representante Legal Consortio Evolet	Michelle Vannessa Proaño		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Carlos Alberto Córdoba		Contratista de Obra Consortio Evolet	Jesús Edinson Perafan		Residente de interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Gerardo Cruz Jiménez		Apoyo a la supervisión HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes		Interventoría Consortio Intersalud PZ.		
Juan Francisco Mora		Supervisor HUSJ	Marco A. Velasco Mejía		Apoyo a la supervisión HUSJ		
José Geovaire Ausecha		Residente de Obra Consortio Evolet	Valentina Callejas Gaviria		Contratista de Obra Consortio Evolet.		
Yolanda Lopez		Coordinadora de Infraestructura HUSJ					
TEMAS TRATADOS							
TEMAS			RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
				SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.					X		
2. Se inicia el presente comité N°41 a las 8:29 a.m. La interventoría manifiesta que realizará una presentación para contextualizar a los asistentes sobre las actividades de obra realizadas realizadas en la semana. La presentación inicia con un recuento de los contratos vinculados al proyecto que son, contrato de obra N°358 2023 y contrato de interventoría N°078 2024. Seguidamente menciona la capacidad instalada del proyecto y se relaciona los permisos y tramite surtidos por el contratista. En cuanto al avance financiero se menciona que el 25 de octubre el Hospital San José de Popayán realizó el desembolso total a titulo de anticipo por un valor de \$9.742.178.571 correspondiente al 30% del valor total del contrato de obra. Por otro lado, se menciona que, a la fecha no se ha realizado el cobro de ningún acta parcial de ninguna de las dos partes, dado que, la interventoría esta sujeta al avance de obra y al acta que presente el contratista. Se informa un avance físico programado y ejecutado actual de 16.77% que corresponde a \$5.445.000.000 aproximadamente.					X		

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”






Durante el período comprendido entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: fundición de la losa de entrepiso del nivel +7.60, correspondiente al tercer piso; localización de columnas y pantallas de dicho entrepiso; armado del acero de refuerzo para las columnas y pantallas del tercer piso; armado de formaletas para dichas columnas y pantallas; y suministro de vigas joist para la losa del cuarto piso. Las actividades realizadas durante el transcurso de la obra han sido las obras de acceso posterior, reubicación del alcantarillado pluvial, reubicación de las redes de acueducto, reubicación de la red sanitaria, localización y replanteo de la obra arquitectónica, excavación de plataforma de trabajo, mejoramiento de la plataforma de trabajo de cimentación, la construcción de los pilotes en concreto reforzado, la construcción de la losa de cimentación en concreto reforzado, la construcción de pantallas y columnas del nivel 1, construcción de losa y vigas del entrepiso del nivel 1, construcción de columnas, pantallas y losas y vigas del nivel 2, igualmente para el nivel 3 se ha realizado la construcción de losas y vigas del entrepiso y la construcción de columnas y pantallas del entrepiso 3.					
3. Por otro lado, la interventoría expone la presentación que llevara a cabo en la mesa técnica del 13 de marzo con el Ministerio de Salud y Protección social. En virtud de lo anterior, la supervisión recomienda realizar la presentación de una forma dinámica y puntual. La interventoría recomienda que, en la mesa técnica del 13 de marzo 2025, tanto como entidad, contratista y consultoría realicen el acompañamiento con su respectivo equipo técnico, dado que, se pueden presentar solicitudes y/o observaciones que no son de su alcance.	Entidad Contratista	X		13/03/2024	
4. Respecto al suministro provisional de energía, se informa que, a la fecha, el contratista de obra se encuentra a la espera de la autorización por parte de la entidad para continuar conectado a la red eléctrica del hospital, implementando un contador independiente, mientras se tramita la conexión definitiva con la Compañía Energética de Occidente.	Entidad	X		14/03/2025	
5. En cuanto al mantenimiento vías provisionales se informa que, el contratista dio respuestas mediante oficio EV-C358-23-0290-25 del 03 de marzo del presente, donde manifiesta	Contratista	X		14/03/2025	

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



que realizará el mantenimiento entre el 10 y el 14 de marzo de 2025.					
6. En relación con la tasación de la presunta multa, la interventoría informa que procedió a dar respuesta a la entidad mediante el oficio CIPZ-078-0171-2025, en el cual se presentaron las justificaciones y apreciaciones correspondientes. Se enfatiza que la decisión de efectuarla será exclusivamente en la entidad.	Entidad	X		A consideracion	
7. Con respecto al plan de contingencia, se informa en el acta de comité anterior se manifestaron las actividades que el contratista de obra ha realizado a la fecha. Por otro lado, la interventoría mediante oficio CIPZ-078-0149-2025 se solicitó al contratista de presentara las justificaciones correspondientes en cuanto al por que no ha ejecutado algunas de las actividades del plan, de lo cual a la fecha aun no ha dado respuesta.	Contratista	X		14/03/2025	

	CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023 Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024	
OBJETO DE LA REUNION: Comité Técnico # 41		FECHA: 7/03/2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Michelle Vanessa Proano M	C. Integral P2	Rep legal	integralp2@gmail.com	
2	Juan Manuel grande R.	Acusj	3er Jurado	juridico@acusj.gov	
3	Marco A Velasco Mejia	HUSJ	Apoyo Infraestructura	coemarvel@gmail.com	
4	GERARDO GUTIERREZ	HUSJ	APOYO SERVICIOS	gerardogutierrez1974@gmail.com	
5	Juan Francisco Flores O	H.U.S.J	Supervisor	—	
6	José Luis Gutierrez	Evolet	R legal	—	
7	Carlos A Cordoba	Consorcio Evolet	R Legal Suplente	consorcioevolet@gmail.com	
8	José F. Rivas	Consorcio Integral P2	Residencia Interventoría	consorciointegralp2@gmail.com	
9	YOLANDA LOPEZ C	HUSJ	COORD. INFRA	mantenimiento@hospital sanjose.gov.co	
10	Valentina Calleja Garzón	Evolet	Apoyo técnico	consorcioevolet@gmail.com	Valentina Calleja
11	José Francisco Jusceda	Consorcio Evolet	RESIDENTE DE OBRA	consorcioevolet@gmail.com	
12					
13					

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



ACTA DE COMITÉ N°42						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024						
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023						
DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO		HORA DE FINALIZACIÓN	
21	03	2025	8:40 A.M.		9:15 A.M.	
ASISTENTES						
NOMBRE		CARGO/ENTIDAD		NOMBRE		
Isabel Cristina Giraldo		Representante Legal Consortio Evolet		Michelle Vannessa Proaño		
Carlos Alberto Córdoba		Contratista de Obra Consortio Evolet		Jesús Edinson Perafan		
Gerardo Cruz Jiménez		Apoyo a la supervisión HUSJ		Marco A. Velasco Mejía		
Juan Francisco Mora		Supervisor HUSJ		Valentina Callejas Gaviria		
Juan Manuel Legarda		Jefe Jurídico HUSJ		Alberto Peña		
José Geovaire Ausecha		Residente de Obra Consortio Evolet				
TEMAS TRATADOS						
TEMAS		RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
			SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.						
2. Se inicia el presente comité N°42 a las 8:40 a.m. La supervisión informa que se iniciará el comité con los siguientes puntos en la agenda: primero, avance de obra; segundo, ajustes a los diseños de consultoría; tercero, tema de la red de media tensión; cuarto, respuesta solicitada para integrar el requerimiento del Ministerio de Salud; y quinto, oficio de solicitud de la entidad al contratista para nuevos frentes de obra. Por otra parte, la supervisión informa que se recibió la documentación remitida por el contratista de obra y la interventoría, correspondiente a la respuesta al oficio 2024232002016871 del Ministerio de Salud y Protección Social. Dicha documentación fue enviada ayer a la Secretaría de Salud Departamental para su revisión y emisión de concepto. Una vez obtenido este último, se procederá a remitirla al Ministerio. Primero , respecto al porcentaje de avance de obra, la interventoría informa que, se lleva un avance programado acumulado de 19.02% y un ejecutado acumulado de 19.61%. En este contexto, la supervisión informa que, según lo manifestado por el Ministerio, la ejecución del proyecto debió iniciar inmediatamente tras la firma del acta de inicio. Sin						



embargo, se enfatiza que, tanto en la viabilidad del proyecto como en el acta de inicio quedo consignado que, el inicio de la ejecución dependía de la emisión de los respectivos permisos.

La interventoría informa que, mediante el oficio CIPZ-078-0180-2025, se presentó la respuesta al oficio N° 104, de fecha 17 de marzo del presente año, remitido por la entidad, relacionado con un presunto incumplimiento. En dicha respuesta, se argumenta que el avance de una obra no se mide linealmente, sino en función del cronograma pactado entre las partes. Asimismo, se adjuntó un informe detallado que consigna el desarrollo de las obligaciones del contratista e interventoría, en concordancia con las condiciones de viabilidad del proyecto establecidas por el Ministerio. Se subraya que la entidad, considerando las condiciones de viabilidad emitidas por el Ministerio, incluyó en el contrato de obra la condición de que el inicio de las obras estaría sujeto a la obtención de los permisos correspondientes.

Por otra parte, el contratista de obra menciona que, en la mesa técnica presencial realizada en el ministerio, la jurídica de este, mencionaba que, ellos no tenían conocimiento frente al tema de la fecha que se inició la ejecución de la obra, es por ello, ellos asumían que la obra había iniciado su ejecución física desde la firma del acta de inicio. Sin embargo, manifiesta que, si a ellos como ministerio les presentan un panorama detallado donde se evidencie que la ejecución inicio a partir de la expedición de la licencia, se evaluaría y se tendría en cuenta para la verificación del avance en ejecución.

Segundo, en relación con los diseños de consultoría del proyecto, la supervisión informa que, el contratista ha solicitado, mediante oficios, información sobre los diseños eléctricos. La supervisión indica que ya se remitió la solicitud al contratista y, adicionalmente, se requirió información a la interventora del contrato de consultoría. Además, menciona que, será convocado el consultor a los comités posteriores para resolver las diferentes dudas.

Tercero, con respecto al tema de red de media tensión, la supervisión convoca mesa técnica para el miércoles 26 de marzo del presente a las 8:30 a.m., en las instalaciones del hospital, donde se convocará a la consultoría del proyecto.

Cuarto, en relación a la respuesta solicitada por la entidad a la interventoría para integrar la respuesta al requerimiento del Ministerio de Salud enviado mediante oficio del 20 de diciembre 2025, la interventoría informa que, se dio respuesta el día de hoy mediante oficio CIPZ-078-0180-2025.

Quinto, para este punto el contratista informa que, se ha dado inicio a la ejecución de la instalación hidrosanitaria para el primer piso. Asimismo, indica que se ha recibido material para comenzar con los trabajos de mampostería.

Entidad
Consultoría

X

28/03/2025

Entidad
Contratista
Interventoría
Consultoría

X

26/03/2025
8:30 a.m.

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.”



3. En relación al suministro provisional de energía, se informa que, a la fecha, el contratista de obra se encuentra a la espera de la autorización por parte de la entidad para continuar conectado a la red eléctrica del hospital, implementando un contador independiente, mientras se tramita la conexión definitiva con la Compañía Energética de Occidente. En respuesta, la supervisión se compromete a dar respuesta al contratista el día de hoy.	Entidad HUSJ	X		21/03/2025	
4. Por otro lado, el contratista solicitó la disponibilidad de espacio en el parqueadero para el almacenamiento de materiales de obra. En respuesta, la supervisión aprueba el uso del espacio, condicionado a la recepción de un oficio de solicitud formal por parte del contratista, para proceder con la autorización correspondiente.	Contratista	X		28/03/2025	



CONSORCIO
EVOLET

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN- INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."
Contrato de interventoría N.078 del 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comité de Obra N° 42

FECHA: 21/03/2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Juan Francisco Mora Obando	H.U.S.J	Subgerencia. SUPERVISOR	—	
2	Marco Antonio Velasco Mejia	HUST	Apoyo Infraestructura	coemavet@gmail.com	
3	GERARDO CUE J.	HUST	APoyo SUPERVISOR	gerardocuej@gmail.com	
4	Carlos A. Cordoba	Consortio Evolet	Rh Suplente	consorcioevolet@gmail.com	
5	Jesús E. PERAZAN L	CONSORCIO INTERMEDIO PZ	Residente INTERVENIENDO	residenciamintermedios@gmail.com	
6	Michelle V. Pantoja M	C. Intersalud PZ	Rep legal	intersaludpz@gmail.com	
7	Juan Giraldo	Evolet	R. legal		
8	José Gerardo Auscedo	Consortio Evolet	Residente de obra	consorcioevolet@gmail.com	
9	Valentina Calleja Gaviria	Consortio Evolet	Apoyo técnico	consorcioevolet@gmail.com	Valentina Calleja G.
10	ALBERTO PENA L	CONSORCIO EVOLET	APoyo Técnico	alberto.penera@gmail.com	
11	Jim Manuel Legado L	HUST	JEFE Líder	integro@hust.com	
12					
13					

**ANEXO 5. TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA
CRUZADA MARZO 2025**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: mar-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
4/03/2025	CIPZ-078-166-2024	RESPUESTA OFICIO INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
5/03/2025	CIPZ-078-167-2024	RESPUESTA MESA TECNICA MINISTERIO DE SALUD	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
5/03/2025	CIPZ-078-168-2024	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
5/03/2025	CIPZ-078-169-2024	RESPUESTA REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO VIAS PROVISIONALES 20 FEBRERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
6/03/2025	CIPZ-078-170-2024	RESPUESTA ACLARACION SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
6/03/2025	CIPZ-078-171-2024	RESPUESTA A OFICIO 104 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025 - TASACIÓN PRESUNTA MULTA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
7/03/2025	CIPZ-073-172-2024	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL - INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: mar-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
14/03/2025	CIPZ-078-173-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0299-25 EVOLET – USO DE RED MEDIA TENSION AÉREA EN PREDIOS DEL HUSJ PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: mar-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
14/03/2025	CIPZ-078-174-2024	Cumplimiento de solicitud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
14/03/2025	CIPZ-078-175-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0299-25 EVOLET – USO DE RED MEDIA TENSION AÉREA EN PREDIOS DEL HUSJ PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
14/03/2025	CIPZ-078-176-2024	CONVOCATORIA A REUNIÓN – USO DE RED DE MEDIA TENSION EN PREDIOS DEL HUSJ.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
15/03/2025	CIPZ-078-177-2024	OBSERVACIONES AL PMA – INFORMES MENSUALES DE DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
17/03/2025	CIPZ-078-178-2024	RESPUESTA A OFICIO DE LA ENTIDAD 30/01/2025 EN RELACIÓN AL OFICIO No. 2024232002016871 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
20/03/2025	CIPZ-078-179-2024	REMISION INFORME MENSUAL FEBRERO 2025 CONTRATO N°358 2023 - CONTRATO N°078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
21/03/2025	CIPZ-078-180-2024	INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
21/03/2025	CIPZ-078-181-2024	SOLICITUD DE MEJORAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: mar-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
22/03/2025	CIPZ-078-182-2024	REMISIÓN COMPROBANTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO FEBRERO 2025 CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
25/03/2025	CIPZ-078-183-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0315-25 Y REITERACION DE OFICIO EV-C358-23-0299-25 , SOLICITUD PUNTO DE CONEXIÓN ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
26/03/2025	CIPZ-078-184-2024	ENTREGA ACTA PARCIAL N°1 DE OBRA - CONTRATO N° 358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
27/03/2025	CIPZ-078-185-2024	REMISIÓN OFICIO ENTIDAD 25 MARZO 2025, CANCELACION FUNDICIÓN	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
27/03/2025	CIPZ-078-186-2024	REMISIÓN OFICIO EV-C358-23-0288-25 – SOLICITUD MEMORIAS DE CALCULO RED CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
28/03/2025	CIPZ-078-187-2024	RESPUESTA OFICIO 25 MARZO 2025 – SOLICITUD DE COMPROBANTES Y RECIBOS DEL USO DEL ANTICIPO PRESUPUESTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
28/03/2025	CIPZ-078-188-2024	REMISION OFICIO REQUERIMIENTO 25 MARZO 2025 - SOLICITUD DE COMPROBANTES Y RECIBOS DEL USO DEL ANTICIPO PRESUPUESTAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
28/03/2025	CIPZ-078-189-2024	COMPROMISOS MESA TECNICA RED DE MEDIA TENSION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024								
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
	CONSORCIO INTERSALUD PZ								
MES:		mar-25							
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
3/03/2025	EV-C358-23-288-24	3/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD MEMORIAS DE CALCULO		X		CIPZ-078-0186-2025
3/03/2025	EV-C358-23-290-24	3/02/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-0153-2025 / MANTENIMIENTO VIAS PROVISIONALES.		X		CIPZ-078-0153-2025
4/03/2025	EV-C358-23-291-24	4/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración Solicitud de detalles constructivos de los equipos de aire acondicionado - Oficio EV-C358-23-0270-25			X	
4/03/2025	N.A	4/03/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	MESA TECNICA MINISTERIO DE SALUD			X	
4/03/2025	EV-C358-23-292-24	4/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS SG-SST			X	
5/03/2025	N.A	5/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
5/03/2025	EV-C358-23-289-24	5/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Reubicación de redes eléctricas y de datos instaladas a una altura inferior a 4.20 metros en la zona del parqueadero frontal.			X	
6/03/2025	EV-C358-23-295-24	6/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Programacion de actividad de bacheo en la via de acceso a la obra- zona de ingreso al parqueadero posterior el hospital universitario san jose			X	
7/03/2025	EV-C358-23-297-24	7/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Informacion de fundicion			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024								
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
	CONSORCIO INTERSALUD PZ								
MES:		mar-25							
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
7/03/2025	EV-C358-23-0298-25	7/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
8/03/2025	EV-C358-23-0299-25	8/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Uso de red de media tensión aérea en predios del HUSJ para conexiarme del proyecto.		X		CIPZ-078-173-2024

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024								
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
	CONSORCIO INTERSALUD PZ								
MES:		mar-25							
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
8/03/2025	EV-C358-23-0300-25	8/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Liberación del piso No. 1 para inicio de instalación de redes Hidrosanitarias.		X		CIPZ-078-196-2024
14/03/2025	N.A	14/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al Oficio EV-C358-23-0299-25 sobre Uso de Red de Media Tensión en Predios del HUSJ			X	
17/03/2025	EV-C358-23-0302-25	17/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-0152-2025 REMISION OFICIO SUPERVISION 18 FEBRERO Y SOLICITUD DE INFORMACION		X		CIPZ-078-0152-2025
17/03/2025	EV-C358-23-0304-25	17/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficios con radicado CIPZ-078-0168-2025 del 05 de marzo de 2025 y CIPZ-078-0177-2025 del 15 de marzo de		X		CIPZ-078-0168-2025
18/03/2024	EV-C358-23-0303-25	18/03/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Observaciones a los Diseños Eléctricos del Hospital San José de Popayán.	X			
12/03/2024	EV-C358-23-0306-25	12/03/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de prórroga al contrato N°358 2023		X		CIPZ-078-0190-2025
14/03/2024	EV-C358-23-0307-25	14/03/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Acta parcial de obra N°1 Consorcio Evolet - Periodo 22/03/2024 al 14/03/2025		X		CIPZ-078-0191-2025
17/03/2025	N.A	17/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Presunto incumplimiento		X		
20/03/2025	EV-C358-23-308-25	20/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión soporte de consignación de rendimientos financieros correspondientes al mes de febrero 2025.				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024								
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
	CONSORCIO INTERSALUD PZ								
MES:		mar-25							
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
20/03/2025	EV-C358-23-0309-25	20/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de informe No. 4 de fiducia.			X	
21/03/2025	EV-C358-23-0311-25	21/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
21/03/2025	EV-C358-23-0310-25	21/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Informacion de fundicion			X	
22/03/2025	EV-C358-23-0310-25	22/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Actividad mejoramiento de vía de acceso a la obra.			X	
25/03/2025	N.A	25/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de explicacion sobre la cancelacion de la fundicion de concretos previstas para hoy y reprogramacion de la misma		X		
25/03/2025	EV-C358-23-0315-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración Oficio No. EV-C358-23-0299-25 y solicitud punto de conexión eléctrico.		X		
25/03/2025	EV-C358-23-0314-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Actividad de fundición de columnas y pantallas piso No. 3.			X	
25/03/2025	EV-C358-23-0312-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Cancelación de fundición de losa de entrepiso No. 3.		X		CIPZ-078-0185-2025
25/03/2025	EV-C358-23-313-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME MENSUAL No. 13 - PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025.			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024		
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"		
	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

MES:	mar-25
------	--------

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
25/03/2025	N.A	25/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE COMPROBANTES Y RECIBOS DEL USO DEL ANTICIPO PRESUPUESTAL		X		CIPZ-078-0187-2025
26/03/2025	EV-C358-23-0319-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
26/03/2025	EV-C358-23-0320-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de losa de entrepiso No. 3.			X	
26/03/2025	EV-C358-23-0321-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
26/03/2025	EV-C358-23-0322-25	26/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-0160-2025		X		CIPZ-078-0160-2025
25/03/2025	EV-C358-23-0318-25	25/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud autorización inicio de actividad de mampostería		X		
27/03/2025	EV-C358-23-0323-25	27/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
28/03/2025	EV-C358-23-0324-25	28/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
31/03/2025	EV-C358-23-0326-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024		
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"		
	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

MES:	mar-25
------	--------

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
31/03/2025	EV-C358-23-0327-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
31/03/2025	N.A	31/03/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE CONVOCATORIA A REUNION CON LOS INGENIEROS HUGO COSME Y GERMAN POLO		X		
31/03/2025	EV-C358-23-0329-24	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0188- 2025 - solicitud de comprobantes y recibos del uso del anticipo presupuestal		X		CIPZ-078-0188-2025
31/03/2025	EV-C358-23-0330-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficio CIPZ-078-0181-2025		X		CIPZ-078-0181-2025
31/03/2025	EV-C358-23-0328-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-189-2025		X		CIPZ-078-189-2025

**ANEXO 6. COMPROBANTE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS MES FEBRERO 2025**



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 7

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	17/03/2025	Fecha de Registro de la Orden:	17/03/2025	Fecha de Pago:	18/03/2025
Proveedor:	891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL			Teléfono:
Tipo de Retención:	Regimen Común			Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: PI_15519 PAGO RENDIMIENTOS FEBRERO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PI	15519	17/03/2025	124,434.99

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
124,434.99	0.00	0	124,434.99

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		124,434.99	0.00	0.00
Totales			124,434.99	0.00	0.00
Valor a Girar:					124,434.99

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202503

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	124,434.99	
25110501001	PROVEEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		124,434.99
						124,434.99	124,434.99

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 7

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL										Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
	Tpo	Clas	Cta	SCta	Obg	Ord	SOrd	Aux	Recu					
977001-GENERICO ANTICIPOS	1	0	101						21		DEVOLUCION EXCEDENTES		124,434.99	-124,434.99
TOTALES													124,434.99	-124,434.99

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

**ANEXO 7. INFORME MENSUAL CONTRATISTA
MARZO 2025**



INFORME MENSUAL 25 DE FEBRERO - 25 DE MARZO

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.”



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E

POPAYÁN-CAUCA, MARZO DE 2025

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM





TABLA DE CONTENIDOS

INFORME MENSUAL 25 DE FEBRERO AL 25 MARZO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. LOCALIZACIÓN.....	5
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.....	6
4. ESTADO DE PÓLIZAS.....	7
5. ESTADO ESTAMPILLAS.....	8
6. ESTADO DE PERMISOS Y LICENCIAS.....	8
6.1 GESTIÓN REALIZADA EN EL PERIODO.....	8
7. GESTIÓN PRÓXIMO PERIODO.....	9
8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.....	9
8.1 ACTIVIDADES SIGUIENTE PERIODO.....	20
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	20
9.1 SEGUIMIENTO FÍSICO.....	20
9.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO.....	21
10. GESTIÓN AMBIENTAL.....	21
11. GESTIÓN SST.....	67
12. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.....	
13.1 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.....	82
13.2 CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD.....	83
13.3 CONTROL DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.....	85
14. RELACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CLIMA.....	85
14.1 HORAS LLUVIAS.....	85
14.2 AFECTACIONES.....	88
15. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.....	89
16. ANEXOS.....	89





1. INTRODUCCIÓN

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E es una IPS con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo y en condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa, no reúne la capacidad para la atención de usuarios en espacios óptimos que cumplan con la normatividad, su infraestructura ofrece dificultades de acceso a los usuarios presentando incomodidad para la prestación del servicio, además no cumple con las necesidades básicas para la habilitación de servicios de salud teniendo en cuenta la Resolución 3100 de 2019. Desde su construcción, esta área física de la Institución no ha tenido el beneficio de una intervención arquitectónica que permitan prestar una atención adecuada, ni fue intervenida en el proceso adelantado de reforzamiento estructural.

Esta entidad presentó ante el Ministerio de Salud el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.”, el cual fue viabilizado y priorizado para ser ejecutado a través de recursos de la nación, los cuales fueron transferidos al Hospital Universitario San José para que iniciara el proceso de contratación

Considerando la normatividad de contratación del Hospital Universitario San José, se celebró el proceso de convocatoria pública No 004 de 2023 y se adjudicó mediante el contrato 358-2023 al CONSORCIO EVOLET del 23 de diciembre de 2023, para que adelante la construcción del proyecto de acuerdo con las condiciones viabilizadas por el Ministerio de Salud. Una vez surtido este proceso, se verificó que, para adelantar las obras contempladas en el alcance es necesario gestionar los permisos y licencias, encontrándose pendiente la licencia de construcción, permisos de la aeronáutica civil, concepto favorable Junta de patrimonio de Popayán y concepto Plan Parcial de Barrio Bolívar.





El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 10 niveles, destinado a servicios administrativos y ambulatorios, distribuidos de la siguiente forma.

NIVEL	SERVICIO	AREA (m2)
Primer piso	Servicios generales	594,11
Segundo piso	Fisioterapia	611,3
Tercer piso	Medicina especializada	631,48
Cuarto piso	Medicina especializada	642,72
Quinto piso	Medicina interna	677,47
Sexto piso	Laboratorio	516,58
Séptimo piso	Laboratorio	513,66
Octavo piso	Administrativo	517,05
Noveno piso	Administrativo	526,91
Décimo piso	Cubierta Helipuerto	69,72
Área total del proyecto (m2)		5301

Cuadro de áreas generale: Fuente ministerio de salud y protección social- concepto técnico de viabilidad

Por lo anterior y atendiendo las obligaciones contractuales se presenta **el informe mensual No. 13** del contrato de obra No 358-2023 firmado con el CONSORCIO EVOLET, en donde se relacionan las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo del **25 de febrero al 25 de marzo de 2025**.





2. LOCALIZACIÓN

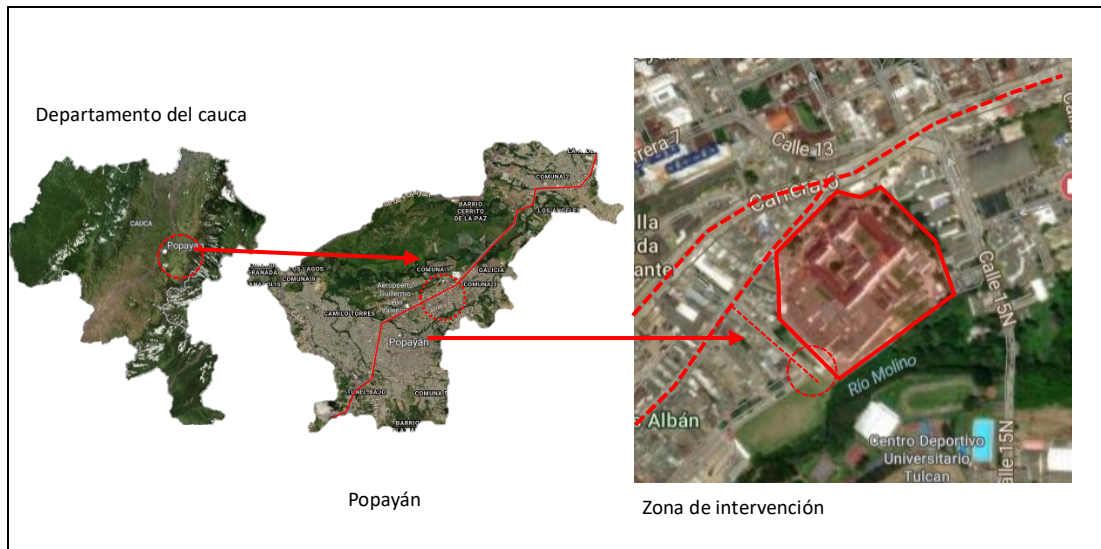


Imagen 1. Departamento del Cauca, Popayán y área a intervenir. Fuente: Maps-Bing

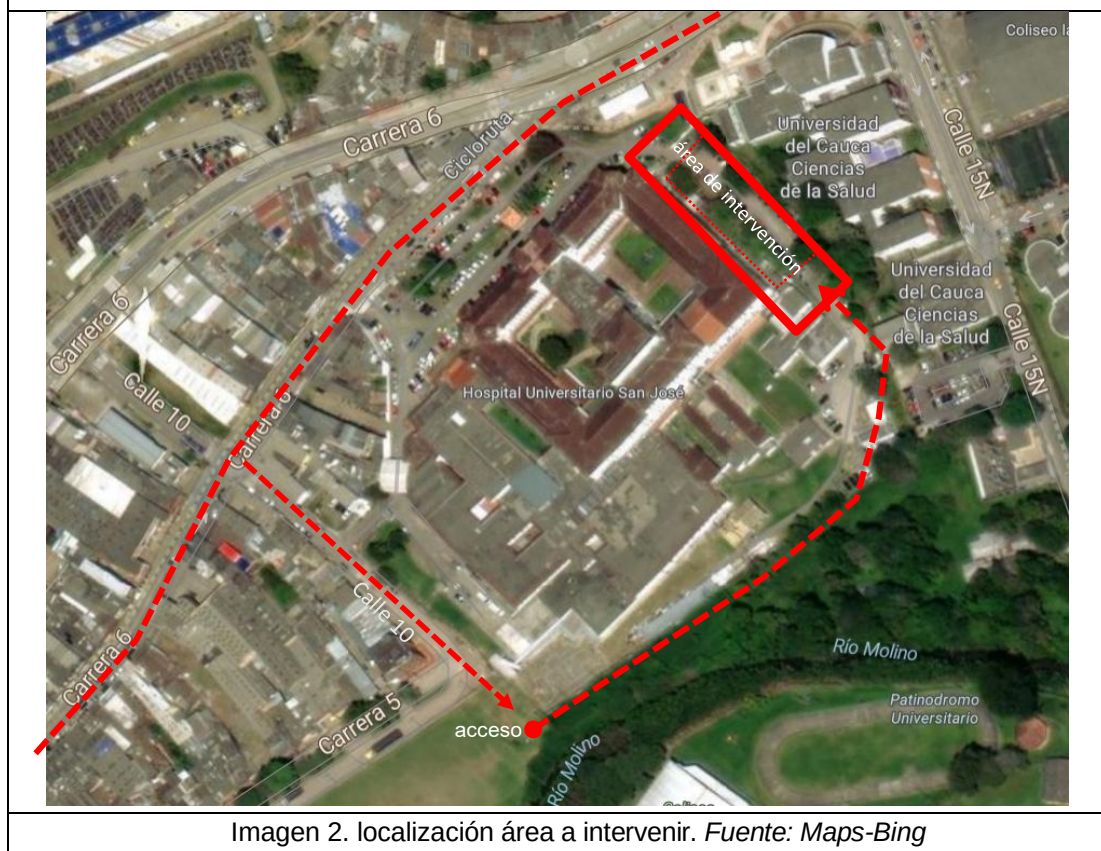


Imagen 2. localización área a intervenir. Fuente: Maps-Bing





3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

Tipo de contrato	Contrato de Obra
Contratante	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E.
Nit	891.580.002-5
Contratista	CONSORCIO EVOLET
Nit	901.784.507-4
Contrato	358 de 2023
Objeto.	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.
Fecha de Suscripción	23 de diciembre de 2023
Valor del contrato	\$ 32.473.928.569
Registro de compromiso	1348 del 27 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución del contrato	Veinte (20) meses
Fecha de inicio	22 de marzo de 2024
Fecha de terminación	22 de noviembre de 2025
% de Anticipo	30%
Valor del Anticipo	\$ 9.742.178.571 (TERCERA FORMA DE PAGO: El Hospital Universitario San José E.S.E entregará al CONTRATISTA hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción.)
Representante legal	ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE
Correos Electrónicos de Contacto	consorcioevolet@gmail.com





4. ESTADO DE PÓLIZAS.

Las pólizas originales del contrato reposan en el expediente del hospital San José, remitidas el 29 de diciembre del 2023.

FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE POLIZA	ASEGURADORA	AMPAROS	VR ASEGURADO	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA
29/12/2023	41-44-101279178	Seguros del estado S.A.	Cumplimiento	6,494.785.713.80	27/12/2023	27/12/2025
			Salarios y prestaciones	1,623.696.428.45	27/12/2023	27/08/2028
			Buen manejo	9,742.178.570.70	27/12/2023	27/12/2025
			Estabilidad y calidad de la obra	3,247.392.856.90	Si ampara 5 años	Si ampara 5 años
29/12/2023	41-40101051477	Seguros del estado S.A.	Predios laborales y operaciones	1,623.696.428.45	27/12/2023	27/08/2030
			Daño emergente y de lucro	1,623.696.428.45	27/12/2023	27/08/2030
			Prejuicios extrapatrimoniales	1,623.696.428.45	27/12/2023	27/08/2030

Las pólizas actualizadas del acta de inicio del contrato reposan en el expediente del Hospital San José, remitidas el día 22 de abril del 2024 **(Ver anexo 1)**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. DE POLIZA	ASEGURADORA	AMPAROS	VR ASEGURADO	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA
22-04-2024	4144 101279178 – Anexo 3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	6,494.785.713.80	22/03/2024	23/03/2026
			Salarios y prestaciones	1,623.696.428.45	22/03/2024	23/11/2028
			Buen manejo	9,742.178.570.70	22/03/2024	23/03/2026
			Estabilidad y calidad de la obra	3,247.392.856.90	SI AMPARA 5 AÑOS Y 0 DIAS	SI AMPARA 5 AÑOS Y 0 DIAS
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
22-04-2024	4140 101051477 – Anexo 3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Predios laborales y operaciones	1,623.696.428.45	22/03/2024	22/11/2030
			Daño emergente y lucro	1,623.696.428.45	22/03/2024	22/11/2030
			Perjuicios extrapatrimoniales	1,623.696.428.45	22/03/2024	22/11/2030
			Contratistas y subcontratistas	1,623.696.428.45	22/03/2024	22/11/2030
			Responsabilidad civil	1,623.696.428.45	22/03/2024	22/11/2030
			Vehículos propios y no propios	1,623.696.428.45	22/03/2024	22/11/2030





5. ESTADO ESTAMPILLAS.

El 13 de marzo de 2024 se realiza el pago de las estampillas procultura por un valor de \$ 162.370.000 y fue remitido el respectivo soporte al Hospital Universitario San José para que fueran incorporados al expediente contractual. Con el cumplimiento de este pago, el contrato cumple con los requerimientos establecidos por la entidad contratante para el perfeccionamiento del contrato. **(Ver anexo 2).**

6. ESTADO DE PERMISOS Y LICENCIAS.

6.1 GESTIÓN REALIZADA EN EL PERIODO

A continuación, se relaciona las gestiones y los trámites realizados durante el periodo de marzo 2024 hasta el 10 de septiembre del 2024:

GESTIONES Y TRAMITES DE LICENCIAS	
TRÁMITE	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE
1. Concepto límite de altura , aprobado mediante radicado 2024251060008680 id 1266434.	04 de marzo de 2024.
2. Derogación del Plan Parcial del Barrio Bolívar , aprobado mediante decreto No. 20241000001135	16 de abril de 2024.
3. Concepto junta de patrimonio , aprobado mediante resolución 20241900037254.	21 de mayo de 2024.
4. Permiso de ocupación temporal para el acceso de la zona posterior del Hospital Universitario San José , aprobado mediante resolución No. 20241110238781	06 de junio de 2024.
5. Programa de manejo ambiental RCD , emitido mediante concepto ambiental SGA-6382-2024.	18 de junio de 2024.
6. Plan de manejo de tráfico , aprobado mediante resolución No. 20241500050244	26 de junio de 2024.
7. Aprovechamiento forestal árbol de Guayacán , aprobado mediante resolución No. DTC 700-10-2024	10 de julio de 2024.
8. Procedencia de Trámites Ambientales "helipuerto" , emitido mediante concepto ambiental SGA-11732-2024	29 de julio de 2024
9. Permiso de construcción Helipuerto , aprobado mediante resolución No. 01537	29 de julio de 2024.
10. Licencia de construcción , aprobada mediante resolución No. CU2-24-0384	10 de septiembre de 2024.





7. GESTIÓN PRÓXIMO PERIODO

En el marco de las obligaciones contractuales del proyecto, informamos que, se da cumplimiento en su totalidad a las gestiones, licencias y permisos necesarios para su ejecución. Hasta la fecha, no ha sido necesario realizar gestiones adicionales. No obstante, si durante el proceso de ejecución surge la necesidad de tramitar algún permiso o licencia adicional, se procederá a gestionarlo de manera adecuada y oportuna, garantizando así el desarrollo y la correcta ejecución del proyecto conforme a la normativa vigente.

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.

A continuación, se describen las diferentes acciones emprendidas en el período del 20 de febrero hasta el 20 de marzo de 2025, correspondiente al presente informe

- Localización y replanteo
- Armado de acero para columnas y pantallas - Nivel +7.60
- Instalación de formaleta para columnas y pantallas - Nivel +7.60
- Fundición de columnas y pantallas - Nivel +7.60
- Entarimado para losa de entrepiso - Nivel +11.50
- Armado de acero de refuerzo para vigas - Nivel +11.50

Las actividades mencionadas se han desarrollaron según los planos y parámetros considerados en el diseño, además de las condiciones propias del sitio de la obra. Así mismo, se contó con la presencia permanente del Residente de Obra; aprobado por la interventoría y supervisión, quien revisa que las actividades se estén realizado de acuerdo con los diseños estructurales aprobados por curaduría.

La ejecución de estas actividades se realizó, considerando el cumplimiento de los procedimientos constructivos, de tal forma que se controlan en sitio las acciones necesarias para la organización de materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramientas menores, cargue de material, flujo de volquetas y demás operaciones constructivas para la gestión de obra.





8.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Localización y replanteo

En el marco de las actividades constructivas y de cimentación del proyecto, se realizaron trabajos topográficos a lo largo del periodo, divididos en distintas etapas.

Actividades de localización y replanteo

- ✓ Localización y replanteo de ejes:
Se iniciaron los trabajos de localización y replanteo de los ejes en el entrepiso 2, fundamental para establecer la ubicación de los ejes de la estructura

Los puntos localizados incluyeron los ejes A, A' B, C, D, E, 1, 1', 2, 3, 4, 5 y 6. Para realizar este proceso, se utilizó un taladro para la perforación e instalación de puntillas en cada punto. Posteriormente, se demarcó cada punto con pintura roja en aceite, trazando un círculo alrededor de cada puntilla.
- ✓ Localización de referencias para pantallas y columnas:
Se llevó a cabo la localización de las referencias para las pantallas y columnas, las cuales fueron materializadas sobre la losa de concreto del tercer piso. La demarcación de los puntos se realizó con pintura azul en aceite, trazando un círculo alrededor de cada puntilla.
- ✓ Localización de vigas de entrepiso:
Se localizaron los puntos de las vigas de entrepiso, según lo indicado en los planos de diseño. Este proceso garantizó la ubicación y alineación de cada uno de los elementos estructurales.
- ✓ Se establecieron niveles para monitorear y registrar la trazabilidad de los asentamientos, permitiendo un seguimiento de su evolución y posibles variaciones.





REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	
• Se realizó la localización y replanteo de ejes. • Se establecieron niveles para llevar control de asentamientos.	• Se realizó la localización de elementos estructurales, vigas columnas y pantallas.
FUENTE: PROPIA	

Armado de acero para columnas y pantallas

Una vez preparada el área de trabajo y verificada la correcta localización de las columnas y pantallas, se procedió al armado e instalación del acero de refuerzo, siguiendo las especificaciones y planos del proyecto. El proceso comenzó con la colocación de las barras principales (varillas longitudinales) en las ubicaciones correspondientes, conforme al diseño estructural establecido, posteriormente, se procedió a la instalación de los estribos (barras transversales) a lo largo de la pantalla, respetando los espaciamientos indicados en los planos. Durante todo el proceso, se realizó una inspección continua para garantizar que todos los elementos





estuvieran correctamente aplomados, alineados y ajustados a las especificaciones técnicas, asegurando así la calidad y la integridad de la estructura.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	
• Se verificó la localización de las columnas y pantallas. • Se realizó el amarre de acero principal.	• Se realizó el amarre de acero de estribos en acero de ½”.
FUENTE: PROPIA	

Instalación de formaleta para columnas y pantallas

Se procede a la instalación de la formaleta para las pantallas y columnas, asegurando el cumplimiento de las especificaciones de diseño en cuanto a nivelación, alineación y recubrimiento mínimo del acero de refuerzo.

El proceso comienza con la marcación los ejes y la ubicación de los elementos estructurales sobre la superficie de la losa, utilizando herramientas de topografía y referencias de los planos de diseño.






Posteriormente, se instalan pines anclados al concreto de la losa, los cuales sirvieron como soporte para fijar los tableros de la formaleta. Los tableros se ensamblaron y se aseguraron entre sí utilizando chapetas, verificando que las juntas estuvieran selladas para evitar filtraciones durante el vaciado del concreto.

Para mantener los tableros en la posición correcta, se instalaron alineadores que aseguró la estabilidad y alineación. Adicionalmente, se instalaron gatos a 45 grados, fijados a la estructura existente.

Una vez instalada la formaleta, se realizó una revisión, y el proceso de plomado, asegurando la verticalidad del elemento, usando hilo y escuadras para verificaciones complementarias, este proceso se realizó en conjunto con la interventoría, verificando que cada elemento estuviese en la posición correcta.


Finalmente, antes de proceder con la fundición, se aplicó desmoldante en las caras internas de la formaleta para facilitar su retiro después del fraguado del concreto.

DESPIECE PANTALLAS Y COLUMNAS

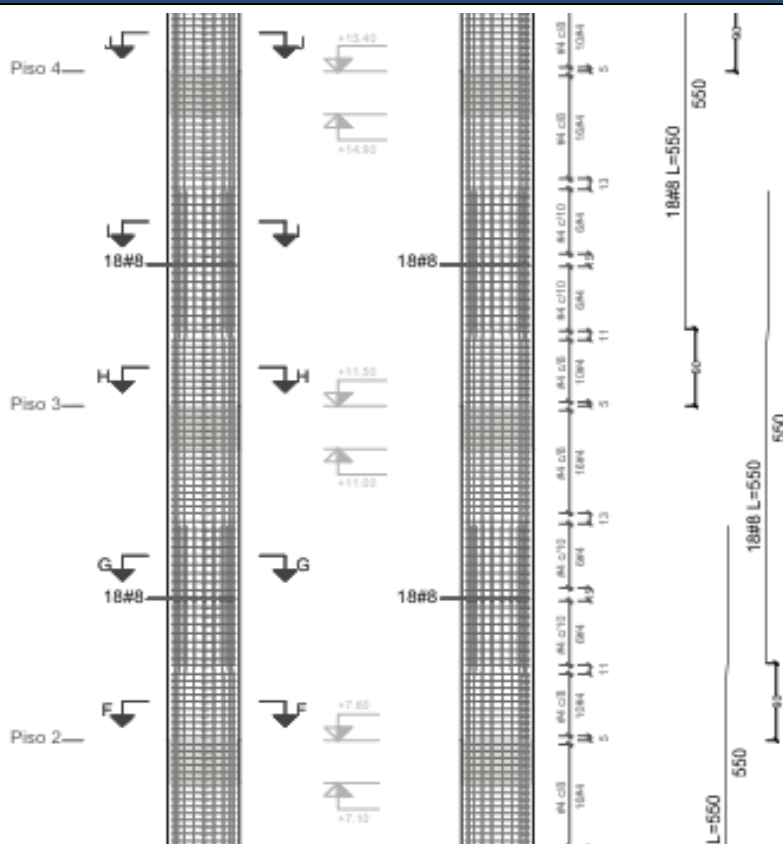

ADJUNTO EN EL **ANEXO 3** SE ENCUENTRAN LOS PLANOS DE DETALLE DE COLUMNAS



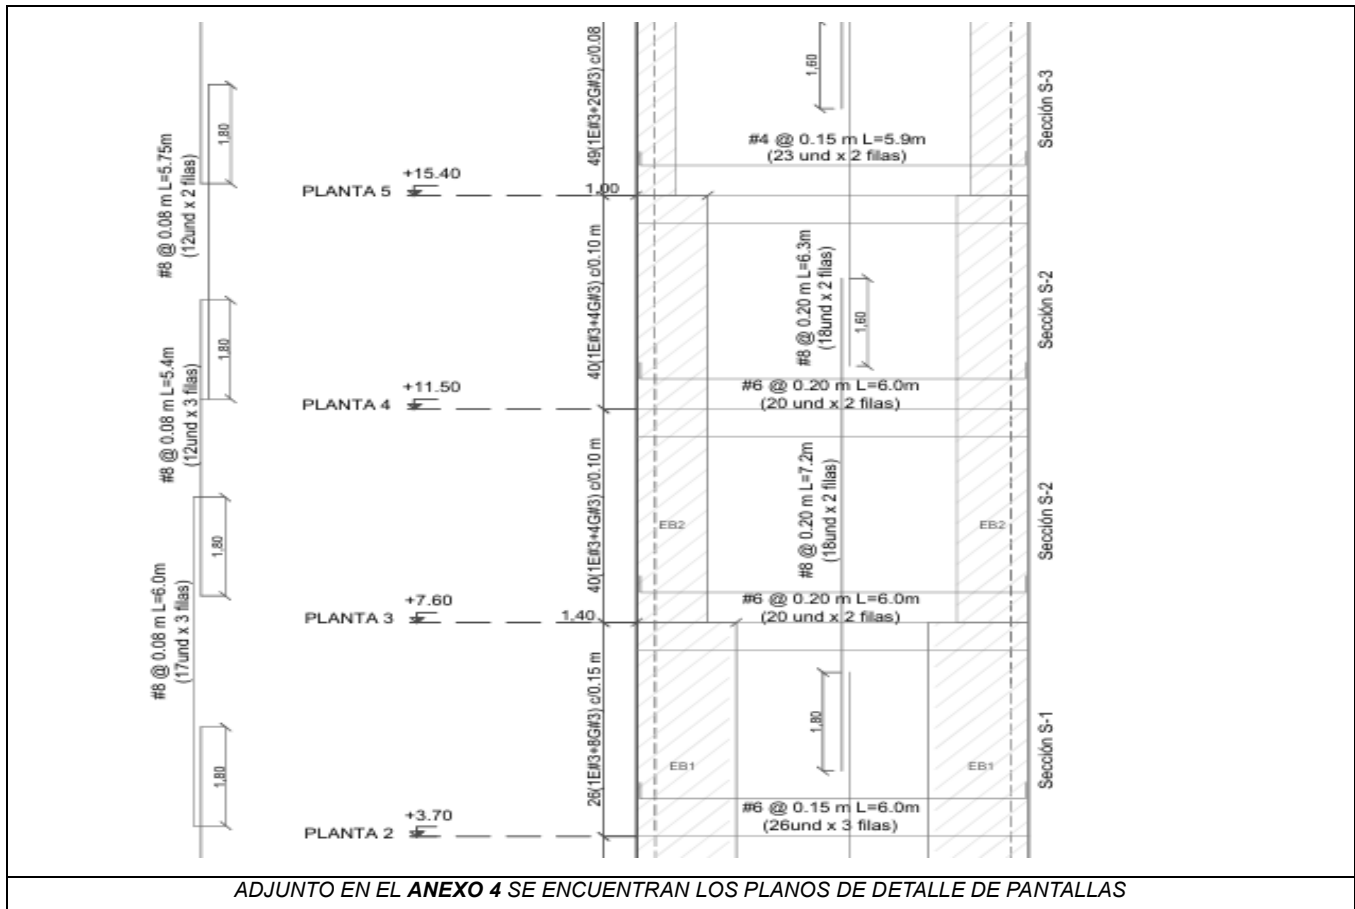

REGISTRO FOTOGRAFICO





	
• Se verificó la localización de la formaleta. • Se procedió a la instalación de cada uno de los tableros, con pines anclados a la losa.	• La unión entre paneles se realiza mediante la utilización de chapetas. • Se finaliza la instalación con alineadores • Se verifican niveles y alineaciones previo a la fundición.
FUENTE: PROPIA	

Fundición de columnas y pantallas

Una vez instalada la formaleta y verificadas las alineaciones y los niveles, asegurando que cumpliera con los requerimientos técnicos y las especificaciones del diseño, posterior a la liberación del acero de refuerzo por parte de la interventoría y el contratista, se procedió a la fundición de las columnas y pantallas.

El proceso inició con la llegada de la autobomba, que fue utilizada para suministrar el concreto autonivelante con una resistencia mínima de 4000 PSI según las especificaciones de diseño. El concreto fue distribuido de manera uniforme sobre las superficies, utilizando una mezcla con agregado máximo de $\frac{1}{2}$ ", de la cual se adjunta en el **anexo 5**, su diseño de mezcla.

Durante este proceso, se utilizaron vibradores mecánicos garantizando la homogeneidad del concreto teniendo especial cuidado en los tiempos de vibrado con el fin de evitar segregación, eliminando burbujas de aire y un llenado completo alrededor del acero de refuerzo.

Una vez completado el proceso de curado del concreto, se inició la hidratación de las pantallas y columnas. Para evitar fisuras por pérdida rápida de humedad y asegurar un curado adecuado, se recubrieron con papel vinipel, garantizando su calidad y resistencia.





Adicionalmente, se llevó a cabo un control de expansión del concreto recibido en obra mediante el método de "slump", verificando su consistencia en cada uno de los camiones mezcladores.

Para garantizar un control de calidad adecuado, se tomaron cuatro muestras de cilindros por cada 40 m³ de concreto vaciado. Estas muestras fueron sometidas a ensayos de compresión, a los cuales se le realizó seguimiento relacionado a continuación:

CONTROL CILINDROS			
		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		CONTROL DE CILINDROS	FORMATO NO. 1
FECHA:	8/03/2025		
NO. TOMA:	35		
LABORATORIO:	EVOLET	CONCRETERA:	GEOACOPIO
CARACTERÍSTICAS			
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PW3-4-5-9 C1 C5 PISO 3 R	EXPANSIÓN:	55CM
TIPO DE MUESTRA:	Concreto 4000PSI - 4 Cilindros de 4"	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 7:	5138
FECHA DEL VACIADO:	8/01/2025	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 16	-
FECHA Y HORA DE INICIO TOMA DE MUESTRA:	08/01/2025 - 5:00Am	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 28:	-
FECHA Y HORA DE TERMINACIÓN TOMA DE MUESTRA:	08/01/2025 - 5:19Am	FECHA DE RECOGIDA DE LOS CILINDROS:	15 de marzo / 22 de marzo/ 5 de abril

IMÁGEN No. 6





		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		CONTROL DE CILINDROS	FORMATO NO. 1
FECHA:	8/03/2025		
NO. TOMA:	36		
LABORATORIO:	EVOLET	CONCRETERA:	GEOACOPIO
CARACTERÍSTICAS			
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	EXPANSIÓN:	60CM
TIPO DE MUESTRA:	Concreto 4000PSI - 4 Cilindros de 4"	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 7:	5626
FECHA DEL VACIADO:	8/01/2025	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 16:	-
FECHA Y HORA DE INCIO TOMA DE MUESTRA:	08/01/2025 - 9:00Am	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 28:	-
FECHA Y HORA DE TERMINACIÓN TOMA DE MUESTRA:	08/01/2025 - 9:17Am	FECHA DE RECOGIDA DE LOS CILINDROS:	15 de marzo / 22 de marzo/ 5 de abril

IMÁGEN No.7

Además, en el **Anexo 6** se adjuntan los resultados de los ensayos de compresión al concreto realizados por el laboratorio Geofísica S.A.S., donde se detalla la resistencia alcanzada, la cual cumple con las especificaciones establecidas en los planos de diseño.






• Se realiza la fundición de columnas y pantallas con concreto autonivelante. • Se golpea la formaleta con martillos de goma, para nivelar de manera adecuada.	• Se utilizan los vibradores de concreto, eliminando burbujas de aire.
FUENTE: PROPIA	

Entarimado para losa de entrepiso

Se instaló un entarimado en tablas proporcionando una base sólida para el armado de acero de entrepiso 3. Con el fin de garantizar la precisión y estabilidad del entarimado, se emplearon gatos hidráulicos y cerchas metálicas. Estos elementos fueron fundamentales para crear una superficie nivelada y segura que permitiera el armado de acero del entrepiso 3.

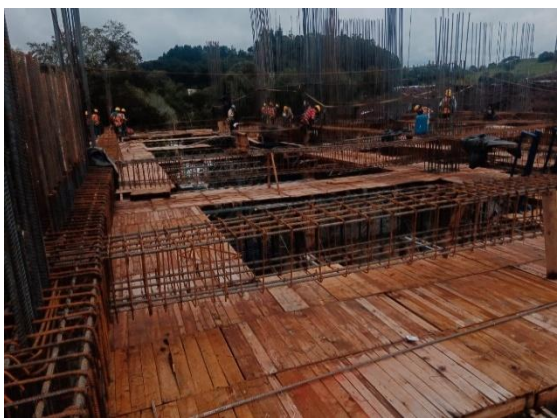REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	
• Se procedió a la instalación del entarimado para el armado de acero de entrepiso 3.	• Se emplearon gatos hidráulicos y cerchas metálicas.
FUENTE: PROPIA	






Armado de refuerzo para vigas de entrepiso 2

En cumplimiento con los diseños estructurales, se procedió al armado del acero de refuerzo para vigas del nivel +11.50, en donde se dispusieron barras longitudinales inferiores en la base de la viga, asegurando que estuvieran separadas correctamente según el diseño.

Posteriormente, se instalaron las barras longitudinales superiores y los estribos, disponiéndose perpendicularmente, distribuyéndose según el espaciamiento requerido a lo largo de la viga, de esta manera, estarían dispuestas para la instalación de la formaleta y posteriormente su fundición.

DESPIECE VIGAS ENTREPISO 2

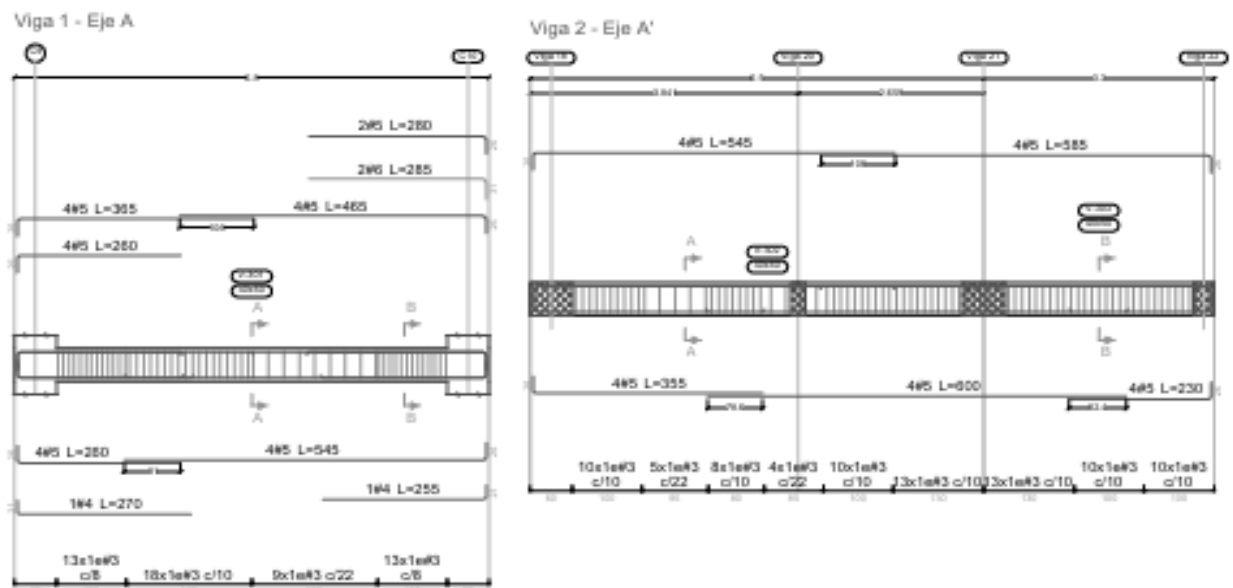

ADJUNTO EN EL ANEXO 7 SE ENCUENTRAN LOS PLANOS DE DETALLE DE VIGAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM





• Se dispusieron las barras longitudinales inferiores en la base de la viga, asegurando que estuvieran separadas correctamente según el diseño	• Se instalaron las barras longitudinales superiores y los estribos, disponiéndose perpendicularmente. • Se instalaron el amarre de los acero de estribos.
FUENTE: PROPIA	

8.1. ACTIVIDADES SIGUIENTE PERIODO.

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el período anterior, se han programado las siguientes actividades para el próximo período:

- ✓ Fundición de columnas y pantallas
- ✓ Armado de acero de entrepiso
- ✓ Instalación de formaleas para losa de entrepiso
- ✓ Fundición losa de entrepiso
- ✓ Mampostería
- ✓ Instalación de redes hidrosanitarias

9.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

8.1SEGUIMIENTO FÍSICO.


Se presentan cantidades de las actividades ejecutadas que, a la fecha de corte del presente informe, sujetas a revisión de la interventoría, sin embargo, se indican como soporte del porcentaje de avance ejecutado.





CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	16.20%	2.82%	19.02%
% Ejecutado	16.20%	3.41%	19.61%
Diferencia	0.00%	0.59%	0.59%

Adicionalmente en la imagen adjunta, se presenta la curva de avance del proyecto:

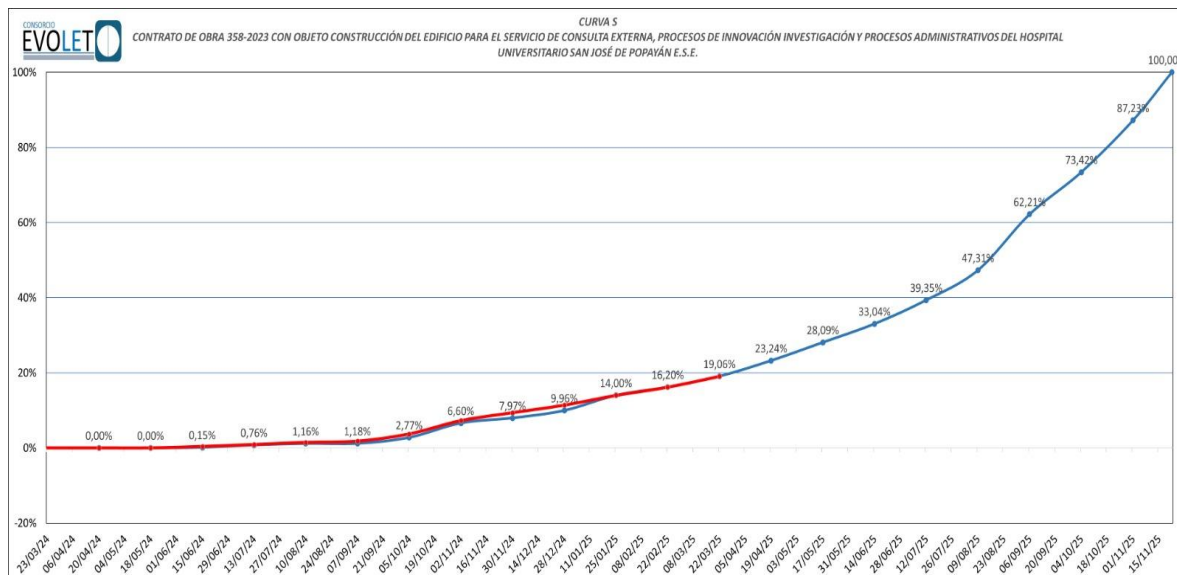

8.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO.

El 25 de octubre el Hospital Universitario San José de Popayán, realizó el desembolso total del anticipo de obra por un valor de nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta con setenta y uno pesos (\$9.742.178.570.71) correspondiente al 30% del valor total del contrato N°358 de 2023. A la fecha de corte del presente informe, se han tramitado un total de catorce (14) solicitudes de pago por fiducia, destinadas a cubrir conceptos como mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte. El saldo disponible del anticipo en fiducia asciende a ciento ochenta y cuatro millones quinientos noventa y dos mil ochocientos dieciocho pesos M/CTE (\$184,592,818.00), con su respectivo desglose por capítulo, ítem y alcance. Asimismo, la ejecución de la obra ha alcanzado el 60,17% del valor del anticipo otorgado, reflejado en los capítulos de cimentación, estructura, acero y otras actividades.



CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4



CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4



Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión.

CAPITULOS	ASIGNACIÓN DE RUBROS PLAN DE INVERSIÓN (22/11/24)		RELACIÓN DE RUBROS DESEMBOLSADOS (28/02/25)		OBRA EJECUTADA (28/02/25)	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
CIMENTACIÓN	1.204.685.838,00	12,37%	1.204.577.838,00	12,36%	2.294.370.199,00	23,55%
PMA	6.325.000,00	0,06%	6.325.000,00	0,06%	88.270.702,00	0,91%
ESTRUCTURA	1.997.640.760,00	20,51%	2.224.136.372,00	15,77%	876.533.012,00	9,00%
ACERO ESTRUCTURA	2.851.653.873,00	29,27%	2.681.516.449,00	27,52%	2.297.699.302,00	23,59%
REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO	341.765.388,00	3,51%	251.812.851,50	2,58%		0,00%
INSTALACIÓN ELECTRICA	120.890.469,00	1,24%	-			0,00%
AIRE ACONDICIONADO	317.711.193,00	3,26%	317.711.193,00	3,26%		0,00%
MAMPOSTERIA	417.677.895,50	4,29%	387.677.895,00	3,98%		0,00%
REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	162.495.956,50	1,67%	162.495.956,50	1,67%		0,00%
FACHADA	966.551.318,00	9,92%	966.551.318,00	9,92%		0,00%
PISOS, GUARDAESCOBAS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	455.398.349,00	4,67%	455.398.349,00	4,67%		0,00%
CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	427.592.031,00	4,39%	427.592.031,00	4,39%		0,00%
EQUIPOS ESPECIALES	471.790.500,00	4,84%	471.790.500,00	4,84%		0,00%
OTRAS ACTIVIDADES					304.725.001,00	3,13%
TOTAL	9.742.178.571,00	100,00%	9.557.585.753,00	91,02%	5.861.598.216,00	60,17%

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM






9. GESTIÓN AMBIENTAL.

9.1 INTRODUCCIÓN

Para dar cumplimiento con las disposiciones requeridas por parte de la autoridad ambiental, es necesario formular e implementar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual contempla acciones para garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos – RCD, aprobado mediante concepto técnico **favorable**, radicado **SGA-11922-2024** del 31 de julio de 2024. Asimismo, incluye medidas en cumplimiento de la autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados, otorgada mediante la Resolución **DTC-700-2024** del 10 de julio de 2024. Además, se implementarán estrategias para atender las recomendaciones establecidas en el oficio de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRC, radicado **SGA-11732-2024**, enfocadas en la minimización del ruido y la comunicación abierta con los residentes del área de influencia del proyecto.

9.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de actividades y medidas diseñadas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos de un proyecto, obra o actividad, protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Incluye planes de prevención, mitigación, compensación, seguimiento y monitoreo, así como educación y capacitación para el personal, su objetivo es minimizar el daño ambiental, garantizando la salud y seguridad.

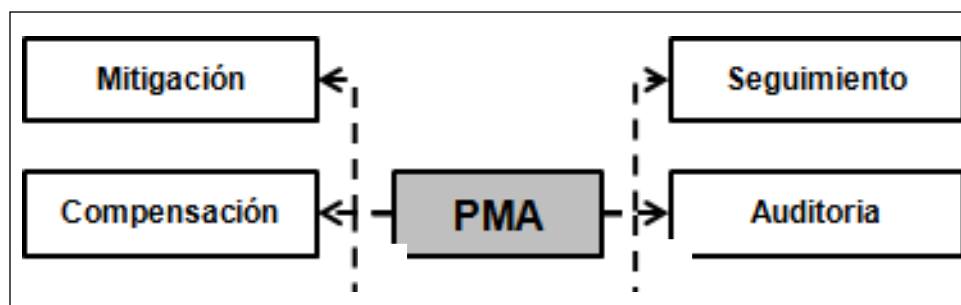

Esquema Plan de Manejo Ambiental
(PMA)

Fuente: Propia





9.2 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla No. 1 Programas PMA

PROGRAMAS	
PROGRAMA 1	APROVECHAMIENTO FORESTAL
PROGRAMA 2	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 3	ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS
PROGRAMA 4	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO
PROGRAMA 5	SALUD OCUPACIONAL VISITANTES
PROGRAMA 6	REUNIONES CON LA COMUNIDAD
PROGRAMA 7	SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA 8	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

9.3 PROGRAMA NO 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL

Bajo los lineamientos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, establecidos en el oficio con radicado **SGA-11732-2024 (Anexo 8)**, donde la Subdirección de Gestión Ambiental indicó que en atención a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015, el proyecto de referencia, no es una actividad objeto de licencia ambiental, sin embargo, debe solicitar a la Autoridad competente concepto ambiental para el retiro y aprovechamiento de árboles aislados de la especie Guayacán Lila encontrado en el predio.

9.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

• Inventario forestal

El 21 de mayo del año 2024, se realizó inventario forestal en el área de influencia del proyecto, donde se evidenció la necesidad de talar las especies arbóreas frutales, relacionada en la **Tabla No. 2** dado que la estabilidad de los individuos se ve afectadas en la construcción del proyecto y las obras estructurales necesarias, siendo un riesgo para la infraestructura del proyecto. **(Anexo 9)**





Tabla No. 2 Inventario forestal

Descripción	Nombre científico	Altura (m)	Diámetro
Mango 1	Mangifera indica	3,55	0,29
Mango 2	Mangifera indica	3,10	0,25
Aguacate 1	Persea americana	4,82	0,15
Aguacate 2	Persea americana	3,95	0,12
Guayabo	Psidium guajava	5,20	0,25
COORDENADAS			
Mango 1	Y 1053154.968	X 762760.374	
Aguacate 1	Y 1053157.748	X 762755.388	
Mango 2	Y 1053171.715	X 762745.942	
Guayabo	Y 1053181.799	X 762738.794	
Aguacate 2	Y 1053182.870	X 762731.858	

- **Solicitud Autoridad Ambiental**

En consecuencia, se remitió una solicitud para la tala mediante el radicado **DTC-4950-2024 (Anexo 10)** el 10 de mayo de 2024 a la Territorial Centro de la CRC. Esta entidad respondió a través del oficio radicado **DTC-6946-2024 (Anexo 11)** del 20 de mayo de 2024, en el cual se establece que, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, específicamente en el Artículo 2.2.1.1.12.13, “ *Las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual se aplicarán únicamente el Salvoconducto Único Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*”

Posteriormente, la Autoridad Ambiental realizó una visita técnica el 4 de julio de 2024. Conforme a la visita realizada se emitió un informe técnico con **radicado DTC-10370-2024 (Anexo 12)**. En dicho informe, se identificó un individuo arbóreo de la especie Guayacán Lila (*Tabebuia rosea*), el cual se encontró en buen estado fitosanitario. Sin embargo, debido a su ubicación dentro del área de intervención, se vería afectada la zona de construcción del proyecto de referencia, por tanto, se ve necesario intervenirlo mediante tala, debido a que la profundidad de las bases para la cimentación y las diferentes obras civiles, afectaría en gran manera su sistema radicular ocasionando inestabilidad al individuo.

En virtud de lo anterior, el 26 de junio de 2024 se presentó ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca la solicitud formal de aprovechamiento forestal dentro del proyecto de obra pública No. 358, mediante el radicado **SG-6653-2024**

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM





(**Anexo 13**). Además, el 9 de julio de 2024 se realizó el pago correspondiente por concepto del trámite, con radicado **DTC-7198-2024 (Anexo 14)**, por un valor de **ochocientos cuarenta y siete mil cinco pesos (\$847.005,00)**. Como resultado, el Centro Territorial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca **otorgó la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados (Guayacán Lila)** mediante el acto administrativo Resolución **DTC-700-2024 (Anexo 15)**

- **Aprovechamiento forestal y siembra de arboles**

En atención a lo requerido mediante acto administrativo **Resolución DTC-700-2024 (Anexo 16)** del 10 de julio de 2024, con expediente AIS-2024-6-249, donde la Autoridad Ambiental otorgó Aprovechamiento forestal de árboles aislados, del cual solicitó que en un término no mayor a un (1) mes se ejecute jornada de tala, en la ubicación autorizada y en la cantidad determinada en la Resolución. En consecuencia, en agosto de 2024 se llevó a cabo una jornada de tala, durante la cual se realizó el aprovechamiento de árboles aislados.



Como medida de compensación ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), dentro de las obligaciones establecidas en el acto administrativo de aprovechamiento forestal autorizado, dispuso la plantación de diez (10) árboles de especies nativas, preferiblemente de porte bajo, como el Cucharo (*Myrsine guianensis*) y el Arrayán de Popayán (*Myrcia popayanensis*). Estas especies desempeñan un papel clave en el aumento de la biodiversidad urbana, ya que proporcionan hábitat, alimento y protección para la fauna local, además de su alta adaptabilidad al entorno debido a su origen regional.

En cumplimiento de esta obligación, se adquirieron cinco (5) árboles de Cucharo y cinco (5) de Arrayán (**Anexo 17**), los cuales fueron sembrados en las zonas verdes





de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca. La jornada de siembra se llevó a cabo en septiembre de 2024, como se evidencia en las siguientes fotografías.

	
<i>Compensación ambiental</i>	<i>Compensación ambiental</i>
 Cucharro No. 1 Coordenadas: 2°27'3" N 76°35'57" O	 Arrayán No. 1 Coordenadas: 2°27'3" N 76°34'57" O
 Arrayan No. 2 Coordenadas: 2°27'3" N 76°33'57" O	 Arrayán No. 3 Coordenadas: 2°27'3" N 76°35'57" O





Arrayan No. 4
Coordenadas: 2°27'2" N 76°33'56"
O



Cucharro No. 2
Coordenadas: 2°27'1" N 76°35'56"
O



Cucharro No. 3
Coordenadas: 2°27'1" N 76°35'56"
O



Arrayán No. 5
Coordenadas: 2°26'60" N
76°35'56" O



Cucharro No. 4
Coordenadas: 2°26'60" N 76°35'56"
O



Cucharro No. 5
Coordenadas: 2°27'3" N 76°35'55"
O





9.5 ESTADO DE CUMPLIMIENTO APROVECHAMIENTO FORESTAL

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
PROGRAMA: Aprovechamiento forestal						FECHA:	Avance a marzo
IMPACTOS A MANEJAR: Alteración del paisaje y alteración de la calidad del aire							
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES	
1	Inventario forestal	1	100%	100%	100%	Se ejecutó inventario forestal el 21 de mayo de 2024, Ver Anexo No. 2	
2	Solicitud Autoridad Ambiental	1	100%	100%	100%	Se realizó solicitud ante la Autoridad Ambiental- CRC, Ver anexos No. 3,4,5,6,7 y 8	
3	Aprovechamiento forestal	6	100%	100%	100%		
4	Siembra de árboles nativos	10	100%	100%	100%		
Observaciones generales: Bajo los lineamientos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, establecidos en el oficio con radicado SGA-11732-2024 (Ver anexo No. 1), donde la Subdirección de Gestión Ambiental indicó que en atención a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015, el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. DE POPAYÁN" no es una actividad objeto de licencia ambiental, sin embargo, debe solicitar a la Autoridad competente concepto ambiental para el retiro y aprovechamiento de árboles aislados de la especie Guayacán Lila encontrado en el predio.						% Cumplimiento del programa	
						100%	
REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
DESCRIPCIÓN: Registro fotografico árboles frutales		DESCRIPCIÓN: Resolución aprovechamiento forestal		DESCRIPCIÓN: Compensación forestal			

10. PROGRAMA NO. 2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMA 1.1)

En atención a las disposiciones establecidas por la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC mediante oficio **SGA-11732-2024 (Anexo 18)**, se radicó el 18 de junio 2024 solicitud de disposición de residuos sólidos a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC mediante radicado **SGA-6382-2024** del cual atendió con radicado **SGA-10565-** del 09 de julio 2024 2024 (**Anexo 19**) donde la Subdirección de Gestión Ambiental - SGA remitió observaciones y aclaraciones sobre documentación presentada, el CONSORCIO EVOLET presentó subsanaciones con oficio **SGA-7436-2024** del 16 de julio de 2024 (**Anexo 20**) así mismo, remitió mediante radicado **DTC-7629-2024** del 19 de julio de 2027 factura de pago No. FE-31377 por el valor de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$763.595,00) por concepto de contos de evaluación (**Anexo 21**)

La Subdirección de Gestión Ambiental - SGA **APROBÓ** el Programa de Manejo Ambiental, presentado por el generador CONSORCIO EVOLET el cual se encuentra acorde a la Resolución 472 del 2017 y su modificación parcial en la Resolución 1257 del 23 de noviembre del 2021, en las especificaciones del edificio objeto del contrato No. 358 de 2023. En ese sentido la Corporación otorgó concepto **TECNICO FAVORABLE** para el desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN-**





INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. DE POPAYÁN", y su viabilidad ambiental para realizar la Gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD como generador mediante radicado **SGA-11922-2024** del 31 de julio del 2024 (**Anexo 22**)

En el Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición presentado y aprobado por la Autoridad ambiental, se detalla las actividades del proyecto, especifica las medidas para prevenir, reducir y reutilizar los RCD, con el fin de mitigar los posibles impactos ambientales negativos en todas las etapas del proyecto, así mismo, se proyecta una generación total de 4602.69 toneladas de RCD, incluyendo material producto de la excavación y sobrantes de la adecuación del terreno. Según la Resolución 1257 de 2021, se excluyen los productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno para establecer la meta de aprovechamiento, por lo tanto, se presentó un total de 320.79 toneladas de material susceptible de aprovechamiento, del cual se espera utilizará 48.19 toneladas, es decir, el 15% de aprovechamiento de RCD.


Entre las acciones de aprovechamiento de los RCD en la obra se incluye destinar un área específica para acopiar el suelo orgánico, proveniente del descapote, con el fin de aprovecharlo en la restauración de zonas afectadas o incorporarlo como parte del paisajismo establecido para el proyecto, los residuos de escombros y material de excavación deberán ser aprovechados en actividades como rellenos de redes, recuperación de suelos, reconformación de taludes, plantas de reutilización o reconformación de vías; entrega de elementos aprovechables en Centros de reciclajes los cuales aumente su vida útil del material; los residuos provenientes de aprovechamientos forestales previamente autorizados por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), pueden ser utilizados por el contratista, para actividades propias de obra o hacer entrega a terceros para su aprovechamiento.

Es importante precisar, que dentro del concepto **TECNICO FAVORABLE** se acoge el Programa de Manejo Ambiental RCD y su Anexo I, presentado a la Autoridad Ambiental, para la gestión de residuos de construcción y demolición RCD, en consecuencia, dentro del **Anexo 22** (Gestores de RCD) hace alusión a la **CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**, ubicado en el PR 11+500 vereda Pisojé Bajo, vía Coconuco, Cauca, con número de NIT 901.476.491-4, representado legalmente por el señor Carlos Alfonso Morales Rigueros, el cual cuanta con **VIABILIDAD AMBIENTAL** para la disposición de residuos de construcción y demolición - RCD ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca, otorgada mediante radicado **SGA-8211-2023** (**Anexo 23**)

- **Inventario de residuos sólidos**

Con la finalidad de verificar los gestores necesarios y adecuados para el manejo de los residuos generados durante todas las etapas del proyecto, se ve la necesidad de crear un inventario de Residuos sólidos, el cual se ilustra en la siguiente imagen:



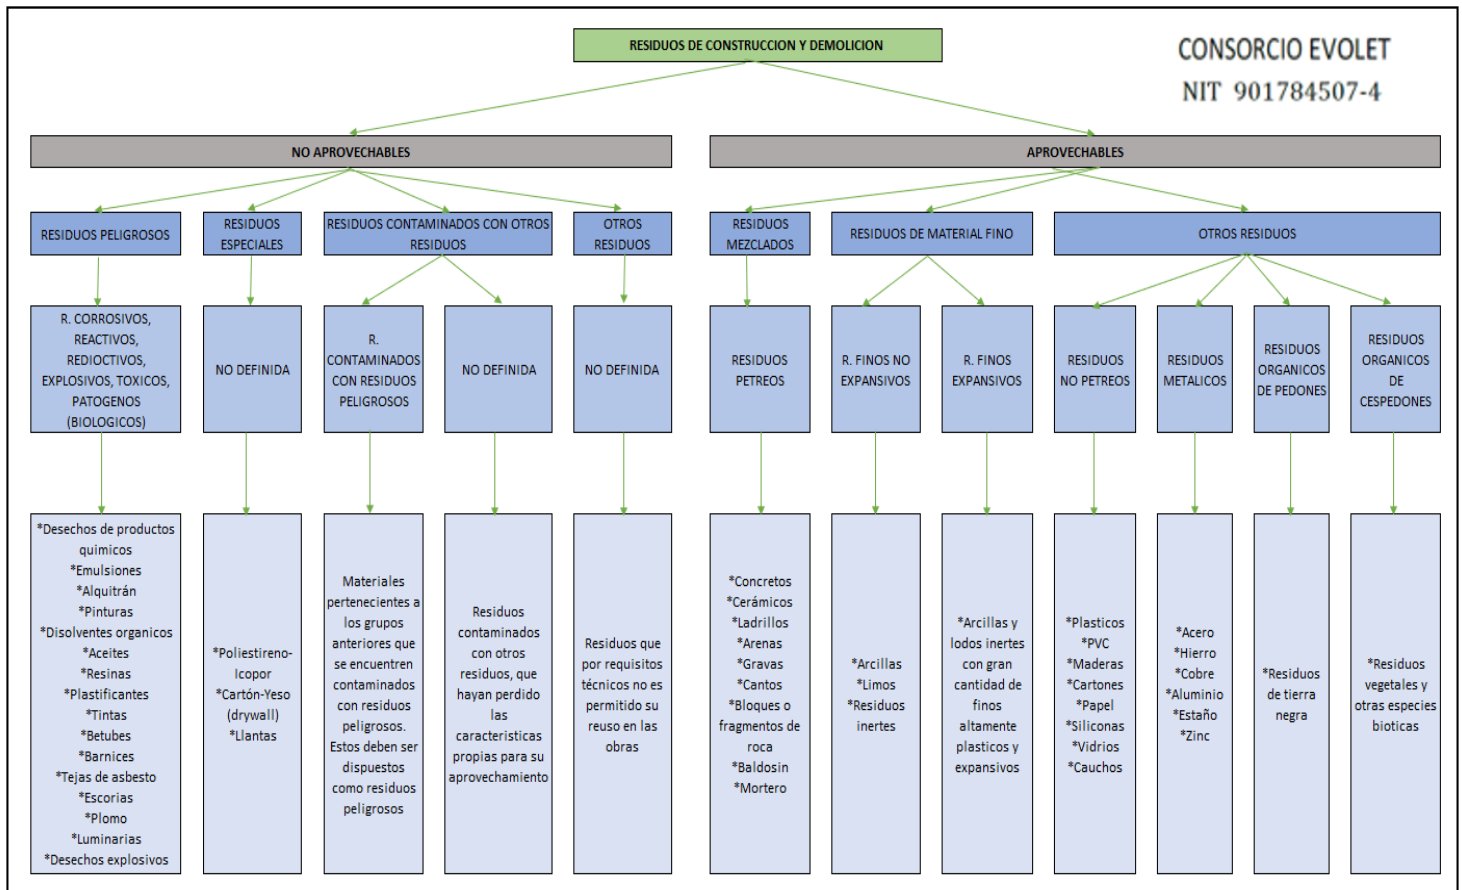

• Delimitación y acondicionamiento de puntos de acopio PMA NP

Se ejecutó acondicionamiento y delimitación de puntos de acopio de residuos aprovechables, No aprovechables y Peligrosos, mediante estructura en materia y techo en Zinc, tal como se ilustra en el siguiente registro fotográfico:





- **Delimitación y acondicionamiento de puntos ecológicos PMA 1.1.1
PMA 1.1.2:**

Se ejecutó acondicionamiento y delimitación de tres puntos ecológicos, los cuales se encuentran debidamente señalizados para la adecuada segregación de residuos en la obra y campamento, tal cómo se ilustran en el siguiente registro fotográfico.





11. Definición de gestores

Se ejecutó definición de gestores autorizados por la autoridad ambiental competente, previa validación de la documentación que los acredita para realizar ese tipo de actividad específica (escombrera, manejo de residuos especiales, aprovechamiento y recolección), así mismo, se le solicitará a cada uno de ellos certificado de disposición final, el cual se reportará a la interventoría.

A continuación, se relacionan algunos de los gestores de RCD, que actuaran como terceros para dar tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, a los residuos generados en obra:

Tabla No. 3 Definición de gestores

TIPO DE RESIDUO	SITIO DE ALMACENAMIENTO	GESTOR
No aprovechables	Punto ecológico (contenedor color negro)	URBASER
Orgánicos	Punto ecológico (contenedor color verde)	URBASER
Reciclables	Punto ecológico (contenedor color Blanco)	AREMARPO- Asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán
Excavación y/o demolición	Punto de acopio sector de obra	Consorcio San Sebastián 064
Peligrosos	Punto de acopio en contenedores (color rojo)	ASERHI SAS Innovaciones ambientales





Cada una de las etapas del programa nos lleva a conocer:

- Donde, cuándo y qué tipo de residuos se producen – Identificando los residuos
- Cómo manejamos los residuos dentro del proyecto - Gestión Interna
- Cómo se disponen adecuadamente los residuos fuera del proyecto – Gestión Externa
- Cómo comunicamos y entrenamos al personal en el manejo de residuos – Comunicación y entrenamiento.
- Proponemos e implementamos estrategias de minimización y prevención de generación de residuos. – Minimización y Prevención
- Medimos la generación de residuos, como los controlamos y hacemos seguimiento al programa- Medición, control y seguimiento.

11.1 Aprovechamiento de gestores NP 1.26

En la siguiente tabla se relacionan las actividades de aprovechamiento ejecutadas por parte de gestore, cantidad y fecha, así mismo, se anexan certificaciones que respaldan el proceso de segregación externa (**Anexo 24**):

Tabla No. 4 Relación jornadas de segregación externas ejecutadas

No.	GESTOR	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD M ³	FECHA
1	Consortio San Sebastián 064	Aprovechables	623	12/07/2024
2	Jonh Fredy Diaz Palomino	Aprovechables	4.0	26/12/2024
3	ASERHI	Peligrosos	0.026	31/01/2025
4	Jonh Fredy Diaz Palomino	Aprovechables	6.0	06/03/2025
5	ASERHI	Peligrosos	0.027	13/03/2025
6	AREMARPO	Aprovechables	0.098	14/03/2025
Total, M³			633.151	

11.2 Inspección y limpieza de acopios / puntos

Se tiene proyectado iniciar en el mes de abril del 2024 con jornadas de inspección ocular, la cual permitirá por medio de un formato de actividades, el cual se llenará diariamente y se presentará a la interventoría me forma mensual el consolidado de jornadas de limpieza, recolección y segregación interna de los residuos generados en el proyecto, el cual se ilustra a continuación.





Tabla No. 5 Formato de inspección y limpieza acopios / puntos

CODIGO:	 FORMATO DE ACTIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS																													
VERSIÓN:																														
FECHA DE APROBACIÓN:																														
MES:																														
ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Los recipientes se encuentran tapados y con su respectiva bolsa																														
Los recipientes se encuentran diferenciadas con el color que le corresponde																														
Se retiran los residuos al terminar la jornada																														
Los recipientes están en el área que corresponde																														
Se realiza la separación en la fuente de los residuos sólidos																														
RESPONSABLE																		OBSERVACIONES												

11.3 Informes CRC / Resolución 1257 de 2021

En atención al cumplimiento de la meta establecida en el Anexo técnico I aprobado en el Plan de Manejo de Residuos mediante radicado **SGA-11922-2024** del 31 de julio de 2024, en el cual se expresa que se espera aprovechar el 15% de residuos RCD generados en la obra durante la vida útil del proyecto (48.19 Ton de RCD), a la fecha se ha aprovechado por medio de gestores 10.098 Ton de RCD, por tanto, se espera ejecutar un alcance al Anexo técnico I aprobado, para ajustar la proyección de generación de residuos objeto de aprovechamiento. Por lo anterior, el alcance se presentará junto con el informe trimestral solicitado por la Autoridad Ambiental para el mes de abril del año 2025, del cual se enviará copia previamente a la interventoría para su aprobación.

Es importante precisar que se han presentado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, dos informes trimestrales, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 1257 de 2021, mediante radicados DTC-11204-2024 del 21-10-2024 y SGA-553-2025 del 17-01-2025 (**Anexo 25**)





11.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
PROGRAMA: Manejo de Residuos sólidos (PMA 1.1)						
IMPACTOS A MANEJAR: Generación de ruido, Contaminación del suelo y del agua, Disposición inadecuada de residuos sólidos convencionales.					FECHA:	Avance a marzo
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	Inventario de residuos sólidos	1	100%	100%	100%	Ver ilustración de informe de avance mes de marzo
2	Delimitación y acondicionamiento de puntos de acopio NP1.25	3	100%	100%	100%	Ver Registros fotograficos de informe de avance mes de marzo
3	Delimitación y acondicionamiento de puntos ecológicos PMA 1.1.1 PMA 1.1.2	3	100%	100%	100%	Ver Registros fotograficos de informe de avance mes de marzo
4	Definición de gestores	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance a mes de marzo
5	Aprovechamiento de gestores NP 1.26	8	75%	75%	75%	Ver anexo No. 15 Certificaciones gestores
6	Capacitación del personal	8	0%	0%	0%	Se darán inicio de las capacitaciones en el mes de abril de 2025
7	Inspección y limpieza de acopios/puntos	8	0%	0%	0%	Se darán inicio de las inspecciones en el mes de abril de 2025
8	Informes CRC / Res. 1257 DE 2021	5	40%	40%	40%	Ver anexos No. 16 y 17 Informes trimestrales CRC
Observaciones generales: La Subdirección de Gestión Ambiental - SGA APROBÓ el Programa de Manejo Ambiental, presentado por el generador CONSORCIO EVOLET el cual se encuentra acorde a la Resolución 472 del 2017 y su modificación parcial en la Resolución 1257 del 23 de noviembre del 2021, en las especificaciones del edificio objeto del contrato No. 358 de 2023. En ese sentido la Corporación otorgó concepto TECNICO FAVORABLE para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN- INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. DE POPAYÁN", y su viabilidad ambiental para realizar la Gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD como generador mediante radicado SGA-11922-2024 del 31 de julio del 2024 (Ver anexo 13).						% Cumplimiento del programa
						50%
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
DESCRIPCIÓN: Punto ecológico oficina		DESCRIPCIÓN: Punto ecológico obra		DESCRIPCIÓN: Puntos de acopio		

12. PROGRAMA NO. 3 ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS

• Cerramiento de materiales PMA 1.2.1

Se realizan actividades de almacenamiento temporal de materiales, garantizando su adecuada protección mediante cubierta plástica color negro, durante el tiempo requerido, tal como se ilustra en el siguiente registro fotográfico.





REGISTRO FOTOGRAFICO



FUENTE: PROPIA

- **Adquisición de telas de polietileno PMA 1.2.3**

Hasta el momento, se han utilizado 1.500 Kg de polietileno negro en la obra, el cual fue utilizado para proteger el material producto de excavaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FUENTE: PROPIA

- **Jornadas de lavado de llantas PMA 1.2.2**

Se dispone de una hidro lavadora industrial junto con dos mangueras, de 30 y 50 metros respectivamente que, fue destinada al sistema de lavado de llantas, permitiendo minimizar la generación de material particulado y barro en las áreas circundantes.





REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lavado de llantas volquetas



Lavado de llantas volquetas



Lavado de llantas volquetas



Lavado de llantas volquetas





- **Control de MP mediante aguas de riego PMA 1.2.4**

Se ejecutaron jornadas de control de material particulado mediante actividades de riego de agua con manguera en las áreas de tránsito de vehículos.

- **Entrega de herramientas pedagógicas al personal PMA 1.2.5**

Se tiene proyectado ejecutar a partir del próximo mes entrega de herramienta pedagógica para entregar al personal, en la cual se harán alusión al cuidado del medio ambiente, adecuada segregación de residuos sólidos, y control de MP.

12.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN.

12.2 PROGRAMA NO. 4 PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO PMA 1.3.0

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
PROGRAMA: Almacenamiento adecuado de materiales de construcción y control de emisiones atmosféricas PMA 1.2						FECHA: Avance a marzo
IMPACTOS A MANEJAR: Generación de residuos y desechos no controlados, Emisión de gases, contaminación del aire						OBSERVACIONES
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	
1	Cerramiento de materiales PMA 1.2.1	8	12.5%	12.5%	12.5%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
2	Adquisición de telas de polietileno PMA 1.2.3	1	0%	0%	0%	Se ejecutará un informe en el mes de noviembre
3	Jornadas de lavado de llantas PMA 1.2.2	3	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
4	Control de MP mediante aguas de riego PMA 1.2.4	3	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
5	Entrega de herramientas pedagógicas al personal PMA 1.2.5	8	0%	0%	0%	Las jornadas se desarrollarán a partir del mes de abril
Observaciones generales: Se realizará la debida protección de los materiales con elementos tales como plástico, lonas impermeables y teleras con estructura de apoyo. Se implementará un sistema de lavado de llantas de los vehículos al salir de la obra, reduciendo la contaminación por polvo y barro en áreas circundantes. Se lleva a cabo sistemas de riego de agua para áreas específicas, reduciendo la generación de material particulado y la contaminación del aire. Se desarrollarán capacitaciones pedagógicas como herramienta para fomentar, el manejo ambiental y disminuir los impactos negativos sobre el área del proyecto.						% Cumplimiento del programa 30,43%
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
						
DESCRIPCIÓN: Protección de material			DESCRIPCIÓN: Jornada de lavado de llantas			

- **Manutención de cobertura vegetal PMA 1.3.1**

En atención a el cronograma plasmado en el Plan de Manejo Ambiental se tiene proyectado ejecutarse en los meses de abril, agosto y noviembre.

- **Jornadas de almacenamiento seguro de material excavado PMA 1.3.2**

En atención a el cronograma plasmado en el Plan de Manejo Ambiental se tiene proyectado ejecutarse en los meses de abril, agosto y noviembre.

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM





- **Control de aguas de escorrentía PMA 1.3.3**

Las jornadas de control de escorrentía, fueron ejecutados de la mano con las actividades de lavado de llantas en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.

- **Mejoramiento de terreno PMA 1.3.9**

Dando alcance al Plan de Manejo Ambiental (PMA), se procedió a instalar material tipo subbase granular, compactado al 95% del Proctor en el acceso principal y en la vía posterior, asegurando una adecuada resistencia y estabilidad para el ingreso de vehículos con materiales destinados a la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FUENTE: PROPIA





12.3 Reubicación de alcantarillado sanitario PMA 1.3.4 - 1.3.5 - 1.3.6 - NP 1.4 -NP 1.18 - 1.1.2 - 2.1 - NP 1.19 - 5.2.4 - 5.2.5 - NP 1.7 - 5.2.10 - NP 1.20 - NP 1.21 - NP 1. 22

- **PMA 1.3.4** Se ha llevado a cabo la reubicación de 9 cajillas sanitarias, asegurando su correcta instalación según las especificaciones técnicas del proyecto, además, se ha construido una nueva cámara de inspección, diseñada para facilitar el acceso y mantenimiento del sistema de saneamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
<i>Demolición y traslado de cajas sanitarias</i>	<i>Demolición y traslado de cajas sanitarias</i>
	
<i>Instalación de tubería</i>	<i>Instalación de tubería</i>





- **PMA 1.3.5:** Se realizó la instalación de entibado en las excavaciones profundas que lo requerían, con el fin de proteger tanto al personal que realiza esta actividad como el material y los taludes, garantizando así la seguridad durante su ejecución.

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
<i>Instalación de entibados en excavación de tubería de aguas lluvias</i>		<i>Instalación de entibados en excavación de tubería de aguas lluvias</i>	
			
<i>Instalación de entibados en excavación de tubería de aguas lluvias</i>		<i>Instalación de entibados en excavación de tubería de aguas lluvias</i>	

- **NP1.4:** Se lleva a cabo la localización y replanteo de las redes húmedas existentes, este proceso garantiza la identificación precisa de su posición, permitiendo su posterior reubicación de manera segura y eficiente.





- **NP1.18 – 1.3.6 – 1.1.2:** Se realiza el corte del andén utilizando un disco de espesor inferior a 12 cm, con el propósito de facilitar la reinstalación de la tubería sanitaria y la tubería de agua potable. Esta intervención se lleva a cabo para garantizar que dichas instalaciones no interfieran con el desarrollo del proyecto, asegurando la correcta funcionalidad de las redes y la continuidad del suministro durante la obra.





- **PMA2.1:** Se realiza la excavación tierra a mano más retiro, para la reubicación de las redes húmedas.



- **NP1.19:** Se ha presentado la necesidad de construir un túnel en material común para la reubicación de una nueva tubería sanitaria de 8 pulgadas de diámetro, con una profundidad menor a 3 metros. Este túnel permitirá el adecuado desempeño y protección del sistema sanitario, garantizando la continuidad, asegurando la estabilidad del terreno y evitando interferencias con otras infraestructuras existentes.





- **PMA5.2.4:** Se procedió con la instalación de tubería sanitaria de PVC de 6 pulgadas, destinada a la conexión de la nueva red sanitaria necesaria para la reubicación del sistema existente. Esta intervención es fundamental para garantizar la continuidad del servicio sanitario y permitir el desarrollo sin interrupciones en el proyecto.



- **PMA5.2.5:** Se lleva a cabo la instalación de tubería sanitaria de PVC de 8 pulgadas como parte de la reubicación y conexión de la nueva red sanitaria, necesaria para la continuidad del proyecto. La instalación incluye el trazado y excavación, la correcta nivelación de la tubería y la utilización de accesorios para garantizar su óptimo funcionamiento





- **NP1.7:** Suministro e instalación de relleno con triturado $tm < 3/4"$ para cimentación de tubería. Se suministró relleno con triturado en la reubicación de tubería de aguas lluvias y de redes sanitarias, así mismo, suministra e instala relleno con triturado de tamaño inferior a $3/4"$ para la cimentación de tuberías en la reubicación de las redes de aguas lluvias y sanitarias, el proceso incluye la nivelación del terreno, la distribución del triturado por capas, y su compactación mediante.



- **PMA 5.2.10:** Se construye una cámara de inspección de 1,2 metros de diámetro como parte del proceso de reubicación de la red de alcantarillado, esta estructura facilita el acceso para la inspección, mantenimiento y limpieza del sistema, garantizando su óptimo funcionamiento.





- **NP1.20:** Se construyen cajas de inspección de 0,60m x 0,60m con una altura inferior a 0,8 m y 10 cm de espesor, diseñadas para la reubicación, inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado. Estas estructuras permiten un acceso rápido y seguro para realizar trabajos de limpieza y reparación, garantizando el correcto funcionamiento.

Las cajas están fabricadas con concreto reforzado para asegurar su resistencia y durabilidad frente a las condiciones del terreno y el flujo constante de aguas residuales, cada caja incluye una tapa de cierre.



- **NP1.21:** Se suministran e instalan sillas YEE de 6" x 8" como parte de la conexión y reubicación de la nueva red sanitaria, estas piezas de unión son fundamentales para garantizar el flujo de aguas residuales. Las sillas YEE están fabricadas con materiales certificados y resistentes a la corrosión, cumpliendo con las normativas vigentes para sistemas sanitarios.





- **NP1.22:** Se realiza la conexión de la nueva red sanitaria a la infraestructura de alcantarillado existente con un diámetro de 8 pulgadas, esta intervención es necesaria para integrar el sistema reubicado con la red principal, garantizando la continuidad de aguas residuales sin interrupciones ni afectaciones al servicio.



en la obra, cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas y garantizando el retiro y disposición final de los materiales en sitios autorizados, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.





REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
<i>Movimientos de tierra, mejoramiento entrada posterior</i>	<i>Movimientos de tierra, mejoramiento entrada posterior</i>

- **PMA1.3.8:** Protección de excavaciones mediante taludes para estabilizar el terreno, no se ha visto la necesidad de estabilizar taludes.
- **NP1.7:** Suministro e instalación de relleno con triturado tm <3/4" para cimentación de tubería, se provee relleno con triturado en la reubicación de tubería de aguas lluvias y de redes sanitarias, se abastece e instala relleno con triturado de tamaño inferior a 3/4" para la cimentación de tuberías en la reubicación de las redes de aguas lluvias y sanitarias. El proceso incluye la nivelación del terreno, la distribución del triturado por capas, y su compactación mediante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	





- **NP1.8:** Es necesario adquirir material importado tipo limo arcilloso para el cerramiento de las excavaciones destinadas a la instalación de la nueva tubería de la red sanitaria. El proceso incluye la instalación del material en capas, seguida de una compactación para asegurar la estabilidad de la excavación.





• ESTADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO

 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
PROGRAMA: Protección del suelo PMA 1.3.0						FECHA: Avance a marzo
IMPACTOS A MANEJAR: Pérdida de la capa vegetal y contaminación del suelo						
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	Manutención de cobertura vegetal PMA 1.3.1	3	0%	0%	0%	se tiene proyectado ejecutarse en los meses de abril, agosto y noviembre
2	Jornadas de almacenamiento seguro de material excavado PMA 1.3.2	8	0%	0%	0%	se tiene proyectado ejecutarse en los meses de abril, agosto y noviembre
3	Control de aguas de escorrentía PMA 1.3.3	3	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
4	Mejoramiento de terreno PMA 1.3.9	1	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
5	Reubicación de alcantarillado sanitario PMA 1.3.4 - 1.3.5 - 1.3.6 - NP 1.4 - NP 1.18 - 1.1.2 - 2.1 - NP 1.19 - 5.2.4 - 5.2.5 - NP 1.7 - 5.2.10 - NP 1.20 - NP 1.21 - NP 1.22	3	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
6	Actividades de alcantarillado pluvial PMA 1.3.7 - 1.3.8 - NP 1.7 - NP 1.8	3	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
Observaciones generales: Se tiene proyectado ejecutar tres jornadas de manutención de cobertura vegetal de los árboles nativos de Arrayán y Cucharero sembrados en la actividad de compensación forestal ejecutada en el mes de septiembre en las instalaciones de la facultad de medicina de la Universidad del Cauca.						% Cumplimiento del programa
						48%
REGISTRO FOTOGRAFICO						
  		 		  		
DESCRIPCIÓN: Instalación de tubería sanitaria		DESCRIPCIÓN: Instalación de entibados		DESCRIPCIÓN: Movimientos de tierra		

13. PROGRAMA NO. 5 SALUD OCUPACIONAL VISITANTES (Obreros y personal técnico) PMA 1.4.0

• Adquisición y empleo de cascos PMA1.4.1

Se dispone de cascos de seguridad blancos para el uso de visitante personal que ingresa a la obra. Estos cascos cumplen con las normativas de seguridad vigentes y se encuentran debidamente etiquetados y almacenados en un lugar accesible. El uso del casco es obligatorio para todos los visitantes, garantizando así su protección durante su permanencia en el área de trabajo.





- **Adquisición y empleo de chalecos PMA 1.4.2**

Se dispone de chalecos para director, ingenieros, residentes, maestros según diseño. Se determinan dos colores de chalecos, para el personal profesional del será de color Rojo y para el personal Operativo será Naranja.



- **Adquisición y actualización del botiquín PMA 1.4.3**

La obra dispone de un botiquín tipo B de primeros auxiliares equipado conforme a la normativa vigente, diseñado para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad o emergencia, el cual se encuentra ubicado en un lugar accesible, garantizando su rápida localización en caso de emergencia.





- **Adquisición de camillas PMA 1.4.5**

La obra dispone de dos camillas rígidas que cumplen con las normativas de seguridad y primeros auxilios vigentes, diseñadas para el traslado seguro de personas en situaciones de emergencia. Estas camillas están estratégicamente ubicadas en la entrada principal y en la entrada posterior, garantizando su accesibilidad en cualquier punto de la obra, ambas están equipadas con correas de sujeción para inmovilización, facilitando el traslado seguro de lesionados.





REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Camilla No.1	Camilla No.2
FUENTE: PROPIA	

- **Adquisición y actualización del extintor PMA 1.4.4**

La obra cuenta con dos extintores multipropósito de 10lb, adecuados para la extinción de fuegos de tipo A (materiales sólidos combustibles), B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos energizados). Los extintores se encuentran ubicados en un lugar accesible, cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Extintor No.1	Extintor No.2
FUENTE: PROPIA	

- **Adquisición y empleo de arnés PMA 1.4.6**

La obra dispone de equipos certificados para trabajos en altura, garantizando la seguridad del personal en actividades que implican riesgo de caída, cual equipo incluye 3 arneses de cuerpo completo y 2 eslingas en "Y" con ganchos





de doble seguro; todos los componentes cumplen con las normativas de seguridad.



- **Adquisición y empleo de líneas de vida PMA 1.4.6**

La obra dispone de equipos certificados para trabajos en altura, garantizando la seguridad del personal en actividades que implican riesgo de caída, cual equipo incluye una línea de vida horizontal de 30 metros; todos los componentes cumplen con las normativas de seguridad.





14. ESTADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL VISITANTES (OBREROS Y PERSONAL TÉCNICO)

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
PROGRAMA: Salud ocupacional de visitantes (obreros y personal técnico) PMA 1.4.0 IMPACTOS A MANEJAR: Accidentes en el área del trabajo e incumplimiento de la normatividad vigente en salud						
					FECHA:	Avenca a marzo
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	Adquisición y empleo de cascos PMA 1.4.1	8	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
2	Adquisición y empleo de chalecos PMA 1.4.2	36	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
3	Adquisición y actualización del botiquín PMA 1.4.3	2	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
4	Adquisición de camillas PMA 1.4.5	2	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
5	Adquisición y actualización del extintor PMA 1.4.4	2	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
6	Adquisición y empleo de arnes PMA 1.4.6	3	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
7	Adquisición y empleo de líneas de vida PMA 1.4.6	2	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
Observaciones generales: Se cuenta con un formato de inspección a cargo del SISQ, el cual se encarga de verificar que el botiquín cuente siempre con todos los elementos y no esté caducados, así como también, el cargue de los extintores.						% Cumplimiento del programa
						100%
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
DESCRIPCIÓN: Extintores		DESCRIPCIÓN: Camilla		DESCRIPCIÓN: Botiquín tipo B		

15. PROGRAMA NO. 6 REUNIONES CON LA COMUNIDAD PMA 1.5.0

• Reuniones con la comunidad PMA 1.5.1

En el marco de las obligaciones contractuales establecidas, se llevó a cabo la socialización del proyecto, con la presencia de, interventoría, Concejo municipal de Popayán, Secretaría de salud del Cauca, Secretaría de planeación de Popayán, Junta de acción comunal del Barrio Bolívar, liga de usuarios del Hospital Universitario San José, comunidad en general y representantes del contratista de obra. Durante el encuentro, se expuso el informe detallado del proceso de obtención de licencias y permisos requeridos, así como los trámites legales y administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto, además, se mencionó el alcance y las características del proyecto, incluyendo aspectos como la implantación, distribución de áreas y espacio público, que se implementarán en la construcción de la nueva torre. Cabe destacar que no se presentaron objeciones a los puntos expuestos.





- **Entrega de volantes informativos PMA 1.6.0 PMA 1.5.1**

Se elaboraron volantes informativos siguiendo los lineamientos establecidos. Estos volantes son distribuidos en las áreas circundantes a la obra, como parte de la primera etapa de socialización con la comunidad, incluyendo vecinos, personal del hospital cercano y autoridades municipales.





REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Distribución de volantes	Distribución de volantes

- Atención de PQRS**

Se adquirió señalética con información de correo electrónico para la recepción de PQRS, (Ver imagen adjunta) la cual se encuentra ubicada en el ingreso a la obra del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Señalética atencion a PQRS	
FUENTE: PROPIA	





• ESTADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA REUNIONES CON LA COMUNIDAD

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
						
PROGRAMA: Reuniones con la comunidad PMA 1.5.0						FECHA: Avance a marzo
IMPACTOS A MANEJAR: Desinformación del proyecto y atención a PQRS						
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	Reuniones con la comunidad PMA 1.5.1	2	50%	50%	50%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
2	Entrega de volantes informativos PMA 1.6.0 PMA 1.5.1	1	100%	100%	100%	Se anexa registro fotográfico en el informe de avance del mes de marzo
3	Atención de PQRS	8	0%	0%	0%	Se tiene proyectado brindar primer informe de atención a PQRS llegadas en el informe del mes de abril
						% Cumplimiento del programa
Observaciones generales: Con la finalidad de evitar desinformación del proyecto, dudas, inquietudes, sugerencias y reclamos del proyecto, se creó el correo consorcioevoletpqrs@gmail.com						18%
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
DESCRIPCIÓN: Señalética informativa de atención de PQRS		DESCRIPCIÓN: Invitación socialización del proyecto		DESCRIPCIÓN: Socialización proyecto		

16. PROGRAMA NO. 7 SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO, SEGURIDAD INDUSTRIAL PMA 1.7.0

• Cerramientos del proyecto y asilamiento de ventanas PMA1.7.1 NP 1.23 NP 1.24

Se llevó a cabo la construcción de cerramientos perimetrales en dos sectores, colindantes a la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca y al parqueadero del Hospital Universitario San José, respectivamente. En el primer sector, se instaló una estructura en guadua, con cuarterones de madera y recubrimiento en lámina de zinc, alcanzando una altura de 3.05 metros. En el segundo sector, se instaló un cerramiento en lámina trapezoidal galvanizada con recubrimiento en poliéster de color azul, proporcionando resistencia a la corrosión y garantizando la delimitación, seguridad y protección contra agentes externos.

Con el fin de prevenir la contaminación auditiva y material particulado hacia el área de oncología, se construye muro de cerramiento en superboard, como una solución para lograr un aislamiento acústico temporal. Este cerramiento






está conformado por una estructura en madera, con recubrimiento en superboard y fresca como aislamiento acústico.



- **Adquisición de señalización vial, reglamentaria, restrictiva e informativa PMA 1.7.3 PMA 1.7.4 PMA 1.7.5**

Se realizó la compra de señalética pertinente de puntos ecológicos, extintor, transite con cuidado, sendero peatonal, inicio y fin de obra, área de herramientas, botiquín, riesgo eléctrico, atención a PQRS, entre otros. A continuación, de ilustra registro fotográfico de algunas señaléticas de tipo preventivo, restrictivo e informativo.



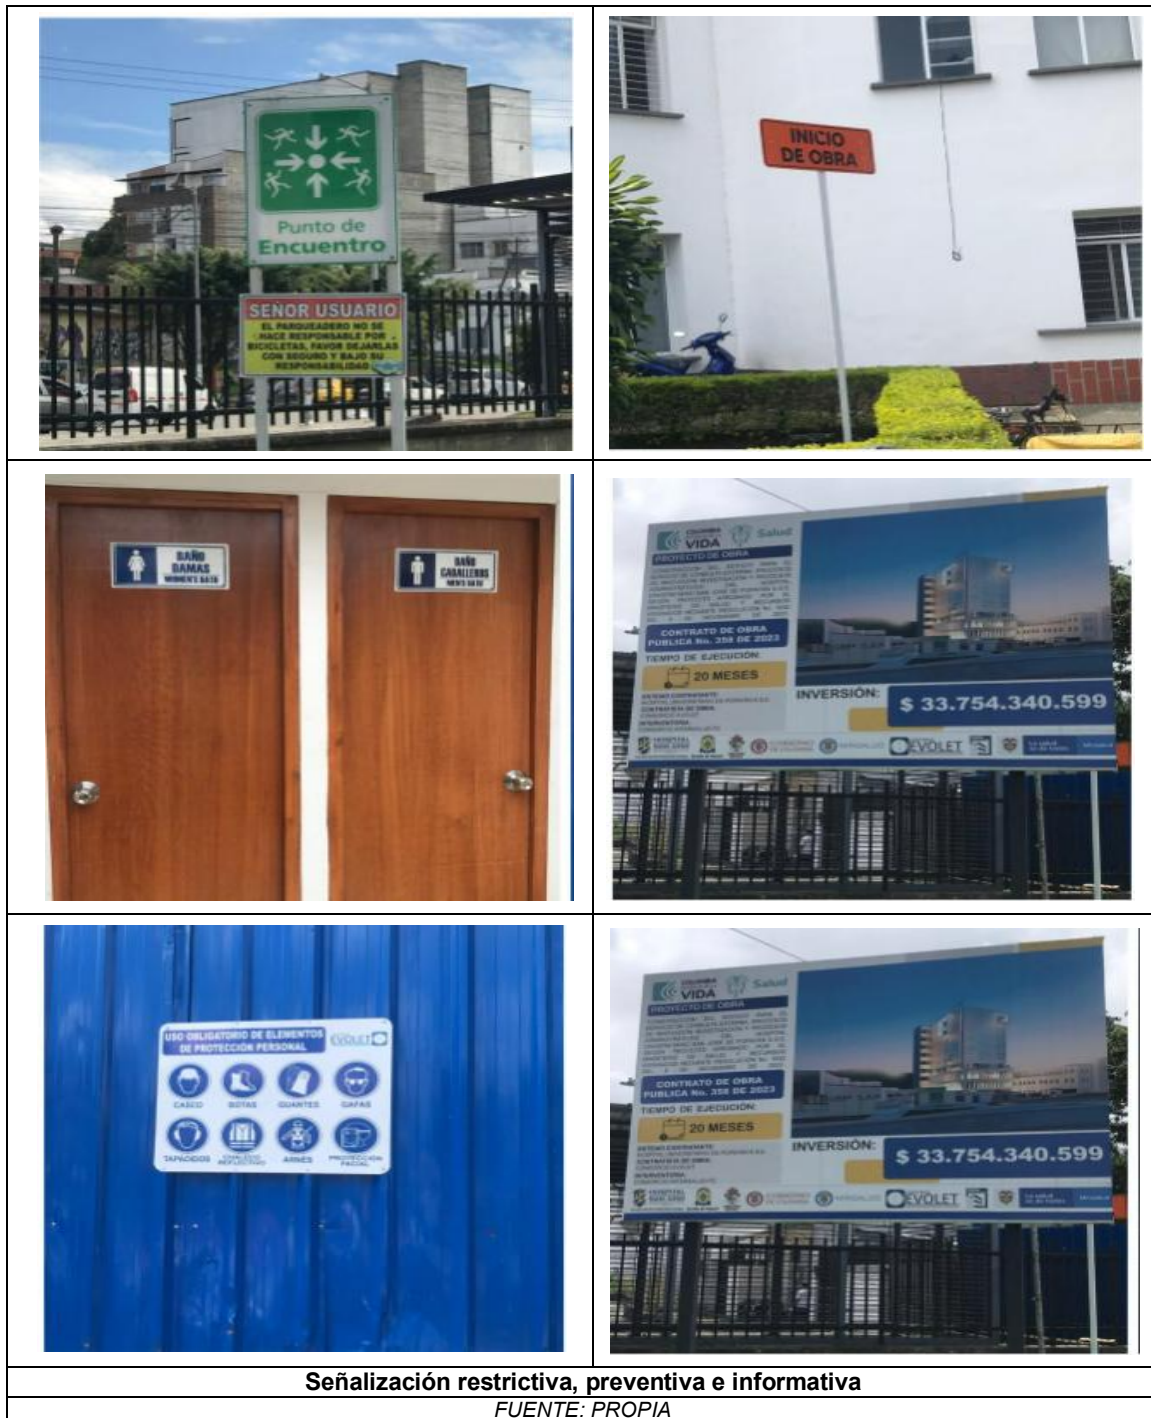



REGISTRO FOTOGRAFICO





Señalización restrictiva, preventiva e informativa

FUENTE: PROPIA

- **Delimitación senderos peatonales y acceso vehicular PMA1.7.2**
Se tiene proyectado ejecutar delimitación de senderos peatonales y acceso vehicular a finales del mes de marzo, del cual se remitirá evidencia en informe mensual del mes de abril.
- **Disposición y empleo de balizas PMA1.7.6**
Se tiene proyectado ejecutar disposición y empleo de balizas a finales del mes de marzo, del cual se remitirá evidencia en informe mensual del mes de abril.
- **Mano de obra para clasificación de RS NP1.27**
Se presentará un informe final en el mes de noviembre con el consolidado en M3 de residuos clasificados.
- **Valla informativa**
Se instaló valla informativa a las afueras de la obra, con información respecto al proyecto, número de contrato, tiempo de ejecución, inversión, entre otros.





Valla informativa
FUENTE: PROPIA

• ESTADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																																																							
CONSORCIO EVOLET																																																							
PROGRAMA: Señalización, cerramiento, seguridad industrial PMA 1.7.0																																																							
IMPACTOS A MANEJAR: Aumento de accidentes y lesiones e incumplimiento de regulaciones normativas																																																							
<table><tr><th>FECHA:</th><th>Avance a marzo</th></tr></table>							FECHA:	Avance a marzo																																															
FECHA:	Avance a marzo																																																						
<table><tr><th>NO.</th><th>ACTIVIDAD</th><th>META</th><th>% DE CUMPLIMIENTO</th><th>% DE AVANCE PROGRAMADO</th><th>% DE AVANCE A LA FECHA</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>Cerramientos del proyecto y asilamiento de ventanas PMA1.7.1 NP 1.23 NP 1.24</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>Ver informe de avance mes de marzo</td></tr><tr><td>2</td><td>Adquisición de señalización vial, reglamentaria, restrictiva e informativa PMA 1.7.3 PMA 1.7.4 PMA 1.7.5</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>Ver informe de avance mes de marzo</td></tr><tr><td>3</td><td>Delimitación senderos peatonales y acceso vehicular PMA1.7.2</td><td>1</td><td>0%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Se tiene proyectado ejecutar delimitación de senderos peatonales y acceso vehicular a finales del mes de marzo</td></tr><tr><td>4</td><td>Disposición y empleo de balizas PMA1.7.6</td><td>1</td><td>0%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Se tiene proyectado ejecutar disposición y empleo de balizas a finales del mes de marzo</td></tr><tr><td>5</td><td>Mano de obra para clasificación de RS NP1.27</td><td>1</td><td>0%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Se presentará un informe final en el mes de noviembre</td></tr><tr><td>6</td><td>Valla informativa</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>Ver informe de avance mes de marzo</td></tr></table>							NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES	1	Cerramientos del proyecto y asilamiento de ventanas PMA1.7.1 NP 1.23 NP 1.24	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance mes de marzo	2	Adquisición de señalización vial, reglamentaria, restrictiva e informativa PMA 1.7.3 PMA 1.7.4 PMA 1.7.5	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance mes de marzo	3	Delimitación senderos peatonales y acceso vehicular PMA1.7.2	1	0%	100%	0%	Se tiene proyectado ejecutar delimitación de senderos peatonales y acceso vehicular a finales del mes de marzo	4	Disposición y empleo de balizas PMA1.7.6	1	0%	100%	0%	Se tiene proyectado ejecutar disposición y empleo de balizas a finales del mes de marzo	5	Mano de obra para clasificación de RS NP1.27	1	0%	100%	0%	Se presentará un informe final en el mes de noviembre	6	Valla informativa	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance mes de marzo
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES																																																	
1	Cerramientos del proyecto y asilamiento de ventanas PMA1.7.1 NP 1.23 NP 1.24	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance mes de marzo																																																	
2	Adquisición de señalización vial, reglamentaria, restrictiva e informativa PMA 1.7.3 PMA 1.7.4 PMA 1.7.5	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance mes de marzo																																																	
3	Delimitación senderos peatonales y acceso vehicular PMA1.7.2	1	0%	100%	0%	Se tiene proyectado ejecutar delimitación de senderos peatonales y acceso vehicular a finales del mes de marzo																																																	
4	Disposición y empleo de balizas PMA1.7.6	1	0%	100%	0%	Se tiene proyectado ejecutar disposición y empleo de balizas a finales del mes de marzo																																																	
5	Mano de obra para clasificación de RS NP1.27	1	0%	100%	0%	Se presentará un informe final en el mes de noviembre																																																	
6	Valla informativa	1	100%	100%	100%	Ver informe de avance mes de marzo																																																	
% Cumplimiento del programa 50%																																																							
Observaciones generales: Por situaciones logísticas, no fue posible remitir soporte de las delimitaciones de senderos peatonales, acceso vehicular y disposición y uso de balizas, sin embargo, se espera ejecutar a finales del mes de marzo las adecuaciones pertinentes, y remitir soportes en el informe mensual del mes de abril.																																																							
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																							
DESCRIPCIÓN: Señaléticas tipo restrictivo, preventivo e informativo			DESCRIPCIÓN: Cerramiento obra		DESCRIPCIÓN: Valla informativa																																																		





17. PROGRAMA NO. 8 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PMA 1.8.0

Fue necesario suprimir dos actividades estipuladas inicialmente en las condiciones del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. DE POPAYÁN"**, tales como, **PMA 1.8.3 Monitoreos de calidad del agua y PMA 1.8.7 Construcción de obras de prevención de la contaminación de cuerpos de agua**. Lo anterior, en atención a que, durante la Evaluación de Impacto Ambiental de la matriz de Vicente Conesa, se pudo verificar que el factor del recurso hídrico posee valor con significancia baja, con categoría <25, por tanto, es un factor que no genera impactos relevantes al medio ambiente.

- **Protección de sumideros PMA 1.8.3**

Se tiene proyectado ejecutar jornadas de protección de sumideros a partir del mes de abril del año 2025, por lo anterior, se presentará registro fotográfico de actividad en el informe mensual de abril.

- **Disposición y empleo de elementos para recolección y uso de agua lluvias PMA 1.8.5**

Se cuenta con un tanque de 1.000 litros para la recolección de aguas lluvias, el cual se utiliza principalmente para curar los cilindros destinados a los ensayos de resistencia a la compresión, sin embargo, este depósito de agua será utilizado como plan de contingencia para posibles suspensiones del servicio de acueducto, el cual servirá de reservorio para el uso de baterías sanitarias, con la finalidad de prevenir afectaciones en la salud de los trabajadores del proyecto.

- **Mantenimiento de sumideros PMA 1.8.6**

Se tiene proyectado ejecutar jornadas de mantenimiento de sumideros a partir del mes de abril del año 2025, por lo anterior, se presentará registro fotográfico de actividad en el informe mensual de abril.

- **Limpieza de vías afectadas PMA 1.8.8**

Se tiene proyectado ejecutar jornadas de limpieza de vías a partir del mes de abril del año 2025, por lo anterior, se presentará registro fotográfico de actividad en el informe mensual de abril.





• ESTADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
PROGRAMA: Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos PMA 1.8.0						FECHA:
IMPACTOS A MANEJAR: Afectaciones en la calidad del agua						A mes de marzo
NO.	ACTIVIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE A LA FECHA	OBSERVACIONES
1	Protección de sumideros PMA 1.8.3	8	0%	0%	0%	Actividad proyectada a iniciar en el mes de abril
2	Disposición y empleo de elementos para recolección y uso de agua lluvias PMA 1.8.5	8	0%	0%	0%	Actividad proyectada a iniciar en el mes de abril
3	Mantenimiento de sumideros PMA 1.8.6	8	0%	0%	0%	Actividad proyectada a iniciar en el mes de abril
4	Limpieza de vías afectadas PMA 1.8.8	8	0%	0%	0%	Actividad proyectada a iniciar en el mes de abril
Observaciones generales: Fue necesario suprimir dos actividades estipuladas inicialmente en las condiciones del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. DE POPAYÁN", tales como, PMA 1.8.3 Monitoreos de calidad del agua y PMA 1.8.7 Construcción de obras de prevención de la contaminación de cuerpos de agua. Lo anterior, en atención a que, durante la Evaluación de Impacto Ambiental de la matriz de Vicente Conesa, se pudo verificar que el factor del recurso hídrico posee valor con significancia baja, con categoría <25, por tanto, es un factor que no genera impactos relevantes al medio ambiente.						% Cumplimiento del programa
						N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO						
N/A			N/A			
DESCRIPCIÓN: N/A			DESCRIPCIÓN: N/A		DESCRIPCIÓN: N/A	

18. GESTIÓN SST.

17.1 INDUCCION LABORAL

TEMAS TRATADOS:

- Política SG-SST, Política prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
- Reglamento de interno de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial, se indica los riesgos a los cuales están expuestos en la actividad contratada (riesgos biomecánicos, biológicos, químicos, psicosociales, físicos y de seguridad (mecánicos, trabajos en alturas, locativos, excavaciones, eléctricos).
- Actos y condiciones inseguras, Se les recomienda reportar condiciones en el ambiente de trabajo.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Comités COPASST Y Convivencia.







- Afiliaciones a seguridad social ARL, EPS, AFP, Caja de compensación familiar.
- Definición de accidente de trabajo e incidente de trabajo.
- Responsabilidades en el cargo a desempeñar.

Tabla 1. Indicador de inducción laboral

SEGUIMIENTO Y MONITOREO – INDUCCION LABORAL			
INDICADOR DE COBERTURA	% FORMACIÓN	FÓRMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de inducciones realizados}}{N^{\circ} \text{ de inducciones programados}} \times 100$ $= 100 \%$

Gráfica 1. Cobertura Inducción



En la gráfica, se muestra el número de inducciones realizadas y aprobadas según ingresos presentados en el periodo que va del 20 de febrero al 20 de marzo de 2025.

En los anexos se evidencian los registros de entrenamiento, notificación de riesgos, generalidades en SST. Las evaluaciones realizadas de manera verbal con preguntas de la inducción dan como resultado de cumplimiento del 100% correspondientes. **(Anexo 26)**

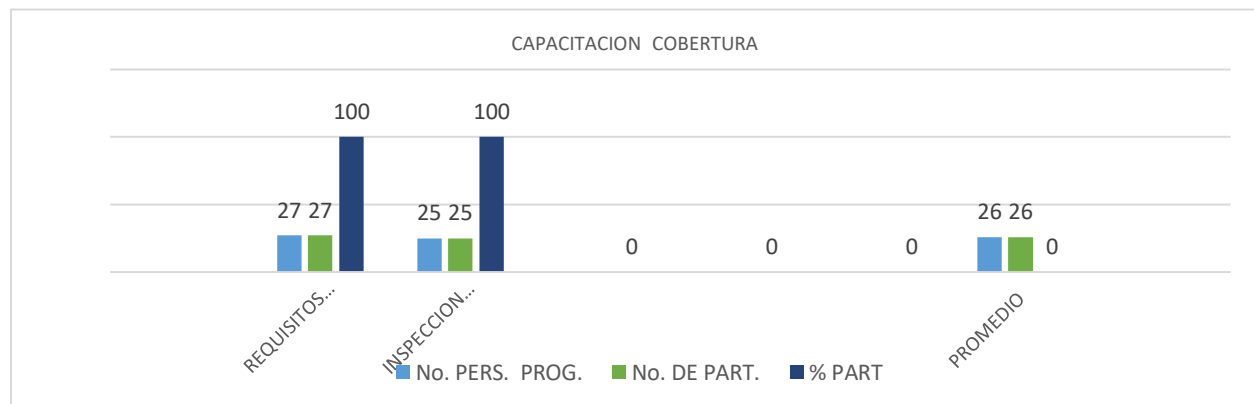





Tabla 2. Indicador capacitaciones e inducciones realizadas

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Formación:
FÓRMULA	$\frac{\text{Nº de capacitaciones e inducciones realizados}}{\text{Nº de capacitaciones e inducciones programados}} \times 100 = \frac{7 + 6}{7 + 6} \times 100 = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$

Grafica 2. Febrero



Grafica 2.1 marzo

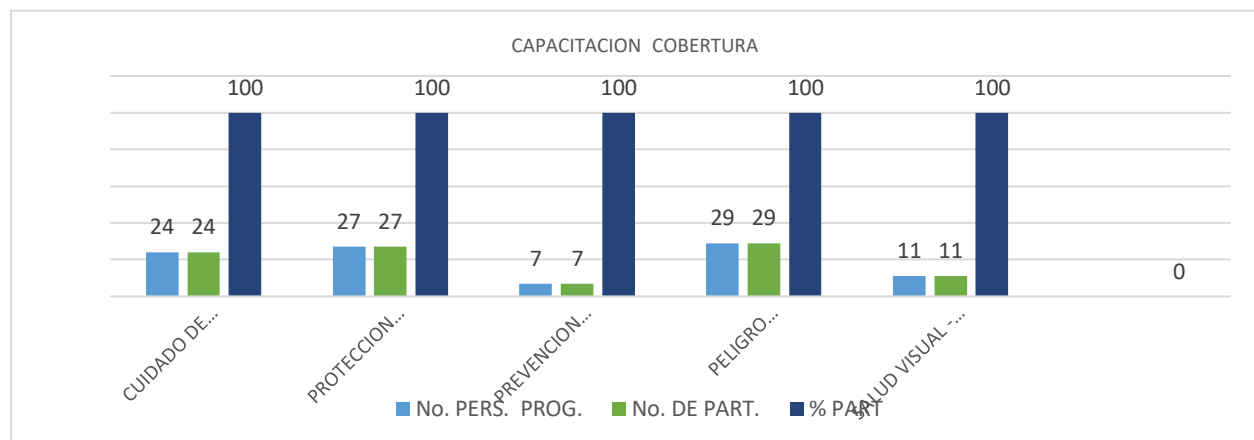

En este indicador se relaciona la suma del total de las capacitaciones (7) y el total de las inducciones (6) para medir el cumplimiento según lo programado de las actividades de formación y desarrollo del personal en su totalidad.

Anexo No.27 Inducciones – 2 Capacitaciones.





17.2. PLAN DE CAPACITACION LABORAL

Se realizan las capacitaciones programadas dando continuidad del proceso laboral, garantizando que el personal tenga información básica y complementaria para fortalecer los conocimientos, comportamientos seguros en la prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo.

A continuación, se presenta los indicadores de gestión del plan de capacitación

Tabla 3. Relación temas de capacitación

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
N°	TEMA	METODOLOGIA	LUGAR	FECHA	DIRIGIDO A	RESPONSABLE
1	Requisitos trabajo en alturas	Teórica - practica	Obra	20.02.2025	Operativo	Elsa Merlene
2	Inspección equipos trabajo en alturas	Teórica practica	Obra	28.02.2025	Operativo	Elsa Merlene
3	Cuidado de ojos y visión	Teoría - práctica	Obra	06.03.2025	Operativo	Elsa Merlene
4	Protección respiratoria	Teoría - practica	Obra	13.03.2025	Operativo	Elsa Merlene
5	Prevención peligro biomecánico – administrativo	Teoría - Practica	Obra	13.03.2025	Administrativo	Elsa Merlene
6	Peligro Biomecánico	Teoría - Practica	Obra	20.03.2025	Operativo	Elsa Merlene
7	Salud visual	Teoría - Practica	Obra	20.03.2025	Administrativo	Elsa Merlene

Tabla 4. Indicador de cumplimiento, Plan de capacitación.





SEGUIMIENTO Y MONITOREO - CAPACITACIÓN			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	FÓRMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de capacitaciones realizados}}{N^{\circ} \text{ de capacitaciones programados}} \times 100$

Anexo No. 2 Capacitaciones

17.3. ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:

- Exámenes médicos de ingreso: Se relacionan 6 exámenes ocupacionales de ingreso, para realizar actividades de coordinador de alturas de actividades de topografía y de amarre de acero. **(Anexo 28)**
- Afiliación al sistema de seguridad social: Para este periodo se reportan las siguientes novedades:

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	Ubaner Pérez Gómez	Ingreso	3
2	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones sas	Ingreso	3

Tabla 5. Relación de novedades del personal.

17.4. INDICADORES DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO Y MONITOREO – CONTRATACION PERSONAL NUEVO			
INDICADOR DE COBERTURA	% afiliación SG SSS:	FÓRMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratado}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculado}} \times 100$ = 13,9%

Tabla 6. Indicadores de gestión afiliación Seguridad Social.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Afiliación al SSS
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores vinculados al SSS}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$

Tabla 7. Indicador de seguimiento y monitoreo, contratación personal

Al cierre del presente informe, se encuentran activos 43 empleados, incluyendo personal operativo y administrativo. La información detallada del personal se





encuentra consolidada en el formato FSGS-010 correspondiente al período mencionado. (**Anexo 29**)

17.5. CONTROL A PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS

No se reporta ningún caso ni ausentismo por esta causa. Hasta la fecha, no se ha presentado personal con patologías o restricciones asociadas.

17.6. CONTROL A PROGRAMAS OSTEOMUSCULAR

Se realiza la capacitación en pausas activas como parte del proceso preventivo del peligro biomecánico asociados al riesgo osteomuscular, hasta el momento no se presenta ninguna patología asociada, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

17.7. ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

- **Trabajo de alturas**

En relación con este tema, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Actualmente, 36 personas cuentan con certificación para trabajo en alturas (**Anexo 30-** Afiliaciones).
- Se garantizará el cumplimiento de las siguientes medidas de control:
 - Identificación y análisis de los peligros asociados al trabajo en alturas.
 - Inspección de anclajes.
 - Revisión de cascos de seguridad con barbuquejo.
 - Verificación del estado de botas de seguridad.
 - Inspección de arneses y equipos de protección personal (EPP) necesarios para la actividad.

- **Orden y aseo**

De manera periódica se realizan jornadas de aseo con el fin de prevenir el riesgo locativo y de esta manera prevenir caídas de los colaboradores.





17.8. Registro de accidentes morbilidad y ausentismo

Casos de accidentes laborales: el día 19 de marzo se registró un accidente de trabajo con un colaborador que realizó una mala fuerza al momento de halar unos ganchos de acero, material que se utiliza para armar estructuras el cual ocasionó dolor en la zona lumbar.

No.	NOMBRE	MOTIVO DE LA AUSENCIA	DIA INICIAL INCAP.	DIA FINAL DE LA INCAP.	PRÓRROGAS	DIAS DE INCAPACIDAD	DÍAS HÁBILES NO LABORADOS
1	Carlos Manuel Polo Noble	AT	19-03-2025	21-03-2025	NO	3	0
2	Jhon Erazo	Calamidad	27-03-2025	NA	NA	NA	NA
3	Carlos Rojas	Motivos personales	28-03-2025	NA	NA	NA	NA
4	Orlando Rojas	Motivos personales	28-03-2025	NA	NA	NA	NA
5	Carlos polo	Motivos personales	03-03-2025	NA	NA	NA	NA
6	Wimar Guaca	Motivos personales	03-03-2025	NA	NA	NA	NA
7	Yoiner Vidal	Motivos personales	03-03-2025	NA	NA	NA	NA





8	Wilmar Zambrano	Calamidad familiar	13-03-2025	NA	NA	NA	NA
9	Luis Mueses	Motivos Personales	17-03-2025	NA	NA	NA	NA
10	William Lebaza	Motivos Personales	17-03-2025	NA	NA	NA	NA
11	Luis Narváez	Motivos Personales	18-03-2025	NA	NA	NA	NA
12	Wilmar Zambrano	Motivos Personales	19-03-2025	NA	NA	NA	NA
TOTAL							12

Tabla 8. Registro de accidentes morbilidad y ausentismo

17.9. DATOS ESTADÍSTICOS

Para calcular las HHT.

Días laborados mes	Horas día	No. Trabajadores	Horas extras	TOTAL, DE HHT
26	8	43	0	8.944

Incap. Laboral A.T	Incap. Laboral E. L	licencias mater/pater	Incap General	Permisos	Total, de días perdido	Horas perdidas por ausentismo
3	0	0	0	0	11	88

HHT REAL
8856





SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de frecuencia: I.F.
FÓRMULA	$\frac{\text{Número de casos reportados} \times 240.000}{\text{Número de horas hombre trabajados}} = \frac{480000}{8856} = 27,100$
DEFINICIÓN	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales)

Tabla 9. número de casos de accidentes de trabajo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de Severidad:
FORMULA	$\frac{\text{Nº días perdidos o cargados por AT en el período} \times 240.000}{\text{Número de horas hombre trabajados}} = \frac{3 \times 240000}{8856} = 81,300$
DEFINICIÓN	El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas-hombre trabajadas durante el mismo

Tabla 10. número de días perdidos accidente laboral

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice Medio de Días Perdidos por Lesiones:
FORMULA	$\frac{\text{No de días perdidos o cargados por causa de lesiones en un periodo}}{\text{Total de casos con tiempo perdido}} = \frac{3}{1} = 3$
DEFINICIÓN	El índice medio de días perdidos por lesiones se define como la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos puede ser aplicado para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo y de enfermedad profesional

Tabla 11. número de días perdidos por lesiones





SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Índice de Lesión Incapacitante (ILI):
FORMULA	$\frac{\text{Índice de frecuencia} \times \text{Severidad}}{1000} \frac{1 \times 3}{1000} = 0,0,3$
DEFINICIÓN	El índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona número de accidentes de trabajo registrados o enfermedades laborales diagnosticadas que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.

Tabla 12. número de días perdidos por lesiones

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Incidencia (IT):
FORMULA	$\frac{(\text{No de accidentes} + \text{No de incidentes}) \times K}{\text{No Total de trabajadores expuestos}} \frac{1 + 1}{34} = 0,05$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño del denominador.

Tabla 13. tasa de incidencia

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (AT) – Accidente de Trabajo:
FORMULA	$\frac{\text{No de horas perdidas por AT} \times K}{\text{No de horas trabajadas}} \frac{24 \times 1000}{8856} = 2,71$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo periodo. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por accidente de trabajo.

Tabla 14. Ausentismo-Accidentes de trabajo





SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Incidencia Específica (EL):
FORMULA	$\frac{\text{Casos nuevos que presentan patologia por expocicion}}{\text{No de horas trabajadas total expuestas al riesgo}} \times K \frac{0}{0} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia específica por enfermedad Laboral corresponde al número de nuevos casos por enfermedad Laboral que ocurren dentro de un período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000 o 100.000 (K) personas

Tabla 15. tasa de incidencia específica

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Prevalencia (E.L.):
FORMULA	$\frac{\text{No. De casos nuevos} + \text{antiguos}}{\text{No de horas trabajadas total expuestas al riesgo}} \times K \frac{0}{0} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de incidencia específica por enfermedad Laboral corresponde al número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo determinado y su relación con el número total de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000 o 100.000 (K) personas

Tabla 16. tasa de Prevalencia

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (EL) – Enfermedad Profesional:
FORMULA	$\frac{\text{Número de horas perdidas por enfermedad profesional}}{\text{No de horas trabajadas}} \times K \frac{0}{0} = 0$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por enfermedad Laboral corresponde al número de horas perdidas por enfermedad Laboral que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por enfermedad Laboral.

Tabla 17. tasa de ausentismo - enfermedad personal





SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	Tasa de Ausentismo (EC) – Enfermedad Común:
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de horas perdidas por enfermedad comun} \times K}{\text{No de horas trabajadas}} \times \frac{0}{0} \times 1000$ $= 0$
DEFINICIÓN	La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un determinado número de horas por enfermedad común

Tabla 18. tasa de ausentismo - enfermedad común

17.10. SANEAMIENTO BÁSICO

Se mantiene la disposición y recolección de residuos, los cuales se clasifican según los códigos de colores y se ubican en toda la obra. Los residuos ordinarios se gestionan conforme a la programación del servicio de aseo público los martes y viernes, mientras que los residuos aprovechables, como madera, cartón y papel de oficina, se almacenan en el punto ecológico bajo techo. Los residuos peligrosos y especiales se manejan a través de un convenio con ASERHI, que los recoge cada vez que se generan; En enero, se recolectaron 26 kilos. Actualmente, está pendiente la organización del kit de derrames.

17.11. PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS

La obra cuenta con un plan diseñado para garantizar la seguridad y protección de todos los colaboradores, visitantes y demás personas presentes. Este plan permite responder de manera eficiente y organizada ante emergencias como caídas, accidentes, incendios, derrumbes o eventos naturales. Además, incluye Procedimientos Operativos Normalizados (PON) que establecen pautas claras de actuación. El Consorcio dispone de dos camillas con riatas de seguridad, dos botiquines y dos extintores ABC para la atención de emergencias, los cuales se encuentran conformados y se abastecen de acuerdo con su uso.





EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.
Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra

Tabla 19. Equipos de atención de emergencias

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

17.12. BRIGADA DE EMERGENCIA

La brigada de emergencias está conformada por el siguiente personal:

BRIGADA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
JEFE DE BRIGADA	Jesús Iruja	76.334.379	JESUS IRUBA
JEFE DE EVACUACIÓN	Guillermo León Escobar	79.3395308	Gust.
BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	Ubaner Perez.	1061600546	Ubaner
BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Ricardo Bolaños	4754652	RICARDO
PERSONAL DE APOYO	Jose Revelo	1061725247	Jose Revelo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% de Capacidad de respuesta
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de Emergencias atendidas oportunamente}}{N^{\circ} \text{ total de emergencias presentadas}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% de simulacros realizados
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de simulacros efectuados}}{N^{\circ} \text{ de simulacros programados}} \times 100 = 0\%$

Tabla 20. Indicador de emergencia





17.13. COPASST

Se cuenta con una vigía de seguridad y salud en el trabajo, quien mensualmente envía una circular de convocatoria a reunión con los representantes de los demás contratistas. En estas reuniones se revisan temas claves relacionados con la seguridad y salud de todos los colaboradores. La próxima reunión está programada para el 8 de abril. **(Anexo 31)**

17.14. COCOLA

Para este periodo no se presenta ninguna novedad referente a acoso laboral.

17.15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Se cuenta con una vigía de seguridad y salud en el trabajo, quien mensualmente envía una circular de convocatoria a reunión con los representantes de los demás contratistas. En estas reuniones se revisan temas claves relacionados con la seguridad y salud de todos los colaboradores. La próxima reunión está programada para el 8 de abril. **(Anexo 32)**

Seguimiento y monitoreo	
INDICADOR	% EPP
FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores dotados con EPP } 28}{N^{\circ} \text{ de trabajadores contratados } 43} \times 100 = 65,1\%$

Tabla 20. porcentaje de personal dotados con EPP vs contratados

La entrega de elementos de protección personal (EPP) alcanza un 65%, ya que no todo el personal requiere estos implementos. Esto se debe a que algunos colaboradores desempeñan funciones administrativas, las cuales no exigen el uso de EPP. **(Anexo 33)**

17.16. INSPECCIONES EN CAMPO:

Se realizan inspecciones en campo conforme a la programación mensual, a compartir herramientas, elementos de protección personal (EPP) y botiquines. Además, se refuerza la observación del comportamiento para mejorar el seguimiento y control preventivo de los riesgos.





Inspecciones programadas Vs ejecutadas					
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MES			
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
GENERAL CAMPO	SEMANAL				
OFICINA	MENSUAL			X	
OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO	SEMANAL				
INSPECCION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	MENSUAL				
EXTINTORES	MENSUAL	X			
BOTIQUINES	MENSUAL				X
TOTAL, PROGRAMADO					

Tabla 22. inspecciones programadas vs ejecutadas

17.17. SEÑALIZACIÓN Y AREAS DELIMITADA

SEÑALES EN OBRA	CANTIDAD	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
Peligro caída de objetos	7	Edificio piso 1 – piso 2	
Peligro riesgo de caída	6	Edificio piso 1 – piso 2	
Uso obligatorio de EPP	3	Ingreso de obra – Edificio piso 1	
Extintor ABC	2	Oficina – Acopio	
Camilla de emergencia	2	Comedor – Acopio de residuos	
Prohibido fumar	1	Edificio piso 1	
Riesgo eléctrico	1		
Atención a PQRS	1	Entrada principal	





Puntos ecológicos	4	2 en oficina – 2 en obra	
Centro de acopio residuos aprovechables	1	Acopio de residuos	
Acopio de residuos no aprovechables	1	Acopio no aprovechables	
Área de herramientas	1	Herramientas	
Acopio residuos peligrosos	1	Acopio de residuos	

Tabla 22. Señalización utilizada en obra

17.18. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO SEÑALIZACION			
INDICADOR DE COBERTURA	% de señales utilizadas	FORMULA	$\frac{N^{\circ} \text{ de señales preventivas puestas en obra}}{N^{\circ} \text{ de señales exigidas en el Plan de Manejo de Tráfico}} = 100\%$

Tabla 23. Seguimiento señales preventivas en obra

La señalización establecida en el Plan de Manejo de Tráfico contempla un total de 18 señales. Sin embargo, tras evaluar las necesidades, se han instalado 31 señales preventivas adicionales con el objetivo de advertir a los colaboradores sobre los riesgos a los que están expuestos.

18. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

De acuerdo con las actividades constructivas, se relaciona el control de calidad de los materiales utilizados durante el periodo del 1 hasta 31 de diciembre:

- ✓ Para efectos de seguimiento y control de calidad del acero de refuerzo utilizado en la cimentación, se adjuntan las cartillas de especificaciones técnicas y certificados de calidad (**Ver anexo 34**), proporcionadas por el proveedor Ferroestación. Estas cartillas corresponden a las siguientes variedades de varillas de acero: acero 1", Acero 3/4", Acero 1/2", Acero 3/8", Acero 5/8".
- ✓ Se llevó a cabo el control de asentamiento del concreto recibido en la obra, utilizando el método de "slump" para evaluar su consistencia.





Posteriormente, se prepararon los cilindros necesarios para realizar el ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Estos cilindros, debidamente identificados, se sometieron a un proceso de hidratación sumergiéndolos en agua, y posteriormente a pruebas de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días.

- ✓ Los resultados de los ensayos son emitidos por el laboratorio Geofísica SAS, donde se observa que la resistencia a la compresión obtenida cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto. **(Ver anexo 35)**

19. CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD

Una vez que el concreto llegó a la obra, se procedió a recolectar las muestras necesarias para la elaboración de 12 cilindros de 4", destinados a ensayos de resistencia a la compresión. El personal del consorcio Evolet realizó la toma de muestras en obra. Posteriormente, los cilindros fueron sumergidos en agua para su curado y una vez transcurrido el número de días requerido para cada prueba, se envió la muestra al laboratorio de Geofísica SAS para su análisis y determinación de la resistencia a compresión.

Adicionalmente, se llevó el seguimiento de cada una de las pruebas relacionadas cumpliendo con la resistencia requerida especificada a continuación:

- ✓ Ensayos de resistencia del concreto premezclado de 4000PSI, suministrado por Geoacopio, para la fundición de las pantallas y columnas.





CONTROL CILINDROS			
		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		CONTROL DE CILINDROS	FORMATO NO. 1
FECHA:	7/02/2025		
NO. TOMA:	34		
LABORATORIO:	EVOLET	CONCRETERA:	GEOACOPIO
CARACTERÍSTICAS			
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	C 2 5 6 7 8 9 PW6-8 ENTREPISO 1	EXPANSIÓN:	60CM
TIPO DE MUESTRA:	Concreto 4000PSI autonivelante - 4 Cilindros de 4"	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 7:	3667
FECHA DEL VACIADO:	7/02/2025	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 14	5977
FECHA Y HORA DE INICIO TOMA DE MUESTRA:	07/02/2025 - 5:31Pm	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 28:	-
FECHA Y HORA DE TERMINACIÓN TOMA DE MUESTRA:	07/02/2025 - 5:45Pm	FECHA DE RECOGIDA DE LOS CILINDROS:	14 de febrero / 21 de febrero / 7 de marzo

IMÁGEN No.7





		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		CONTROL DE CILINDROS	FORMATO NO. 1
FECHA:	14/02/2025		
NO. TOMA:	34		
LABORATORIO:	EVOLET	CONCRETERA:	GEOACOPIO
CARACTERÍSTICAS			
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	C10 - PW1 9 10 ENTREPISO 1	EXPANSIÓN:	63CM
TIPO DE MUESTRA:	Concreto 4000PSI autonivelante - 4 Cilindros de 4"	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 7:	4863
FECHA DEL VACIADO:	10/02/2025	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 16	-
FECHA Y HORA DE INCIO TOMA DE MUESTRA:	10/02/2025 - 7:32Pm	RESISTENCIA OBTENIDA DÍA 28:	-
FECHA Y HORA DE TERMINACIÓN TOMA DE MUESTRA:	10/02/2025 - 7:47Pm	FECHA DE RECOGIDA DE LOS CILINDROS:	17 de febrero / 24 de febrero/ 10 de marzo

IMÁGEN No.8

En el **Anexo 36** se adjuntan los resultados de estos ensayos de compresión al concreto realizados por el laboratorio Geofísica S.A.S. los cuales verifican que se cumple con la resistencia requerida según los planos de diseño.

20. CONTROL DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para esta etapa, se adjunta en el **anexo 37** el procedimiento de cimentación, donde se especifican las fases, actividades y elementos que se tuvieron en cuenta durante la realización de las obras de cimentación y losa de entepiso 2.

Cabe destacar que en obra cada uno de los aspectos a controlar se gestionó mediante la supervisión del Residente de Obra, quien haciendo uso de la Bitácora de Obra realizó el diligenciamiento diario de las actividades, el seguimiento y los controles respectivos con la participación de Interventoría. **(Ver Anexo 38).**

21. RELACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

- HORAS LLUVIAS**





Para el período entre el 20 de febrero al 20 de marzo de 2025 se reportan horas de lluvia con afectaciones asociadas a la ejecución de actividades constructivas. En el reporte climatológico del periodo reportado se han registrado 8 días con lluvias fuertes que han ocasionado la suspensión de actividades.





CONSORCIO EVOLET 		CONTROL DE LLUVIAS - DICIEMBRE				
PROYECTO:	Construcción para edificio de consulta externa, proceso de innovación, investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José E.S.E				CONTRATO DE OBRA No.	Resolución 1832 del 8 de noviembre de 2023
CONTRATISTA:	Consortio Evolet					
FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	TIEMPO	ACUMULADO	CLIMA	SUSPENSIÓN/TRABAJO CON RESTRICCIÓN
Viernes, 21 de febrero de 2025	12:30	15:20	0:45	62:55:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra
Martes, 25 de febrero de 2025	15:10	15:30	0:20	63:15:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra
Miércoles, 26 de febrero de 2025	14:30	15:30	1:00	64:15:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra
Viernes, 28 de febrero 2025	14:30	15:00	0:30	64:45:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra
Viernes, 14 de marzo de 2025	14:15	16:40	2:25	67:10:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra
Martes, 18 de marzo de 2025	14:30	15:30	1:00	68:10:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra
Jueves, 20 de marzo de 2025	14:30	15:00	0:30	68:40:00	Lluvias fuertes	Suspensión de obra





22. AFECTACIONES

En el periodo reportado en el presente informe, no se presentaron situaciones que afectaran las actividades de obra, el personal o su entorno. Se siguieron las condiciones establecidas en los procedimientos constructivos para brindar seguridad en la ejecución, vigilancia y salud de los trabajadores, dando seguimiento a las labores desarrolladas en el periodo, lo anterior, se vio favorecido, además, por las condiciones climáticas con pocos días de lluvia en las actividades ejecutadas en este periodo.

23. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Dado que el consorcio presenta las planillas a fin de mes, se adjuntan las planillas de seguridad social del personal administrativo (**Anexo 39**) y del personal operativo (**Anexo 40**) correspondientes al periodo anterior (febrero). Cabe destacar que las fechas de pago de las planillas de seguridad social dependen de los dos últimos dígitos del documento de identidad del aportante y cuentan con días hábiles adicionales en el mes siguiente.

Respecto al personal operativo vinculado al proyecto, se relaciona quienes durante el 20 de febrero al 20 de marzo ejecutaron las actividades debidamente afiliadas al sistema de seguridad social, donde se adjunta entrega de EPP, planillas de Seguridad Social y documentos de capacitaciones.

PERSONAL ADMINISTRATIVO				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EPS	ARL
ALVARO EDUARDO GAITÁN	19289121	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10301884	INGENIERO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL	SANITAS	SURA
JUAN SEBASTIÁN OROZCO	1061748118	ARQUITECTO DE APOYO TÉCNICO	NUEVA E.P.S.	SURA
JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ	76310636	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA E.P.S.	SURA
JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ	1061725247	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	NUEVA E.P.S.	SURA
JULIO CESAR MAYA BASTIDAS	98385333	COORDINADOR SST	SANITAS	SURA



CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4



LAURA VALENTINA CALLEJAS	1061818139	ARQUITECTA DE APOYO TÉCNICO	SANITAS	SURA
GULLERMO LEON ESCOBAR	93395308	INSPECTOR DE OBRA	SANITAS	SURA
CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1061735885	INGENIERA DE APOYO TÉCNICO	SANITAS	SURA
ELSA MALENE OSORIO MUÑOZ	34533693	PROFESIONAL EN SEGURIDAD OCUPACIONAL	SANITAS	POSITIVA
LORENA FALLA FALLA	1019092020	COORDINADORA SST	NUEVA E.P.S.	SURA
CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES	34328843	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA	SANITAS	SURA
LUCIO CRUZ	4617779	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SANITAS	SURA
DIEGO MELLIZO	3954519	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SANITAS	SURA
ARMANDO CANO	12270356	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	NUEVA EPS	SURA

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL
ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA
CRISTIAN CAMILO MACA AVIRAMA	1002966961	AIC	PORVENIR	SURA
CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA
CARLOS ANDRES ROJAS GUTIERREZ	1007462733	SANITAS	COLPENSIONES	SURA
CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA
DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA
EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA
EMBER JAVID SIMALES BONILLA	1061744746	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA
HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM



CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4



JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA
LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	SANITAS	PORVENIR	SURA
MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
OBER FERNEY SANCHEZ SOL	1061761500	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA
ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA
RAUL LOZADA BERMEO	1117839679	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA
UBANER PEREZ GOMEZ	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA
WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA
WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA
YONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA
ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES	1081595473	EMSSANAR	PORVENIR	SURA
WILMAR ZAMRANO YANDI	1002849154	SANITAS	PORVENIR	SURA
LUIS ERNESTO NARVAEZ ESPINOSA	10568074	SANITAS	PORVENIR	SURA
JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ	1061017769	SANITAS	COLFONDOS	SURA



CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM



PERSONAL OPERATIVO - TOPOGRAFIA				
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL
LUIS ANGEL BAOS	1061804293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
NESDRY YELISSA NARVAEZ GALVIS	1061708231	EMSSANAR	N/A	SURA
LAURA PATRICIA MOYA SOL	1061780375	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
FERNANDO CALVACHE BURBANO	10304252	SANITAS	PORVENIR	SURA
PABLO ERNESTO LASSO CALVACHE	1061781142	ASMETSALUD	COLFONDOS	SURA

24. ANEXOS

1. Pólizas del contrato
2. Estampillas
3. Planos detalles de columnas
4. Planos de detalles de pantallas
5. Diseño de mezcla
6. Resultados ensayos de compresión al concreto – Columnas y pantallas
7. Detalle vigas de entepiso
8. SGA-11732-2024
9. Inventario forestal en la zona de intervención.
10. DTC-4950-2024 10-05-2024
11. DTC-6946-2024 20-05-2024
12. DTC-10370-2024 04-07-2024
13. SG-6653-2024 26-06-2024
14. DTC-7198-2024 09-07-2024
15. DTC-700-2024 10-07-2024
16. Compra árboles nativos
17. Compensación ambiental
18. SGA-10565-2024 09-07-2024
19. SGA-7436-2024 16-07-2024
20. DTC-7629-2024 19-07-2024
21. SGA-11922-2024 31-07-2024
22. SGA-8211-2023
23. Comprobante gestores externos
24. Primer informe CRC DTC-11204-2024 21-10-2024
25. Segundo Informe CRC SGA-553-2025 17-01-2025
26. Afiliaciones y exámenes ocupacionales
27. Capacitaciones al personal





- 28. Inducción del personal
- 29. COPASST
- 30. COCOLA
- 31. Entrega EPP y dotación
- 32. Maquinaria y vehículos
- 33. ATEL
- 34. Control de calidad de acero
- 35. Resultados ensayos de compresión al concreto
- 36. Resultados ensayos de compresión al concreto
- 37. Procedimiento constructivo
- 38. Bitácora de obra
- 39. Seguridad social personal administrativo – Febrero
- 40. Seguridad social personal operativo – Febrero

ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4

JOSE GEOVAIRE AUSECHA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4



ANEXO 8. RESISTENCIA CONCRETO CONTRATISTA



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A
INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
183	975	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	271,3	4	8252	335	4768	32,9	281	4000	27,6	119,2	17,8	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	976	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	255,3	4	8012	325	4621	31,9	281	4000	27,6	115,5	17,8	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	977	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	257,1	5	8171	321	4563	31,5	281	4000	27,6	114,1	17,8	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	978	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	225,2	4	8171	281	3998	27,6	281	4000	27,6	99,9	19,1	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3 Fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	979	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	220,7	4	7854	287	4075	28,1	281	4000	27,6	101,9	19,1	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3 Fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	980	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	236,1	4	8332	289	4110	28,3	281	4000	27,6	102,7	19,1	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3 Fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	981	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	228,6	4	8252	283	4019	27,7	281	4000	27,6	100,5	20,3	Entrepiso 2 vigas ejes 3-6'	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	982	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	233,7	4	8171	292	4148	28,6	281	4000	27,6	103,7	20,3	Entrepiso 2 vigas ejes 3-6'	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	983	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	230,3	4	8252	285	4047	27,9	281	4000	27,6	101,2	20,3	Entrepiso 2 vigas ejes 3-6'	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	984	T28	4	07-feb-25	07-mar-25	28	381,6	4	8012	486	6908	47,6	281	4000	27,6	172,7	65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW6-8 Piso 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera Gomez
KAREN SORJA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A
INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (N)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
223	1154	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	275,6	3	8171	344	4891	33,7	281	4000	27,6	122,3	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1155	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	282,4	3	8252	349	4963	34,2	281	4000	27,6	124,1	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1156	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	301,0	4	8495	361	5138	35,4	281	4000	27,6	128,5	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1157	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	323,2	5	8332	396	5626	38,8	281	4000	27,6	140,7	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1158	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	304,5	4	8171	380	5404	37,3	281	4000	27,6	135,1	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1159	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	309,6	3	8171	386	5496	37,9	281	4000	27,6	137,4	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A
INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
183	975	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	271,3	4	8252	335	4768	32,9	281	4000	27,6	119,2	17,8	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	976	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	255,3	4	8012	325	4621	31,9	281	4000	27,6	115,5	17,8	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	977	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	257,1	5	8171	321	4563	31,5	281	4000	27,6	114,1	17,8	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	978	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	225,2	4	8171	281	3998	27,6	281	4000	27,6	99,9	19,1	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3 Fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	979	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	220,7	4	7854	287	4075	28,1	281	4000	27,6	101,9	19,1	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3 Fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	980	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	236,1	4	8332	289	4110	28,3	281	4000	27,6	102,7	19,1	Entrepiso 2 Vigas ejes 1'-3 Fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	981	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	228,6	4	8252	283	4019	27,7	281	4000	27,6	100,5	20,3	Entrepiso 2 vigas ejes 3-6'	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	982	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	233,7	4	8171	292	4148	28,6	281	4000	27,6	103,7	20,3	Entrepiso 2 vigas ejes 3-6'	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	983	T28	4	27-feb-25	06-mar-25	7	230,3	4	8252	285	4047	27,9	281	4000	27,6	101,2	20,3	Entrepiso 2 vigas ejes 3-6'	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
183	984	T28	4	07-feb-25	07-mar-25	28	381,6	4	8012	486	6908	47,6	281	4000	27,6	172,7	65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW6-8 Piso 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SORJA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A
INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (N)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAMIENTO (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
223	1154	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	275,6	3	8171	344	4891	33,7	281	4000	27,6	122,3	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1155	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	282,4	3	8252	349	4963	34,2	281	4000	27,6	124,1	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1156	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	301,0	4	8495	361	5138	35,4	281	4000	27,6	128,5	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1157	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	323,2	5	8332	396	5626	38,8	281	4000	27,6	140,7	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1158	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	304,5	4	8171	380	5404	37,3	281	4000	27,6	135,1	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	1159	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	309,6	3	8171	386	5496	37,9	281	4000	27,6	137,4	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
Karen Sofia Mosquera G.
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNÓLOGO
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



ANEXO 9. RESISTENCIA CONCRETO INTERVENTORIA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

													RESISTENCIA DE DISEÑO			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2		
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES				
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DÍAS			Kg/cm²	PSI	Mpa						
1	LOSA DE CIMENTACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.1	30.4	13223	177.9	2.449	9-dic-24	18-mar-25	99	525.2	TIPO 5	301.0	4282	29.52	107.0					
2					15.1	30.2	12864	179.1	2.383	9-dic-24	18-mar-25	99	520.4	TIPO 5	296.3	4215	29.1	105.4					

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
3	LOSA DE CIMENTACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.0	30.1	13226	176.7	2.487	14-dic-24	18-mar-25	94	518.7	TIPO 5	299.3	4257	29.35	106.4						
4					15.1	30.1	13152	177.9	2.456	14-dic-24	18-mar-25	94	524.4	TIPO 5	300.6	4275	29.5	106.9						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
5	PANTALLAS PW9 PW5 PW3 C9 C8 (NIVEL 1)	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.2	30.2	12700	180.3	2.333	7-ene-25	18-mar-25	70	511.1	TIPO 5	289.1	4112	28.35	102.8						
6					15.1	30.3	12692	177.9	2.355	7-ene-25	18-mar-25	70	508.4	TIPO 5	291.4	4145	28.6	103.6						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

													RESISTENCIA DE DISEÑO		4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2		
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES			
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa					
7	PANTALLAS PW2 PW4 PW7 PW8 - COLUMNAS C3 C5 C6 C7 (NIVEL 1)	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.2	30.3	13037	180.3	2.387	9-ene-25	18-mar-25	68	512.1	TIPO 5	289.7	4120	28.41	103.0				
8					15.1	30.3	13046	179.1	2.408	9-ene-25	18-mar-25	68	511.1	TIPO 5	291.0	4139	28.5	103.5				

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
9	PANTALLAS PW9 PW5 PW3 C9 C8 (NIVEL 1)	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.1	30.1	12937	177.9	2.420	11-ene-25	18-mar-25	66	509.3	TIPO 5	291.9	4152	28.63	103.8						
10					15.2	30.2	13018	181.5	2.376	11-ene-25	18-mar-25	66	544.0	TIPO 5	305.7	4348	30.0	108.7						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
11	LOSA DE ENTREPISO NIVEL 2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.0	30.3	13199	176.7	2.469	28-ene-25	18-mar-25	49	525.2	TIPO 5	303.1	4311	29.72	107.8						
12					15.1	30.2	12888	179.1	2.387	28-ene-25	18-mar-25	49	525.0	TIPO 5	298.9	4252	29.3	106.3						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
13	PANTALLAS PW5 PW7 COLUMNAS C5 C1 (NIVEL 2)	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.0	30.2	12885	176.7	2.414	4-feb-25	18-mar-25	42	522.7	TIPO 5	301.6	4290	29.58	107.3						
14					15.1	30.4	12971	179.1	2.383	4-feb-25	18-mar-25	42	524.9	TIPO 5	298.9	4251	29.3	106.3						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
15	CUMAS PANTALLAS NIVEL 2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.0	30.2	13099	176.7	2.459	7-feb-25	18-mar-25	39	545.8	TIPO 5	314.9	4480	30.89	112.0						
16					15.1	30.3	13335	177.9	2.478	7-feb-25	18-mar-25	39	546.0	TIPO 5	313.0	4452	30.7	111.3						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE



Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.	CODIGO:	T-293
SOLICITÓ:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		
UBICACIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ		

RESISTENCIA DE DISEÑO																			4000	PSI	28	Mpa	280	Kg/Cm2
PROBETA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ORIGEN DE LA MEZCLA	ASENTAMIENTO IN	DIÁMETRO	ALTURA	PESO	ÁREA	DENSIDAD	FECHA	FECHA	EDAD	LECTURA KN	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA			EVOLUCIÓN %	OBSERVACIONES					
No.					cm	cm	(gr)	(cm2)	(Gr/cm3)	FUNDICIÓN	ROTURA	DIAS			Kg/cm²	PSI	Mpa							
17	PANTALLAS NIVEL 2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E - MUNICIPIO DE POPAYÁN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PREMEZCLADO GEOACOPIO	N/S	15.1	30.2	13045	177.9	2.428	7-feb-25	18-mar-25	39	521.0	TIPO 5	298.6	4248	29.29	106.2						

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS

					
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS POR PERSONAL DEL LABORATORIO. DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Carolina Legarda. CAROLINA LEGARDA GEOTECNÓLOGO - Mat. Profesional # 19516006477CAU Aprobó	VoBo SOLICITANTE
--	-------------------------
