

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15 –ABRIL 26 – MAYO 25 DE 2025</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO DEL PROYECTO:  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023". |
| INTERVENTOR:          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRATISTA:          | CONSORCIO EVOLET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO: | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15<br>(PERIODO ABRIL 26 - MAYO 25 DE 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15**  
**CONSORCIO INTERSALUD PZ**

|                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   |
| <p><b>Elaboró: Jesús Edinson Perafan</b><br/>Residente de Interventoría</p>         | <p><b>Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M.</b><br/>Representante legal<br/>Consortio Intersalud PZ</p> |

MAYO 25 DE 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                 | 8   |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ....                                                                     | 9   |
| 2.1. Localización.....                                                                                | 10  |
| 2.2. Justificación.....                                                                               | 11  |
| 2.3. Características del Proyecto.....                                                                | 12  |
| 3.1. Contrato de Obra.....                                                                            | 13  |
| 3.2. Póliza del Contrato de Obra. ....                                                                | 14  |
| 3.3. Contrato de Interventoría.....                                                                   | 16  |
| 3.4. Pólizas de Interventoría.....                                                                    | 17  |
| 4.1. Gestión Administrativa.....                                                                      | 18  |
| 4.1.1 Personal de Interventoría .....                                                                 | 18  |
| 4.1.2 Personal del contratista de obra. ....                                                          | 19  |
| 4.1.3. Comités de obra. ....                                                                          | 19  |
| 4.1.4 Correspondencia Cruzada.....                                                                    | 20  |
| 4.2. Gestión Técnica.....                                                                             | 29  |
| 4.2.1 Avance de obra .....                                                                            | 29  |
| 4.3. Gestión Financiera .....                                                                         | 91  |
| 4.4. Gestión Socioambiental .....                                                                     | 101 |
| 5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....                                                       | 113 |
| 6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA .....                                                                  | 131 |
| 7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE MUESTRAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA..... | 132 |
| 8. CONCLUSIONES .....                                                                                 | 138 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### Tabla de ilustraciones

|                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. ....               | 10                                   |
| Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1. ....          | 34                                   |
| Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 ..... | 35                                   |
| Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3. ....          | 36                                   |
| Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. .... | 37                                   |
| Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. ....    | 38                                   |
| Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. ....        | 39                                   |
| Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2 .....        | 40                                   |
| Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3. ....        | 41                                   |
| Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. ....       | 42                                   |
| Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. ....       | 43                                   |
| Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. ....       | 44                                   |
| Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. ....       | 45                                   |
| Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. ....       | 46                                   |
| Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. ....       | 47                                   |
| Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. ....      | 48                                   |
| Ilustración 17. Detalle losa de entrepiso .....                        | 49                                   |
| Ilustración 18. Detalle joist VT 01.....                               | 49                                   |
| Ilustración 19. Detalle joist VT 02.....                               | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA<br/> "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA<br/> EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS<br/> ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE<br/> POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE<br/> SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE<br/> RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <b>INFORME MENSUAL No. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Documento<br>Versión 1                                                              |

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ilustración 20. Detalle joist VT 03.....                              | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 21. Detalle joist VT 04.....                              | 50                                   |
| Ilustración 22. Detalle joist VT 05.....                              | 51                                   |
| Ilustración 23. Detalle joist VT 06.....                              | 51                                   |
| Ilustración 24. Detalle joist VT 07.....                              | 52                                   |
| Ilustración 25. Detalle joist VT 08.....                              | 52                                   |
| Ilustración 26. Detalle joist VT 09.....                              | 53                                   |
| Ilustración 27. Disposición de vigas joist entrepiso 3 N+11.50 .....  | 56                                   |
| Ilustración 28. Disposición de refuerzo viga A N +11.50.....          | 57                                   |
| Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A' N +15.40 .....        | 58                                   |
| Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga B N +15.40.....          | 59                                   |
| Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga C N +15.40.....          | 60                                   |
| Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +15.40 .....  | 61                                   |
| Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +15.40.....  | 62                                   |
| Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +15.40.....  | 63                                   |
| Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*) N +15.40. .... | 64                                   |
| Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1* (B-E) N +15.40. ....  | 65                                   |
| Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +15.40.....    | 66                                   |
| Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +15.40.....    | 66                                   |
| Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +15.40.....    | 67                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +15.40 .....  | 68                                   |
| Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +15.40.....    | 68                                   |
| Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +15.40.....   | 69                                   |
| Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +15.40.....    | 69                                   |
| Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 5 ' (B-E) N +15.40 ..... | 70                                   |
| Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5' ' (B-E) N +15.40      | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +15.40         | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 47. Acero corrugado de pantallas .....                    | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 48. Acero corrugado de columnas.....                      | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 49. Acero de refuerzo Vigas Joist.....                    | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 50. Acero corrugado vigas de entrepiso ...                | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 51. Fundición losa de cimentación .....                   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Ilustración 52. Concreto para columnas.....                           | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |

### Lista de tablas

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Contrato de obra .....                                                    | 14 |
| Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra.....                           | 14 |
| Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra..... | 15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tabla 4. Contrato de Interventoría .....        | 16 |
| Tabla 5. Pólizas de Interventoría .....         | 17 |
| Tabla 6. Personal de Interventoría.....         | 18 |
| Tabla 7. Personal del contratista de obra. .... | 19 |
| Tabla 8. Actas de comité .....                  | 20 |

### Lista de Anexos

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.....                        | 15 |
| Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.....                                                                        | 17 |
| Anexo 3. Planillas personal Interventoría.....                                                                           | 19 |
| Anexo 4. Actas de comité mayo de 2025 .....                                                                              | 20 |
| Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. ....                                                                    | 29 |
| Anexo 6. Autorización de desembolso G Y J FERRETERIAS S.A del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025. ....       | 94 |
| Anexo 7. Autorización de desembolso IMCOMERSA LUD SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025. ....           | 94 |
| Anexo 8. Autorización de desembolso REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025 ..... | 94 |
| Anexo 9. Autorización de desembolso EQUIPAR GLEASON del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025. ....             | 94 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 10. Autorización de desembolso SILOGISTICA SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025. ....                  | 94  |
| Anexo 11. Autorización de desembolso HIDRAULICA Y SANITARIA SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025.....        | 94  |
| Anexo 12. Autorización de desembolso CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025..... | 94  |
| Anexo 14. Informe mensual del periodo del 26 abril al 25 de mayo de 2025 del contratista de obra .....                         | 132 |
| Anexo 15. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA.....                                                                  | 137 |
| Anexo 16. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA .....                                                               | 138 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE ABRIL A 25 DE MAYO DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## 2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km<sup>2</sup>, el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



*Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.*

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km<sup>2</sup>, se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## **2.2. Justificación.**

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

### **2.3. Características del Proyecto.**

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

#### 3.1. Contrato de Obra.

| CONTRATO N° 358 DE 2023            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma contratista                  | <b>CONSORCIO EVOLET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIT                                | 901.784.507-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto del contrato                | Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. |
| Valor del contrato incluido el AIU | Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$32.473.928.569)                                                                                                                                                                                                 |
| Contrato N°                        | 358 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acta de Inicio                     | 22 de marzo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plazo inicial estimado             | Veinte (20) meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ampliación de plazo                | Ciento setenta y dos (172) días                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plazo final estimado               | Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de terminación inicial       | 22 de noviembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de terminación final         | 13 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Registro presupuestal              | 1348 del 27 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Imputación Presupuestal            | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

*Tabla 1. Contrato de obra*

### 3.2. Póliza del Contrato de Obra.

| Seguros del Estado<br>N°. 41-44-101279178 Anexo 3                            | Vigencia        |               | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                                                                              | Desde           | Hasta         |                     |
| Cumplimiento del Contrato                                                    | 22-marzo-2024   | 23-marzo-2026 | \$ 6.494.785.713,80 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                | 22-marzo-2024   | 23-marzo-2026 | \$ 9.742.178.570,70 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 22-marzo-2024   | 23-nov-2028   | \$ 1.623.696.428,45 |
| Estabilidad y calidad de la obra                                             | Cinco (5) años. |               | \$ 3.247.392.856,90 |

*Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra*

| Seguros del Estado<br>N°. 41-40-101051477 Anexo 3 | Vigencia      |             | Valor               |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|                                                   | Desde         | Hasta       |                     |
| Predios, labores y operaciones                    | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Daño emergente y lucro cesante                    | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Perjuicios extrapatrimoniales                     | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Contratistas y subcontratistas                    | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Responsabilidad civil patronal                    | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Vehiculos propios y no propios                    | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | \$ 1.623.696.428,45 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

*Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.*

| Seguros del Estado<br>N°. 41-44-101279178 Anexo 4                            | Vigencia                                   |              | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                              | Desde                                      | Hasta        |                     |
| Cumplimiento del Contrato                                                    | 22-marzo-2024                              | 13-sept-2026 | \$ 6.494.785.713,80 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                | 22-marzo-2024                              | 13-sept-2026 | \$ 9.742.178.570,70 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 22-marzo-2024                              | 13-may-2029  | \$ 1.623.696.428,45 |
| Estabilidad y calidad de la obra                                             | Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días. |              | \$ 3.247.392.856,90 |

*Tabla 3. Póliza de cumplimiento Contratista de obra*

| Seguros del Estado<br>N°. 41-40-101051477 Anexo 4 | Vigencia      |             | Valor               |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|                                                   | Desde         | Hasta       |                     |
| Predios, labores y operaciones                    | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Daño emergente y lucro cesante                    | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Perjuicios extrapatrimoniales                     | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Contratistas y subcontratistas                    | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Responsabilidad civil patronal                    | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | \$ 1.623.696.428,45 |
| Vehiculos propios y no propios                    | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | \$ 1.623.696.428,45 |

*Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra*

*Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### 3.3. Contrato de Interventoría.

| <b>CONTRATO N° 078 DE 2024</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma contratista                     | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIT                                   | 901.794.710-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto del contrato                   | Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023". |
| Valor del contrato                    | Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. (\$1.280.412.030) incluido iva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato N°                           | 078 de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acta de Inicio                        | 22 de marzo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plazo inicial estimado                | Veinte (20) meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ampliación de plazo<br>Otro si No .01 | Ciento setenta y dos (172) días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plazo final estimado                  | Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de terminación<br>inicial       | 22 de noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de terminación<br>final         | 13 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Imputación<br>Presupuestal            | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Registro                              | Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

*Tabla 5. Contrato de Interventoría*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

### 3.4. Pólizas de Interventoría.

| Aseguradora Solidaria de Colombia<br>N°. 435-47-<br>994000056187 ANEXO<br>2 | Vigencia      |             | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|
|                                                                             | Desde         | Hasta       |                  |
| Cumplimiento del Contrato                                                   | 22-marzo-2024 | 22-may-2026 | \$256.082.406,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables             | 22-marzo-2024 | 22-nov-2028 | \$64.020.601,50  |
| Calidad del Servicio                                                        | 22-nov-2025   | 22-nov-2030 | \$256.082.406,00 |

*Tabla 6. Pólizas de Interventoría*

*Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.*

*Póliza ampliación de plazo de interventoría OTROSI N°01.*

| Aseguradora Solidaria de Colombia<br>N°. 435-47-<br>994000056187 ANEXO<br>3 | Vigencia      |             | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|
|                                                                             | Desde         | Hasta       |                  |
| Cumplimiento del Contrato                                                   | 22-marzo-2024 | 10-nov-2026 | \$256.082.406,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables             | 22-marzo-2024 | 10-may-2029 | \$64.020.601,50  |
| Calidad del Servicio                                                        | 22-nov-2025   | 13-may-2031 | \$256.082.406,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

#### 4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE MARZO al 25 DE ABRIL DE 2025.

##### 4.1. Gestión Administrativa

##### 4.1.1 Personal de Interventoría

| CARGO                                          | PROFESIONAL              |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Representante Legal                            | Michelle Vannessa Proaño |
| Director de Interventoría                      | Martin Adolfo Morillo    |
| Residente de Interventoría                     | Jesús Edinson Perafán L. |
| Inspector de Obra                              | Augusto Guzmán Enriquez  |
| Ingeniera Auxiliar Técnica                     | Angélica Ordóñez Cortés  |
| Ingeniera eléctrica                            | Xiomara Giraldo          |
|                                                |                          |
| <b>Dedicación 30%</b>                          |                          |
| Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo | Aixsa Angulo Agudelo.    |
| Abogado Juridico                               | José Alexander Romero    |
| Contador publico                               | Edwin Micolta Mondragón  |

*Tabla 7. Personal de Interventoría.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### *Anexo 3. Planillas personal Interventoría*

#### **4.1.2 Personal del contratista de obra.**

| CARGO                                          | PROFESIONAL              |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Representante Legal                            | Isabel Cristina Giraldo  |
| Director de obra                               | Álvaro Eduardo Gaitán    |
| Suplente representante legal                   | Carlos Alberto Córdoba   |
| Ingeniero residente de obra                    | José Geovaire Ausecha    |
| Asesor Infraestructura Hospitalaria            | Juan Sebastian Orozco    |
| Profesional en Seguridad Ocupacional           | Elsa Malene Osorio Muñoz |
| Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo | Lorena Falla Falla       |
| Inspector de obra                              | Guillermo León Escobar   |
| Ingeniero civil apoyo técnico.                 | Claudia Gaviria          |

*Tabla 8. Personal del contratista de obra.*

#### **4.1.3. Comités de obra.**

Durante el periodo se realizaron cuatro (4) comités técnicos

| COMITÉ | FECHA      |
|--------|------------|
| 47     | 02-05-2025 |
| 48     | 09-05-2025 |
| 49     | 16-05-2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|    |            |
|----|------------|
| 50 | 23-05-2025 |
|----|------------|

*Tabla 9. Actas de comité*

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Adicionalmente, se realizaron reuniones eléctricas y con el personal jurídico de la entidad, con el fin de abordar las observaciones eléctricas y el ajuste al diseño electrico.

Se informa que se solicito a la entidad mediante oficio la entrega de las actas de comité firmadas N°48, N°49, N°50.

#### *Anexo 4. Actas de comité mayo de 2025*

##### **4.1.4 Correspondencia Cruzada**

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

|           |                    |                                                                                                                         |                         |                                                                 |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2/05/2025 | CIPZ-078-0238-2025 | CREVISION PREACTAS DE OBRA N°2 – PAQUETE N°4 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 – OBSERVACIÓN PREACTAS EN GENERAL                  | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 2/05/2025 | CIPZ-078-0239-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C58-23-368 2025 “REQUERIMIENTOS ELECTRICOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA”                               | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 3/05/2025 | CIPZ-078-0240-2025 | REMISION BALANCE DE OBRA N°3 , CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023                                                           | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO              |
| 5/05/2025 | CIPZ-078-0241-2025 | RESPUESTA AL OFICIO EV-C358-23-0392-25 – DISEÑOS ELECTRICOS                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 5/05/2025 | CIPZ-078-0242-2025 | REMISION OBSERVACIONES ELECTRICAS OFICIO EV- C358-23-0392- 25 CONTRATISTA DE OBRA                                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO              |
| 5/05/2025 | CIPZ-078-0243-2025 | REMISION POLIZAS OTROSI N°1 CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023                                                              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO              |
| 7/05/2025 | CIPZ-078-0244-2025 | OBSERVACIONES INFORME N°14 ABRIL 2025 CONTRATISTA                                                                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 6/05/2025 | CIPZ-078-0245-2025 | REVISION PLANO DE PRODUCCION VIGAS JOIST PISO 5 (NIVEL N+19.30) – OBSERVACION VIGAS DE ENTREPISO                        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 6/05/2025 | CIPZ-078-0246-2025 | REVISION DE PREACTA N° 2, PAQUETE N°5 OFICIO EV- C358-23-0390-25 DEL 5 DE MAYO DE 2025.                                 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 7/05/2025 | CIPZ-078-0247-2025 | SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL – INGENIERO ELECTRICISTA                                                                   | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 7/05/2025 | CIPZ-078-0248-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 7 DE MAYO 2025 – “ENTREGA DE DISEÑOS DE LA RED DE MEDIA TENSION (MT) PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|            |                    |                                                                                                                |                         |                                                              |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7/05/2025  | CIPZ-078-0249-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 7 MAYO 2025 – “SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS MINIMO DE TRABAJO – COMPONENTE   | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 12/05/2025 | CIPZ-078-0250-2025 | SOLICITUD DE PAGO DEL ACTA INTERVENTORIA, CONTRATO 078 DE 2024                                                 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 14/05/2025 | CIPZ-078-0251-2025 | REMISION DE CONTROL DE ASENTAMIENTOS CONTRATO N°358 2023                                                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 13/05/2025 | CIPZ-078-0252-2025 | AVANCE EN EJECUCION DE OBRA                                                                                    | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 13/05/2025 | CIPZ-078-0253-2025 | VISITA TECNICA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA                                                    | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 13/05/2025 | CIPZ-078-0254-2025 | RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0393-25 - OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PARA CAMBIO DE PROFESIONALES.        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 13/05/2025 | CIPZ-078-0255-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0392-25, OBSERVACIONES ELECTRICAS                                                  | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 13/05/2025 | CIPZ-078-0256-2025 | CORRESPONDENCIA CONTRATO N°358 DE 2023                                                                         | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 15/05/2025 | CIPZ-078-0257-2025 | REMISION POLIZAS OTROSI N°1 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°078 DE 2024                                            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 16/05/2025 | CIPZ-078-0258-2025 | RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 15 DE MAYO 2025 – “SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES           | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 16/05/2025 | CIPZ-078-0259-2025 | REQUERIMIENTOS APANTALLAMIENTO DEL EDIFICIO Y RESPUESTA A OFICIO EV- C358-23-0345-25                           | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 16/05/2025 | CIPZ-078-0260-2025 | REMISION OFICIO EV-C358-23-0411-25 CONTRATISTA - “SOLICITUD”                                                   | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 19/05/2025 | CIPZ-078-0261-2025 | REMISIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO MARZO-ABRIL 2025, CONTRATO N°358 2023                               | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0262-2025 | REVISION DE PLANO DE FABRICACIÓN VIGAS JOIST ENTREPIOS N°6(N+23.20), N°7(N+27.10), N°8(N+31.00) y N°9(N+34.90) | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0263-2025 | TRAMITES CONEXION RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA.                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0264-2025 | TRAMITES CONEXIÓN RED DE INCENDIOS                                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0266-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°2 DE OBRA- CONTRATO n358 2023                                                           | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|            |                    |                                                                                                                                      |                         |                                                                    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0267-2025 | ACTA DE MODIFICACION N°001 DEL 14 DE MAYO 2025 – CONTRATO N°358 2023                                                                 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0268-2025 | SOLICITUD FRENTE A CONSIGNACIÓN ERRÓNEA DE RECURSOS A LA CUENTA FIDUCIARIA                                                           | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO<br>EVOLET |
| 20/05/2025 | CIPZ-078-0269-2025 | SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD COMPONENTE SST                                                                              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO<br>EVOLET |
| 21/05/2025 | CIPZ-078-0270-2025 | RESPUESTA OFICIOS 15 DE MAYO – SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA SOBRE PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR DESCARGAS ELECTRICAS | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 22/05/2025 | CIPZ-078-0271-2025 | RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0417-25 – REQUERIMIENTOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DEL EDIFICIO                                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO<br>EVOLET |
| 22/05/2025 | CIPZ-078-0272-2025 | RESPUESTA OFICIO 20 DE MAYO – SOLICITUD DE APOYO EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA REINTEGRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR ERROR     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 23/05/2025 | CIPZ-078-0273-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°2 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 24/05/2025 | CIPZ-078-0274-2025 | RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0419-25 – SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO   | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO<br>EVOLET |
| 26/05/2025 | CIPZ-078-0275-2025 | REITERACION PROVISIONAL ELECTRICA                                                                                                    | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO<br>EVOLET |
| 26/05/2025 | CIPZ-078-0276-2025 | RESPUESTA EV-C358-23-0405-25, JUSTIFICACION CAMBIO SECCION VIGAS ENTREPISO (N+19.30) BALCONES                                        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO<br>EVOLET |
| 27/05/2025 | CIPZ-078-277-2025  | SOLICITUD ENTREGA ESTUDIO DE LOS PARAMETROS DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO.                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 26/05/2025 | CIPZ-078-278-2025  | SOLICITUD DE CIERRE DE VENTANAS CON VISTA DIRECTA A ZONAS ASISTENCIALES – PISO 3 HUSJ                                                | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 26/05/2025 | CIPZ-078-0280-2025 | RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 14 DE MAYO - SOLICITUD DE CONCEPTO CLARO SOBRE OBSERVACIONES DEL COMPONENTE ELECTRICO                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |
| 27/05/2025 | CIPZ-078-0281-2025 | SOLICITUD REPROGRAMACION COMITÉ DE OBRA                                                                                              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|            |                    |                                                                                                                                      |                         |                                                                 |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 27/05/2025 | CIPZ-078-0282-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-412-25 – “COBRO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO”                                                | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 27/05/2025 | CIPZ-078-0283-2025 | INSPECCION AMBIENTAL A OBRA - 19 DE MAYO 2025.                                                                                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 27/05/2025 | CIPZ-078-0284-2025 | REMISION CONCEPTO INFORME BALANCE N°3 DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL 26 DE MAYO 2025              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 27/05/2025 | CIPZ-078-0285-2025 | SOLICITUD FRENTE A CONSIGNACIÓN ERRÓNEA DE RECURSOS A LA CUENTA FIDUCIARIA – ACTUALIZACIÓN DEL CASO A 27/05/2025                     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 28/05/2025 | CIPZ-078-0286-2025 | REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL 2025                                                                                               | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE<br>ADM Y FINANCIERO HUSJ         |
| 30/05/2025 | CIPZ-078-0287-2025 | REVISION INFORME MENSUAL MAYO 2025 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023                                                                     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 29/05/2025 | CIPZ-078-0288-2025 | REMISIÓN OFICIO ENTIDAD 29 DE MAYO 2025 “RESPUESTA POSITIVA FRENTE A SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN ERRÓNEA DE RECURSOS – AUTORIZACIÓN DE | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO        | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                                   | DESTINO                                                                              | ASUNTO                                                                                                                                |
|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2/05/2025        | EV-C358-23-0386-25 | 2/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Reporte personal obra.                                                                                                                |
| 4/05/2025        | EV-C358-23-0392-25 | 4/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Diseños eléctricos.                                                                                                                   |
| 6/05/2025        | EV-C358-23-0391-25 | 6/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Solicitud disponibilidad de<br>parqueadero para la actividad de<br>fundición de<br>columnas y pantallas del piso No. 5.               |
| 7/05/2025        | N.A                | 7/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Entrega diseños de red de media<br>tension (MT) para conexión electrica<br>contrato 358 2023                                          |
| 7/05/2025        | N.A                | 7/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Solicitud de informacion sobre equipo<br>minimos de trabajo - componente<br>electrico                                                 |
| 7/05/2025        | EV-C358-23-0393-25 | 7/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Hojas de vida Ingeniero eléctrico e<br>Ingeniero civil especialista en<br>estructuras.                                                |
| 6/05/2025        | N.A                | 7/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Convocatoria reunion para estudio y<br>ajustes en el diseño de aire<br>acondicionado contrato 358 2023                                |
| 8/05/2025        | EV-C358-23-0393-25 | 8/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Control asentaminetos torre para el<br>servicio de consulta externa en<br>construccion                                                |
| 6/05/2025        | N.A                | 8/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Respuesta a observaciones del<br>componente electrico oficio EV-C358-<br>23-392-25                                                    |
| 8/05/2025        | N.A                | 8/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Solicitud de estudio actualizado de<br>control de asentamientos de la torre                                                           |
| 8/05/2025        | N.A                | 8/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Solicitud de aclaracion en mesa<br>tecnica sobre los diseños utilizados<br>para la ejecuion del contrato de<br>interventoria 078 2024 |
| 9/05/2025        | EV-C358-23-0395-25 | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | JUAN FRANCISCO MORA<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO - COPIA<br>MICHELLE VANNESSA | Solicitud área parcial de parqueadero<br>para el acopio de materiales.                                                                |
| 8/05/2025        | N.A                | 9/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y<br>FINANCIERA - JUAN<br>FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Aceptacion del cambio de profesional<br>electrico contrato 078 2024                                                                   |
| 9/05/2025        | EV-C358-23-0396-25 | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ               | Respuesta oficio CIPZ-078-0249-2025<br>"SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE<br>EQUIPOS<br>MINIMO DE TRABAJO –                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|            |                    |            |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                               |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/05/2025  | EV-C358-23-0399-29 | 9/05/2025  | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Entrega de acta de obra No. 2.                                                                                                                |
| 9/05/2025  | EV-C358-23-0397-25 | 9/05/2025  | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-02408-2025<br>- Red de media tensión (MT) para<br>la conexión eléctrica"                                            |
| 9/05/2025  | EV-C358-23-0398-25 | 9/05/2025  | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Reporte personal obra.                                                                                                                        |
| 9/05/2025  | EV-C358-23-0400-25 | 9/05/2025  | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Reporte personal obra.                                                                                                                        |
| 10/05/2025 | EV-C358-23-0401-25 | 10/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta a los oficios CIPZ-078-0226-<br>2025 y CIPZ-078-0233-2025.                                                                          |
| 8/05/2025  | EV-C358-23-390-25  | 10/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud ajuste de rubros.                                                                                                                   |
| 30/04/2025 | n.a                | 10/05/2025 | Universidad autonoma del<br>cauca                         | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | visita obra uniautonoma                                                                                                                       |
| 14/05/2025 | n.a                | 14/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud de concepto claro sobre<br>observaciones del componente<br>electrico en el oficio EV-C358-23-0392-<br>25 hecho por consorcio evolet |
| 14/05/2025 | EV-C358-23-0405-25 | 14/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta a oficios con radicado CIPZ-<br>078-0159-2025, CIPZ-078-0163-2025<br>y CIPZ-078-0245-2025                                           |
| 14/05/2025 | n.a                | 14/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud de polizas requeridas para la<br>legalizacion del otro si N°1 contrato<br>078 2024                                                  |
| 15/05/2025 | EV-C358-23-0407-25 | 15/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Entrega acta modificacion N°001                                                                                                               |
| 15/05/2025 | EV-C358-23-0408-25 | 15/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Entrega acta de obra N°2                                                                                                                      |
| 15/05/2025 | EV-C358-23-0410-25 | 15/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0244-<br>2025, Observaciones Informe N°14<br>Abril 2025.                                                     |
| 15/05/2025 | EV-C358-23-0409-25 | 15/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0255-<br>2025                                                                                                    |
| 15/05/2025 | EV-C358-23-0411-25 | 15/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud.                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|            |                    |            |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                           |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/05/2025 | EV-C358-23-0404-25 | 12/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta oficio con radicado CIPZ-078-01-2025 - Radicado el 21 de marzo de 2025                                                          |
| 15/05/2025 | n.a                | 15/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud de concepto tecnico sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) e informe de cumplimiento por parte del consorcio |
| 15/05/2025 | n.a                | 15/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud de certificacion de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales consorcio intersalud pz             |
| 15/05/2025 | n.a                | 15/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud de requerimiento al contratista sobre plan de mitigacion de riesgo por descargas electricas naturales                           |
| 16/05/2025 | n.a                | 16/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud informe de interventoria - abril 2025                                                                                           |
| 16/05/2025 | n.a                | 16/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | solicitud de informe de rendimientos financieros del anticipo abril 2025                                                                  |
| 16/05/2025 | EV-C358-23-411-25  | 16/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-0254-2025 – Observaciones sobre cambio de profesionales                                                         |
| 16/05/2025 | EV-C358-23-412-25  | 16/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Cobro plan de manejo ambiental del proyecto                                                                                               |
| 17/05/2025 | EV-C358-23-0413-25 | 17/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0245-2025                                                                                                    |
| 19/05/2025 | EV-C358-23-414-25  | 19/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Remisión soporte de consignación de rendimientos financieros correspondientes al mes de marzo y abril 2025.                               |
| 19/05/2025 | n.a                | 19/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Convocatoria mesa tecnica - revision diseños                                                                                              |
| 19/05/2025 | EV-C358-23-415-25  | 19/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Estado del balance de obra del contrato No. 358 de diciembre de 2023                                                                      |
| 19/05/2025 | EV-C358-23-0416-25 | 19/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Remisión de informe No. 6 de fiducia.                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|            |                    |            |                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                    |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/05/2025 | EV-C358-23-0417-25 | 19/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Respuesta a Oficio CIPZ-078-0259-2025.                                                             |
| 19/05/2025 | EV-C358-23-0418-25 | 19/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Reporte personal obra.                                                                             |
| 19/05/2025 | EV-C358-23-0419-25 | 19/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Solicitud de Reprogramación de Actividades - Instalaciones Eléctricas y Aire Acondicionado         |
| 19/05/2025 | N.A                | 19/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Acta no contiene aspectos debatidos en esa sesión                                                  |
| 20/05/2025 | EV-C358-23-0421-25 | 20/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Respuesta a Oficio CIPZ-078-0262-2025.                                                             |
| 20/05/2025 | EV-C358-23-0420-25 | 20/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | ACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS MOVILES                                                              |
| 20/05/2025 | n.a                | 20/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Oficio recepción de pago ACTA 1 en fiducia                                                         |
| 20/05/2025 | EV-C358-23-0422-25 | 20/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | JUAN FRACISCO MORA<br>SUBGERENTE COPIA<br>MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta CIPZ-078-01-2025                                                                         |
| 20/05/2025 | n.a                | 20/05/2025 | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Solicitud de apoyo en el proceso de autorizacion para reintegro de recursos transferidos por error |
| 21/05/2025 | EV-C358-23-0423-25 | 21/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Remisión de informe mensual del 25 de marzo a 25 de abril del 2025.                                |
| 21/05/2025 | EV-C358-23-0424-25 | 21/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0264-2025                                                             |
| 21/05/2025 | EV-C358-23-425-25  | 21/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0263-2025                                                             |
| 22/05/2025 | EV-C358-23-0426-25 | 22/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de losa de entrepiso No. 5. |
| 22/05/2025 | n.a                | 22/05/2025 | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ                                           | Autorización para Reintegro de Recursos                                                            |
|            |                    |            |                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

*Anexo 5. Trazabilidad de correspondencia Cruzada.*

## **4.2. Gestión Técnica**

### **4.2.1 Avance de obra**

Durante el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, el contratista de obra terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso 4 N +15.40, el armado de aceros de las vigas de entrepiso 4 N+15,40 y la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso 4 N+15.40, se instalaron las vigas joist de entrepiso 4 N+15.40. Se realizó la fundición de las vigas y losa de entrepiso 4 N+15.40.

Se realizó la instalación de aceros de columnas y pantallas para el piso 5 N+15.40 a N+19.30.

Se realizó la instalación de formaleta para columnas y columnas y pantallas del piso 5 N+15.40 a N+19.30.

Se realizó la instalación de concretos de columnas y columnas y pantallas para el piso 5 N+15.40 a N+19.30.

Se terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso 5 N +19.30, el armado de aceros de las vigas de entrepiso 5 N+19,30 y la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso 5 N+19.30, se instalaron las vigas joist de entrepiso 5 N+19.30.

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas centrales del nivel 2 a 3 N+7.60 a N+11.50.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas centrales del nivel 2 a 3 N+7.60 a N+11.50.

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas de emergencia del nivel 3 a 4 N+11.50 a N+15.40.

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas de emergencia del nivel 3 a 4 N+11.50 a N+15.40

Se han construido muros en mampostería estructural en las fachadas y muros confinados en las zonas húmedas y muros perimetrales de las gradas centrales y de emergencia en los pisos 1 y 2.

Se ha realizado la instalación de redes sanitarias bajo el piso 2 y piso 3.

Los aceros de vigas y losas fueron verificados que cumplieran en diámetro, cuantía, longitud, espaciamientos, posición conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría.

Se verificó que las vigas joist de los entresijos cumplieran en dimensión, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales, para lo cual se utilizó flexómetro y calibrador.

Se verificó que el acero de la malla electrosoldada, cumplieran con lo estipulado en los diseños aprobados por la curaduría, se verificó las dimensiones de las formaletas de las vigas de entresijo cumplieran con los diseños estructurales se verificó los niveles de la formaleta de la losa de entresijo 4 N+15.40 y entresijo 5 N+19.30.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las vigas y losa de entresijo No 4 N+15.40, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, para lo cual los

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

asentamientos de los concretos de cada vehículo de suministro se encontraron dentro del margen de las 7" más o menos 1", se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima exigida conforme a los diseños estructurales.



Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Se verificó que los aceros de las columnas y pantallas del entrepiso N+15.40 a N+19.30 cumplieran con el diámetro, longitud, cuantía, disposición, espaciamiento, conforme a lo establecido en los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se verifico las formaletas para columnas y pantallas del entrepiso N+15.40 a N+19.30, cumplieran con las dimensiones, los plomos, escuadra y alineamientos conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las columnas y pantallas de entrepiso N+15.40 a N+19.30, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 8" más o menos 1".

Se verificó la disposición de formaleta de la losa de entrepiso No 5 N+19.30, se verificó que los aceros de las vigas de entrepiso del nivel 5 N+19.30 cumplieran en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas de emergencia del entrepiso 3 N+7.60 a N+11.50 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento y espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las de las gradas de emergencia del entrepiso 3 N+7.60 a N+11.50, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 3000 psi de resistencia.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

Cabe mencionar que, en los planos de producción de las vigas joist se identifico el cambio de sección de las vigas de entrepiso N°12 y N°13 de la planta del nivel 5 N+19.30, a lo cual mediante oficio CIPZ-078-0276-2025 del 26 de mayo se le solicito al contratista la justificación de ello. El contratista de obra mediante oficio EV-C358-23-0405-25 presento la justifiacion. Sin embargo, esta interventoria luego de realizar la debida revisión de la documentación remitida se observó que dichos cambios fueron justificados por el contratista y avalados por la consultoría. Sin embargo, se solicitó que la documentación este avalada por el ingeniero estructural parte del equipo mínimo del contratista.

Para los muros de mampostería, se realizó control de localización y dimensiones, se verificó la instalación de los anclajes de los arranques de los refuerzos a la losa inferior, se controló el correcto vaciado de las dovelas y de las columnetas de confinamientos, se verificó la correcta instalación de los aceros de refuerzo tanto en dovelas como en columnetas.

Para la tubería sanitaria, se ha llevado control del sentido de flujo de la tubería, pendientes y dimensiones, conforme a los diseños, se realizó recomendaciones de ajustes a trazados en la zona del cuarto eléctrico, para minimizar los riesgos por filtraciones al sector, se ha verificado que no existan filtraciones con ensayos de estanquidad de la tubería.

### **DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N 15.40 A N +19.30**

- COLUMNA C1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |


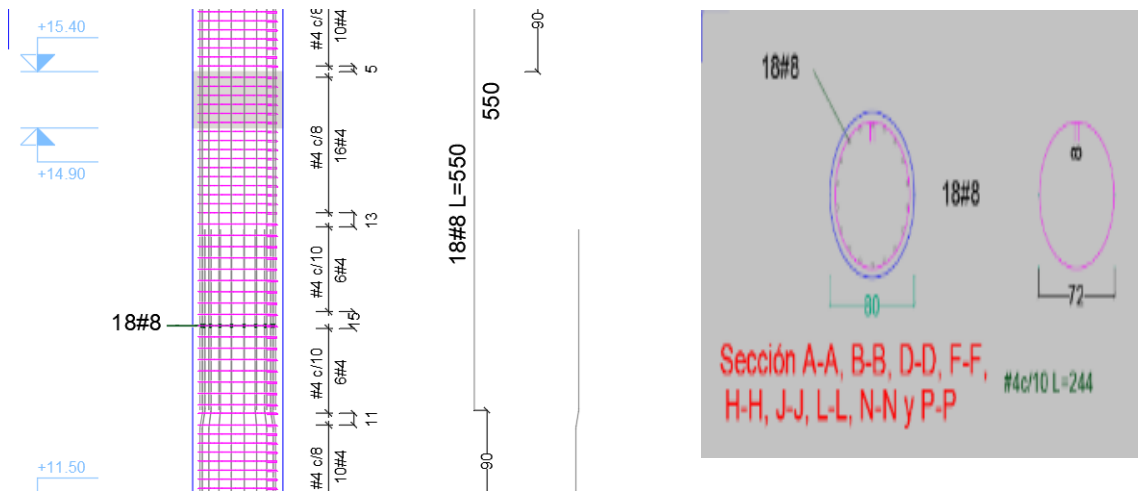


Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1.

- COLUMNA C2, C4 y C5

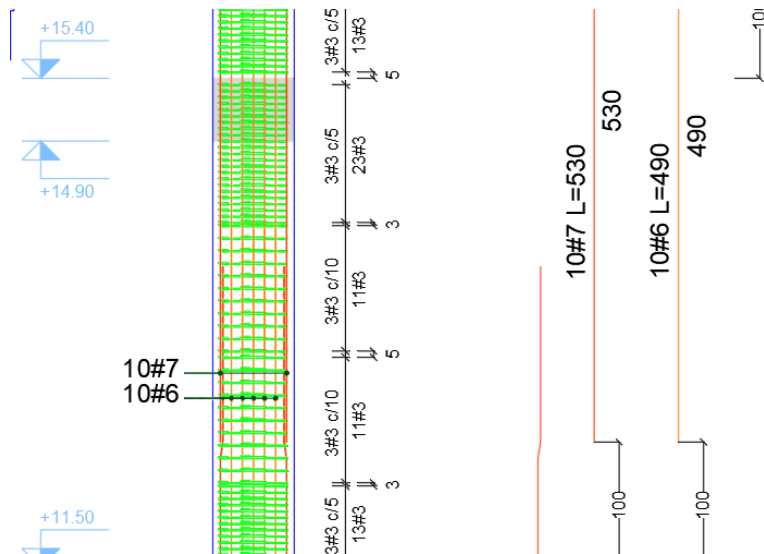

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

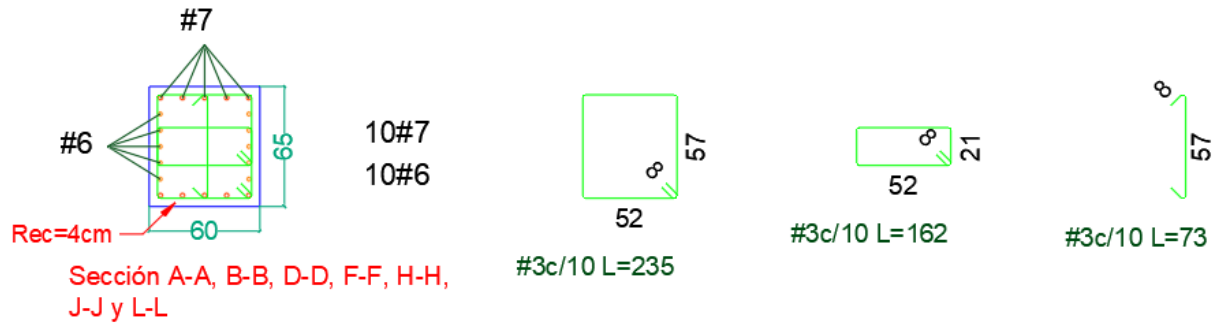


*Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5*

- COLUMNA C3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

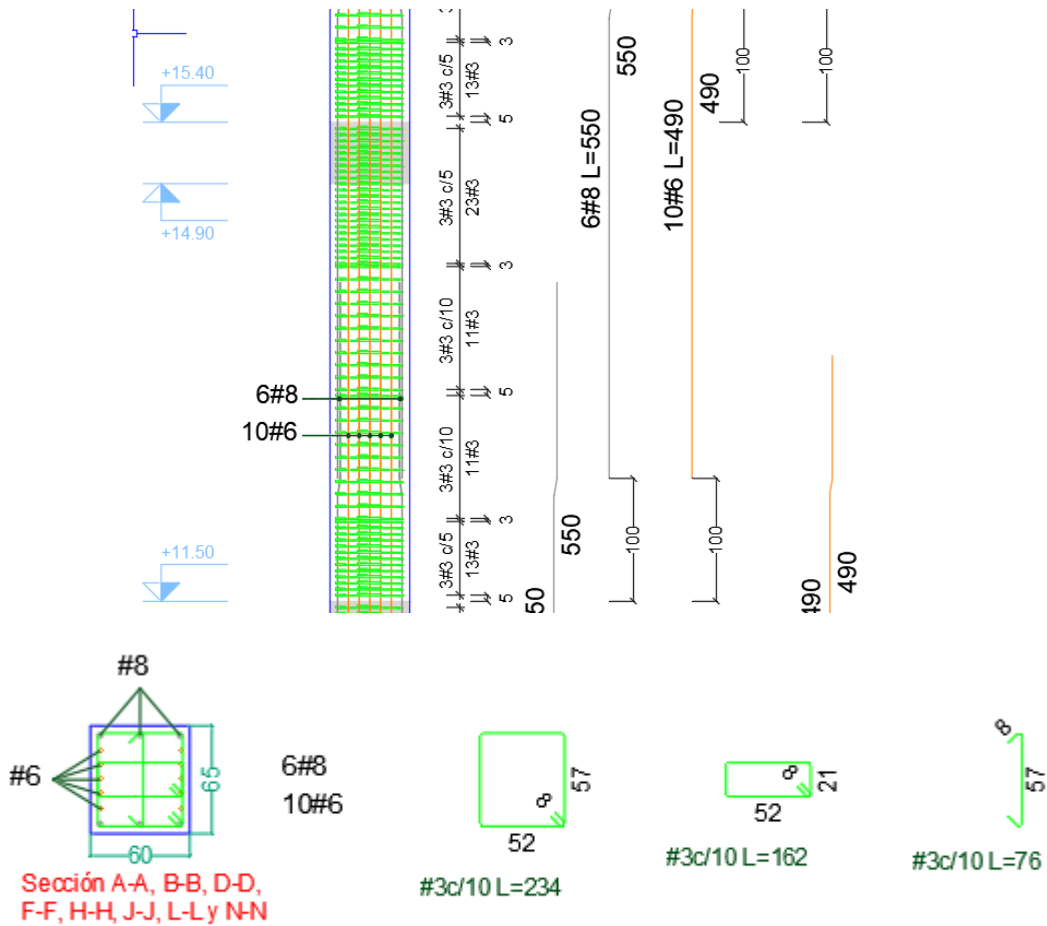


Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.

- COLUMNA C6, C7 y C8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

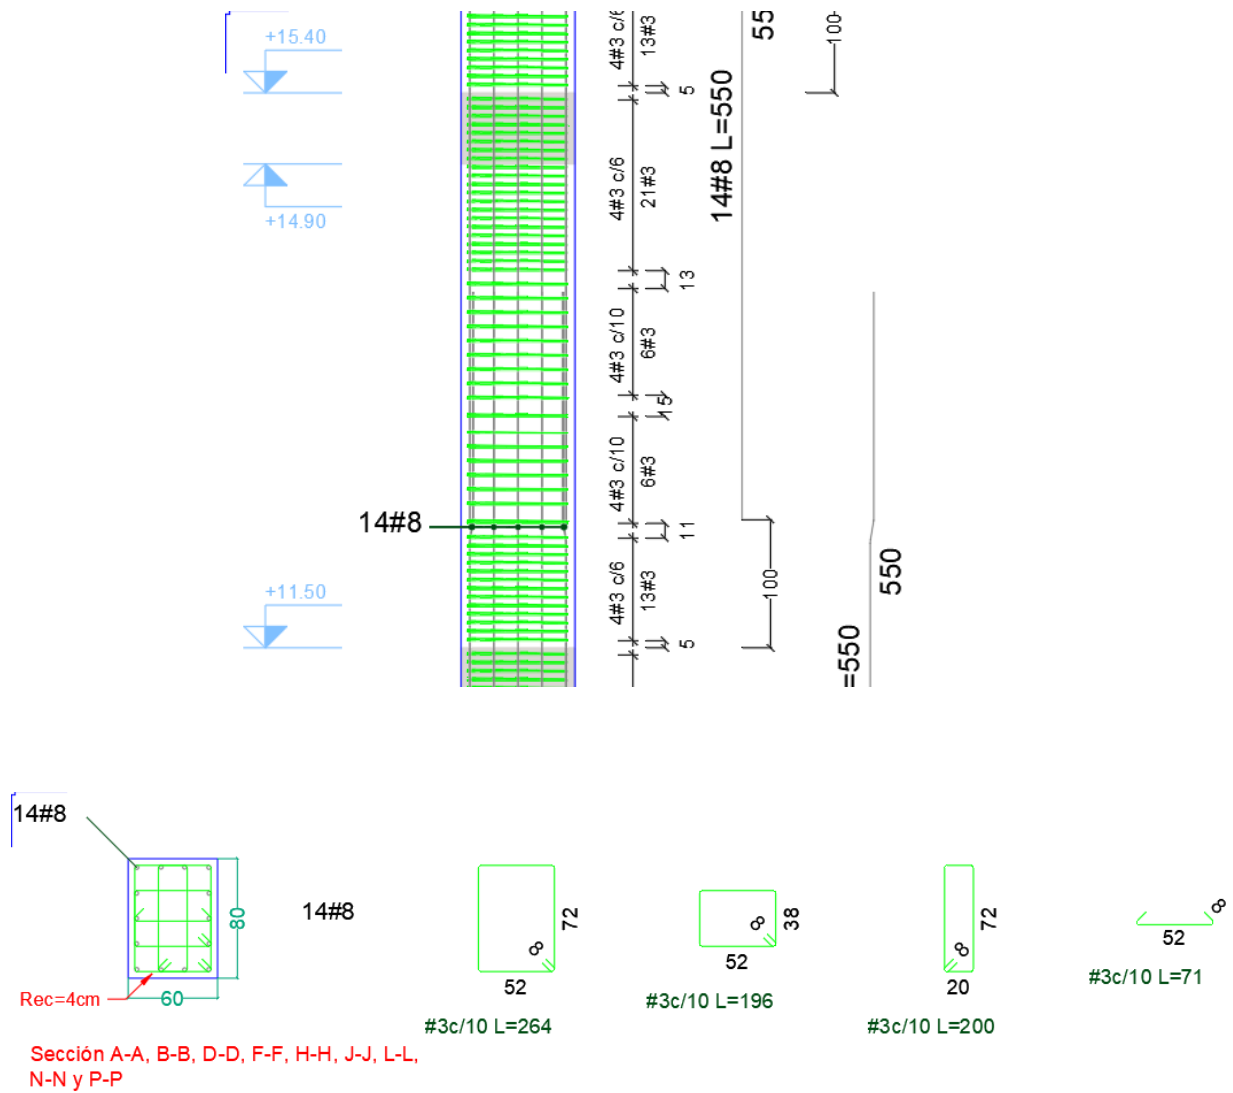


*Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.*

- COLUMNA C9 y C10

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

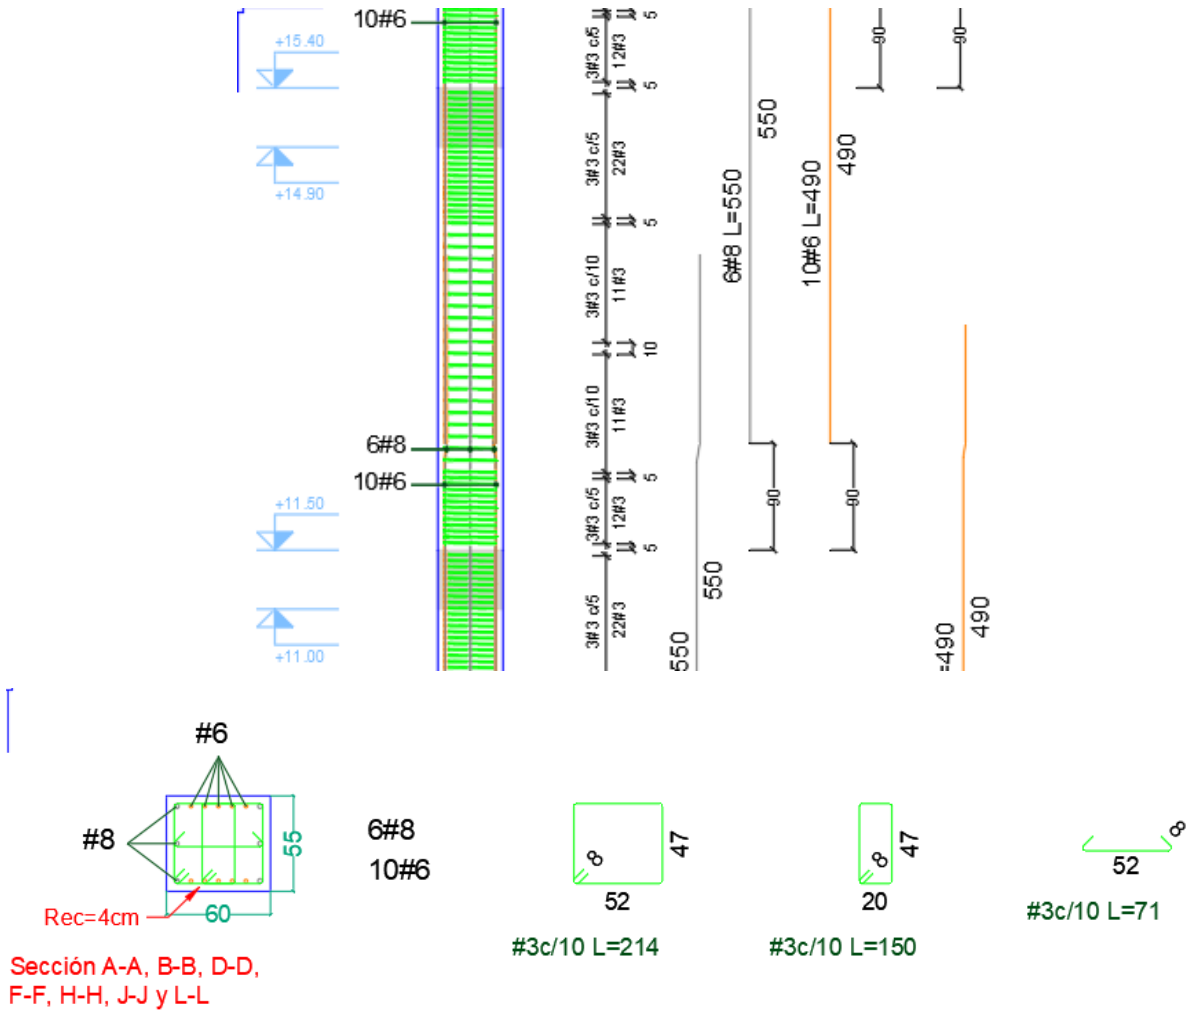


*Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

## **DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +15.40 A N +19.30**

### • **PANTALLA PW1**

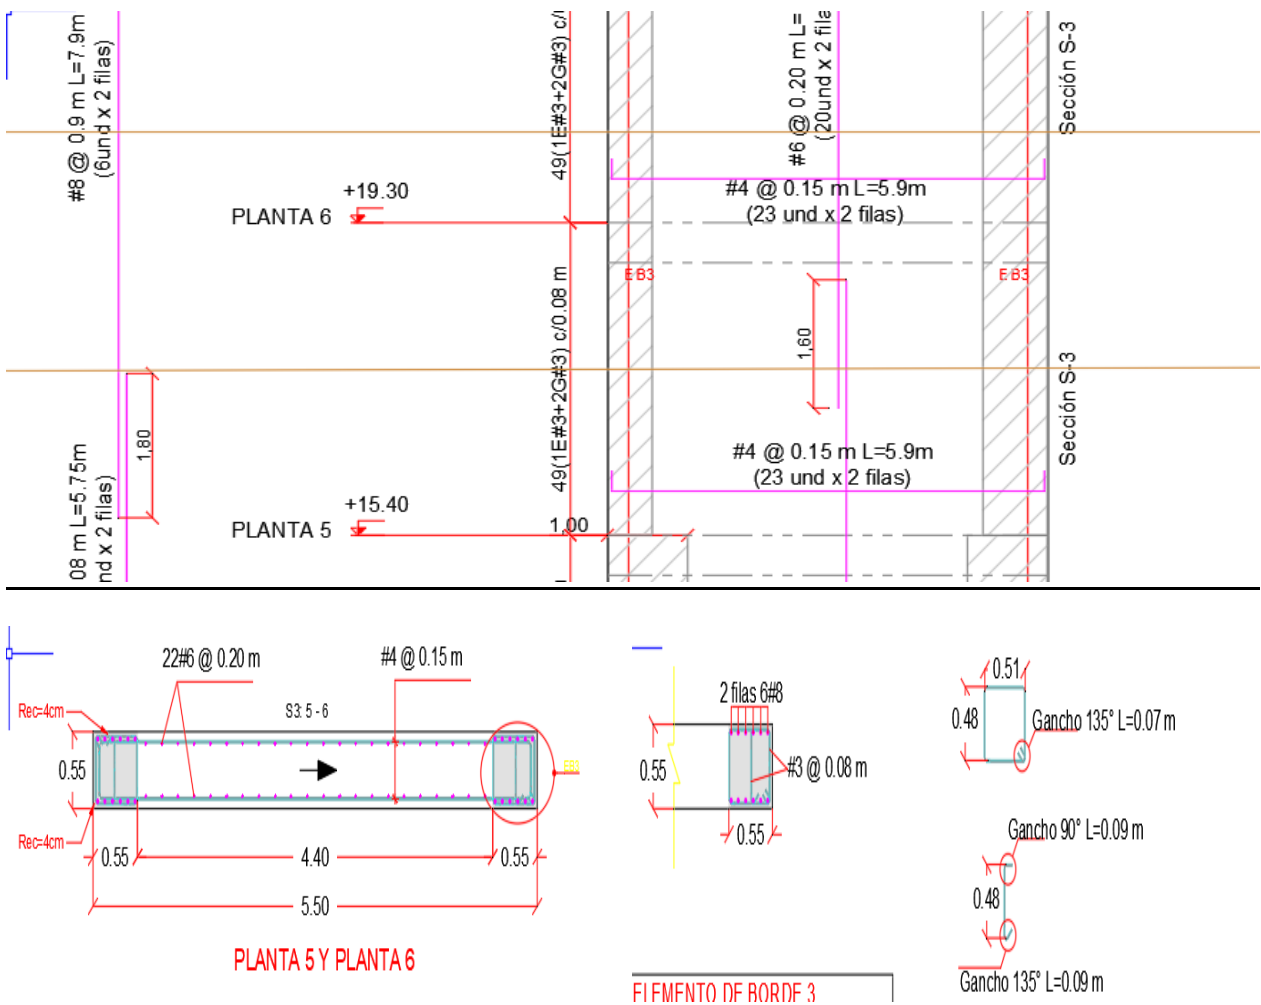


Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

• **PANTALLA PW2**

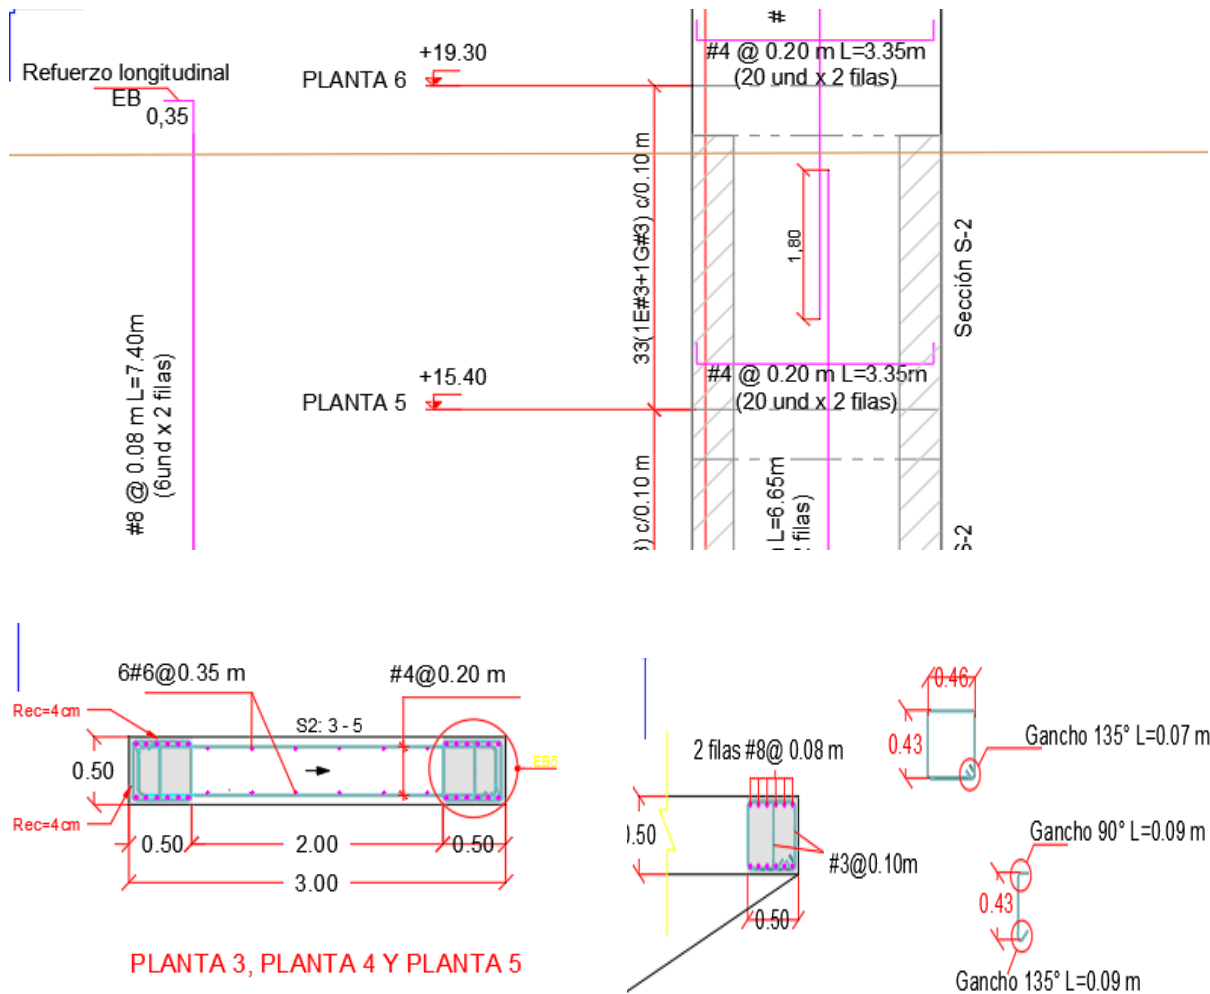


*Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

- PANTALLA PW3**

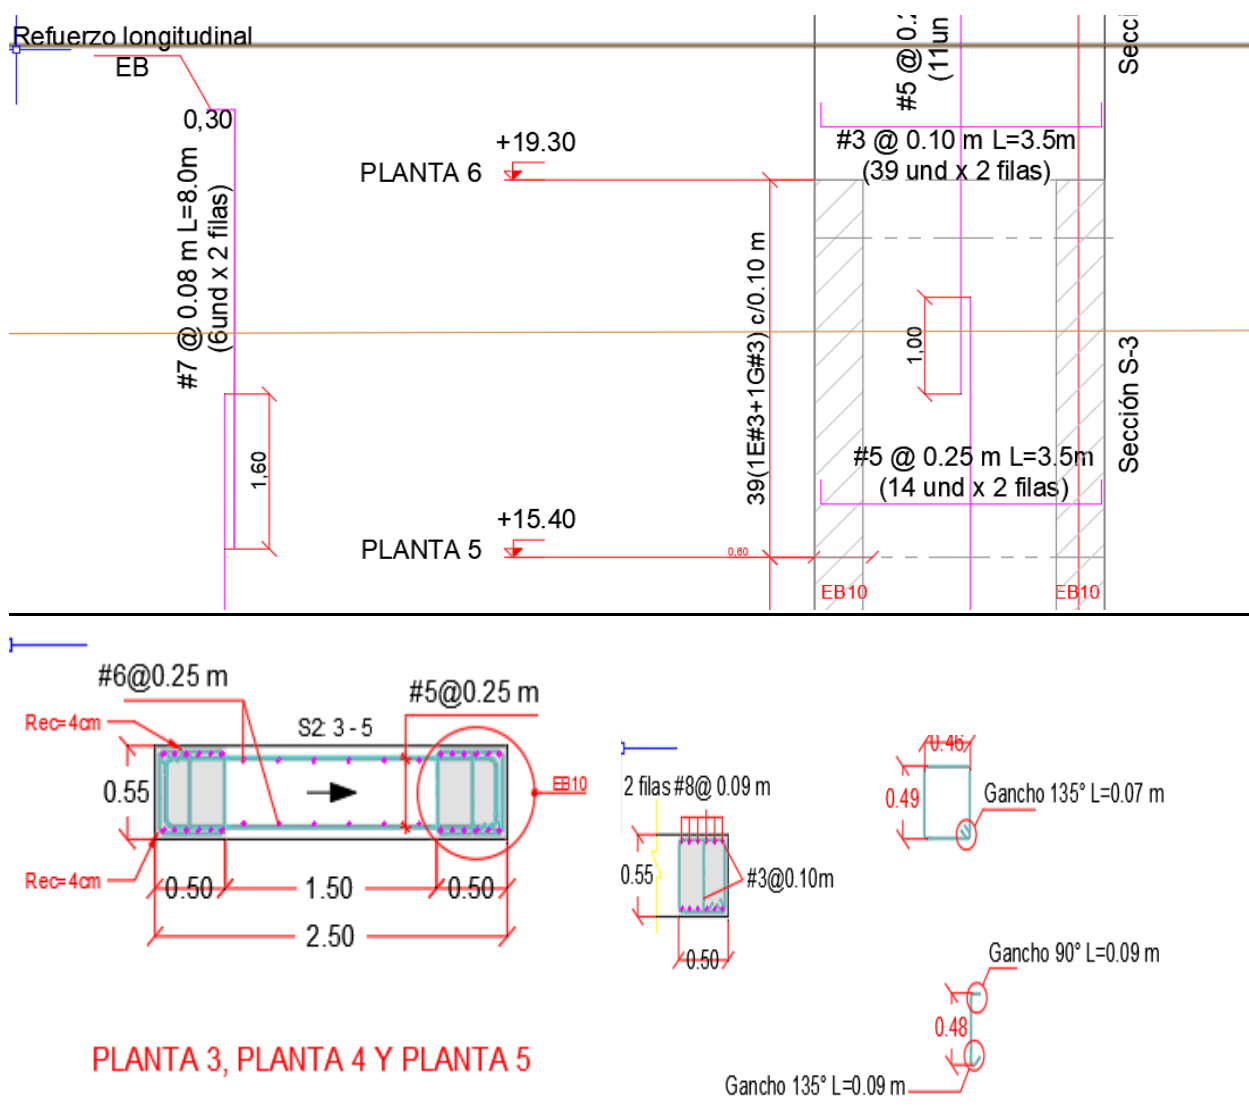


*Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

• **PANTALLA PW4**

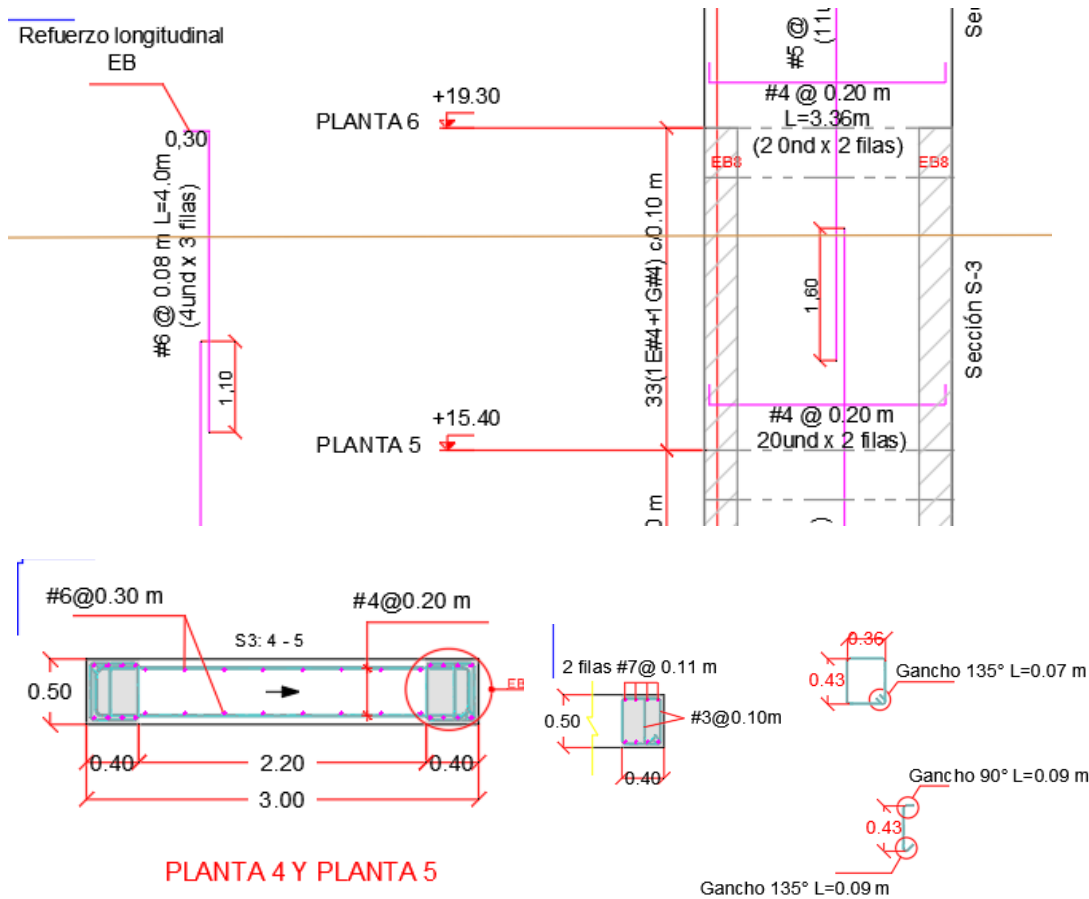


*Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

- PANTALLA PW5**

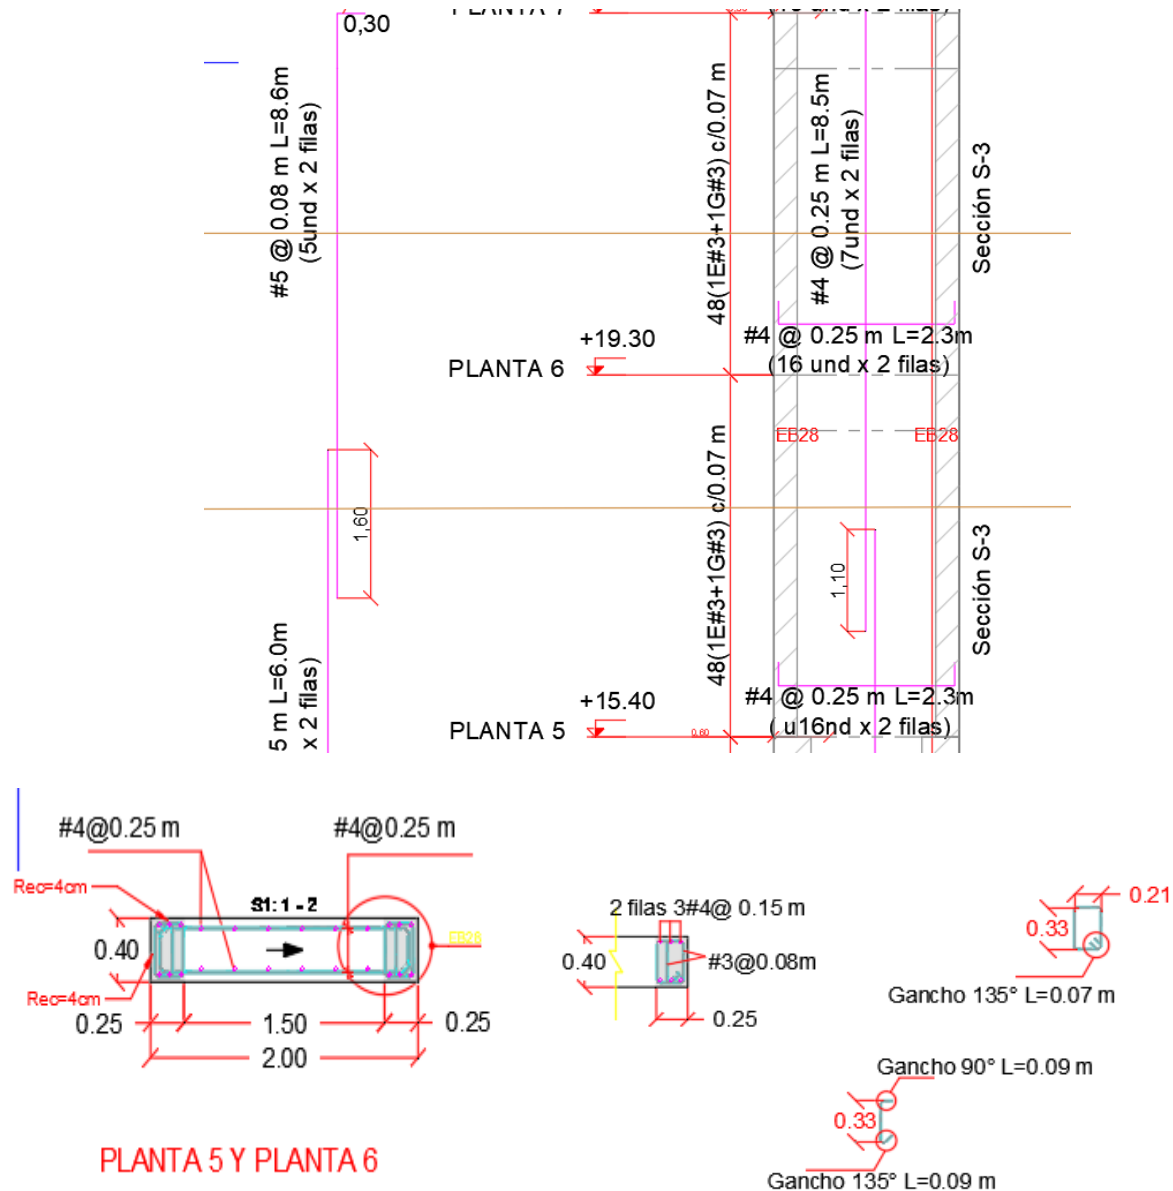


*Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

● **PANTALLA PW6**

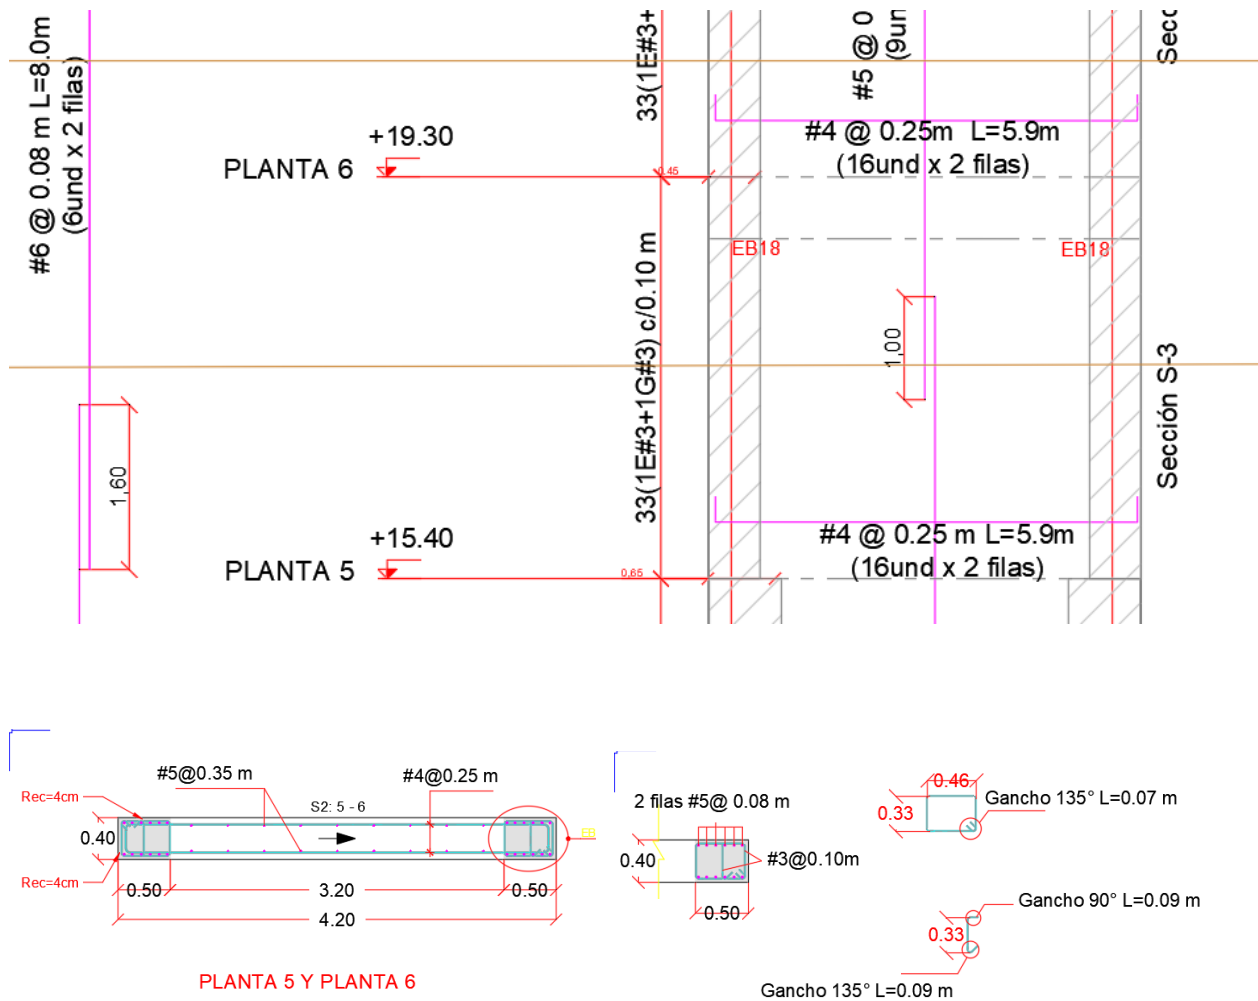


*Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

• **PANTALLA PW7**

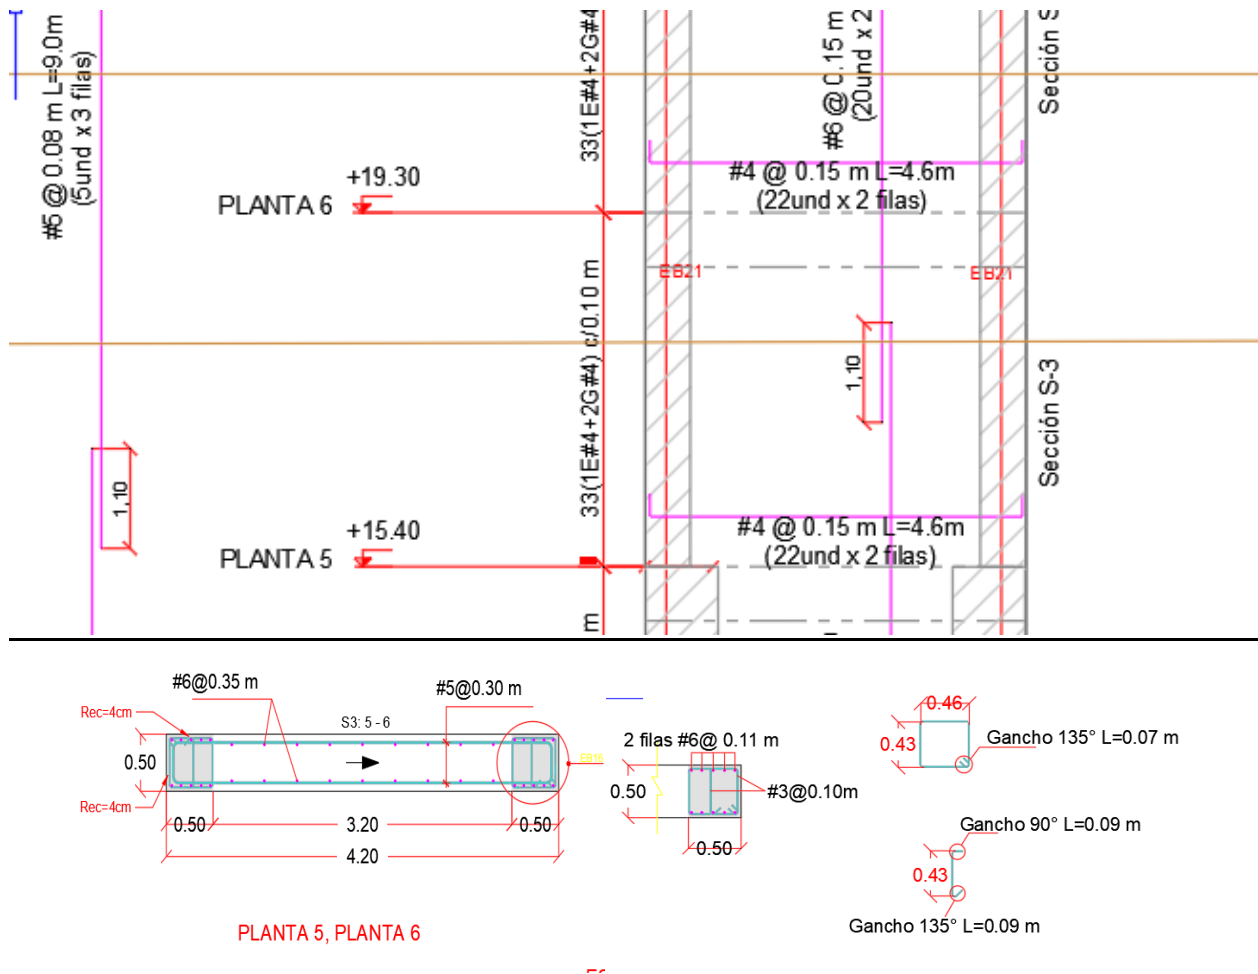


*Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

- PANTALLA PW8

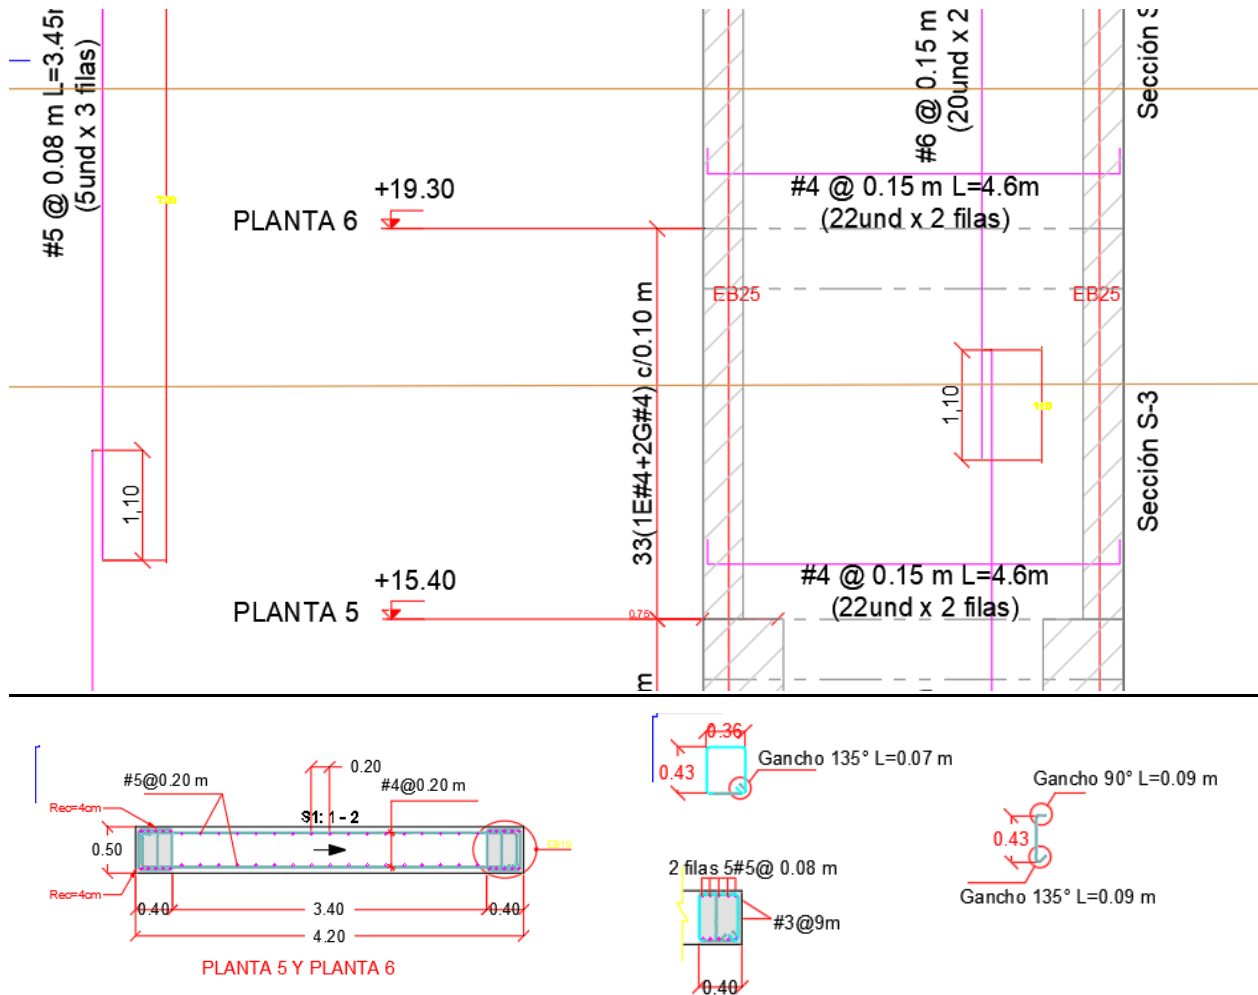


*Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

• **PANTALLA PW9**

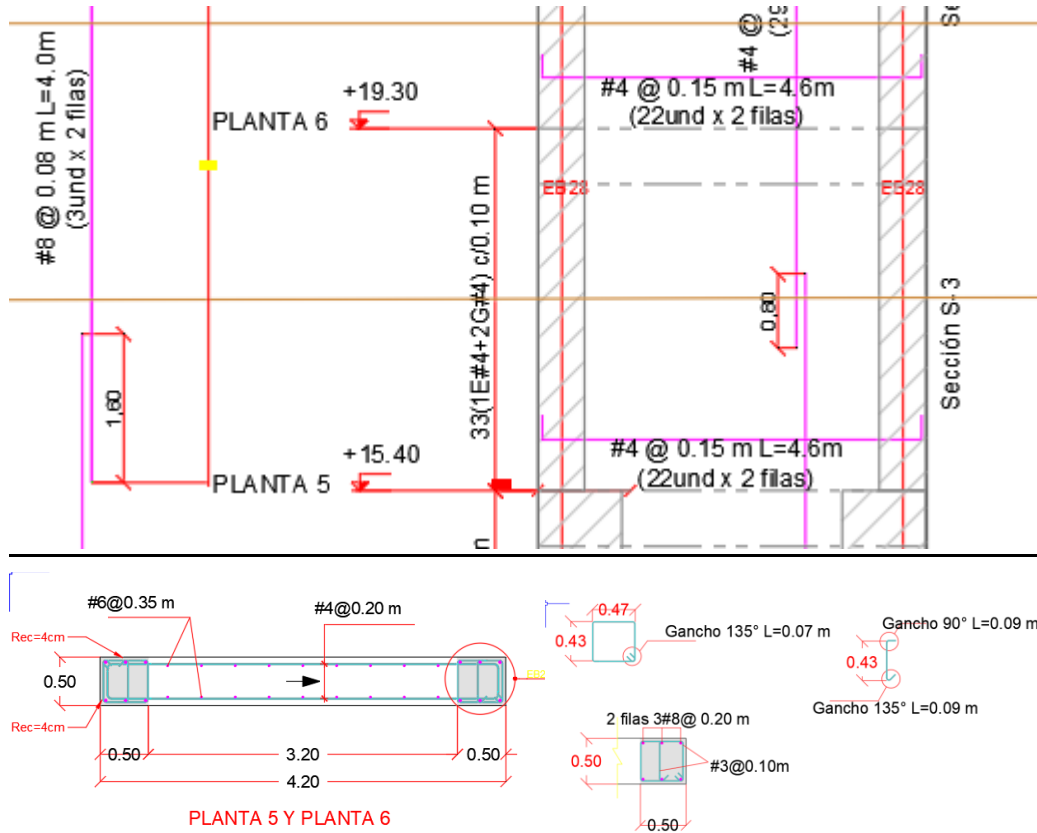


*Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

• PANTALLA PW10


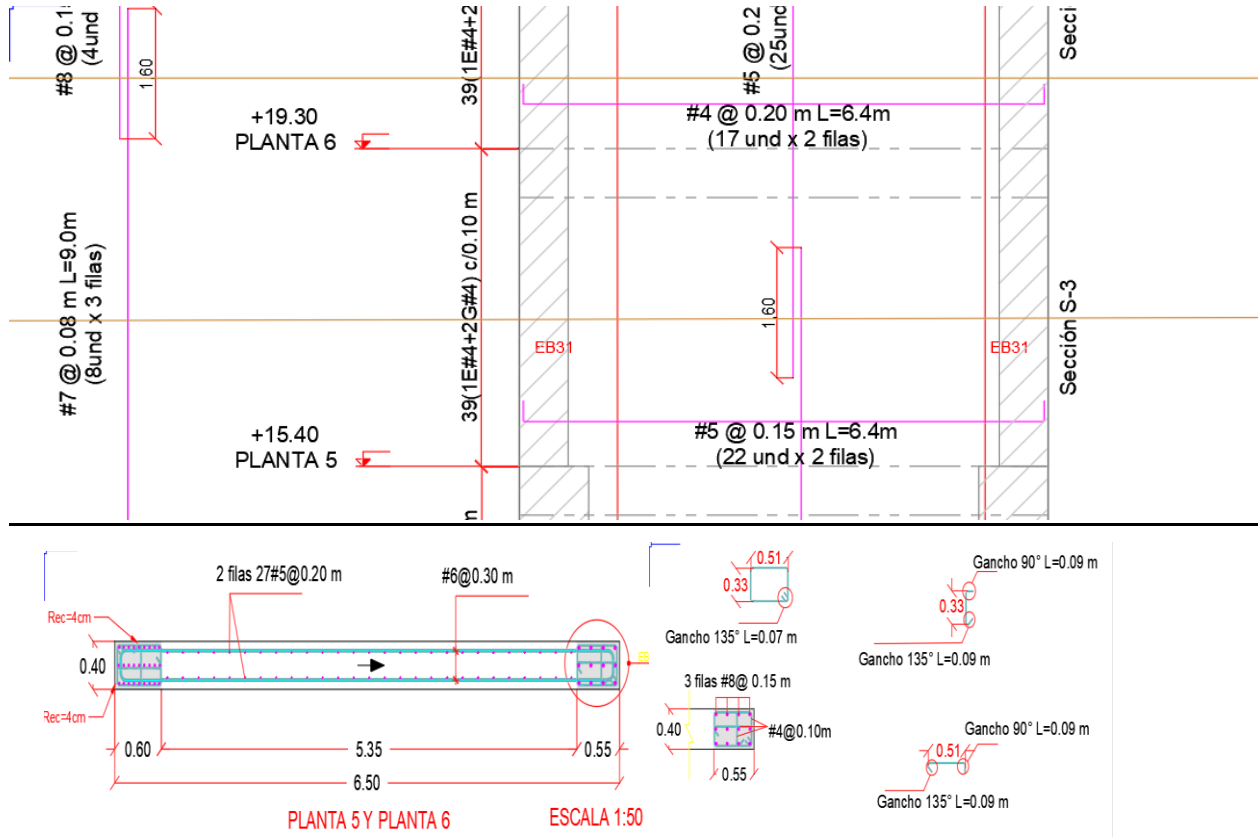


*Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

### **DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO 3 N +11.50**

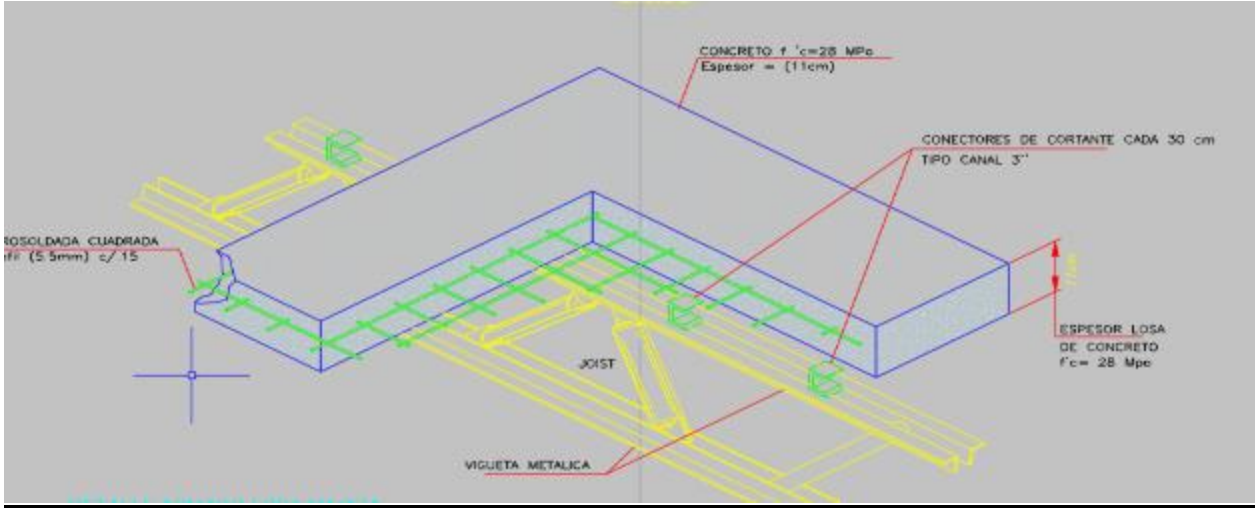

| RESUMEN DE LA LOSA                 |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ITEM                               | ESPECIFICACIÓN                             |
| ESPESOR DE LA LOSA (cm)            | 11.0                                       |
| Malta de retracción para la placa: | Malta elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 - Doble |

*Ilustración 17. Detalle losa de entepiso*

### **DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO 5 N +19,30**

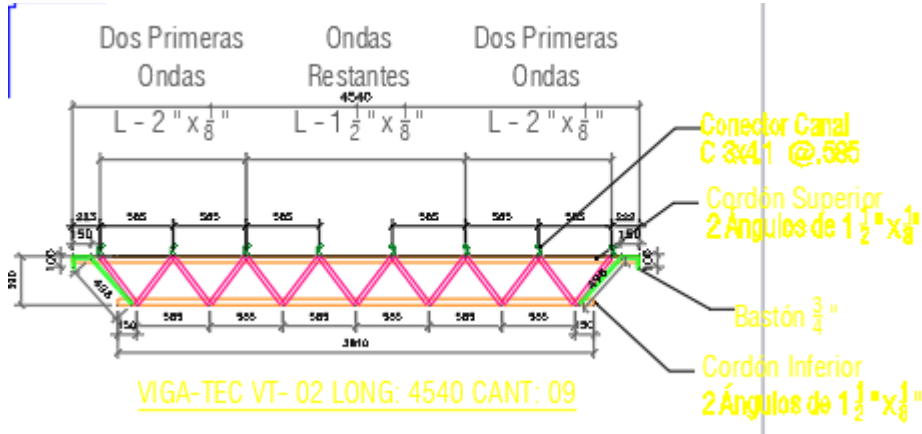


*Ilustración 18. Detalle joist VT 02*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

**DETALLE VIGA TEC VT 03**

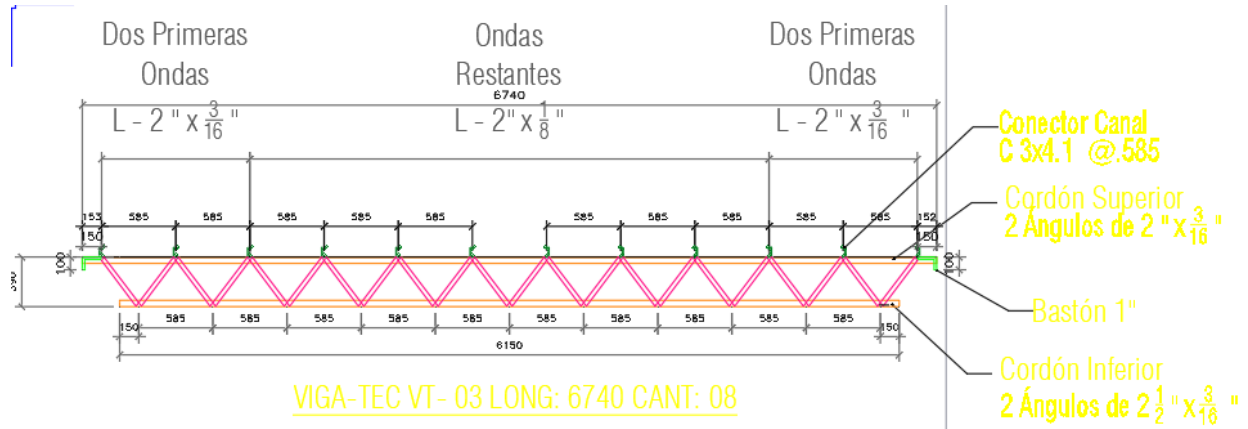


Ilustración 19. Detalle joist VT 03.

**DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO 5 N +19,30**

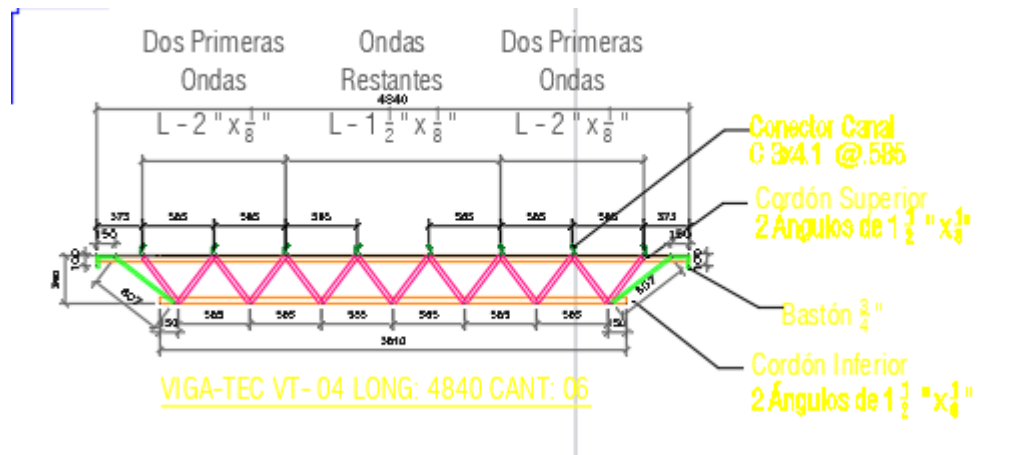


Ilustración 20. Detalle joist VT 04

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

**DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO 5 N +19,30**

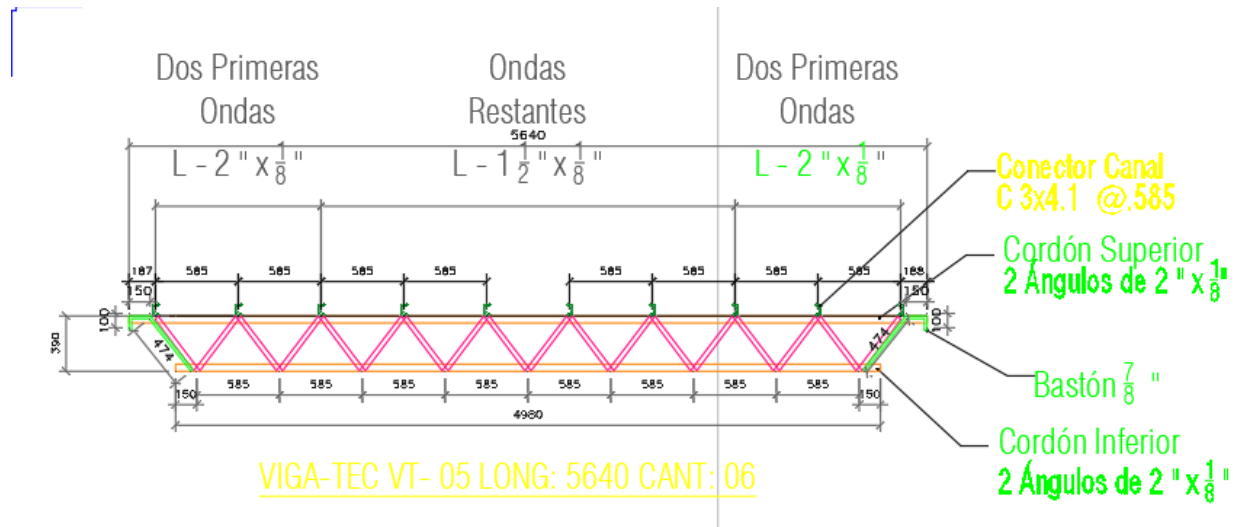


*Ilustración 21. Detalle joist VT 05.*

**DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO 5 N +19,30**

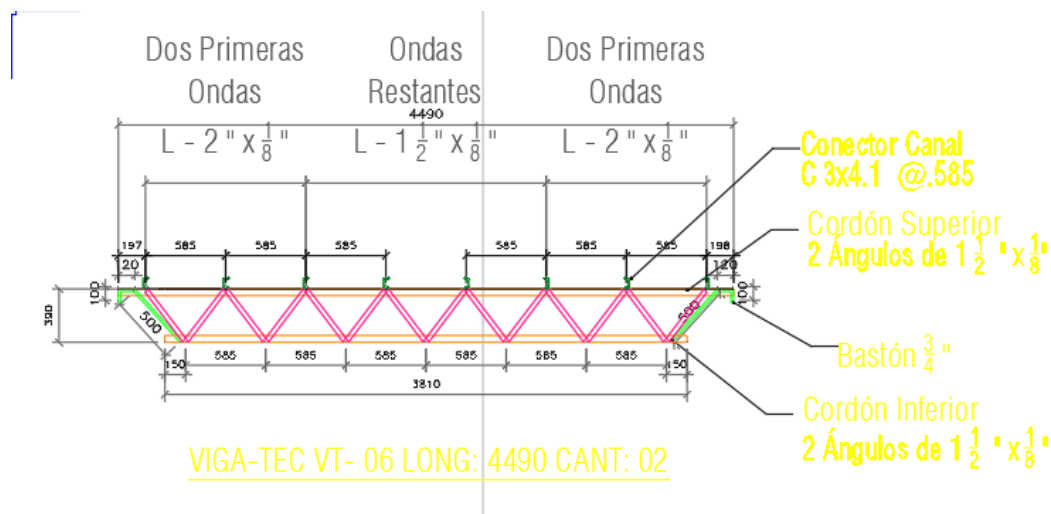


*Ilustración 22. Detalle joist VT 06.*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

**DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO 5 N +19,30**

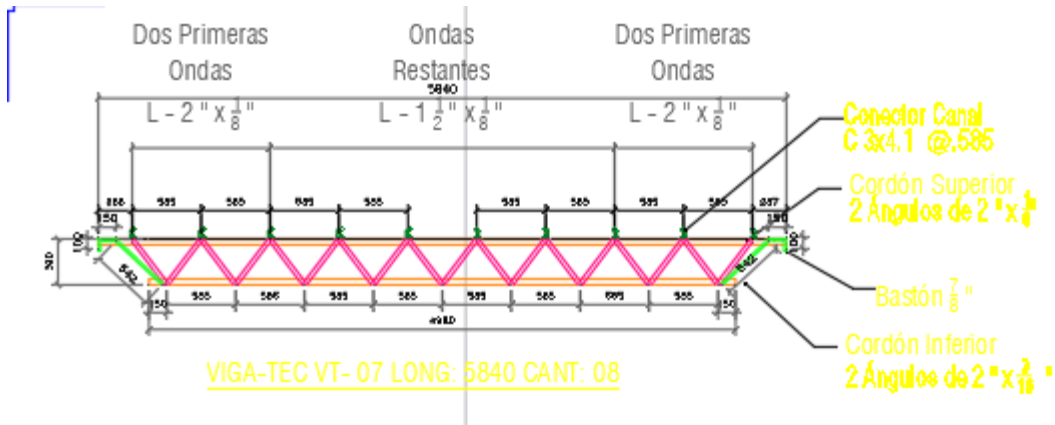


*Ilustración 23. Detalle joist VT 07.*

**DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO 5 N +19,30**

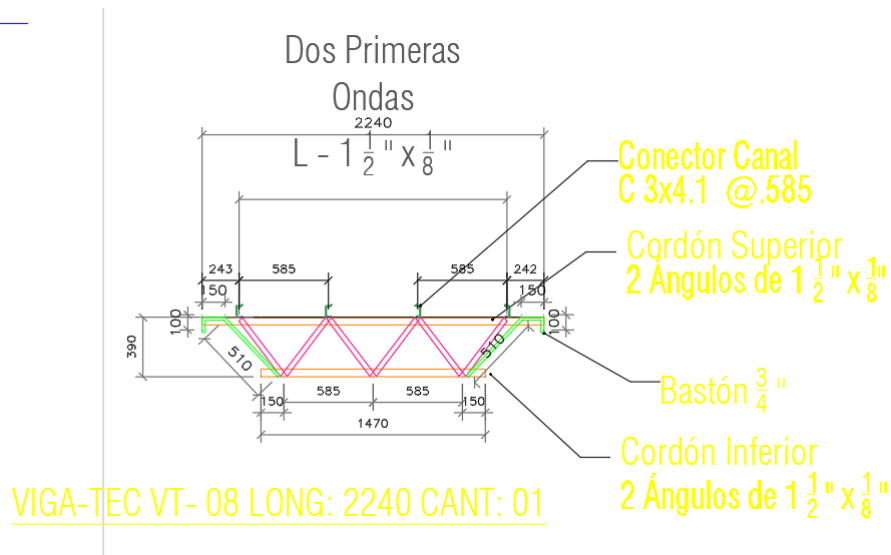


*Ilustración 24. Detalle joist VT 08*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

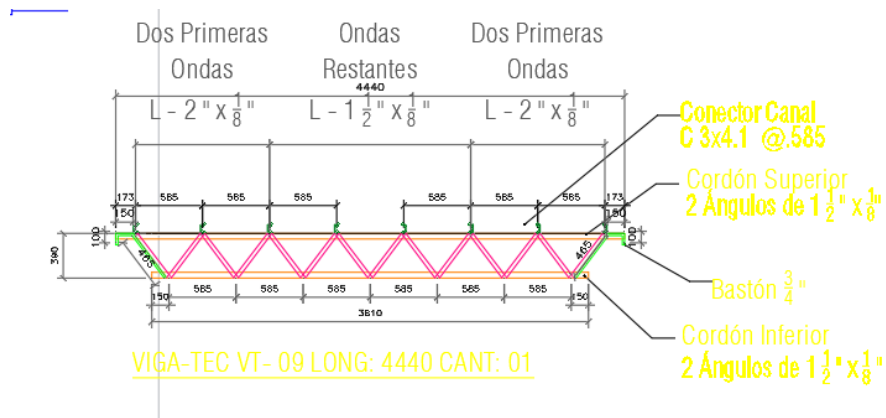


*Ilustración 25. Detalle joist VT 09*

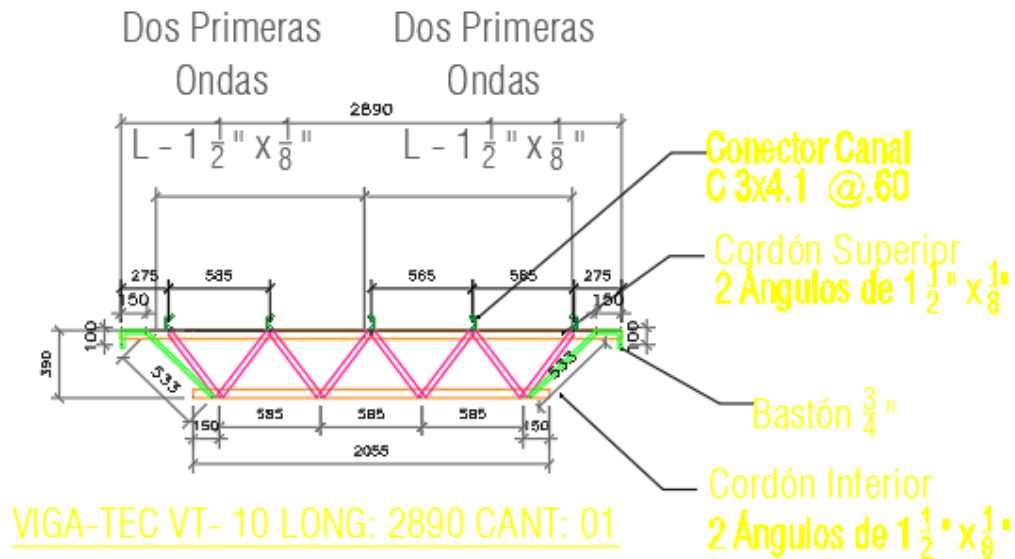


*Ilustración 26. Detalle joist VT 10*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

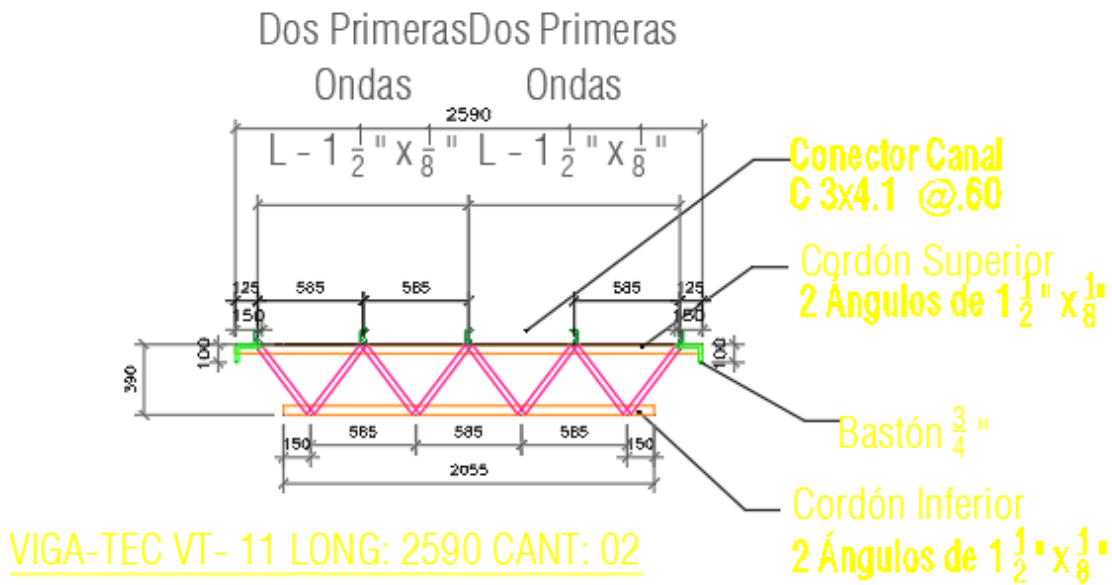


*Ilustración 27. Detalle joist VT 11*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

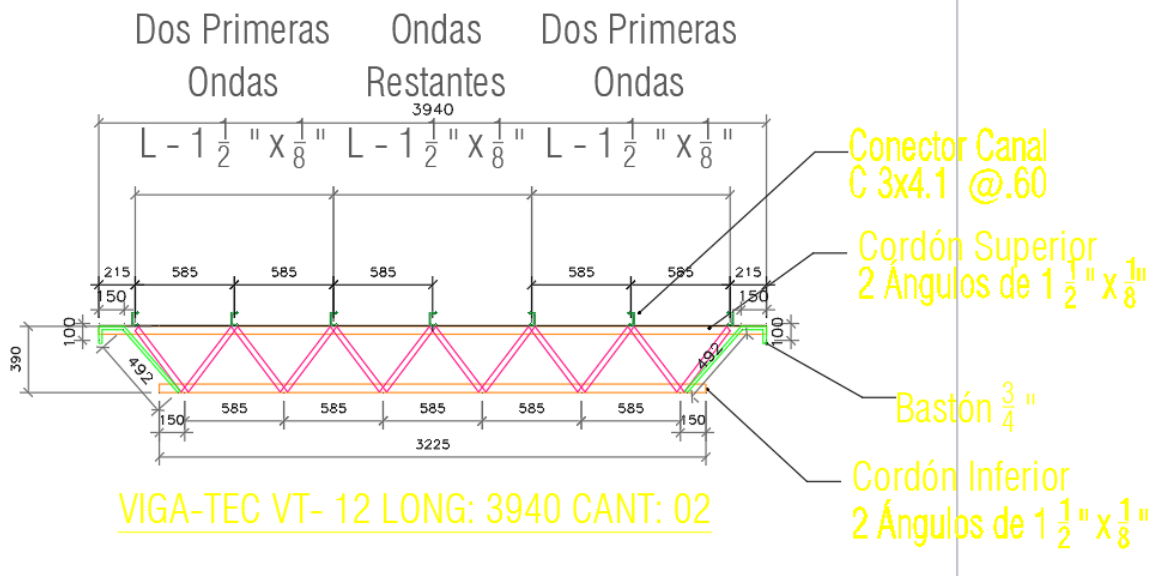


Ilustración 28. Detalle joist VT 12

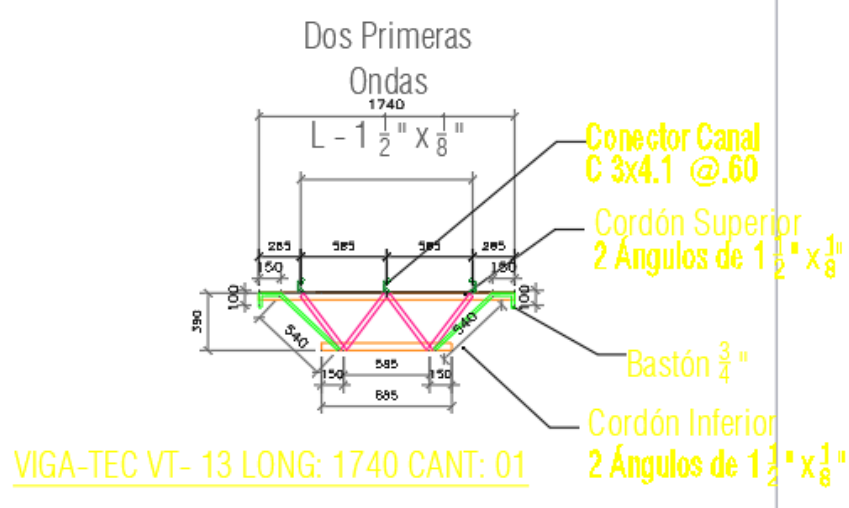


Ilustración 29. Detalle joist VT 13

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA  
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA  
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE  
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE  
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE  
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

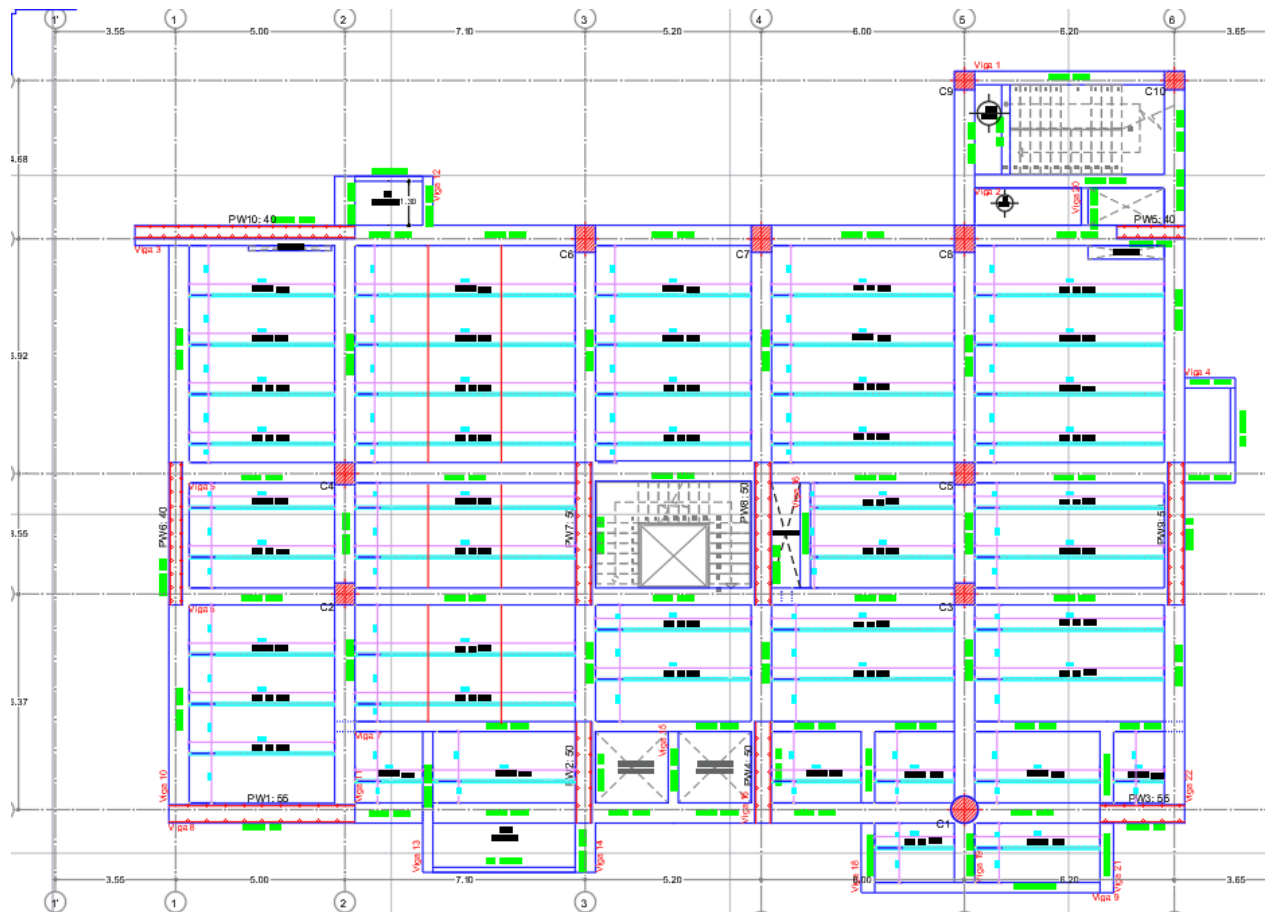


*Ilustración 30. Disposición de vigas joist entrepiso 5 N+19.30*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

**DETALLE VIGAS ENTREPISO N +19.30**

• **DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6)**

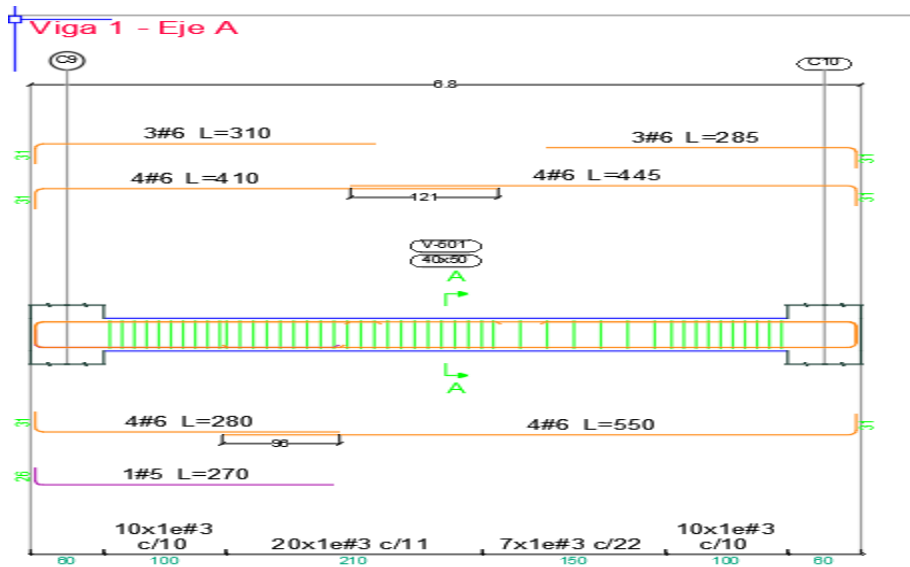


*Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga A N +19.30.*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6)**




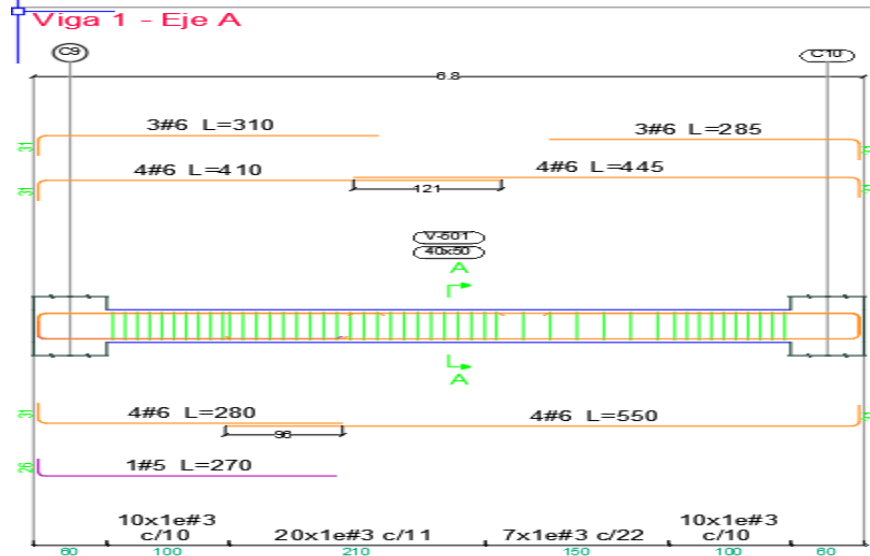


*Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga A' N+19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6') N +15.40**

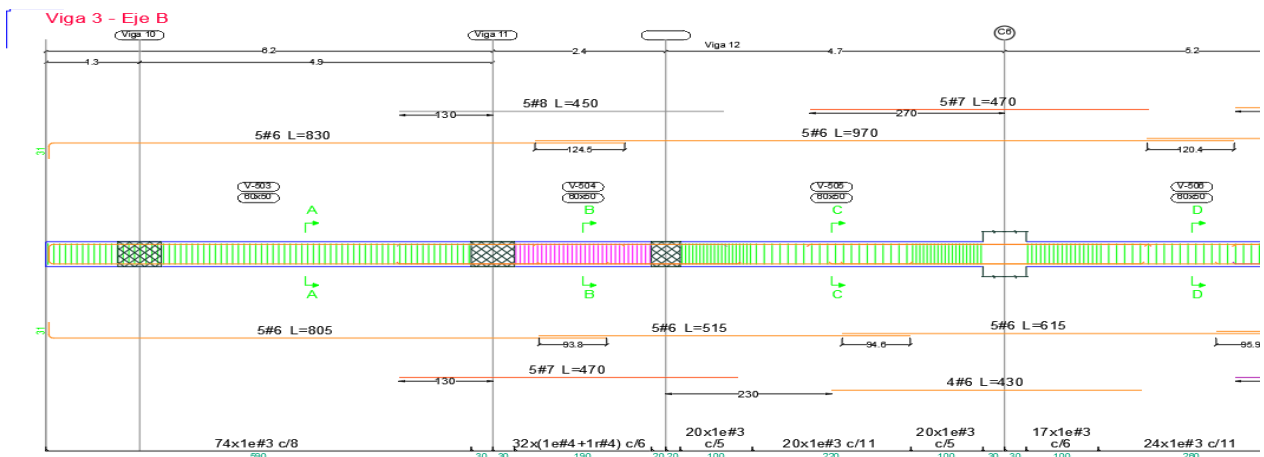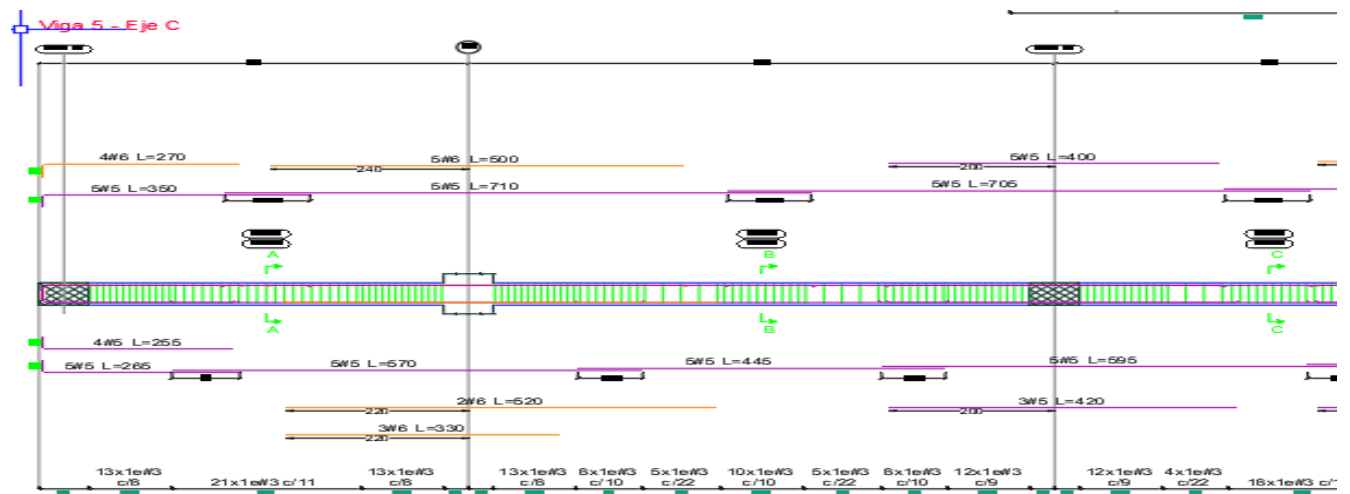

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

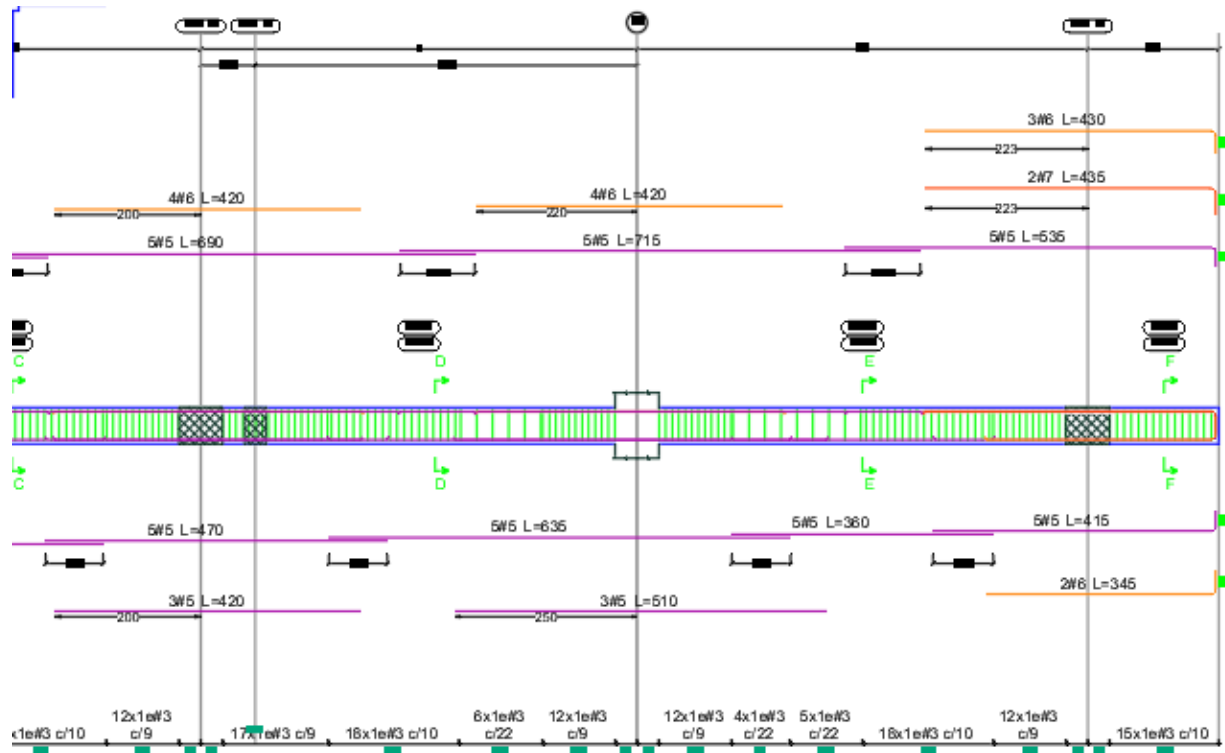


*Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga C N +15.40.*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA D (1' - 2) N +19.30

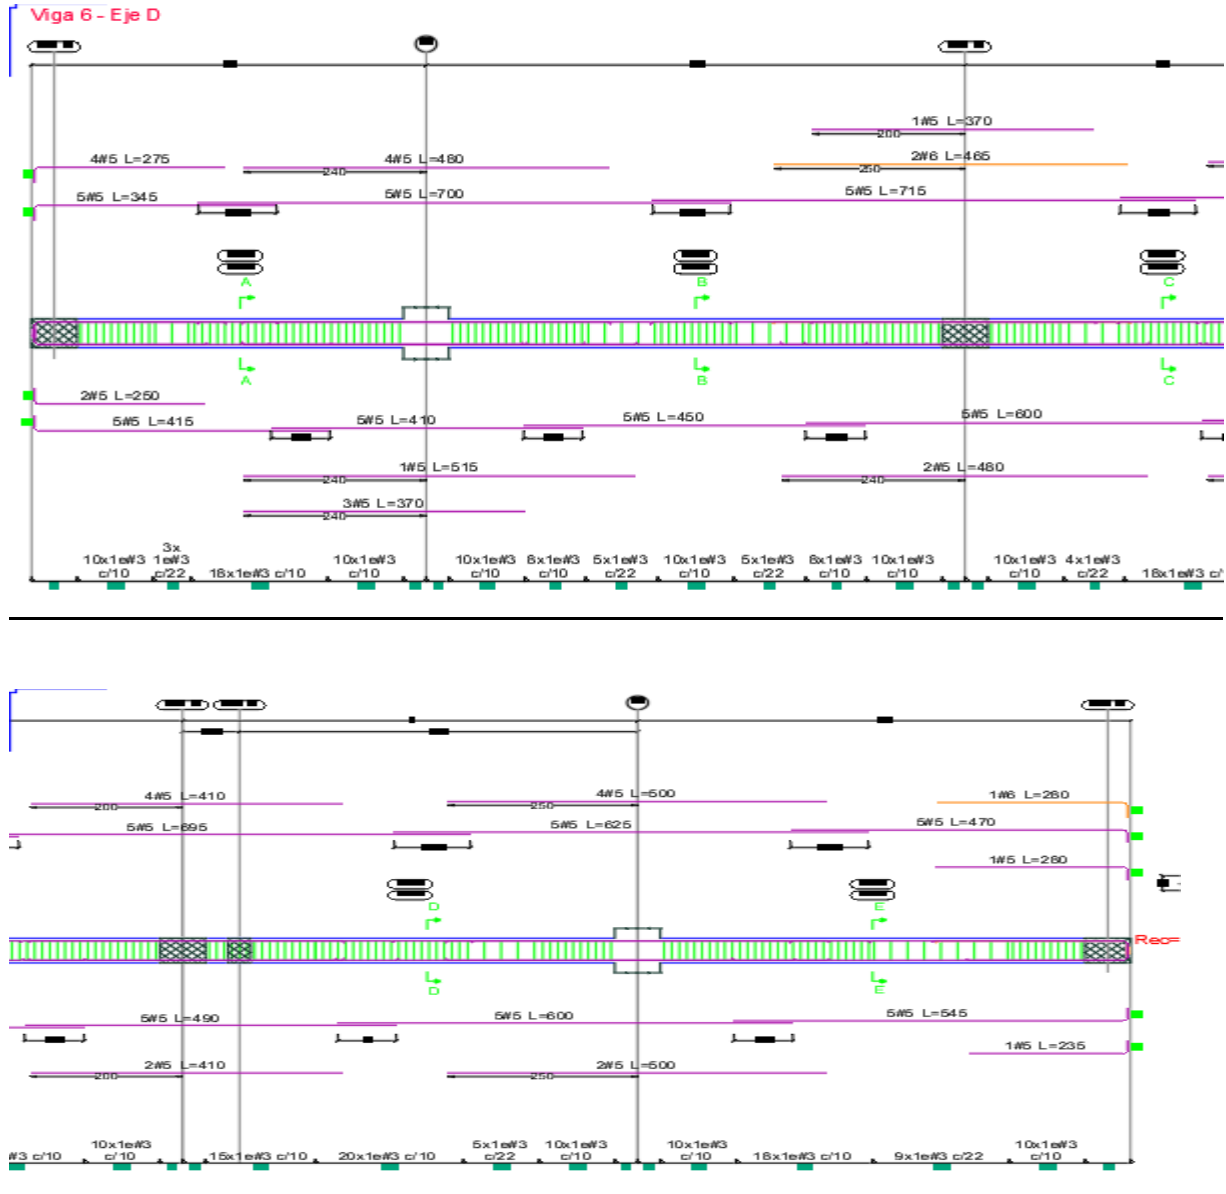


*Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +15.40*

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 15

Documento  
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA D (1'-6') N +19.30

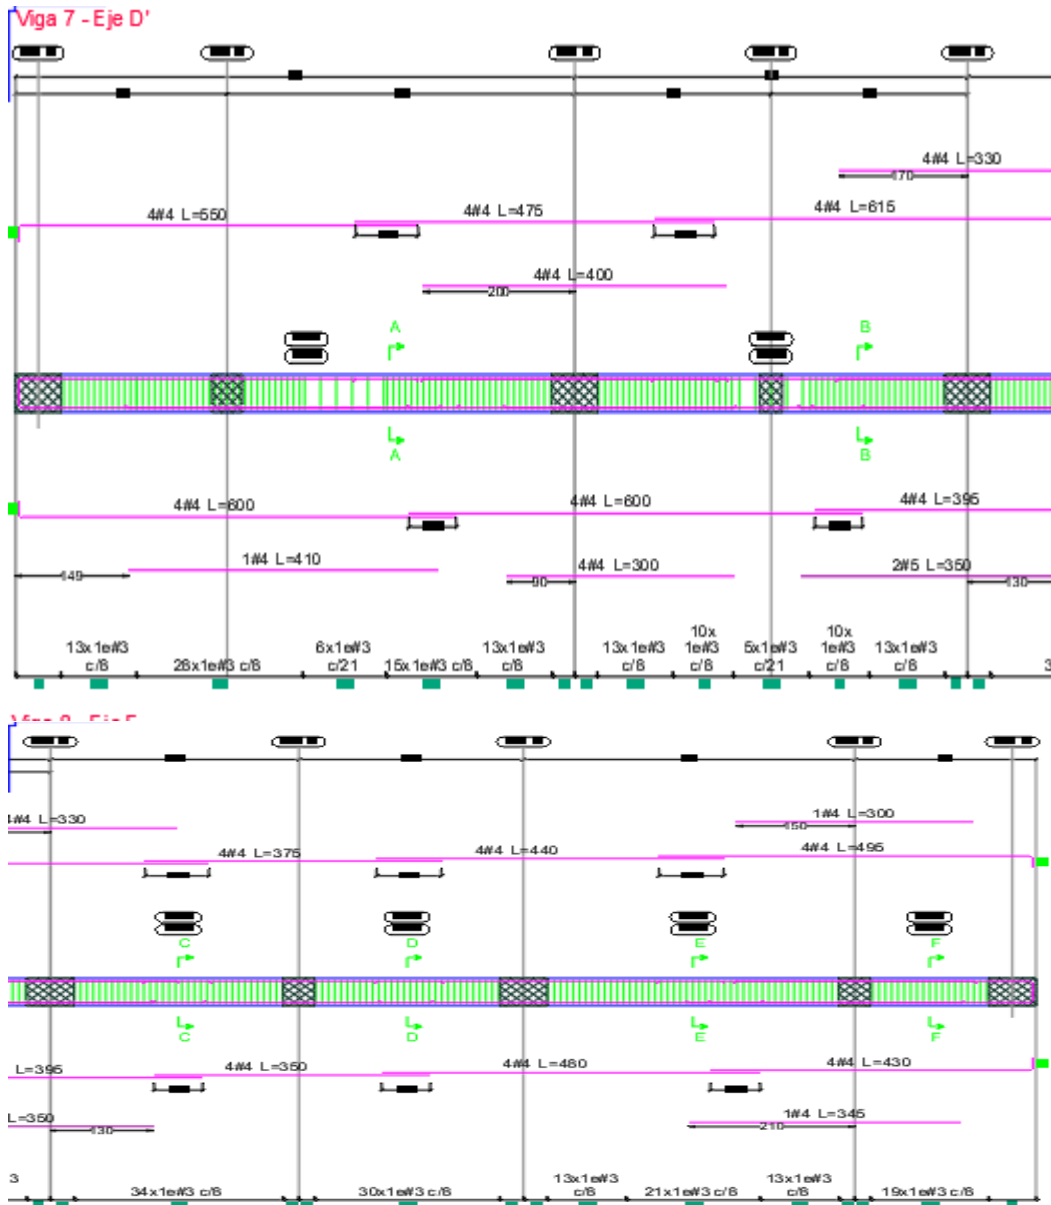


Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +15.40.

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA E (1- 6)

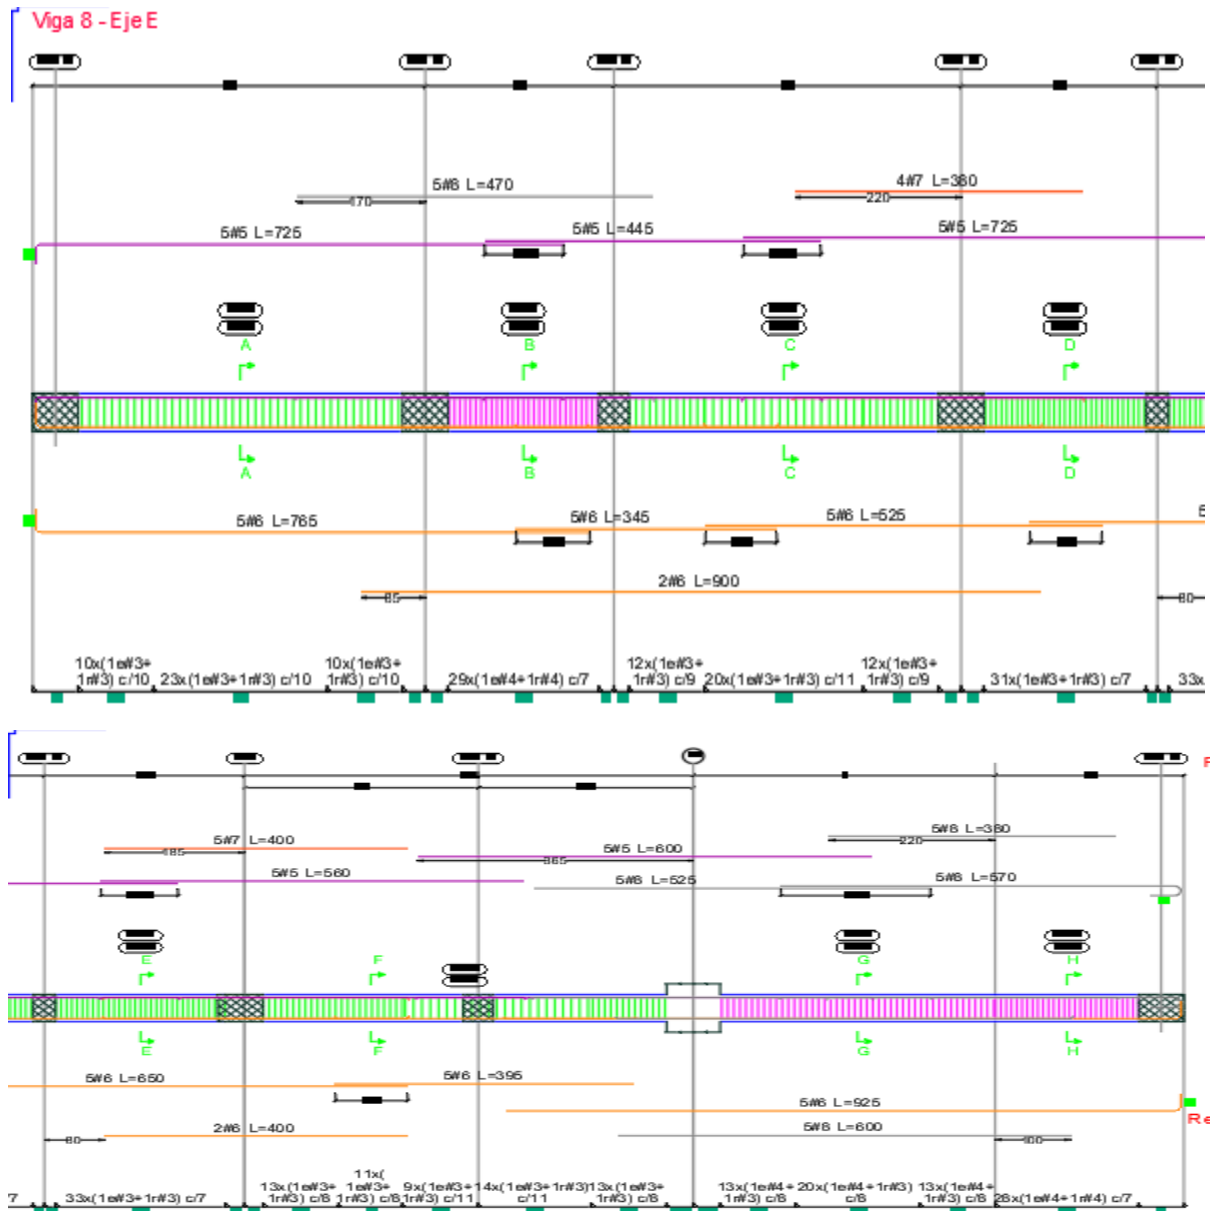


*Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga E (1-6) N + 19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA E \*

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA  
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA  
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE  
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE  
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE  
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”



Documento  
Versión 1

**Viga 9 - Eje E'**

Diagrama de la Viga 9 - Eje E' que muestra la distribución de armadura longitudinal y transversal. La viga tiene una longitud total de 19.95 metros, dividida en tramos de 9.05m, 7.45m y 4.4m. Se indican las vigas adyacentes: Viga 18 a la izquierda, Viga 19 en el centro y Viga 21 a la derecha.

**Armadura Longitudinal:**

- Tramo 1 (0-9.05m): 2#6 L=600
- Tramo 2 (9.05-16.50m): 2#6 L=325
- Tramo 3 (16.50-20.95m): 2#6 L=525
- Tramo 4 (20.95-25.40m): 2#6 L=370

**Armadura Transversal:**

- Tramo 1 (0-9.05m): 10x1e#3 c/11
- Tramo 2 (9.05-16.50m): 3x1e#3 c/22
- Tramo 3 (16.50-20.95m): 18x1e#3 c/11
- Tramo 4 (20.95-25.40m): 19x1e#3 c/11
- Tramo 5 (25.40-29.85m): 9x1e#3 c/11

**Detalles de Armadura:**

- Barra de 10x50 mm
- Barra de 126 mm
- Barra de 96 mm

[illegible]

*Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga E (1\*-6\*) N +19.30*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

• **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E)**


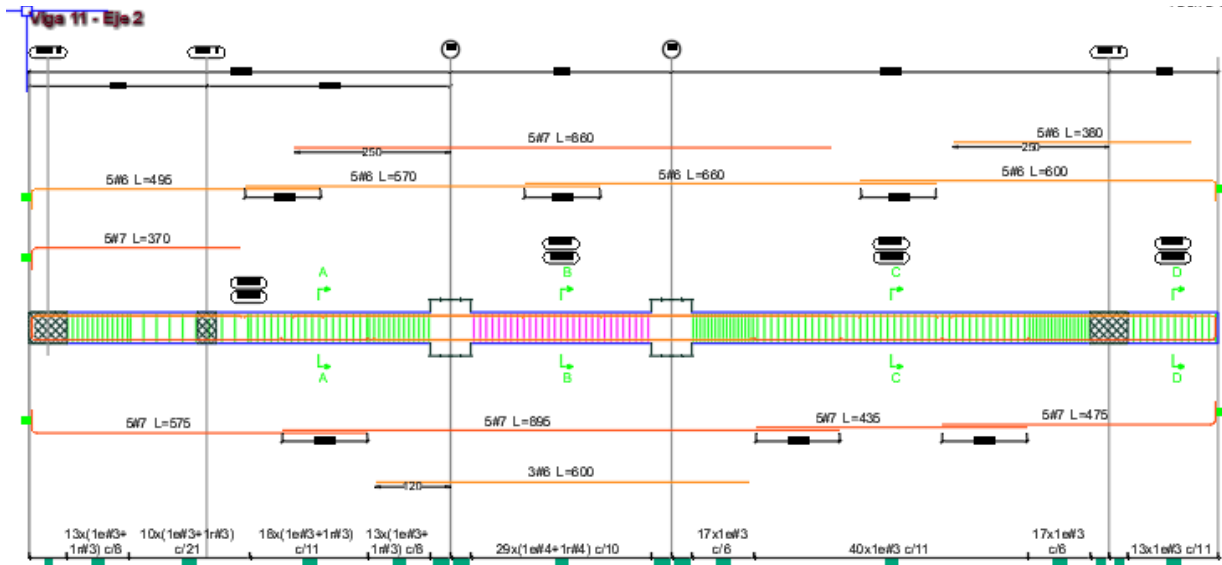


*Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +19.30*

• **DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E)**

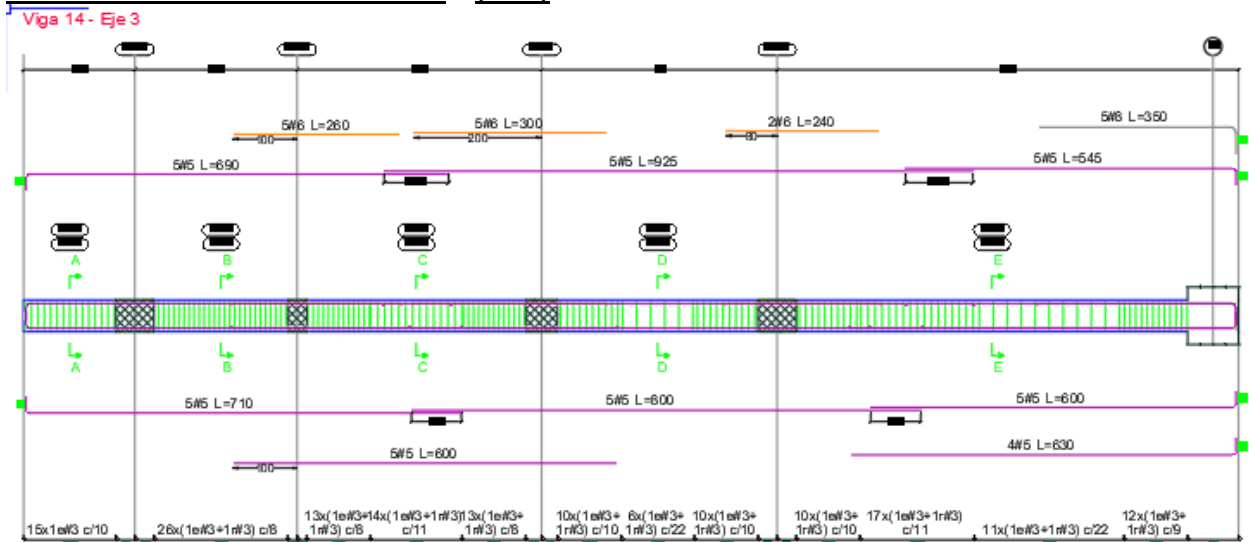

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> | <p><b>CONSORCIO<br/>INTERSALUD PZ</b></p>  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                                                                |

*Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 3\* (B-E)

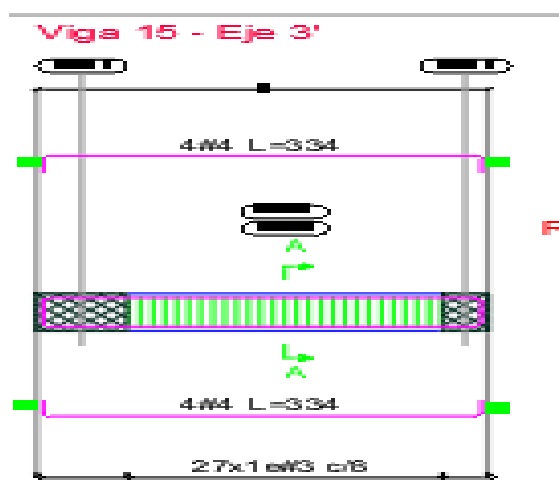


*Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 3\*(B-E) N +15.40*

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E)**

Viga 18 - Eje 4


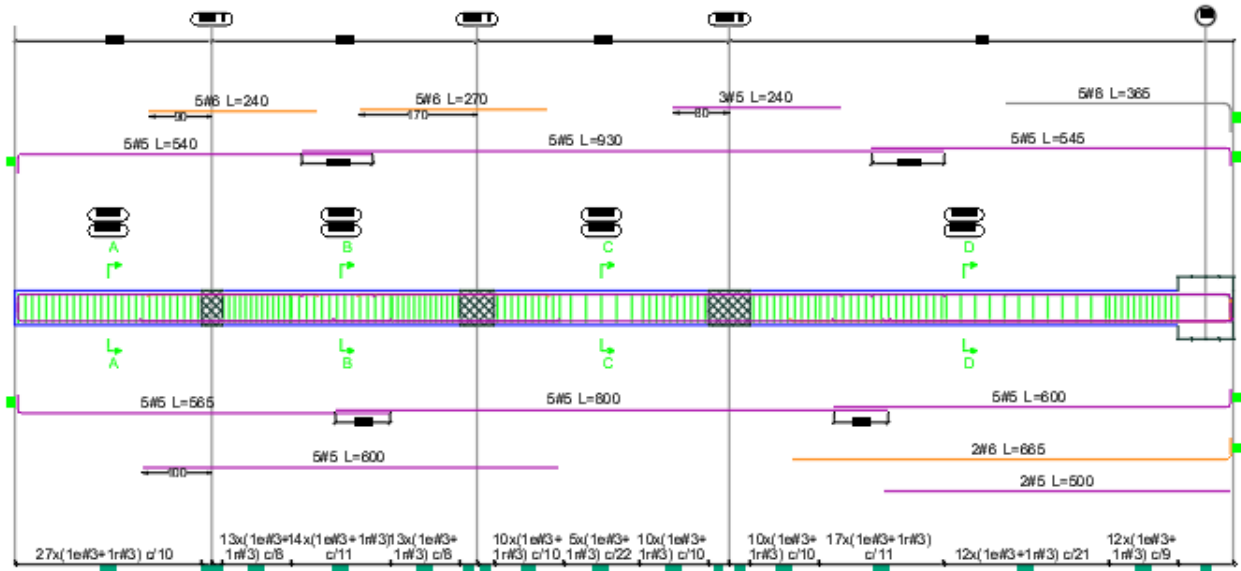


*Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 4' (C-D)**

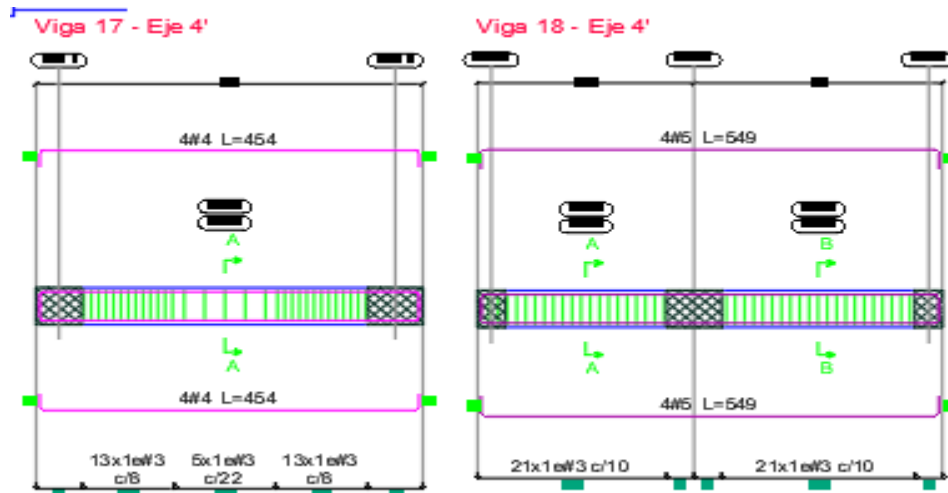

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

*Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C) N +19.30*

• DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E) N +19.30

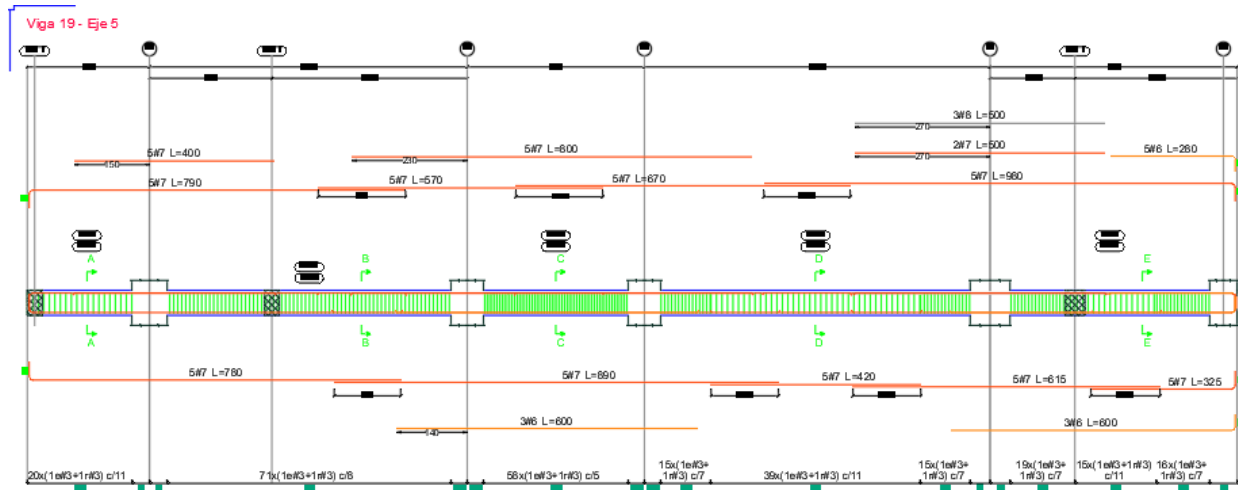


*Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +15.40*

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 15

Documento  
Versión 1

DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E)

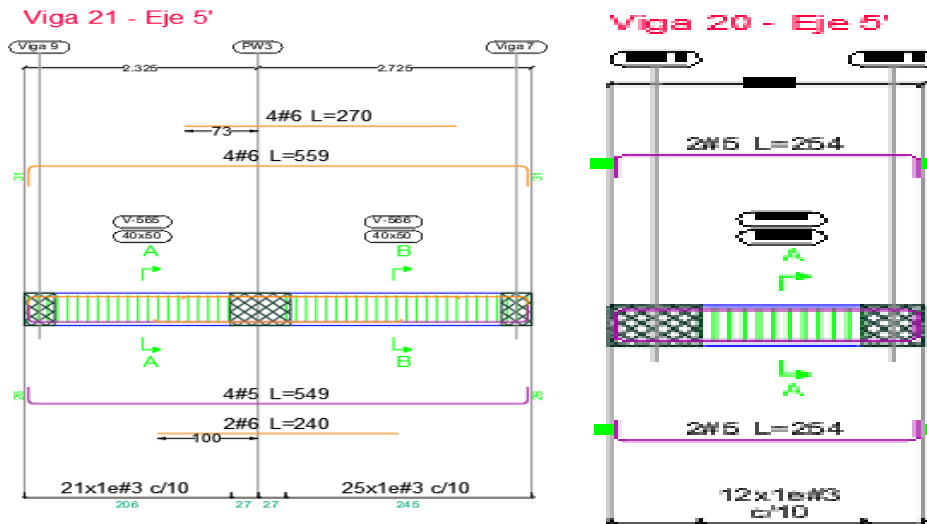


Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E) N +19.30

• DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E) N +19.30

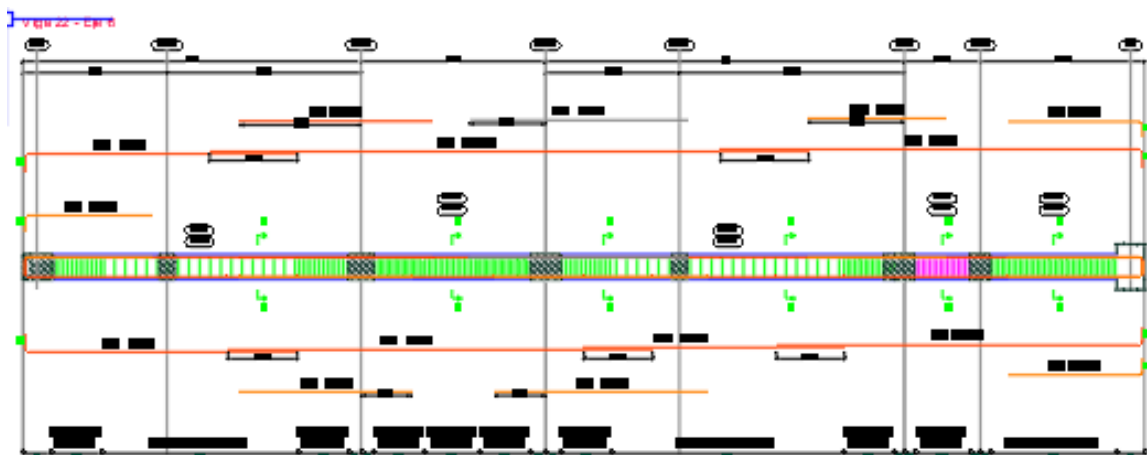


Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +19.30

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> | <p align="center"><b>CONSORCIO<br/>INTERSAUD PZ</b></p>  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                                                                               |

• DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E) N +15.40

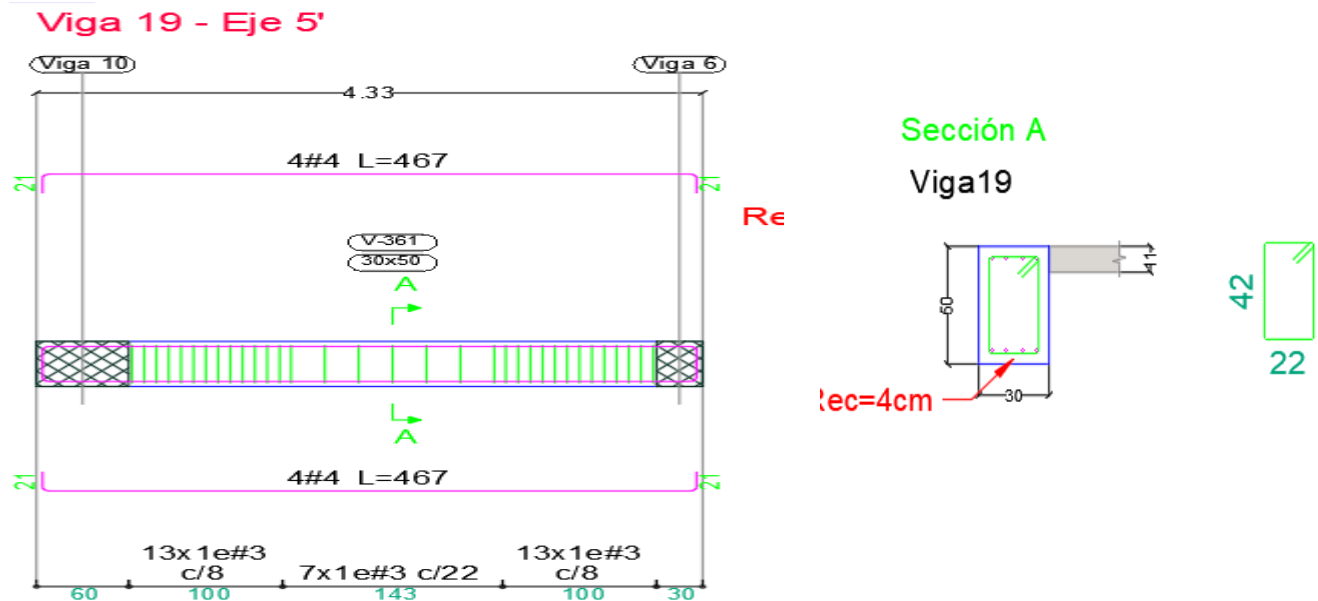


*Ilustración 48. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E) N +15.40*

**ACERO ESTRUCTURAS**

REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 2 filas, acero transversal de varilla No 6 espaciado 0.20 mts dispuesto en dos filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

y acero transversal de varilla N°4 dispuesto en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.

- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°5 dispuestas en 2 filas, refuerzo transversal en varilla No 5 espaciados 0.25 mts en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.25 mts, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 7 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas con espaciamiento 0.15 mts, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo transversal varilla No 6 en 2 filas espaciados 0.15 mts, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varillas No 6 en 3 filas espaciadas 0.12 mt, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

**REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".**

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, las ondas restantes la

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

conforman un ángulo de  $2 \times 3/16$ , con bastón de refuerzo en varilla lisa 1" en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , el cordón inferior lo conforman dos ángulos de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , las dos primeras ondas la conforman un ángulo de  $2 \times 1/8$ , las ondas restantes la conforman un ángulo de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , con bastón de refuerzo en varilla lisa  $\frac{3}{4}$  en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de  $2 \times 1/8$ , el cordón inferior lo conforman dos ángulos de  $2 \times 3/16$ , las dos primeras ondas la conforman un ángulo de  $2 \times 1/8$ , las ondas restantes la conforman un ángulo de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , con bastón de refuerzo en varilla lisa  $7/8$  en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4\*\* a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de  $2 \times 1/8$ , el cordón inferior lo conforman dos ángulos de  $2 \times 3/16$ , las dos primeras ondas la conforman un ángulo de  $2 \times 1/8$ , las ondas restantes la conforman un ángulo de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , con bastón de refuerzo en varilla lisa  $7/8$  en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de  $2 \times 1/8$ , el cordón inferior lo conforman dos ángulos de  $2 \times 3/16$ , las dos primeras ondas la conforman un ángulo de  $2 \times 1/8$ , las ondas restantes la conforman un ángulo de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , con bastón de refuerzo en varilla lisa  $7/8$  en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , el cordón inferior lo conforman dos ángulos de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , las dos primeras ondas la conforman un ángulo de  $1 \frac{1}{2} \times 1/8$ , con bastón de refuerzo en varilla lisa  $\frac{3}{4}$  en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### **REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO A N+19.30**

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5 y 6, en la parte inferior varilla No 5 y 6, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.

### **REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+15.40 A N +19.30**

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## **ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO**

### ▪ **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO 5 N+19.30**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A\*, A\*\*, A\*\*\*, B, C, D, D\*, D\*\*, E, E\*, 1\*, 1, 2, 3, 3\*, 4, 4\*, 4\*\*, 5, 6, 6\* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D\*, D\*\*, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A\*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A\*\*, A\*\*\*, E\*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

### ▪ **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entepiso 5 N +19,30, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entepiso 5.

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entepiso 5.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 5.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 5.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 5.

La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 5.


La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 5.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 5.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 5.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> | <p><b>CONSORCIO<br/>INTERSAUD PZ</b></p>  <p>Documento<br/>Versión 1</p> |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**
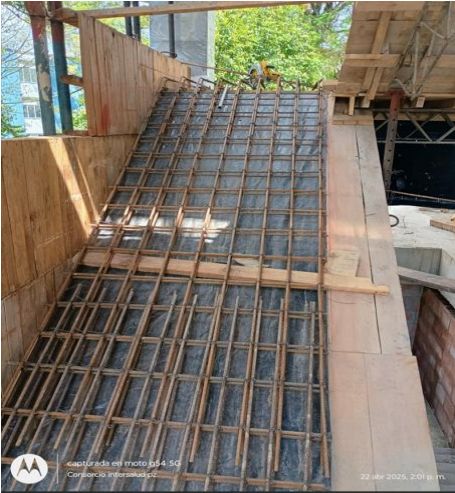
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <p><b>ACERO CORRUGADO <math>F_y=420</math> Mpa GRADAS DE EMERGENCIA</b></p>         |                                                                                      |
|  |  |
| <p><b>ACERO CORRUGADO <math>F_y=420</math> Mpa GRADAS CENTRALES</b></p>             |                                                                                      |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



**CONCRETO PARA ESCALERAS DE EMERGENCIAS 3000 PSI**



**CONCRETO PARA GRADAS CENTRALES 3000 PSI**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA  
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA  
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE  
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE  
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE  
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



Mo,

***ACERO DE REFUERZO  $F_y=420$  Mpa COLUMNAS***


**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

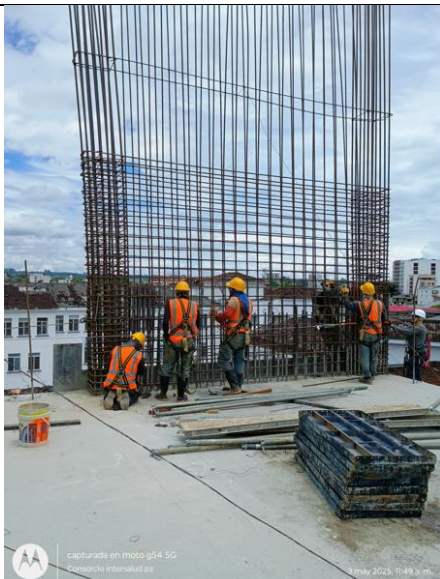

***ACERO DE REFUERZO  $F_y=420$  Mpa PANTALLAS***

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



***ACERO REFUERZO  $F_y=420$  Mpa VIGAS JOIST***

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



**ACERO CORRUGADO  $F_y=420$  Mpa VIGAS ENTREPISO**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



**MALLAS ELECTROSOLDADAS 15X15  $F_u=550MPa$ ,  $S_y=485MPa$**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>capturada en moto g54 5G<br/>Consorcio InterSalud PZ<br/>8 may 2025, 7:06 a. m.</p>  |  <p>4</p>                                                                                |
|  <p>capturada en moto g54 5G<br/>Consorcio InterSalud PZ<br/>8 may 2025, 7:06 a. m.</p> |  <p>capturada en moto g54 5G<br/>Consorcio InterSalud PZ<br/>7 may 2025, 8:17 a. m.</p> |
| <p><b>CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS</b></p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  <p>Documento<br/>Versión 1</p> |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |



**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



**MAMPOSTERIA**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1



**RED SANITARIA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado en obra y con lo estipulado en dichos documentos.

Para la verificación y seguimiento de lo anterior se hizo uso de flexómetros y calibradores para medir directamente las dimensiones, longitudes, diámetros y espaciamientos de los elementos estructurales y el acero de refuerzo en sitio. Esto incluyó la verificación de las vigas joist, las formaletas de vigas y losas, los aceros de la malla electrosoldada, los aceros de columnas y pantallas, y los aceros de las gradas.

Para realizar el control del concreto en sitio, se realizaron ensayos de asentamiento (Slump) y toma de muestras.

Adicionalmente, para la liberación de actividades como la instalación de redes hidrosanitarias, red contra incendios, se le solicito al contratista mediante oficio CIPZ-078-0196-2025 la entrega de la planimetría y la información correspondiente, debidamente identificada, para el entrepiso el cual se está solicitando la liberación. Dicha información debe contener la planta arquitectónica del piso bajo el cual se va a realizar los trabajos, ésta debe venir en formato dwg que permita identificar de forma clara las capas de las redes. Por otra parte, estos documentos deben contar con cuadro de convenciones para una clara identificación de las redes. Igualmente, en los planos presentados deberán estar claramente identificados los puntos sanitarios, diámetros de tuberías y sentido del flujo.

De igual forma para la actividad de mampostería y posterior liberación de campo se solicitó al contratista mediante oficio CIPZ-078-0194-2025 y se reiteró mediante oficio CIPZ-078-0290-2025 entregar el plano de localización debidamente identificado con los ejes de ubicación, el plano de perfil de detalle del muro a construir en donde se indica las dovelas, los refuerzos horizontales, las dilataciones y las dimensiones de las ventanas y

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

vanos de puertas que se encuentren incorporados en el muro, todo debidamente acotado. Adicional se solicitó llevar un estricto registro fotográfico del proceso constructivo de cada muro, el cual debe detallar el proceso de planteo, la ejecución de anclajes tanto verticales como horizontales.

Asimismo, se precisó al contratista de obra, que las deficiencias que se detecten en los muros por falta de planificación durante el proceso de construcción deberán ser corregidas sin que ameriten un reconocimiento económico por las mismas.


- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de mayo de 2025 del 26.74% frente un avance programado acumulado del 26.56%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025 es de 3.40% frente a un avance programado del 3.32%.

| FECHA DE CORTE | VALOR PROGRAMADO | PORCENTAJE PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 31-08-2024     | \$109,503,404    | 0.33%                 | \$363.707.100   | 1.12%                |
| 30-09-2024     | \$858,324,856    | 2.16%                 | \$1.055.624.921 | 3.28%                |
| 31-10-2024     | \$1.948.435.571  | 6.00%                 | \$2.356.607.214 | 7.26%                |
| 30-11-2024     | \$2.636.884.000  | 8.12%                 | \$3.049.301.893 | 9.39%                |
| 31-12-2024     | \$3.299.608.964  | 10.13%                | \$3.705.275.250 | 11.41%               |
| 31-1-2025      | \$4.715.214.428  | 14.52%                | \$4.715.214.428 | 14.52%               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

|           |                 |        |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 25-2-2025 | \$5.260.776.428 | 16.2%  | \$5.260.776.428 | 16.2%  |
| 25-3-2025 | \$6.189.530.785 | 19.06% | \$6.423.343.071 | 19.78% |
| 25-4-2025 | \$7.546.940.999 | 23.24% | \$7.579.414.928 | 23.34% |
| 25-5-2025 | \$8.917.340.785 | 27.46% | \$8.917.340.785 | 27.46% |
| AVANCE    | \$1.370.399.786 | 4.22%  | \$1.337.925.857 | 4.12%  |

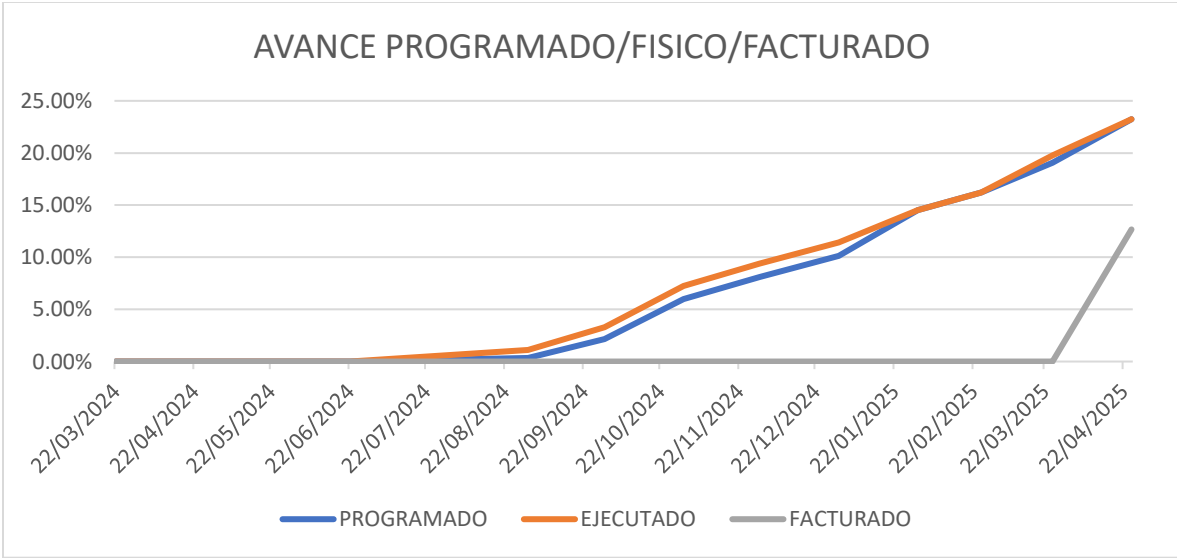

**4.3. Gestión Financiera**

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo \$9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de abril de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

| AUTORIZACIONES DE PAGO                                                     |                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| PROVEEDOR                                                                  | VALOR/CONCEPTO                                 | ITEM PLAN DE INVERSION |
| 1. CONCRETOS Y AGREGADOS<br>GEOACOPIO SAS                                  | \$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo | Materiales             |
| 2. FERRETERÍA GYJ                                                          | \$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo   | Materiales             |
| 3. URIEL PALTA AMA                                                         | \$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo     | Transporte             |
| 4. UBANER PEREZ                                                            | \$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo     | Mano de obra           |
| 5. PEDRO ROMO                                                              | \$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo     | Alquiler de equipos    |
| 6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S | \$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo   | Mano de obra           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                                                                                  |                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S</b> | \$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.   | Mano de obra |
| <b>8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN</b>                                                | \$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo. | Materiales   |
| <b>9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S</b> | \$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.   | Mano de obra |
| <b>10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S</b>                                        | \$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.   | Mano de obra |
| <b>11. DIANA CAROLINA VIVAS</b>                                                  | \$133.865.096 m/cte                             | Mano de obra |
| <b>12. SILOGISTICA</b>                                                           | \$103.240.000 m/cte                             | Transporte   |
| <b>13. LA ALIANZA GROUP SAS</b>                                                  | \$309.835.612 m/cte.                            | Mano de obra |
| <b>14. UBANER PEREZ</b>                                                          | \$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo   | Mano de obra |
| <b>15. UBANER PEREZ</b>                                                          | \$30.000.000 m/cte                              | Mano de obra |
| <b>16. G Y J FERRETERIAS S.A.</b>                                                | \$71.110.589 m/cte                              | Materiales   |
| <b>17. IMCOMERSA LUD SAS</b>                                                     | \$27.620.616 m/cte                              |              |
| <b>18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA</b>                                           | \$26.064.505 m/cte                              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>19.EQUIPAR GLEASON</b>                       | \$29.741.279 | Alquiler de equipos |
| <b>20. SILOGISTICA S.A.S</b>                    | \$21.600     | Transporte          |
| <b>21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS</b> | \$1          | Mano de obra        |
| <b>22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS</b>     | \$34.228     | Materiales          |

*Anexo 6. Autorización de desembolso G Y J FERRETERIAS S.A del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025.*

*Anexo 7. Autorización de desembolso IMCOMERSA LUD SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025.*

*Anexo 8 Autorización de desembolso REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025*

*Anexo 9. Autorización de desembolso EQUIPAR GLEASON del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025.*

*Anexo 10. Autorización de desembolso SILOGISTICA SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025.*

*Anexo 11. Autorización de desembolso HIDRAULICA Y SANITARIA SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025.*

*Anexo 12. Autorización de desembolso CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS del 2 de mayo de 2025, pagado AL 8 DE MAYO DE 2025*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### **ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION**

| ITEM No | DESCRIPCION DEL ITEM | VALOR PROGRAMADO APROBADO | VALOR TRANSFERIDO    | % TRANSFERIDO | SALDO FIDUCIA |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1       | ALQUILER DE EQUIPOS  | \$ 85,500,000.00          | \$ 85.500.000.00     | 0.02%         | \$ 0          |
| 2       | TRANSPORTE           | \$ 105,400,000.00         | \$ 105.400.000.00    | 1.08%         | \$ 0          |
| 3       | MATERIALES           | \$ 7,205,599,277.00       | \$ 7,205.599.277.00  | 73.23%        | \$ 0          |
| 4       | MANO DE OBRA         | \$ 2,345,679,294.00       | \$ 2,345,679,293.00  | 24.08%        | \$ 0          |
|         | TOTAL                | \$ 9,742,178,571.00       | \$ 9,742,178,571 .00 | 100%          | \$ 0          |

El contratista de obra hizo entrega del informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de mayo de 2025 mediante oficio EV-C358-23-0416-25 del 19 de mayo del presente.

Cabe destacar que, al término del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°2, con fecha de corte al 8 de mayo de 2025 por un valor de \$ 1,331,595,292 correspondiente al 4.10% del valor contractual quedando un saldo por facturar de \$27.029.033.004. Se realiza una amortización del anticipo por un valor de \$399.478.588, quedando pendiente por amortizar \$8.108.709.901 del anticipo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

| CONTRATO DE OBRA 358-2023        |                   |                   |                                   |                 |                 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| BALANCE CORTE 26-05-2025         |                   |                   | BALANCE DEL ANTICIPO:             |                 |                 |
| VALOR CONTRATO PPAL              |                   | \$ 32,473,928,569 | VALOR ANTICIPO                    |                 | \$9,742,178,571 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL         |                   | -                 | AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES     | \$1,233,990,082 |                 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO           |                   | \$ 32,473,928,569 | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA        | \$ 399,478,588  |                 |
| VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES | \$ 4,113,300,273  |                   | AMORTIZACION ACUMULADA            | \$1,633,468,670 |                 |
| VALOR FACTURADO MES DE MAYO      | \$ 1,331,595,292  |                   | % PORCENTAJE ACUMULADO AMORTIZADO | 16,77%          |                 |
| VALOR FACTURADO ACUMULADO        | \$5,444,895,565   |                   | SALDO POR AMORTIZAR               | \$8,108,709,901 |                 |
| % PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO | 16.77%            |                   | % PORCENTAJE ACUMULADO AMORTIZADO | 83.23%          |                 |
| SALDO POR FACTURAR               | \$ 27,029,033,004 |                   |                                   |                 |                 |
| SUMAS IGUALES                    | \$ 32,473,928,569 | \$ 32,473,928,569 | SUMAS IGUALES                     | \$9,742,178,571 | \$9,742,178,571 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".




**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

**CONTRATO 358-2023  
AVANCE FISICO**



**CONTRATO 358-2023  
AVANCE FINANCIERO**

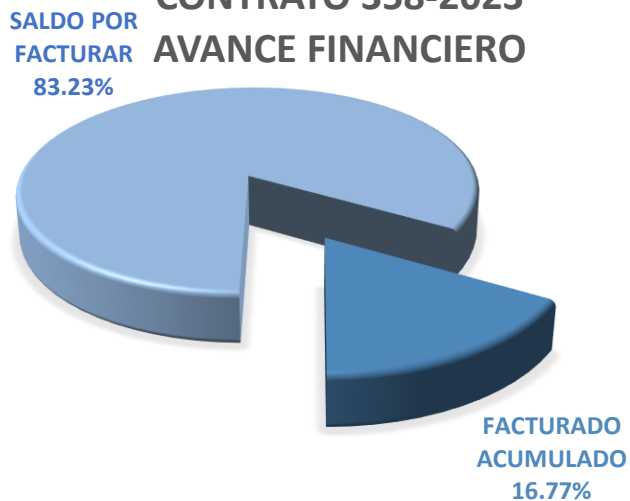


**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



**INFORME MENSUAL No. 15**


Documento  
Versión 1

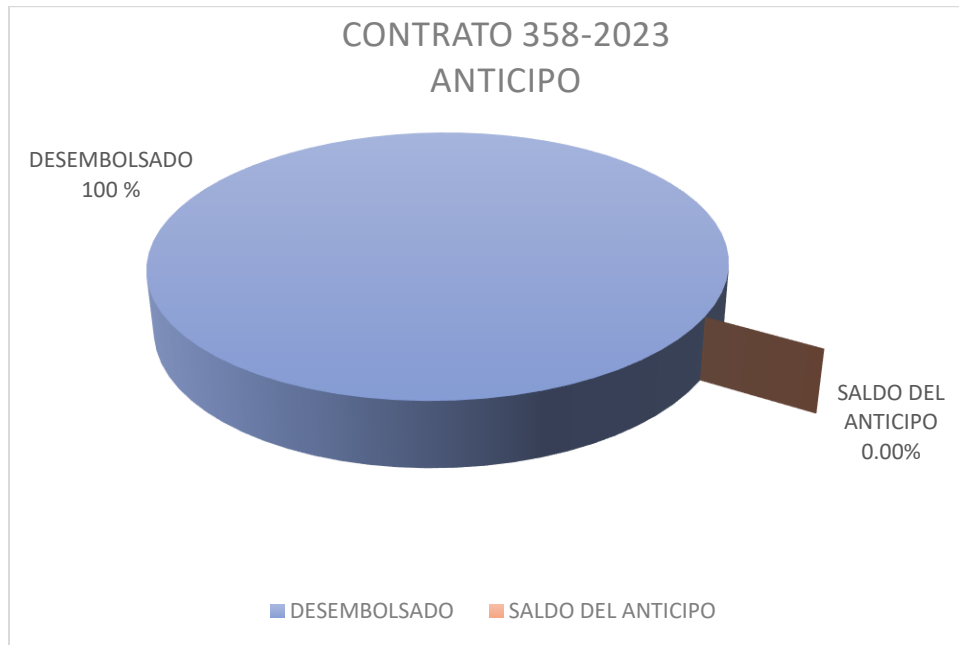

• **Desembolsado: \$9,742,178,571.0  
m/cte**

**Anticipo \$ 9,742,178,571.00 m/cte**


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

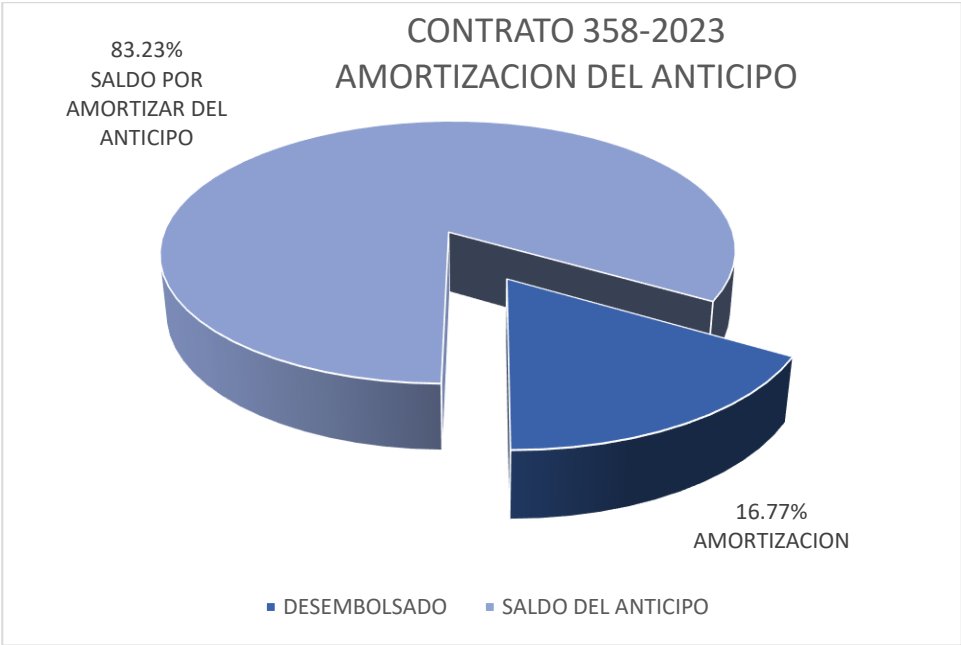

| CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024         |                |                  |                               |        |        |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|
| BALANCE CORTE 8-05-2025                    |                |                  | BALANCE DEL ANTICIPO:         |        |        |
| VALOR CONTRATO PPAL                        |                | \$ 1.280.412.030 | VALOR ANTICIPO                |        | \$0.00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL                   |                | \$0.00           | AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | -      |        |
| VALOR TOTAL CONTRATADO                     |                | \$ 1.280.412.030 | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA    | \$0.00 |        |
| VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES ACUMULADO | \$ 162.183.000 |                  | SALDO POR AMORTIZAR           | \$0.00 |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  <p>Documento<br/>Versión 1</p> |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |

|                                |                  |                  |               |        |        |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| VALOR PRESENTE ACTA            | \$ 52.503.368    |                  |               |        |        |
| VALOR ACUMULADO ACTAS          | \$ 214.686.368   |                  |               |        |        |
| PORCENTAJE ACUMULADO FACTURADO | 16.77%           |                  |               |        |        |
| SALDO POR FACTURAR             | \$1.065.725.662  |                  |               |        |        |
| PORCENTAJE SALDO POR FACTURAR  | 83.23%           |                  |               |        |        |
| SUMAS IGUALES                  | \$ 1.280.412.030 | \$ 1.280.412.030 | SUMAS IGUALES | \$0.00 | \$0.00 |

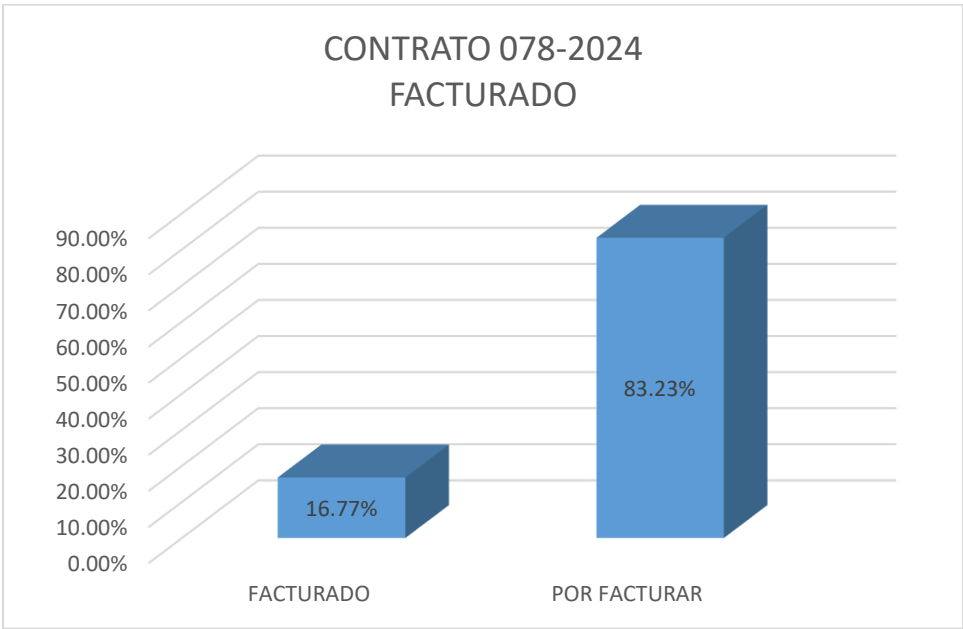

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

#### **4.4. Gestión Socioambiental**

Para el informe del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

##### **PROGRAMA No 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.**

La ejecución de las actividades forestales correspondientes a la tala de los individuos forestales fue ejecutada al 100% de igual manera las siembras de las plántulas establecidas en la resolución de aprovechamiento emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, sin embargo, no se tiene registro fotográfico del mantenimiento de estas especies por lo cual no se establece la actividad como cumplida hasta el presente periodo.

##### **PROGRAMA No 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

Se observa la instalación y adecuación de puntos de acopio de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, si embargo se presentan varios hallazgos objeto de mejora por parte del contratista para el correcto manejo integral de los residuos sólidos generados en los frentes de obra.

Como primera medida la información de los puntos de recepción de residuos sólidos ordinarios esta opaca y en ocasiones no visible por lo cual debe ser objeto de intervención por parte del contratista.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

### Registro fotográfico de recipientes si rotulo visible



Por otra parte, los puntos de acopio de residuos aprovechables presentaron colmatación en el presente periodo ya que no fueron entregados en su totalidad a los gestores de dichos materiales.




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

En cuanto al manejo de los residuos de construcción y demolición RCD se evidencia dispersión de estos en varios sectores de obra por lo cual se oficia al contratista para que adelante las labores de traslado a sitio de almacenamiento temporal para su posterior evacuación



El punto ecológico instalado en el inicio de la obra no se encuentra completo

*Registro fotográfico punto ecológico instalado al inicio de la obra*

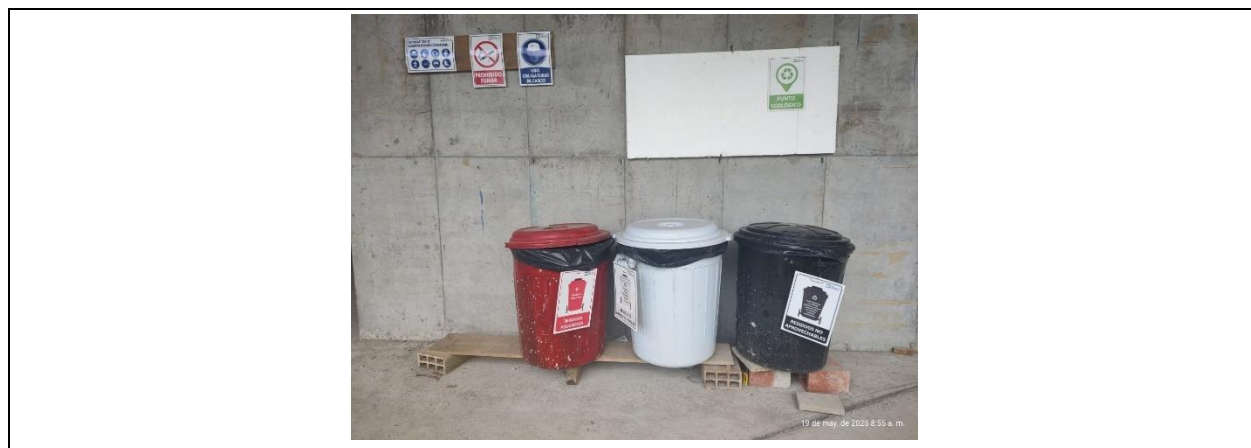

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

Se solicita al contratista mediante oficio CIPZ-078-0283-2025 del 27 de mayo del presente para que adelante las acciones correctivas relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos

### **PROGRAMA No 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.**

Durante las inspecciones y recorridos realizados por la Interventoría se evidencia el material pétreo sin la protección adecuada para el control de las dispersiones por acción del agua y del viento.

También se evidencia disposición de material de RCD a los costados de los materiales pétreos. Se informa al contratista de manera verbal remediar la situación para evitar dispersión del material y contaminación del mismo por otros materiales.



### **PROGRAMA No 4 PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO**

La ejecución de estas actividades ha sido ejecutada en periodos anteriores y su revisión obedece estrictamente a los profesionales de ingeniería civil toda vez que constituyen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

obras civiles sanitarias y de drenaje cuyo presupuesto quedó adjudicado en el PMA pero corresponde a un experto en el tema la revisión de su ejecución. A la fecha, dichas actividades fueron ejecutadas al 100% entre septiembre y noviembre del 2024.

Para efectos ambientales las actividades de: manutención de cobertura vegetal, jornadas de almacenamiento seguro de material excavado, las cuales quedaron programadas para el mes de abril teniendo en cuenta los ajustes que se le realizaron al PMA para este periodo, no se lograron revisar ya que no se contó con acompañamiento en la visita de inspección.

#### **PROGRAMA No 5: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.**

Durante la inspección se constató que el personal operativo, administrativo y los visitantes que ingresan a la zona de obra hacen uso adecuado de la indumentaria exigida según el tipo de labor o actividad a desempeñar. Entre los elementos observados se incluyen cascos, chalecos reflectivos, botas de seguridad, guantes, gafas y protectores auditivos, lo cual contribuye a minimizar los riesgos laborales y promueve una cultura preventiva en el entorno de trabajo.

De igual manera, se evidenció la presencia de un botiquín de primeros auxilios tipo B, acondicionado con los implementos básicos requeridos según la normativa vigente. Este cuenta con suministros médicos esenciales, una camilla rígida para el traslado de personas lesionadas, un extintor con carga vigente y debidamente señalizado, así como una dotación completa de elementos de protección personal adicionales para atención inmediata en caso de emergencia.

Complementariamente, el área dispone de equipos especializados para trabajos en condiciones de riesgo, tales como arneses de seguridad y líneas de vida, los cuales están

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

en buenas condiciones de uso y disponibles para los trabajadores que realizan labores en altura o en espacios confinados. Todos estos elementos se encuentran ubicados en puntos estratégicos, claramente identificados y de fácil acceso, lo que garantiza una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo. Esta organización evidencia el compromiso del proyecto con el cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales y el bienestar integral del equipo humano.

Se evidencio el uso de casco de protección de las visitas guiadas con el fin de preservar la integridad de las personas.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |



## PROGRAMA No 6. REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el presente periodo no se llevaron a cabo reuniones presenciales con la comunidad del área de influencia del proyecto. No obstante, se mantienen habilitadas y operativas las líneas de comunicación establecidas para la atención oportuna de inquietudes, sugerencias y reclamos por parte de la ciudadanía. Entre estos canales se destaca el correo electrónico dispuesto por el contratista, el cual se encuentra activo y disponible para recibir comunicaciones en cualquier momento, así como el buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), instalado en la entrada principal de la obra y debidamente identificado.

Estas herramientas permiten asegurar la continuidad en la interacción con la comunidad, facilitando el ejercicio del control social y el seguimiento a la gestión del proyecto, aun en los periodos en que no se programen espacios de diálogo directo. Se resalta la importancia de continuar promoviendo la participación comunitaria mediante la divulgación periódica de estos canales, y de fortalecer su seguimiento a través del

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

registro, análisis y respuesta oportuna a las comunicaciones recibidas, como parte del compromiso con la gestión social y la transparencia en el desarrollo del proyecto

Se evidencia que se mantiene abierto el canal para la comunicación activa de las PQRs.



## **PROGRAMA No 7. SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

Durante las inspecciones realizadas por la Interventoría, se evidenció que algunos frentes de trabajo cuentan con delimitaciones visibles para restringir el paso de personas ajenas a las actividades que allí se desarrollan. Esta medida contribuye significativamente a la reducción de riesgos asociados a actos inseguros, al evitar el ingreso involuntario de personal no autorizado o sin la protección adecuada.


Se identificó el uso de cinta de demarcación en ciertas zonas, lo cual es una práctica positiva en materia de prevención de accidentes. Sin embargo, se observó que esta medida no se ha implementado de manera uniforme en todos los frentes de trabajo activos, lo que representa una oportunidad de mejora en el control de riesgos.

Es importante resaltar que la correcta delimitación de áreas de trabajo está regulada por la **Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo**, la cual establece los estándares

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), específicamente en lo relacionado con la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Además, la **Norma Técnica Colombiana NTC 5523** brinda lineamientos sobre la señalización de seguridad en los lugares de trabajo, incluyendo el uso adecuado de demarcaciones físicas.

Ante esta situación, se informó al contratista sobre la necesidad de implementar de forma integral y permanente las medidas de delimitación en todos los frentes activos, utilizando elementos de señalización visibles, resistentes y acordes con la normatividad vigente. Esto no solo garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, sino que fortalece las condiciones de seguridad en el proyecto y protege la integridad de todo el personal presente en la obra

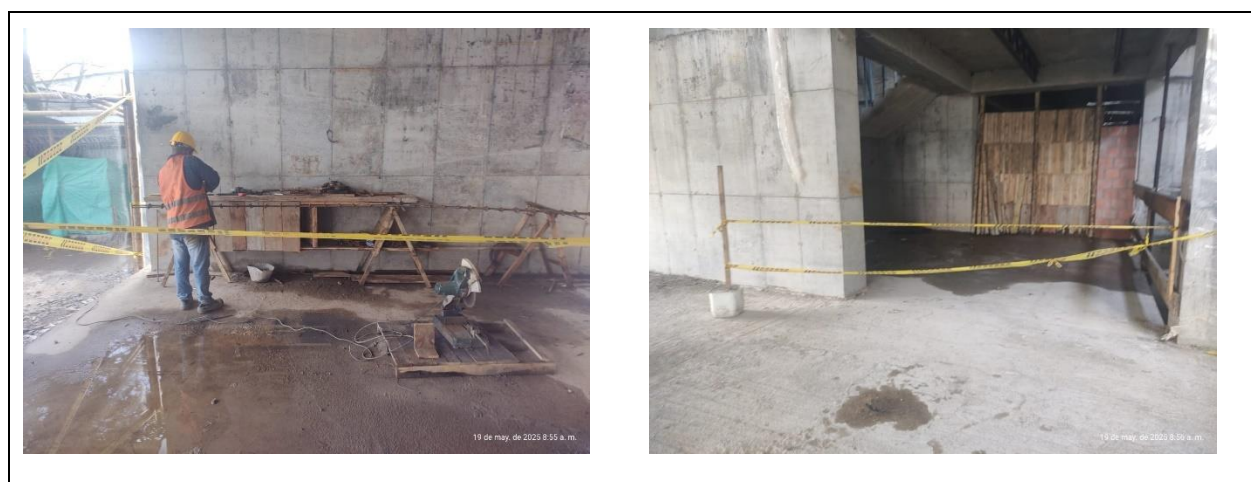

## **PROGRAMA No 8 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

De acuerdo con los compromisos adquiridos por el contratista durante el periodo anterior, se avanzó en la implementación de medidas para la protección de los sumideros ubicados

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

en el área de influencia del proyecto. Entre las acciones desarrolladas, se destaca la instalación de coberturas con poli sombra, cuya función principal es evitar la colmatación de estos sistemas de drenaje debido a la acumulación de residuos sólidos, hojas secas, sedimentos u otros materiales que puedan ser arrastrados por el viento o el agua lluvia.

Esta medida preventiva busca garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico de los sumideros, minimizando el riesgo de obstrucciones que puedan generar encharcamientos, afectaciones a la infraestructura o impactos negativos sobre el entorno inmediato. Asimismo, estas acciones contribuyen al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al control de impactos en la fase constructiva, en especial aquellos relacionados con el manejo de aguas lluvias y el control de residuos.

Se resalta que esta actividad debe mantenerse de forma periódica, realizando inspecciones continuas que permitan verificar el estado de los elementos instalados, así como su limpieza y reposición en caso de desgaste o deterioro. Esto refleja un avance positivo por parte del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y en la adopción de prácticas responsables con el entorno.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |



## **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 28 DE MAYO DE 2025**

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, es requisito fundamental contar con la aprobación oficial del documento PMA. A la fecha, dicho documento aún se encuentra en proceso de ajustes por parte del contratista, lo que ha impedido su validación final por parte de la interventoría y las autoridades competentes.

Si bien se ha evidenciado la ejecución de varios programas y actividades ambientales en el área del proyecto, la ausencia de un PMA aprobado impide definir con precisión los indicadores, metas y cronogramas oficiales que permitan medir objetivamente el nivel de cumplimiento. En consecuencia, hasta tanto no se cuente con la versión definitiva y avalada del PMA, no es posible establecer porcentajes formales de avance en la ejecución de los compromisos ambientales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

Esta situación resalta la importancia de agilizar el proceso de revisión y ajuste del documento, ya que su aprobación no solo es una exigencia normativa, sino que también es una herramienta clave para el seguimiento técnico, el control ambiental del proyecto y la toma de decisiones informadas frente a la gestión de impactos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

## 5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 21 abril al 20 de mayo 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

| MARCO LEGAL |                          |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.         | NORMATIVA                | ASPECTO LEGAL                                                                                                                                                                                        |
| 1           | Ley 9 de 1979            | Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario                                                                                                                                               |
| 2           | Decreto 1072 de 2015     | Por medio del cual se expide el Decreto Único                                                                                                                                                        |
| 3           | Resolución 2400 de 1979  | Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal. |
| 4           | Resolución 0312 de 2019  | Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST                                                                                     |
| 5           | Resolución 4272 del 2021 | Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.** La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales corresponden al pago del mes de abril 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

**RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA**

| ÍTEM                                                                                                                | NUMERO DE PLANILLA                                                               | PERIODO | FECHA DE PAGO | No. DE TRABAJADO RES POR PLANILLA | OPERADOR                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE                                                                               |                                                                                  |         |               |                                   |                                      |
| 1                                                                                                                   | 9485566898                                                                       | ABRIL   | 5/05/2025     | 1                                 | APORTES EN LINEA                     |
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL                                                                       |                                                                                  |         |               |                                   |                                      |
| 2                                                                                                                   | 9485629696                                                                       | ABRIL   | 2025/05/02    | 13                                | APORTES EN LINEA                     |
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION<br>este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL |                                                                                  |         |               |                                   |                                      |
| 3                                                                                                                   | SE RELACIONAN 3 CONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y NO SE RELACIONA PLANILLAS VIGENTES |         |               | 3                                 |                                      |
| 4                                                                                                                   | 9484779619                                                                       | ABRIL   | 2025/05/06    | 1                                 | ASOPAGOS                             |
| 5                                                                                                                   | 7965797720                                                                       | ABRIL   | 2025/04/30    | 1                                 | APORTES EN LINEA                     |
| 6                                                                                                                   | 9484823877                                                                       | ABRIL   | 2025/04/30    | 1                                 | APORTES EN LINEA                     |
| 7                                                                                                                   | 9483737037                                                                       | ABRIL   | 2025/05/09    | 1                                 | SOI- NO SE PRESENTA PLANILLA VIGENTE |
| 8                                                                                                                   | 9485362420                                                                       | ABRIL   | 2025/05/28    | 1                                 | APORTES EN LINEA                     |
| 9                                                                                                                   | 4600313904                                                                       | ABRIL   | 2025/04/22    | 1                                 | APORTES EN LINEA                     |
| 10                                                                                                                  | SE REPORTAN 2 INGRESOS                                                           |         |               | 2                                 |                                      |
| 11                                                                                                                  | SE REPORTAN 3 RETIROS                                                            |         |               | 3                                 |                                      |
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION                                                         |                                                                                  |         |               |                                   |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

**RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA**

| ÍTEM                                         | NUMERO DE PLANILLA       | PERIODO | FECHA DE PAGO | No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA | OPERADOR                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 13                                           | SE RELACIONA CONTRATISTA | ABRIL   |               | 1                              | NO SE PRESENTA PLANILLA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE    |
| <b>CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ</b>        |                          |         |               |                                |                                                        |
| 14                                           | 9485934181               | ABRIL   | 2025/05/13    | 27                             | APORTES EN LINEA                                       |
| 15                                           | INGRESOS                 | ABRIL   |               | 3                              |                                                        |
| 16                                           | RETIRO                   | ABRIL   |               | 2                              |                                                        |
| <b>CONTRATIST- TOPOGRAFIA</b>                |                          |         |               |                                |                                                        |
| 17                                           | 9482661891               | ABRIL   | 2025/03/04    | 2                              | NO SE PRESENTA PLANILLA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE    |
| <b>CONTRATIST- TOPOGRAFIA- INDEPENDIENTE</b> |                          |         |               |                                |                                                        |
| 18                                           | INDEPENDIENTE            | ABRIL   |               | 0                              | SIN NOVEDAD                                            |
| 19                                           | INGRESOS                 | ABRIL   |               | 0                              | SIN NOVEDAD                                            |
| 20                                           | RETIRO                   | ABRIL   |               | 1                              |                                                        |
| <b>CONTRATISTA- MAMPOSTERIA</b>              |                          |         |               |                                |                                                        |
| 21                                           | TRABAJADORES             | ABRIL   |               | 0                              | SIN NOVEDAD                                            |
| 22                                           | INGRESO                  | ABRIL   |               | 2                              | SE PRESENTA DOCUMENTOS AFILIACION E INGRESO            |
| 23                                           | RETIRO                   | ABRIL   |               | 4                              |                                                        |
| <b>CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS</b>          |                          |         |               |                                |                                                        |
| 24                                           | TRABAJADORES             | ABRIL   |               | 5                              | SE PRESENTAN PLANILLAS ARL, PENDIENTES SALUD Y PENSION |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

**RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA**

| ÍTEM         | NUMERO DE PLANILLA | PERIODO | FECHA DE PAGO | No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA | OPERADOR                                    |
|--------------|--------------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 25           | INGRESO            | ABRIL   |               | 2                              | SE PRESENTA DOCUMENTOS AFILIACION E INGRESO |
| 26           | RETIRO             | ABRIL   |               | 0                              | <b>SIN NOVEDAD</b>                          |
| <b>TOTAL</b> |                    |         |               | <b>64</b>                      |                                             |

| CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE                   |                                |               |           |              |      |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------|
| No.                                                     | NOMBRES Y APELLIDOS            | CEDULA        | EPS       | AFP          | ARL  | CCF         |
| 1                                                       | ELVIO MARINO SANTIAGO CAMPO    | 10.305.105    | SANITAS   | PROTECCION   | SURA | COMFACAUC A |
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP |                                |               |           |              |      |             |
| 2                                                       | CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ   | 10.302.884    | SANITAS   | COLPENSIONES | SURA | N/A         |
| 3                                                       | CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES | 34.328.843    | SANITAS   | PORVENIR     | SURA | N/A         |
| 4                                                       | JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ  | 76.310.636    | NUEVA EPS | PROTECCIÓN   | SURA | N/A         |
| 5                                                       | GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO | 93.395.308    | SANITAS   | PORVENIR     | SURA | N/A         |
| 6                                                       | CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA   | 1.061.735.885 | SANITAS   | PORVENIR     | SURA | N/A         |
| 7                                                       | LORENA FALLA FALLA             | 1.019.092.020 | NUEVA EPS | PORVENIR     | SURA | N/A         |
| 8                                                       | JULIO CESAR MAYA BASTIDAS      | 98.385.333    | SANITAS   | PROTECCIÓN   | SURA | N/A         |
| 9                                                       | JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ  | 1.061.748.118 | SANITAS   | PORVENIR     | SURA | N/A         |
| 10                                                      | ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ      | 34.533.693    | SANITAS   | PENS VEJ ACT | SURA | N/A         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

| CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO |                                  |               |         |          |      |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|----------|------|----------------|
| 11                                                               | WILINSON ANDRES QUILINDO CHARO   | 1.007.410.693 |         |          | SURA |                |
| 12                                                               | JULIAN ANDRES SANCHEZ SANTACRUZ  | 76.332.823    |         |          | SURA |                |
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- RETIRO  |                                  |               |         |          |      |                |
| 13                                                               | JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ      | 1.061.725.247 |         |          |      |                |
| 14                                                               | LAURA VALENTINA CALLEJAS GAVIRIA | 1.061.818.139 |         |          |      |                |
| 15                                                               | LUIS FANCISCO ORTEGA HERNANDEZ   | 91.243.438    |         |          |      |                |
| CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP            |                                  |               |         |          |      |                |
| 16                                                               | PEREZ GOMEZ UBANER               | 1061600546    | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUC<br>A |

| CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ |                                |            |             |              |      |            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------|------|------------|
| No.                            | NOMBRES Y APELLIDOS            | CEDULA     | EPS         | AFP          | ARL  | CCF        |
| 16                             | EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ | 1065097610 | EMSSANAR    | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 17                             | LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE    | 4754652    | AIC         | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 18                             | MARCO AURELIO BONILLA YATA     | 76311480   | NUEVA EPS   | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |
| 19                             | ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES  | 1081595473 | EMSSANAR    | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 20                             | JHON EDILSON ERAZO URBANO      | 1085687158 | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 21                             | WEIMAR HERNAN GUACA            | 10317382   | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 22                             | WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA  | 1061779951 | SANITAS     | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 23                             | WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA     | 76327746   | EMSSANAR    | COLFONDOS    | SURA | COMFACAUCA |
| 24                             | RAUL LOZADA BERMEO             | 1117839679 | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 25                             | DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA | 1061792376 | AIC         | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 26                             | JUAN CARLOS MONSALVE MORALES   | 6526535    | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 27                             | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO   | 16891549   | ASMET SALUD | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 28                             | CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ     | 1061601164 | ASMET SALUD | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 29                             | UBANER PEREZ GAVIRIA           | 10435329   | ASMET SALUD | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 30                             | CARLOS MANUEL POLO NOBLE       | 1143353255 | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 31                             | JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN      | 75055901   | NUEVA EPS   | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |
| 32                             | ORLANDO ROJAS SANCHEZ          | 1061221640 | SANITAS     | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

| 33                                               | CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL     | 1061810740    | ASMET SALUD | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| 34                                               | OBER FERNEY SANCHEZ SOL         | 1061761500    | ASMET SALUD | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 35                                               | HEIDER SARRIA SARRIA            | 10296880      | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 36                                               | ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO   | 1061778681    | NUEVA EPS   | PROTECCION   | SURA | COMFACAUCA |
| 37                                               | JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ        | 1061804575    | ASMET SALUD | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 38                                               | WILMAR ZAMRANO YANDI            | 1002849154    | SANITAS     | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 39                                               | JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ    | 1061017769    | SANITAS     | COLFONDOS    | SURA | COMFACAUCA |
| 40                                               | LUIS ERNESTO NARVAEZ ESPINOSA   | 10568074      | SANITAS     | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 41                                               | JESUS ALBEIRO IRUA LASSO        | 76334379      | SANITAS     | PROTECCION   | SURA | COMFACAUCA |
| 42                                               | LUIS HORACIO MUESES CABEZAS     | 1061812269    | SANITAS     | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| <b>CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS</b> |                                 |               |             |              |      |            |
| 43                                               | KLEIN JAWER CRUZ BURBANO        | 1061738571    |             |              | SURA |            |
| 44                                               | PAULINO ANGULO MUÑOZ            | 76336476      |             |              | SURA |            |
| <b>CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS</b>  |                                 |               |             |              |      |            |
| 45                                               | CRISTIAN CAMILO MACA AVIRAMA    | 1002966961    | AIC         | PORVENIR     | SURA | COMFACAUCA |
| 46                                               | CARLOS ANDRES ROJAS GUTIERREZ   | 1007462733    | SANITAS     | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |
| <b>CONTRATISTA TOPOGRAFIA</b>                    |                                 |               |             |              |      |            |
| 47                                               | LUIS ANGEL BAOS                 | 1.061.804.293 | NUEVA EPS   | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |
| 48                                               | FERNANDO CALVACHE BURBANO       | 10.304.252    | NUEVA EPS   | PORVENIR     | SURA |            |
| <b>CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO</b>           |                                 |               |             |              |      |            |
|                                                  | SIN NOVEDAD                     |               |             |              |      |            |
| <b>CONTRATISTA TOPOGRAFIA- RETIRO</b>            |                                 |               |             |              |      |            |
| 49                                               | NESDRY YELISSA NARVAEZ GALVIS   | 1.061.708.231 | EMSSANAR    | N/A          | SURA |            |
| <b>CONTRATISTA – HIDROSANITARIA</b>              |                                 |               |             |              |      |            |
| No.                                              | NOMBRES Y APELLIDOS             | CEDULA        | EPS         | AFP          | ARL  | CCF        |
| 50                                               | JAIME JUNIAN MUÑOZ GUASAMALLI   | 4.617.575     | SURA        | COLPENSIONES | SURA |            |
| 51                                               | JOSE CLAUDIO IETER RENGIFO      | 76.190.347    | ASMET SALUD | COLPENSIONES | SURA |            |
| 52                                               | LUISA FERNANDA MORENO ORTEGA    | 1.088.651.098 | MALLAMAS    | PORVENIR     | SURA |            |
| 53                                               | ROLANDO BURBANO CALIBIO         | 15.571.993    | SANITAS     | PORVENIR     | SURA |            |
| 54                                               | FERNANDO ANDRES CHACON CABARICO | 1.130.607.657 | SANITAS     |              | SURA |            |
| <b>CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- INGRESOS</b>    |                                 |               |             |              |      |            |
| 55                                               | HAROLD EVER ZAPATA VALENCIA     | 10.593.026    | SANITAS     | COLPENSIONES | SURA |            |

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA  
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA  
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE  
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE  
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE  
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”



Documento  
Versión 1

**INFORME MENSUAL No. 15**

|                                       |                              |               |           |          |             |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------------|
| 56                                    | ARLIN COLLAZOS TROCHEZ       | 1.060.868.818 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA        |                                   |
| CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- RETIROS |                              |               |           |          |             |                                   |
|                                       | SIN NIOVEDAD                 |               |           |          |             |                                   |
| CONTRATISTA - MAMPOSTERIA             |                              |               |           |          |             |                                   |
| No.                                   | NOMBRES Y APELLIDOS          | CEDULA        | EPS       | AFP      | ARL         | CCF                               |
| CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- INGRESO    |                              |               |           |          |             |                                   |
| 57                                    | 76.325.832                   | SANITAS       | POSITIVA  | POSITIVA | 76.325.832  | INICIO DE COBERTURA<br>13/05/2026 |
| 58                                    | PPT 5403220                  | NUEVA EPS     | POSITIVA  | POSITIVA | PPT 5403220 | INICIO DE COBERTURA<br>19/05/2026 |
| CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- RETIRO     |                              |               |           |          |             |                                   |
| 59                                    | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SERNA | 1.144.044.900 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA    | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SERNA      |
| 60                                    | MIGUEL GARCIA SIERRA         | 1.098.657.855 | SANITAS   | PORVENIR | POSITIVA    | MIGUEL GARCIA SIERRA              |
| 61                                    | ALVARO ALDAIR SANCHEZ        | 1.002.970.903 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA    |                                   |
| 62                                    | CARLOS JAVIER VALENCIA       | 1.059.044.132 |           |          | POSITIVA    |                                   |
| TOTAL 62                              |                              |               |           |          |             |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

| RELACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO     |                                 |               |             |          |              |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|
| CONTRATISTA – INSERLIFT SAS          |                                 |               |             |          |              |                                |
| No.                                  | NOMBRES Y APELLIDOS             | CEDULA        | EPS         | AFP      | ARL          | CCF                            |
| 63                                   | FRANK LUIS MARTINEZ ORTIZ       | 1143137874    | SALUD TOTAL | SURA     | PORVENIR     | PENDIENTE PLANILLA             |
| CONTRATISTA - INSERLIFT SAS- INGRESO |                                 |               |             |          |              |                                |
| 64                                   | STEVENS DIVAN RIVERA TORRES     | 1.001.911.186 | SURA        | SURA     | PORVENIR     | INICIO DE COBERTURA 17/04/2025 |
| CONTRATISTA - ELECTRICO              |                                 |               |             |          |              |                                |
| No.                                  | NOMBRES Y APELLIDOS             | CEDULA        | EPS         | AFP      | ARL          | CCF                            |
| 65                                   | KARLOS SANTIAGO SAMBONI BURBANO | 1002967226    |             | POSITIVA | COLPENSIONES |                                |
| 66                                   | ALDINEVER QUILINDO LEBAZA       | 1007201005    |             | POSITIVA | PORVENIR     |                                |
| TOTAL 4                              |                                 |               |             |          |              |                                |

## RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN DE PERSONAL        | CANTIDAD  |
|--------------------------------|-----------|
| Nuevo                          | 16        |
| Antiguo                        | 40        |
| Retiro                         | 6         |
| Personal flotante- transitorio | 4         |
| Incapacidad laboral            | 2         |
| Incapacidad común              | 0         |
| <b>TOTAL, DE PERSONAL</b>      | <b>68</b> |

Indicadores de cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR               | % Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:                                                                             |
| FORMULA                 | $\frac{\text{Nº de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{\text{No de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$ |

**EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).** La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <b>INFORME MENSUAL No. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento<br>Versión 1                                                              |

siguientes ingresos:

| No.          | EMPRESA/ CONTRATISTA                              | NOVEDAD | No TRAB   |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1            | Consorcio EVOLET                                  | Ingreso | 2         |
| 2            | PEREZ GOMEZ UBANER                                | Ingreso | 2         |
| 3            | MAMPOSTERIA- JOSE MELLIZO                         | Ingreso | 2         |
| 4            | Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS | Ingreso | 0         |
| 5            | HSA INGENIERIA SAS                                | Ingreso | 2         |
| 6            | ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS                        | Ingreso | 2         |
| 7            | ESTRUCTURA METALICA                               | Ingreso | 4         |
| 8            | INSERFIT                                          | Ingreso | 2         |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |         | <b>16</b> |

**DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).** La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP's mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal para los trabajadores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR               | % Entrega de dotación y EPP al personal                                                                               |
| FORMULA                 | $\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP}}{\text{Numero de trabajadaores contratados}} \times 100 = 100\%$ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 16 ingresos y se registró en el formato de entrenamiento las inducciones correspondientes al periodo de los colaboradores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ, INGENIO TOPOGRAFICO, , EMPRESA HIDROSANITARIA, MAMPOSTERIA, ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS, INSERLIFT I

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICADOR</b>        | <b>% Cobertura Inducción y reintucción del personal</b>                                                                                         |
| <b>FORMULA</b>          | $\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 11}{\text{No. de trabajadores ingresan en el mes } 11} \times 100 = 100\%$     |
| <b>INDICADOR</b>        | <b>% cumplimiento del programa de Inducción y reintucción del personal</b>                                                                      |
| <b>FORMULA</b>          | $\frac{\text{No. de Inducciones y reintucciones ejecutadas } 11}{\text{No. de Inducciones y reintucciones programadas } 11} \times 100 = 100\%$ |

## CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 5 actividades relacionadas con el área SST, con el tema asociado a la atencion de emergencias, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra

Indicadores de Cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>INDICADOR</b>        | <b>% Capacitación del personal</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <b>INFORME MENSUAL No. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento<br>Versión 1                                                              |

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMULA</b>   | $\frac{\text{No. de trabajadores asisten capacitación al mes 27}}{\text{No. de trabajadaores en el mes 27}} \times 100 = 100\%$ |
| <b>INDICADOR</b> | <b>% cumplimiento del programa de Inducción y reintucción del personal</b>                                                      |
| <b>FORMULA</b>   | $\frac{\text{No. de capacitaciones ejecutadas 2}}{\text{No. de de capacitaciones programas 2}} \times 100 = 100\%$              |

| No.             | FECHA      | TEMA                                       | No. TRABAJADO RES ASISTENTES | No. TRABAJADO RES PROGRAMAS | % INDICADOR CUMPLIMIENTO |
|-----------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1               | 24/04/2025 | Prevención auditiva                        | 29                           | 29                          | 32/32*100 = 100%         |
| 2               | 30/04/2025 | Trabajo en alturas                         | 26                           | 26                          | 44/44*100 = 100%         |
| 3               | 15/05/2025 | Fiebre amarilla prevención- administrativo | 7                            | 7                           | 7/7*100 = 100%           |
| 4               | 09/05/2025 | Fiebre amarilla prevención- administrativo | 29                           | 29                          | 29/29*100 = 100%         |
| 5               | 15/05/2025 | Cuidado de manos                           | 32                           | 32                          | 32/32*100 = 100%         |
| <b>PROMEDIO</b> |            |                                            |                              |                             |                          |

| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Imagen No. 1</b> Socialización de Simulacro                                      | <b>Imagen No. 2.</b> Simulacro de Evacuación                                         |
| FUENTE: CONSORCIO EVOLET                                                            |                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## COMITÉ PARITARIO DE SST.

En el informe presentado para el periodo correspondiente se evidencia el acta de la reunión del COPASST del mes de mayo del 2025, mediante el registro CE-SGSST-07.1

## COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

En el informe presentado para el periodo correspondiente no se evidencia el ítem sobre el COCOLA, en el informe del periodo anterior el contratista aclara que por el numero de personal dependiente que es inferior a 10 colaboradores, no esta obligado a su conformación, se relaciona lo comentado que lo justifica: *“Según la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo de Colombia, modificada por la Resolución 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral es obligatorio para: • Empresas públicas y privadas con 10 o más trabajadores. Las empresas sí debe cumplir con el deber general de prevenir el acoso laboral y promover un ambiente sano, conforme a la Ley 1010 de 2006”.*

Se realiza la solicitud en las observaciones el desarrollo de un plan de acción para los casos que se puedan presentar ya que cuenta con contratistas con personal a cargo.

## ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

## AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

| CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO |                    |                          |                  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| No.                           | ORIGEN             | EMPRESA                  | TIEMPO REPORTADO |
| 1                             | ACCIDENTE LABORAL  | SIN NOVEDAD              | 1                |
| 2                             | INCAPACIDAD X A. T | CONSORCIO EVOLET, UBANER | 26+21=45         |
| 3                             | ENFERMEDAD LABORAL | SIN NOVEDAD              | 0                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

|                             |                              |                    |                |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>4</b>                    | INCAPACIDAD X A. L           | SIN NOVEDAD        | 0              |
| <b>5</b>                    | ENFERMEDAD COMUN             | SIN NOVEDAD        | 0              |
| <b>6</b>                    | PERMISOS                     | UBANER PEREZ GOMEZ | 29 DIAS        |
| <b>7</b>                    | INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS | SIN NOVEDAD        | 0              |
| <b>TOTAL, DE AUSENTISMO</b> |                              |                    | <b>76 DIAS</b> |

| <b>RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)</b><br>21 Abril – 20 mayo Periodo 2025                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                         | <b>RESULTADO</b>        |
| Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo                                                                                       | 62                      |
| Número de accidentes laborales durante el periodo                                                                                                          | 1                       |
| Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo                                                                               | 47                      |
| Numero de enfermedades laborales del periodo                                                                                                               | 0                       |
| Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo                                                        | 0                       |
| Número de enfermedades común durante el periodo                                                                                                            | 0                       |
| Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo                                                            | 0                       |
| Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra                                                                              | 3                       |
| Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra                                            | 108+47=155              |
| Frecuencia de Accidentalidad =<br>= <u>No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100</u><br>No de trabajadores en el mes                          | 1/62*100 =1,6%          |
| Severidad de Accidentalidad = <u>No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes</u> *100<br># de trabajadores en el mes              | 47+0/62*100=75.8%       |
| Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000                                                                                                           | 1.6*75.8/1000 =<br>0.12 |
| Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo) | 47/25*100 =188%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## **Control a programas epidemiológicos**

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

## **Control a programas osteomuscular**

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores. Se evidencia recomendaciones generales.

## **ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:**

### **Relación de actividades ejecutadas durante el periodo**

#### **Trabajo de alturas:**

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

### **La interventoría relaciona la gestión presentada por el contratista:**

El contratista informa, mediante oficio EV-C358-23-0385-25, radicado el 2 de mayo de 2025, la instalación de la malla contra caídas y de la línea de vida portátil horizontal, junto con las certificaciones técnicas correspondientes. Se recibe la siguiente documentación al respecto:

- Ensayo dinámico norma UNE EN 1263 INSERLIFT SAS
- Memoria de cálculo y certificación soportes sistema mixto tipo T INSERLIFT SAS
- Certificado 1947 redes anticaídas INSERLIFT SAS
- Certificación del lote San José Popayán sellado
- Ficha\_tecnica\_sistema\_tipo\_t\_mixto\_inserlift oficial
- Certificado del conector de anclaje

La interventoría verifica la instalación de los sistemas de protección colectiva, los cuales han sido ubicados estratégicamente en la zona perimetral del edificio en construcción y en espacios internos con riesgo de caída a distinto nivel.

La interventoría realizara los seguimientos pertinentes al contratista en cuanto a los monitoreo permanente y continuación de estas medidas de control durante la existencia del riesgo de caída de altura durante la ejecución de la obra y en todas sus etapas.

El contratista realiza la entrega del documento CE-MA-01 "Manual de Contratistas", el día 2 de abril de 2025, mediante oficio radicado EV-C358-23-0356-25. Se evidencia además el registro de socialización del manual realizada el 15 de abril de 2025, mediante el formato CV-SGSST-14-V1.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

El día 20 de mayo de 2025, mediante oficio radicado EV-C358-23-0422-25, el contratista remite el registro de socialización del plan de emergencia, correspondiente al día 14 de abril de 2025

El contratista mediante oficio con radicado No. EV-C358-23-0356-2 del 14 de abril del 2025 y oficio con radicado No. EV-C358-23-0404-25 del 12 de mayo, da respuesta a esta solicitud. Mediante el registro CV-SGSST-141V1 – Actividades trabajo en alturas, condiciones y actos inseguros – Resolución trabajo seguro en alturas, el contratista comunica la información solicitada en el tema de altura a los trabajadores. Registra la socialización del procedimiento de izaje de carga con pluma el día 09 de mayo del 2025 mediante el formato CV-SGSST-14-V1. Enviado el día 20 de mayo del 2025 mediante radicado EV-C358-23-0422-25

En el desarrollo de estas actividades se cuentan con 45 personas certificadas para labor en alturas.

## **ORDEN Y ASEO**

La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden y aseo, se evidencia la intervención y corrección de las observaciones realizadas como prevención del el riesgo locativo y de esta manera prevenir caídas de los colaboradores a nivel y de diferente nivel, Desde a la interventoría se continua con las solicitud del orden y aseo durante la jornada laboral y en especial donde se desempeñan actividades de altura, mantener limpio y sin obstáculos los senderos peatonales, además de identificados.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |



### SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

## PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Los equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET son los relacionados a continuación:

| EQUIPO                                        | CANTIDAD | UBICACIÓN                            |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Botiquines primeros auxilios                  | 2        | Obra – Oficina administrativa        |
| Camilla rígida                                | 2        | Área de bienestar – Punto ecológico. |
| Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb | 2        | Oficina administrativa - Obra        |

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

## BRIGADA DE EMERGENCIA

El CONSORCIO EVOLET cuenta con la brigada de emergencia conformación por los siguientes integrantes:

| BRIGADA                   | NOMBRE                 | CEDULA     | FIRMA       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------------|
| JEFE DE BRIGADA           | Jesús Truba            | 76.334.379 | JESUS TRUBA |
| JEFE DE EVACUACIÓN        | Guillermo León Erazbar | 79.3395308 | Guil.       |
| BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS | Ubaner Perez.          | 1061600546 | Ubaner P.   |
| BRIGADA CONTRA INCENDIOS  | Ricardo Bolaños        | 4754652    | RICARDO     |
| PERSONAL DE APOYO         | Jose Revelo            | 1061725247 | Jose Revelo |

Indicadores de Cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| INDICADOR               | % Capacidad de respuesta |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <b>INFORME MENSUAL No. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento<br>Versión 1                                                              |

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMULA</b>   | $\frac{\text{Numero de emergencias atendidas oportunamente}}{\text{Numero de emergencias presentadas}} \times 100 = N.A.$ |
| <b>INDICADOR</b> | <b>% de simulacros realizados</b>                                                                                         |
| <b>FORMULA</b>   | $\frac{\text{Numero de simulacros efectuados}}{\text{Numero de simulacros programados}} \times 100 = N.A$                 |

## INSPECCIONES.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, la programación del plan de trabajo SG-SST para este año, las inspecciones realizadas fueron:

- Inspección equipos de emergencia camilla y botiquín, mediante registro CV-SGSST-63.3- V1, con fecha del 30 de abril del 2025 por parte del contratista EVOLET, UBANER PEREZ GOMEZ realiza inspección a equipo de botiquín con registro SST-ST-07 con fecha 25/ de abril y 12 de mayo del 2025, inspección de extintor con registro SST-FT-06 con fecha 26 de abril y 10 de mayo del 2025.
  - Se relaciona inspección de lo equipos eléctricos mediante registro SST-ST-05, con fecha del 21 de abril y 28 de mayo del 2025.
  - Inspección en obra registro SST-FT-10 INSPECCION DE ACCESO PARA TRABAJOS DE ALTURAS, con fecha 22, 28 de abril, 5, 12, de mayo del 2025.
- Inspección en obra, mediante

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                              |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <p><b>Imagen No. 19, 20 y 21. Equipos y materiales de emergencia</b></p>          |                                                                                    |                                                                                     |
| <p align="center">FUENTE: PROPIA- INFORME CONSORCIO EVOLET- ABRIL 2025</p>        |                                                                                    |                                                                                     |

## 6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025.

*Anexo 13. Informe mensual del periodo del 26 abril al 25 de mayo de 2025 del contratista de obra*

## 7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

En el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de columnas, pantallas y losas de entrepiso N°3(0.00+11.50)

**Resultados de ensayos de resistencia a la compresión losa de entrepiso N°4 (N+15.40), del contratista de obra**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

**INFORME MENSUAL No. 15**

Documento  
Versión 1

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |
| 343     | 1964                   | T39                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 254,2              | 4               | 8171       | 317                  | 4512 | 31,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 112,8         | 20,3              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1965                   | T39                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 248,8              | 4               | 8171       | 311                  | 4417 | 30,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 110,4         | 20,3              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1966                   | T39                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 243,5              | 4               | 8171       | 304                  | 4322 | 29,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 108,0         | 20,3              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1967                   | T40                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 253,4              | 4               | 8171       | 316                  | 4498 | 31,0 | 281                      | 4000 | 27,6 | 112,4         | 17,8              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1968                   | T40                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 252,2              | 4               | 8171       | 315                  | 4477 | 30,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 111,9         | 17,8              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1969                   | T40                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 248,3              | 2               | 8252       | 307                  | 4365 | 30,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 109,1         | 17,8              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1970                   | T41                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 233,6              | 2               | 8171       | 291                  | 4145 | 28,6 | 281                      | 4000 | 27,6 | 103,6         | 20,3              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1971                   | T41                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 226,9              | 3               | 8171       | 283                  | 4027 | 27,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 100,7         | 20,3              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |
| 343     | 1972                   | T41                    | 4                     | 29-abr-25     | 06-may-25    | 7           | 235,4              | 2               | 8252       | 291                  | 4138 | 28,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 103,5         | 20,3              | Entrepiso 4 Vigas<br>Hora de toma: 7:00 am |

Se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para su aceptación.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

**Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas  
entrepiso N°6 (N+15.40, N+19.30), del contratista de obra.**

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ÁREA TAL. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|----------------|--------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                |                                            |
| 358     | 2088                   | T42                    | 4                     | 08-may-25     | 15-may-25    | 7           | 324,6              | 3               | 8413       | 393                  | 5595 | 38,6 | 281                      | 4000 | 27,6 | 139,9         | 62,0           | Pantallas y columnas piso 5 (1)            |
| 358     | 2089                   | T42                    | 4                     | 08-may-25     | 15-may-25    | 7           | 301,9              | 3               | 7854       | 392                  | 5576 | 38,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 139,4         | 62,0           | Pantallas y columnas piso 5 (1)            |
| 358     | 2090                   | T42                    | 4                     | 08-may-25     | 15-may-25    | 7           | 311,4              | 3               | 8171       | 389                  | 5526 | 38,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 138,2         | 62,0           | Pantallas y columnas piso 5 (1)            |
| 358     | 2091                   | T43                    | 4                     | 08-may-25     | 15-may-25    | 7           | 270,8              | 5               | 8091       | 341                  | 4855 | 33,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 121,4         | 60,0           | Pantallas y columnas piso 5 (2)            |
| 358     | 2092                   | T43                    | 4                     | 08-may-25     | 15-may-25    | 7           | 270,1              | 5               | 8091       | 340                  | 4841 | 33,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 121,0         | 60,0           | Pantallas y columnas piso 5 (2)            |
| 358     | 2093                   | T43                    | 4                     | 08-may-25     | 15-may-25    | 7           | 262,9              | 5               | 8012       | 335                  | 4759 | 32,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 119,0         | 60,0           | Pantallas y columnas piso 5 (2)            |

Al realizar un análisis los resultados del contratista de obra, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para aceptación.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

### C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

#### RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

**C.5.6.2.4** — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de  $f'_c$  .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

**C.5.6.3.3** — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a  $f'_c$  .

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que  $f'_c$  por más de 3.5 MPa cuando  $f'_c$  es 35 MPa o menor; o por más de  $0.10f'_c$  cuando  $f'_c$  es mayor a 35 MPa.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

**C.5.6.3.4** — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

**C.5.6.4.4** — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar  $f'_c$ , sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a  $f'_c$  en más de 3.5 MPa.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documento<br/>Versión 1</p>                                                      |

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

#### **C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia**

**C.5.6.5.1** — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que  $f'_c$  por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las apartes .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

*Anexo 14. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

• Resultados resistencia concreto interventoria

| ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA                        | FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD (DÍAS) | CARGA (KN) | ÁREA (mm) | ESFUERZO |      | DESARROLLO (%) | CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-----------|----------|------|----------------|--------|
|                                                              |               |                 |             |            |           | Mpa      | PSI  |                |        |
| VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +7,60 - PISO 3) | 27/02/2025    | 14/05/2025      | 76          | 386,9      | 8251,6    | 46,9     | 6698 | 167,5          | SI     |
|                                                              | 27/02/2025    | 14/05/2025      | 76          | 385,0      | 8251,6    | 46,7     | 6665 | 166,6          | SI     |
| PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +7,60 - PISO 3)                  | 21/03/2025    | 14/05/2025      | 54          | 444,1      | 8091,4    | 54,9     | 7840 | 196,0          | SI     |
|                                                              | 21/03/2025    | 14/05/2025      | 54          | 442,4      | 8011,8    | 55,2     | 7888 | 197,2          | SI     |

| ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA                         | FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD (DÍAS) | CARGA (KN) | ÁREA (mm) | ESFUERZO |      | DESARROLLO (%) | CUMPLE |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-----------|----------|------|----------------|--------|
|                                                               |               |                 |             |            |           | Mpa      | PSI  |                |        |
| VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +11,50 - PISO 4) | 27/03/2025    | 14/05/2025      | 48          | 417,7      | 8171,3    | 51,1     | 7302 | 182,6          | SI     |
|                                                               | 27/03/2025    | 14/05/2025      | 48          | 414,8      | 8091,4    | 51,3     | 7323 | 183,1          | SI     |
|                                                               | 27/03/2025    | 14/05/2025      | 48          | 412,6      | 8011,8    | 51,5     | 7356 | 183,9          | SI     |
| PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +11,50 - PISO 4)                  | 3/04/2025     | 14/05/2025      | 41          | 414,8      | 8171,3    | 50,8     | 7251 | 181,3          | SI     |
|                                                               | 3/04/2025     | 14/04/2025      | 41          | 415,8      | 8171,3    | 50,9     | 7269 | 181,7          | SI     |

*Anexo 15. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA*

**8. CONCLUSIONES**

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de mayo de 2025 del 27.46 % por valor de \$8.917.340.785 frente un avance programado del 27.46%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025 es de 4.12% frente a un avance programado del 4.22%.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

El contratista de obra presentó acta de cobro parcial No 2, por valor de \$1.331.595.292, correspondiente al 4.10% del valor contractual, con corte al 8 de mayo de 2025, para un acumulado de facturación de \$5.444.895.565 equivalente al 16.77% del valor del contrato.

Se toma el 30% del valor del acta \$399.478.588 para amortizar el anticipo del contratista de obra mediante el acta parcial de obra No 2.

El contrato de interventoría, factura en igual porcentaje por lo facturado del contrato de obra, por lo cual el acta parcial No 2 de interventoría es de \$52.503.368, con corte al 8 de mayo de 2025, con un valor acumulado facturado del \$214.686.368 equivalente al 16.77% del valor del contrato, no se realiza amortización ya que no cuenta con anticipo.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, se realizó el suministro e instalación de aceros para el piso 5 N+15.40 al N+19.30 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, suministro e instalación de aceros de vigas y losa de entrepiso 6 N+19.30.

Se suministró e instaló las vigas joist de la losa de entrepiso 6 N+19.30.

Se realizó el suministro e instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, la losa y vigas de entrepiso N+15.40 al N+19.30. Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo en cuenta el procedimiento indicado en el aparte C.5.6. EVALUACION Y ACEPTACION DE CONCRETOS DE LA NSR 10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

Teniendo en cuenta que se presentó una actualización del PMA a la fecha, se tienen algunas actividades pendientes de seguimiento toda vez que es necesario el periodo de transición para implementarlas, entre esas se encuentran las actividades del programa "PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS".

En general, se presencia la necesidad de capacitaciones y organización de lugares de acopio de residuos puesto que se evidencia desorden en algunos puntos ecológicos, acopio e inadecuada separación en los recipientes.

Se observó adecuada separación de residuos peligrosos, implementación de señalética, provisión y acceso de elementos de protección personal.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. Asimismo, ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.

Para el periodo correspondiente al informe se evidencia la realización de simulacro de evacuación con el personal de obra y el consorcio EVOLET, realizado el día 11 /04/2025.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.</b></p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p align="center">Documento<br/>Versión 1</p>                                       |

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP's mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.

Se han acatado todas las observaciones realizadas en informes anteriores respecto del componente ambiental y del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo posible, entre otras cosas, un seguimiento más claro y una medición de cumplimiento mucho más eficiente.

Las actividades pendientes para realizar en el mes de mayo quedaron consolidadas en cada uno de los programas, así como algunas observaciones para mejora en la medición de cumplimiento para informes posteriores.



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                 |                               |    |                   |             |                               |               |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO   |                               |    | SUCURSAL<br>PASTO |             |                               | COD.SUC<br>41 | NO.PÓLIZA<br>41-40-101051477 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |    |                   | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 28 04 2025                      | 22                            | 03 | 2024              | 00:00       | 13 05 2031                    | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4 |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA            |
|                                           | TELÉFONO: 3043935212              |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5 |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                                | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA            |
|                                                                                                | TELÉFONO 8234508                  |
| BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |                                   |

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL   | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024     | 13/05/2031     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024     | 13/05/2031     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024     | 13/05/2031     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |

## ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

| VALOR PRIMA NETA                 | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| \$ ***1,912,847.00               | \$ *****3,000.00  | \$ ****364,011.00 | \$ *****2,279,858.00   | \$ ****1,623,696,428.45 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                    |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                           | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483            | 100.00            |                        |                         |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Isabel Giraldo

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO                 |  |  | SUCURSAL<br>PASTO                           |  |  | COD.SUC<br>41        |  | NO.PÓLIZA<br>41-40-101051477                |  | ANEXO<br>4           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>28 04 2025 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>22 03 2024 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>13 05 2031 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA        |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                           |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |  |                      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |                                   |  | TELÉFONO: 3043935212 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                                                |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                |  |  |  |  |  |                        |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5 |  |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                                |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |  |  | TELÉFONO: 8234508                 |  |
| BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |                                   |  |

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL   | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024     | 13/05/2031     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024     | 13/05/2031     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024     | 13/05/2031     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483B

2



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                 |                               |  |                   |                               |  |               |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO   |                               |  | SUCURSAL<br>PASTO |                               |  | COD.SUC<br>41 | NO.PÓLIZA<br>41-40-101051477 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS       | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 28 04 2025                      | 22 03 2024                    |  | 00:00             | 13 05 2031                    |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4              |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA<br>TELÉFONO: 3043935212 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5          |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                 | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA<br>TELÉFONO 8234508 |
| BENEFICIARIO:                                                                   |                                            |

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

## CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias

**Bancolombia** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189

**Banco de Bogotá** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

|                                        |                                       |                           |                                       |                                                  |                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ ***1,912,847.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****3,000.00 | IVA<br>\$ *****364,011.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****2,279,858.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ ****1,623,696,428.45 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                       |                           | DISTRIBUCION COASEGURO                |                                                  |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                 | % DE PART.                | NOMBRE COMPAÑIA                       | % PART.                                          | VALOR ASEGURADO         |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA       | 225483                                | 100.00                    |                                       |                                                  |                         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

## FORMA DE PAGO

| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
|-----------|------------|-------|
|           |            |       |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |



(415)7709998021167 (8020)11009610188095 (3900)000002279858 (96)20250322

REFERENCIA PAGO:  
1100961018809-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO                 |  |  | SUCURSAL<br>PASTO                           |  |  | COD.SUC<br>41        |  | NO.PÓLIZA<br>41-40-101051477                |  | ANEXO<br>4           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>28 04 2025 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>22 03 2024 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>13 05 2031 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA        |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                           |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |  |                      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |                                   |  | TELÉFONO: 3043935212 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                                                |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                |  |  |  |  |                        |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5 |  |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                                |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |  |  |  | TELÉFONO: 8234508                 |  |
| BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                   |  |

**TEXTO ACLARATORIO**

**PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :**

| NOMBRE                                                 | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO                         | 19289121-3     | 45.00         |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO                           | 10301884-2     | 45.00         |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1    | 10.00         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Isabel Giraldo

DLF225483B

3



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |                               |    |                   |             |                               |               |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO   |                               |    | SUCURSAL<br>PASTO |             |                               | COD.SUC<br>41 | NO.PÓLIZA<br>41-44-101279178 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |    |                   | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 28 04 2025                      | 22                            | 03 | 2024              | 00:00       | 22 11 2030                    | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4 |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA            |
|                                           | TELÉFONO: 3043935212              |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5 |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                                   | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA            |
|                                                                                                   | TELÉFONO 8234508                  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 22/03/2024                           | 13/09/2026     | \$6,494,785,713.80 | \$6,494,785,713.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22/03/2024                           | 13/05/2029     | \$1,623,696,428.45 | \$1,623,696,428.45 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 22/03/2024                           | 13/09/2026     | \$9,742,178,570.70 | \$9,742,178,570.70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$3,247,392,856.90 | \$3,247,392,856.90 |

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

|                                            |                              |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| AMPARO<br>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VIGENCIA DESDE<br>13/05/2026 | VIGENCIA HASTA<br>13/05/2031 | SUMA ASEGURADA<br>\$3,247,392,856.90 |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|

| VALOR PRIMA NETA                 | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| \$ **25,503,155.00               | \$ *****8,000.00  | \$ ***4,847,119.00 | \$ *****30,358,274.00  | \$ ***21,108,053,569.85 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                    |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                           | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483            | 100.00             |                        |                         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Isabel Giraldo

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |                               |  |                   |                               |  |               |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO   |                               |  | SUCURSAL<br>PASTO |                               |  | COD.SUC<br>41 | NO.PÓLIZA<br>41-44-101279178 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS       | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 28 04 2025                      | 22 03 2024                    |  | 00:00             | 22 11 2030                    |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4              |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA<br>TELÉFONO: 3043935212 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5          |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                                   | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA<br>TELÉFONO 8234508 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

## CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias

Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

|                                        |                                       |                           |                                        |                                                  |                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ **25,503,155.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ ***4,847,119.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****30,358,274.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ ***21,108,053,569.85 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                       |                           | DISTRIBUCION COASEGURO                 |                                                  |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                 | % DE PART.                | NOMBRE COMPAÑIA                        | % PART.                                          | VALOR ASEGURADO         |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA       | 225483                                | 100.00                    |                                        |                                                  |                         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

## FORMA DE PAGO

| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
|-----------|------------|-------|
|           |            |       |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |



(415) 7709998021167 (8020) 11009610188088 (3900) 000030358274 (96) 20250322

REFERENCIA  
PAGO:  
1100961018808-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO                 |  |  | SUCURSAL<br>PASTO                           |  |  | COD.SUC<br>41        |  | NO.PÓLIZA<br>41-44-101279178                |  | ANEXO<br>4           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>28 04 2025 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>22 03 2024 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>22 11 2030 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA        |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                           |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |  |                      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO EVOLET |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507-4 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA    |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |                                   |  | TELÉFONO: 3043935212 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                                                   |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.002-5 |  |                   |  |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142                                                                   |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |                                   |  | TELÉFONO: 8234508 |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE                                                 | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO                         | 19289121-3     | 45.00         |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO                           | 10301884-2     | 45.00         |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1    | 10.00         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483B

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**4351957628**

**PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 3**

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA**

COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

DIA MES AÑO  
**28 04 2025**  
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO  
**15 05 2025**  
FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSORCIO INTERSALUD PZ**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: **CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO**

CIUDAD: **POPAYÁN, CAUCA**

TELÉFONO: **3016192419**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E**

IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E**

IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

**AMPAROS**

**GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| DESCRIPCION AMPAROS                           | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTRATO                                      |                |                |                |
| CUMPLIMIENTO                                  | 22/03/2024     | 10/11/2026     | 256,082,406.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 22/03/2024     | 10/05/2029     | 64,020,601.50  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                          | 22/11/2025     | 13/05/2031     | 256,082,406.00 |

BENEFICIARIOS  
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 172 DÍAS, DE ACUERDO A OTRO SI 001 DE FECHA 15/04/2025 AL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS EN ESTE ANEXO CONTINUAN VIEGENTES.

**\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

|                        |                 |                    |                |                 |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA:    | GASTOS EXPEDICION: | IVA:           | TOTAL A PAGAR:  |
| \$ ***576,185,413.50   | \$ *****488,732 | \$****5,000.00     | \$ *****93,809 | \$ *****587,541 |

|                               |       |        |                                  |       |                 |
|-------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|-----------------|
| NOMBRE INTERMEDIARIO          | CLAVE | %PART  | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
| ROCIO SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ | 5932  | 100.00 |                                  |       |                 |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.coww.digitalclient/#login>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

  
**FIRMA ASEGURADOR**

  
(415)7701861000019(8020)00000000007000435195762

  
**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
CADB257A0E08FC7D57

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: [defensoriasolidaria@gmail.com](mailto:defensoriasolidaria@gmail.com)

Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna \* Celular: 310 223 4304 \* Correo electrónico: [martinezjlunaabogados@gmail.com](mailto:martinezjlunaabogados@gmail.com)

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 791 91 80 \* Fax: (601) 791 91 80 \* Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://aseguradorasolidaria.com.co/recursos/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf>

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social            | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                      | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901794710  | 6  | CONSORCIO INTERSALUD PZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO | POPAYAN-CAUCA       | 7777777  | No                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |           |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2025-04 | 2025-04 | 1496002719 | 9486284281 | Y        | 2025/05/06 | 2025/05/21 | BANCOLOMBIA | 15        | \$400,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO            |                |            | NOVEDADES                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD |        |      |     | CCF    |        |      |     | RIESGOS |        |      |     | PARAFISCALES |        |      |     |        |      |             |          |                             |               |     |     |     |          |  |     |     |  |  |             |           |  |  |     |     |  |           |
|---------------------|----------------|------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|--------|------|-----|--------|--------|------|-----|---------|--------|------|-----|--------------|--------|------|-----|--------|------|-------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------|--|-----|-----|--|--|-------------|-----------|--|--|-----|-----|--|-----------|
| No.                 | Identificación |            | Nombre                           | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac     | avp | vct | irl | vip   | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte  | Codigo | Dias | IBC | Aporte       | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC         | Aporte   | Exonerado<br>SENA e<br>ICBF | Total Aportes |     |     |     |          |  |     |     |  |  |             |           |  |  |     |     |  |           |
| 1                   | CC             | 66785383   | ANGULO AGUDELO<br>AIXSA          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        | 0    |     | \$0    | \$0    |      | 0   |         | \$0    | \$0  |     | 0            |        | \$0  | \$0 | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100 | 0                           |               | \$0 | \$0 | No  | \$99,100 |  |     |     |  |  |             |           |  |  |     |     |  |           |
| 2                   | CC             | 10527864   | GUZMAN ENRIQUEZ<br>AUGUSTO       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        | 0    |     | \$0    | \$0    |      | 0   |         | \$0    | \$0  |     | 0            |        | \$0  | \$0 | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100 | 0                           |               | \$0 | \$0 | No  | \$99,100 |  |     |     |  |  |             |           |  |  |     |     |  |           |
| 3                   | CC             | 1061817104 | ORDÓÑEZ CORTES<br>ANGELICA       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        | 0    |     | \$0    | \$0    |      | 0   |         | \$0    | \$0  |     | 0            |        | \$0  | \$0 | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100 | 0                           |               | \$0 | \$0 | No  | \$99,100 |  |     |     |  |  |             |           |  |  |     |     |  |           |
| 4                   | CC             | 76313467   | PERAFAN LEDEZMA<br>JESUS EDINSON |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        | 0    |     | \$0    | \$0    |      | 0   |         | \$0    | \$0  |     | 0            |        | \$0  | \$0 | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100 | 0                           |               | \$0 | \$0 | No  | \$99,100 |  |     |     |  |  |             |           |  |  |     |     |  |           |
| Total Afiliados( 4) |                |            |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        |      | \$0 | \$0    |        |      | \$0 | \$0     |        |      | \$0 | \$0          |        |      | \$0 | \$0    |      |             | \$0      | \$0                         |               |     | \$0 | \$0 |          |  | \$0 | \$0 |  |  | \$5,694,000 | \$396,400 |  |  | \$0 | \$0 |  | \$396,400 |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social            | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                      | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901794710  | 6  | CONSORCIO INTERSALUD PZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO | POPAYAN-CAUCA       | 7777777  | No                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |           |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2025-04 | 2025-04 | 1496002719 | 9486284281 | Y        | 2025/05/06 | 2025/05/21 | BANCOLOMBIA | 15        | \$400,300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$396,400       | \$3,900        | \$0                    | \$400,300     |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 4         | \$396,400       | \$3,900        | \$0                    | \$400,300     |
| TOTAL                    |        |             |    | 4         | \$396,400       | \$3,900        | \$0                    | \$400,300     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                        |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                 | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                        |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 2/05/2025                            | CIPZ-078-0238-2025 | CREVISION PREACTAS DE OBRA N°2 – PAQUETE N°4 DEL 23 DE ABRIL DE 2025 – OBSERVACIÓN PREACTAS EN GENERAL | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 2/05/2025                            | CIPZ-078-0239-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C58-23-368 2025 “REQUERIMIENTOS ELECTRICOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA”              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 3/05/2025                            | CIPZ-078-0240-2025 | REMISION BALANCE DE OBRA N°3 , CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO              |           |            |     |                                                        |
| 5/05/2025                            | CIPZ-078-0241-2025 | RESPUESTA AL OFICIO EV-C358-23-0392-25 – DISEÑOS ELECTRICOS                                            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 5/05/2025                            | CIPZ-078-0242-2025 | REMISION OBSERVACIONES ELECTRICAS OFICIO EV-C358-23-0392-25 CONTRATISTA DE OBRA                        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO              |           |            |     |                                                        |
| 5/05/2025                            | CIPZ-078-0243-2025 | REMISION POLIZAS OTROSI N°1 CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO              |           |            |     |                                                        |
| 7/05/2025                            | CIPZ-078-0244-2025 | OBSERVACIONES INFORME N°14 ABRIL 2025 CONTRATISTA                                                      | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                  |                         |                                                                 |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                           | ORIGEN                  | DESTINO                                                         | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                  |                         |                                                                 | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 6/05/2025                            | CIPZ-078-0245-2025 | REVISION PLANO DE PRODUCCION VIGAS JOIST PISO 5 (NIVEL N+19.30) – OBSERVACION VIGAS DE ENTREPISO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                                         |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                                  | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                                         |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 6/05/2025                            | CIPZ-078-0246-2025 | REVISION DE PREACTA N° 2, PAQUETE N°5 OFICIO EV- C358-23-0390-25 DEL 5 DE MAYO DE 2025.                                 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 7/05/2025                            | CIPZ-078-0247-2025 | SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL – INGENIERO ELECTRICISTA                                                                   | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 7/05/2025                            | CIPZ-078-0248-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 7 DE MAYO 2025 – “ENTREGA DE DISEÑOS DE LA RED DE MEDIA TENSION (MT) PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 7/05/2025                            | CIPZ-078-0249-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 7 MAYO 2025 – “SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS MINIMO DE TRABAJO – COMPONENTE            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 12/05/2025                           | CIPZ-078-0250-2025 | SOLICITUD DE PAGO DEL ACTA INTERVENTORIA, CONTRATO 078 DE 2024                                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 14/05/2025                           | CIPZ-078-0251-2025 | REMISION DE CONTROL DE ASENTAMIENTOS CONTRATO N°358 2023                                                                | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 13/05/2025                           | CIPZ-078-0252-2025 | AVANCE EN EJECUCION DE OBRA                                                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 13/05/2025                           | CIPZ-078-0253-2025 | VISITA TECNICA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                         |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                  | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                         |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 13/05/2025                           | CIPZ-078-0254-2025 | RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0393-25 - OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PARA CAMBIO DE PROFESIONALES. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 13/05/2025                           | CIPZ-078-0255-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0392-25, OBSERVACIONES ELECTRICAS                                           | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 13/05/2025                           | CIPZ-078-0256-2025 | CORRESPONDENCIA CONTRATO N°358 DE 2023                                                                  | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 15/05/2025                           | CIPZ-078-0257-2025 | REMISION POLIZAS OTROSI N°1 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°078 DE 2024                                     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025                           | CIPZ-078-0258-2025 | RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 15 DE MAYO 2025 – “SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES    | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025                           | CIPZ-078-0259-2025 | REQUERIMIENTOS APANTALLAMIENTO DEL EDIFICIO Y RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0345-25                     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025                           | CIPZ-078-0260-2025 | REMISION OFICIO EV-C358-23-0411-25 CONTRATISTA - “SOLICITUD”                                            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025                           | CIPZ-078-0261-2025 | REMISIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO MARZO-ABRIL 2025, CONTRATO N°358 2023                        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                                 |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                          | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                                 |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0262-2025 | REVISION DE PLANO DE FABRICACIÓN VIGAS JOIST ENTREPISOS N°6(N+23.20), N°7(N+27.10), N°8(N+31.00) y N°9(N+34.90) | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0263-2025 | TRAMITES CONEXION RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA.                                                              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0264-2025 | TRAMITES CONEXIÓN RED DE INCENDIOS                                                                              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0266-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°2 DE OBRA- CONTRATO n358 2023                                                            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0267-2025 | ACTA DE MODIFICACION N°001 DEL 14 DE MAYO 2025 – CONTRATO N°358 2023                                            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0268-2025 | SOLICITUD FRENTE A CONSIGNACIÓN ERRÓNEA DE RECURSOS A LA CUENTA FIDUCIARIA                                      | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025                           | CIPZ-078-0269-2025 | SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD COMPONENTE SST                                                         | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                                                                                               |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                                                                                        | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                                                                                               |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 21/05/2025                           | CIPZ-078-0270-2025 | RESPUESTA OFICIO 15 DE MAYO = SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA SOBRE PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR DESCARGAS ELECTRICAS NATURALES Y SOLICITUD DE CONCERTO TÉCNICO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 22/05/2025                           | CIPZ-078-0271-2025 | RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0417-25 – REQUERIMIENTOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DEL EDIFICIO                                                                                | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 22/05/2025                           | CIPZ-078-0272-2025 | RESPUESTA OFICIO 20 DE MAYO – SOLICITUD DE APOYO EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA REINTEGRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR ERROR                                              | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 23/05/2025                           | CIPZ-078-0273-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°2 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023                                                                                   | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 24/05/2025                           | CIPZ-078-0274-2025 | RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0419-25 – SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO                                            | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 26/05/2025                           | CIPZ-078-0275-2025 | REITERACION PROVISIONAL ELECTRICA                                                                                                                                             | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 26/05/2025                           | CIPZ-078-0276-2025 | RESPUESTA EV-C358-23-0405-25, JUSTIFICACION CAMBIO SECCION VIGAS ENTREPISO (N+19.30) BALCONES                                                                                 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                                                                                |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                                                                         | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                                                                                |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 27/05/2025                           | CIPZ-078-277-2025  | SOLICITUD ENTREGA ESTUDIO DE LOS PARAMETROS DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO.                                                                                       | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 26/05/2025                           | CIPZ-078-278-2025  | SOLICITUD DE CIERRE DE VENTANAS CON VISTA DIRECTA A ZONAS ASISTENCIALES – PISO 3 HUSJ                                                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 26/05/2025                           | CIPZ-078-0280-2025 | RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 14 DE MAYO - SOLICITUD DE CONCEPTO CLARO SOBRE OBSERVACIONES DEL COMPONENTE ELECTRICO<br>Y RESPUESTA A CORREO DEL 22 DE MAYO REMISION | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 27/05/2025                           | CIPZ-078-0281-2025 | SOLICITUD REPROGRAMACION COMITÉ DE OBRA                                                                                                                        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 27/05/2025                           | CIPZ-078-0282-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-412-25 – “COBRO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO”                                                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 27/05/2025                           | CIPZ-078-0283-2025 | INSPECCION AMBIENTAL A OBRA - 19 DE MAYO 2025.                                                                                                                 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 27/05/2025                           | CIPZ-078-0284-2025 | REMISION CONCEPTO INFORME BALANCE N°3 DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL 26 DE MAYO 2025                                        | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAZABILIDAD<br>CORRESPONDENCIA ENVIADA | <b>CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024</b><br><br><b>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"</b> |  |
|                                         | <b>CONSORCIO INTERSALUD PZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

MES CORRESPONDIENTE: may-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA |                    |                                                                                                                                      |                         |                                                              |           |            |     |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| FECHA DEL OFICIO                     | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                                               | ORIGEN                  | DESTINO                                                      | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|                                      |                    |                                                                                                                                      |                         |                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 27/05/2025                           | CIPZ-078-0285-2025 | SOLICITUD FRENTE A CONSIGNACIÓN ERRÓNEA DE RECURSOS A LA CUENTA FIDUCIARIA – ACTUALIZACIÓN DEL CASO A 27/05/2025                     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 28/05/2025                           | CIPZ-078-0286-2025 | REMISION INFORMES MENSUALES ABRIL 2025                                                                                               | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ         |           |            |     |                                                        |
| 30/05/2025                           | CIPZ-078-0287-2025 | REVISION INFORME MENSUAL MAYO 2025 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023                                                                     | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |
| 29/05/2025                           | CIPZ-078-0288-2025 | REMISIÓN OFICIO ENTIDAD 29 DE MAYO 2025 “RESPUESTA POSITIVA FRENTE A SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN ERRONEA DE RECURSOS – AUTORIZACIÓN DE | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |           |            |     |                                                        |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                    |                                                               |                                                                                                                |           |            |     |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |                |                                                    |                                                               |                                                                                                                |           |            |     |                                                                                     |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                    |                                                               |                                                                                                                |           |            |     |                                                                                     |
| MES:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | may-25         |                                                    |                                                               |                                                                                                                |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                                                               |                                                                                                                |           |            |     |                                                                                     |
| FECHA DEL OFICIO                         | CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                             | DESTINO                                                       | ASUNTO                                                                                                         | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                                                               |                                                                                                                | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                                                     |
| 2/05/2025                                | EV-C358-23-0386-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reporte personal obra.                                                                                         |           |            |     |                                                                                     |
| 4/05/2025                                | EV-C358-23-0392-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Diseños eléctricos.                                                                                            |           |            |     |                                                                                     |
| 6/05/2025                                | EV-C358-23-0391-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de columnas y pantallas del piso No. 5. |           |            |     |                                                                                     |
| 7/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Entrega diseños de red de media tension (MT) para conexión electrica contrato 358 2023                         |           |            |     |                                                                                     |
| 7/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud de informacion sobre equipo minimos de trabajo - componente electrico                                |           |            |     |                                                                                     |
| 7/05/2025                                | EV-C358-23-0393-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Hojas de vida Ingeniero eléctrico e Ingeniero civil especialista en estructuras.                               |           |            |     |                                                                                     |
| 6/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Convocatoria reunion para estudio y ajustes en el diseño de aire acondicionado contrato 358 2023               |           |            |     |                                                                                     |
| 8/05/2025                                | EV-C358-23-0393-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Control asentaminetos torre para el servicio de consulta externa en construccion                               |           |            |     |                                                                                     |
| 6/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta a observaciones del componente electrico oficio EV-C358-23-392-25                                    |           |            |     |                                                                                     |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              |           |            |     |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |                |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
| MES:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | may-25         |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
| FECHA DEL OFICIO                         | CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                             | DESTINO                                                                     | ASUNTO                                                                                                                       | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                                                                             |                                                                                                                              | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                                                     |
| 8/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ               | Solicitud de estudio actualizado de control de asentamientos de la torre                                                     |           |            |     |                                                                                     |
| 8/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ               | Solicitud de aclaracion en mesa tecnica sobre los diseños utilizados para la ejecuion del contrato de interventoria 078 2024 |           |            |     |                                                                                     |
| 9/05/2025                                | EV-C358-23-0395-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA | Solicitud área parcial de parqueadero para el acopio de materiales.                                                          |           |            |     |                                                                                     |
| 8/05/2025                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/05/2025      | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ               | Aceptacion del cambio de profesional electrico contrato 078 2024                                                             |           |            |     |                                                                                     |
| 9/05/2025                                | EV-C358-23-0396-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                   | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ               | Respuesta oficio CIPZ-078-0249-2025 "SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS MINIMO DE TRABAIO – COMPONENTE                   |           |            |     |                                                                                     |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |           |            |     |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |           |            |     |                                                                                     |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |           |            |     |                                                                                     |
| MES:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | may-25         |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |           |            |     |                                                                                     |
| FECHA DEL OFICIO                         | CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                              | DESTINO                                                       | ASUNTO                                                                                                                              | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                     | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                                                     |
| 9/05/2025                                | EV-C358-23-0399-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Entrega de acta de obra No. 2.                                                                                                      |           |            |     |                                                                                     |
| 9/05/2025                                | EV-C358-23-0397-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-02408-2025 - Red de media tensión (MT) para la conexión eléctrica"                                        |           |            |     |                                                                                     |
| 9/05/2025                                | EV-C358-23-0398-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reporte personal obra.                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
| 9/05/2025                                | EV-C358-23-0400-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/05/2025      | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reporte personal obra.                                                                                                              |           |            |     |                                                                                     |
| 10/05/2025                               | EV-C358-23-0401-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta a los oficios CIPZ-078-0226-2025 y CIPZ-078-0233-2025.                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
| 8/05/2025                                | EV-C358-23-390-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud ajuste de rubros.                                                                                                         |           |            |     |                                                                                     |
| 30/04/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/05/2025     | Universidad autonoma del cauca                      | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | visita obra uniautonoma                                                                                                             |           |            |     |                                                                                     |
| 14/05/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud de concepto claro sobre observaciones del componente electrico en el oficio EV-C358-23-0392-25 hecho por consorcio evolet |           |            |     |                                                                                     |
| 14/05/2025                               | EV-C358-23-0405-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta a oficios con radicado CIPZ-078-0159-2025, CIPZ-078-0163-2025 y CIPZ-078-0245-2025                                        |           |            |     |                                                                                     |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           |           |            |     |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           |           |            |     |                                                                                     |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           |           |            |     |                                                                                     |
| MES:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | may-25         |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           |           |            |     |                                                                                     |
| FECHA DEL OFICIO                         | CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                              | DESTINO                                                       | ASUNTO                                                                                                                                    | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                                           | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                                                     |
| 14/05/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud de polizas requeridas para la legalizacion del otro si N°1 contrato 078 2024                                                    |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | EV-C358-23-0407-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Entrega acta modificacion N°001                                                                                                           |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | EV-C358-23-0408-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Entrega acta de obra N°2                                                                                                                  |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | EV-C358-23-0410-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0244-2025, Observaciones Informe N°14 Abril 2025.                                                        |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | EV-C358-23-0409-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0255-2025                                                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | EV-C358-23-0411-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud.                                                                                                                                |           |            |     |                                                                                     |
| 12/05/2025                               | EV-C358-23-0404-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio con radicado CIPZ-078-01-2025 - Radicado el 21 de marzo de 2025                                                          |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud de concepto tecnico sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) e informe de cumplimiento por parte del consorcio |           |            |     |                                                                                     |
| 15/05/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud de certificacion de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales consorcio intersalud pz             |           |            |     |                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |



|      |        |
|------|--------|
| MES: | may-25 |
|------|--------|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO        | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                              | DESTINO                                                       | ASUNTO                                                                                                          | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
|                  |                    |                |                                                     |                                                               |                                                                                                                 | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 15/05/2025       | n.a                | 15/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud de requerimiento al contratista sobre plan de mitigacion de riesgo por descargas electricas naturales |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025       | n.a                | 16/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud informe de interventoria - abril 2025                                                                 |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025       | n.a                | 16/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | solicitud de informe de rendimientos financieros del anticipo abril 2025                                        |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025       | EV-C358-23-411-25  | 16/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-0254-2025 – Observaciones sobre cambio de profesionales                               |           |            |     |                                                        |
| 16/05/2025       | EV-C358-23-412-25  | 16/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Cobro plan de manejo ambiental del proyecto                                                                     |           |            |     |                                                        |
| 17/05/2025       | EV-C358-23-0413-25 | 17/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0245-2025                                                                          |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | EV-C358-23-414-25  | 19/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión soporte de consignación de rendimientos financieros correspondientes al mes de marzo y abril 2025.     |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | n.a                | 19/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Convocatoria mesa tecnica - revision diseños                                                                    |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | EV-C358-23-415-25  | 19/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                    | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Estado del balance de obra del contrato No. 358 de diciembre de 2023                                            |           |            |     |                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |



|      |        |
|------|--------|
| MES: | may-25 |
|------|--------|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO        | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                                    | DESTINO                                                                | ASUNTO                                                                                     | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
|                  |                    |                |                                                           |                                                                        |                                                                                            | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                        |
| 19/05/2025       | EV-C358-23-0416-25 | 19/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Remisión de informe No. 6 de fiducia.                                                      |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | EV-C358-23-0417-25 | 19/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta a Oficio CIPZ-078-0259-2025.                                                     |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | EV-C358-23-0418-25 | 19/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Reporte personal obra.                                                                     |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | EV-C358-23-0419-25 | 19/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Solicitud de Reprogramación de Actividades - Instalaciones Eléctricas y Aire Acondicionado |           |            |     |                                                        |
| 19/05/2025       | N.A                | 19/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Acta no contiene aspectos debatidos en esa sesión                                          |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025       | EV-C358-23-0421-25 | 20/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Respuesta a Oficio CIPZ-078-0262-2025.                                                     |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025       | EV-C358-23-0420-25 | 20/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | ACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS MOVILES                                                      |           |            |     |                                                        |
| 20/05/2025       | n.a                | 20/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD<br>PZ | Oficio recepción de pago ACTA 1 en fiducia                                                 |           |            |     |                                                        |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |     |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |                |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
|                                          | CONSORCIO INTERSALUD PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
| MES:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | may-25         |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |     |                                                                                     |
| FECHA DEL OFICIO                         | CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA RECIBIDO | ORIGEN                                                    | DESTINO                                                                                                       | ASUNTO                                                                                             | ESTADO    |            |     | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                    | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A |                                                                                     |
| 20/05/2025                               | EV-C358-23-0422-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | JUAN FRACISCO MORA<br>SUBGERENTE COPIA<br>MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta CIPZ-078-01-2025                                                                         |           |            |     |                                                                                     |
| 20/05/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20/05/2025     | JUAN FRANCISCO MORA -<br>SUBGERENTE ADMTO Y<br>FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ                                           | Solicitud de apoyo en el proceso de autorizacion para reintegro de recursos transferidos por error |           |            |     |                                                                                     |
| 21/05/2025                               | EV-C358-23-0423-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ                                           | Remisión de informe mensual del 25 de marzo a 25 de abril del 2025.                                |           |            |     |                                                                                     |
| 21/05/2025                               | EV-C358-23-0424-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ                                           | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0264-2025                                                             |           |            |     |                                                                                     |
| 21/05/2025                               | EV-C358-23-425-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ                                           | RESPUESTA AL OFICIO CIPZ-078-0263-2025                                                             |           |            |     |                                                                                     |
| 22/05/2025                               | EV-C358-23-0426-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ                                           | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de losa de entrepiso No. 5. |           |            |     |                                                                                     |
| 22/05/2025                               | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22/05/2025     | CONSORCIO EVOLET                                          | MICHELLE VANNESSA<br>PROAÑO INTERVENTORA<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ                                           | Autorización para Reintegro de Recursos                                                            |           |            |     |                                                                                     |

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Actuando única y exclusivamente como vocera de  
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE  
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #759985 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP\_628139 del 14/05/2025 09:08:07, presenta la siguiente línea de pago:

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nro. Operación:         | 16                             |
| Cuenta/Encargo Destino: | BANCOLOMBIA - CC - 86837651208 |
| Nro. Doc. Tercero:      | 891502316                      |
| Nombre Tercero:         | CVS EQUIPAR Y CIA S EN C       |
| Estado Giro:            | PG - Pagado                    |
| Valor Giro:             | \$29,741,279.00                |
| Observaciones:          | OP_628139-                     |

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 16/05/2025 09:00:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA  
NIT 830053812-2

NUMERO : 16

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

|                                 |               |                                |            |                      |            |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal : | 14/05/2025    | Fecha de Registro de la Orden: | 14/05/2025 | Fecha de Pago:       | 14/05/2025 |
| Proveedor:                      | 891502316 - 1 | CVS EQUIPAR Y CIA S EN C       | Teléfono:  |                      |            |
| Tipo de Retención:              | Regimen Común |                                |            | Actividad Económica: |            |

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L\_001-ALQUILER MAQUINARIA-19394181

### Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---------|--------|-------|-------|
|---------|--------|-------|-------|

### Valores Liquidados

| Valor Bruto   | Descuentos | Reintegro | Valor Neto    |
|---------------|------------|-----------|---------------|
| 29,741,279.00 | 0.00       | 0         | 29,741,279.00 |

### Conceptos de Liquidación

| Descripción                                | Clase            | Porcentaje | Bases         | Descuentos | Reintegros    |
|--------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS | OTROS DESCUENTOS |            | 29,741,279.00 | 0.00       | 0.00          |
| Totales                                    |                  |            | 29,741,279.00 | 0.00       | 0.00          |
| Valor a Girar:                             |                  |            |               |            | 29,741,279.00 |

### Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 16 Periodo: 202505

| Mayor       | Descripción                     | Area | Ceco | Nit           | Descripción              | Débito        | Crédito       |
|-------------|---------------------------------|------|------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 35050502003 | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS |      |      | 891502316 - 1 | CVS EQUIPAR Y CIA S EN C | 29,741,279.00 |               |
| 25110501001 | PROVEEDORES                     |      |      | 891502316 - 1 | CVS EQUIPAR Y CIA S EN C |               | 29,741,279.00 |
|             |                                 |      |      |               |                          | 29,741,279.00 | 29,741,279.00 |

### Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 16

| Area                      | IMPUTACION PRESUPUESTAL |      |     |      |     |     |      |     | Descripción | No Res              | Vlr. Res      | Vlr Giro       |
|---------------------------|-------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-------------|---------------------|---------------|----------------|
|                           | Tpo                     | Clas | Cta | SCta | Obj | Ord | SOrd | Aux | Recu        |                     |               |                |
| 977001-GENERICO ANTICIPOS | 4                       | 0    | 503 |      |     |     |      |     | 21          | ALQUILER DE EQUIPOS | 29,741,279.00 | -29,741,279.00 |
| TOTALES                   |                         |      |     |      |     |     |      |     |             |                     | 29,741,279.00 | -29,741,279.00 |

|                                                                                      |                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Autorizado por<br><br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br><br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Actuando única y exclusivamente como vocera de  
FI CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS U SAN JOSE  
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #766793 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP\_632602 del 23/05/2025 17:09:07, presenta la siguiente línea de pago:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nro. Operación:         | 19                                    |
| Cuenta/Encargo Destino: | BBVA COLOMBIA - CC - 0721000100023885 |
| Nro. Doc. Tercero:      | 901246498                             |
| Nombre Tercero:         | SILOGISTICA SAS                       |
| Estado Giro:            | PG - Pagado                           |
| Valor Giro:             | \$21,600.00                           |
| Observaciones:          | OP_632602-                            |

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 05/06/2025 11:44:37.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA  
NIT 830053812-2



**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91**  
Nit: 830053812  
**NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233**  
**120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE**  
**ORDEN DE PAGO**

Página: 1 de 1

NUMERO : 19  
NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                 |               |                                |            |                      |            |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal : | 23/05/2025    | Fecha de Registro de la Orden: | 23/05/2025 | Fecha de Pago:       | 26/05/2025 |
| Proveedor:                      | 901246498 - 9 | SILOGISTICA SAS                |            | Teléfono:            |            |
| Tipo de Retención:              | Regimen Común |                                |            | Actividad Económica: |            |

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS  
Concepto: L\_001-TRANSPORTE-19506629

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---------|--------|-------|-------|
|---------|--------|-------|-------|

**Valores Liquidados**

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 21,600.00   | 0.00       | 0         | 21,600.00  |

**Conceptos de Liquidación**

| Descripción                                | Clase            | Porcentaje | Bases     | Descuentos | Reintegros |
|--------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|
| DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS | OTROS DESCUENTOS |            | 21,600.00 | 0.00       | 0.00       |
| Totales                                    |                  |            | 21,600.00 | 0.00       | 0.00       |
| Valor a Girar:                             |                  |            |           |            | 21,600.00  |

**Codificación Contable**

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 19 Periodo: 202505

| Mayor       | Descripción                     | Area | Ceco | Nit           | Descripción     | Débito    | Crédito   |
|-------------|---------------------------------|------|------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 25110501001 | PROVEEDORES                     |      |      | 901246498 - 9 | SILOGISTICA SAS |           | 21,600.00 |
| 35050502003 | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS |      |      | 901246498 - 9 | SILOGISTICA SAS | 21,600.00 |           |
|             |                                 |      |      |               |                 | 21,600.00 | 21,600.00 |

**Detalle Presupuestal**

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 19

| Area                      | IMPUTACION PRESUPUESTAL |      |     |   |     |     |     |   |     |     |      | Descripción | No Res  | Vlr. Res  | Vlr Giro   |
|---------------------------|-------------------------|------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|-------------|---------|-----------|------------|
|                           | Tpo                     | Clas | Cta | S | Cta | Obj | Ord | S | Ord | Aux | Recu |             |         |           |            |
| 977001-GENERICO ANTICIPOS | 4                       | 0    | 301 |   |     |     |     |   |     |     | 21   | TRANSPORTE  |         | 21,600.00 | -21,600.00 |
|                           |                         |      |     |   |     |     |     |   |     |     |      |             | TOTALES | 21,600.00 | -21,600.00 |

|                                                                                      |                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Autorizado por<br><br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br><br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Actuando única y exclusivamente como vocera de  
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSUMOS U SAN JOSE  
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #766786 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP\_632601 del 23/05/2025 17:08:18, presenta las siguientes líneas de pago:

| Nro. Operación | Cuenta/Encargo Destino         | Nro. Doc. Tercero | Nombre Tercero                    | Estado Giro | Observaciones | Valor Giro  |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 18             | BANCOLOMBIA - CC - 26121191085 | 900648234         | CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS | PG - Pagado | OP_632601-    | \$34,228.00 |

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 05/06/2025 11:43:30.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA  
NIT 830053812-2

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Actuando única y exclusivamente como vocera de  
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE  
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #766786 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP\_632601 del 23/05/2025 17:08:18, presenta la siguiente línea de pago:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Nro. Operación:         | 18                                |
| Cuenta/Encargo Destino: | BANCOLOMBIA - CC - 26121191085    |
| Nro. Doc. Tercero:      | 900648234                         |
| Nombre Tercero:         | CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS |
| Estado Giro:            | PG - Pagado                       |
| Valor Giro:             | \$34,228.00                       |
| Observaciones:          | OP_632601-                        |

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 05/06/2025 11:44:21.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA  
NIT 830053812-2

NUMERO : 18

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

|                                 |               |                                   |                      |                |            |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Fecha Compromiso Presupuestal : | 23/05/2025    | Fecha de Registro de la Orden:    | 23/05/2025           | Fecha de Pago: | 26/05/2025 |
| Proveedor:                      | 900648234 - 3 | CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS | Teléfono:            |                |            |
| Tipo de Retención:              | Regimen Común |                                   | Actividad Económica: |                |            |

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L\_001-SALDOMATERIALES-19506578

### Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---------|--------|-------|-------|
|---------|--------|-------|-------|

### Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 34,228.00   | 0.00       | 0         | 34,228.00  |

### Conceptos de Liquidación

| Descripción                                | Clase            | Porcentaje | Bases     | Descuentos | Reintegros |
|--------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|
| DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS | OTROS DESCUENTOS |            | 34,228.00 | 0.00       | 0.00       |
| Totales                                    |                  |            | 34,228.00 | 0.00       | 0.00       |
| Valor a Girar:                             |                  |            |           |            | 34,228.00  |

### Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 18 Periodo: 202505

| Mayor       | Descripción                     | Area | Ceco | Nit           | Descripción                       | Débito    | Crédito   |
|-------------|---------------------------------|------|------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 35050502003 | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS |      |      | 900648234 - 3 | CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS | 34,228.00 |           |
| 25110501001 | PROVEEDORES                     |      |      | 900648234 - 3 | CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS |           | 34,228.00 |
|             |                                 |      |      |               |                                   | 34,228.00 | 34,228.00 |

### Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 18

| Area                      | IMPUTACION PRESUPUESTAL |      |     |      |     |     |      |     |      | Descripción | No Res | Vlr. Res  | Vlr Giro   |            |
|---------------------------|-------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-------------|--------|-----------|------------|------------|
|                           | Tpo                     | Clas | Cta | SCta | Obg | Ord | SOrd | Aux | Recu |             |        |           |            |            |
| 977001-GENERICO ANTICIPOS | 4                       | 0    | 101 |      |     |     |      |     | 21   | MATERIALES  |        | 34,228.00 | -34,228.00 |            |
| TOTALES                   |                         |      |     |      |     |     |      |     |      |             |        |           | 34,228.00  | -34,228.00 |

|                                                                                  |                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Autorizado por<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Dependencia<br>NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202 | Elaborado por |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Actuando única y exclusivamente como vocera de  
FI CONSTRUCC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE  
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #766796 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP\_632603 del 23/05/2025 17:10:07, presenta la siguiente línea de pago:

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nro. Operación:         | 20                               |
| Cuenta/Encargo Destino: | BANCO DE BOGOTA - CC - 520702598 |
| Nro. Doc. Tercero:      | 901303016                        |
| Nombre Tercero:         | HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL |
| Estado Giro:            | PG - Pagado                      |
| Valor Giro:             | \$1.00                           |
| Observaciones:          | OP_632603-                       |

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 05/06/2025 11:44:57.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA  
NIT 830053812-2



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A  
**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA     | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |             |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |             |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------|------|--------------------------|-------------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |                  |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI         | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI         | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 309     | 1784                   | T38                    | 4                     | 12-abr-25     | <u>21-abr-25</u> | 9           | 336,9              | 1               | 7933       | 433                  | <b>6160</b> | 42,5 | 281                      | <b>4000</b> | 27,6 | 154,0         | 55,0              | PW1 7 8 10 PISO 4                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"                                                                         |
| 309     | 1785                   | T38                    | 4                     | 12-abr-25     | <u>21-abr-25</u> | 9           | 349,7              | 1               | 8091       | 441                  | <b>6269</b> | 43,2 | 281                      | <b>4000</b> | 27,6 | 156,7         | 55,0              | PW1 7 8 10 PISO 4                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"                                                                         |
| 309     | 1786                   | T38                    | 4                     | 12-abr-25     | <u>21-abr-25</u> | 9           | 374,4              | 3               | 8091       | 472                  | <b>6711</b> | 46,3 | 281                      | <b>4000</b> | 27,6 | 167,8         | 55,0              | PW1 7 8 10 PISO 4                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2". La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1784 y 1785 |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A.  
**INTERVENTORÍA:** N.A.

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA  | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                                        |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |               |                                             |                           |                                                                                                                                                      |
| 298     | 1673                   | T37                    | 4                     | 03-abr-25     | 11-abr-25    | 8           | 339,5              | 4               | 8252       | 420                  | 5968 | 41,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 149,2         | 65,0          | C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6, 9 PISO 4 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                         |
| 298     | 1674                   | T37                    | 4                     | 03-abr-25     | 11-abr-25    | 8           | 306,3              | 3               | 8332       | 375                  | 5332 | 36,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 133,3         | 65,0          | C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6, 9 PISO 4 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1673 y 1675 |
| 298     | 1675                   | T37                    | 4                     | 03-abr-25     | 11-abr-25    | 8           | 345,3              | 3               | 8252       | 427                  | 6069 | 41,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 151,7         | 65,0          | C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6, 9 PISO 4 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                         |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                                                                                                                                         |
| 274     | 1571                   | T34                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 224,4              | 3               | 8171       | 280                  | 3983 | 27,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 99,6          | 20,3              | Entrepiso 3 fibra                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras, La muestra 1571, presenta dispersión con respecto a las muestras 1572 y 1573 |
| 274     | 1572                   | T34                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 274,9              | 1               | 8413       | 333                  | 4739 | 32,7 | 281                      | 4000 | 27,6 | 118,5         | 20,3              | Entrepiso 3 fibra                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras                                                                               |
| 274     | 1573                   | T34                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 285,1              | 3               | 8332       | 349                  | 4962 | 34,2 | 281                      | 4000 | 27,6 | 124,0         | 20,3              | Entrepiso 3 fibra                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras                                                                               |
| 274     | 1574                   | T35                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 289,6              | 4               | 8171       | 361                  | 5139 | 35,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 128,5         | 19,1              | Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1575                   | T35                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 286,5              | 5               | 8171       | 358                  | 5085 | 35,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 127,1         | 19,1              | Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1576                   | T35                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 307,0              | 3               | 8171       | 383                  | 5450 | 37,6 | 281                      | 4000 | 27,6 | 136,2         | 19,1              | Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras, La muestra 1576, presenta dispersión con respecto a las muestras 1574 y 1575 |
| 274     | 1577                   | T36                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 294,7              | 4               | 8091       | 371                  | 5282 | 36,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 132,1         | 20,3              | Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1578                   | T36                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 293,6              | 3               | 8171       | 366                  | 5211 | 35,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 130,3         | 20,3              | Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1579                   | T36                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 272,0              | 4               | 8332       | 333                  | 4734 | 32,6 | 281                      | 4000 | 27,6 | 118,4         | 20,3              | Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras, La muestra 1579, presenta dispersión con respecto a las muestras 1577 y 1578 |

REVISÓ  
*Karen Sofía Mosquera G.*  
**KAREN SOFÍA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 19516000791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                             |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                                                                                           |
| 256     | 1474                   | T33                    | 4                     | 21-mar-25     | 29-mar-25    | 8           | 302,7              | 5               | 8171       | 378                  | 5372 | 37,0 | 281                      | 4000 | 27,6 | 134,3         | N.S               | C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3                    | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                              |
| 256     | 1475                   | T33                    | 4                     | 21-mar-25     | 29-mar-25    | 8           | 315,6              | 3               | 8332       | 386                  | 5493 | 37,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 137,3         | N.S               | C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3                    | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                              |
| 256     | 1476                   | T33                    | 4                     | 21-mar-25     | 29-mar-25    | 8           | 290,1              | 4               | 8171       | 362                  | 5149 | 35,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 128,7         | N.S               | C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3                    | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Presenta dispersión con respecto a las muestras 1474 y 1475 |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A.  
**INTERVENTORÍA:** N.A.

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                              |
| 223     | 1154                   | T32                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 275,6              | 3               | 8171       | 344                  | 4891 | 33,7 | 281                      | 4000 | 27,6 | 122,3         | N.S               | PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R                 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1155                   | T32                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 282,4              | 3               | 8252       | 349                  | 4963 | 34,2 | 281                      | 4000 | 27,6 | 124,1         | N.S               | PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R                 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1156                   | T32                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 301,0              | 4               | 8495       | 361                  | 5138 | 35,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 128,5         | N.S               | PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R                 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1157                   | T31                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 323,2              | 5               | 8332       | 396                  | 5626 | 38,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 140,7         | N.S               | PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3                | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1158                   | T31                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 304,5              | 4               | 8171       | 380                  | 5404 | 37,3 | 281                      | 4000 | 27,6 | 135,1         | N.S               | PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3                | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1159                   | T31                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 309,6              | 3               | 8171       | 386                  | 5496 | 37,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 137,4         | N.S               | PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3                | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A  
**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                        |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                              |
| 204     | 1067                   | T25                    | 4                      | 10-feb-25     | 11-mar-25    | 29          | 311,9              | 3               | 8171       | 389                  | 5537 | 38,2 | 281                      | 4000 | 27,6 | 138,4         | 63,0              | C10 - PW1 9 10 PISO 2                      | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera Gomez*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A  
**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA     | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |             |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |             |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------|------|--------------------------|-------------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |                  |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI         | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI         | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 309     | 1784                   | T38                    | 4                     | 12-abr-25     | <u>21-abr-25</u> | 9           | 336,9              | 1               | 7933       | 433                  | <b>6160</b> | 42,5 | 281                      | <b>4000</b> | 27,6 | 154,0         | 55,0              | PW1 7 8 10 PISO 4                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"                                                                         |
| 309     | 1785                   | T38                    | 4                     | 12-abr-25     | <u>21-abr-25</u> | 9           | 349,7              | 1               | 8091       | 441                  | <b>6269</b> | 43,2 | 281                      | <b>4000</b> | 27,6 | 156,7         | 55,0              | PW1 7 8 10 PISO 4                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"                                                                         |
| 309     | 1786                   | T38                    | 4                     | 12-abr-25     | <u>21-abr-25</u> | 9           | 374,4              | 3               | 8091       | 472                  | <b>6711</b> | 46,3 | 281                      | <b>4000</b> | 27,6 | 167,8         | 55,0              | PW1 7 8 10 PISO 4                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2". La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1784 y 1785 |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

FGLR-67  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A.  
**INTERVENTORÍA:** N.A.

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA  | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                                        |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |               |                                             |                           |                                                                                                                                                      |
| 298     | 1673                   | T37                    | 4                     | 03-abr-25     | 11-abr-25    | 8           | 339,5              | 4               | 8252       | 420                  | 5968 | 41,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 149,2         | 65,0          | C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6, 9 PISO 4 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                         |
| 298     | 1674                   | T37                    | 4                     | 03-abr-25     | 11-abr-25    | 8           | 306,3              | 3               | 8332       | 375                  | 5332 | 36,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 133,3         | 65,0          | C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6, 9 PISO 4 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1673 y 1675 |
| 298     | 1675                   | T37                    | 4                     | 03-abr-25     | 11-abr-25    | 8           | 345,3              | 3               | 8252       | 427                  | 6069 | 41,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 151,7         | 65,0          | C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6, 9 PISO 4 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                         |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                                                                                                                                         |
| 274     | 1571                   | T34                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 224,4              | 3               | 8171       | 280                  | 3983 | 27,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 99,6          | 20,3              | Entrepiso 3 fibra                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras, La muestra 1571, presenta dispersión con respecto a las muestras 1572 y 1573 |
| 274     | 1572                   | T34                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 274,9              | 1               | 8413       | 333                  | 4739 | 32,7 | 281                      | 4000 | 27,6 | 118,5         | 20,3              | Entrepiso 3 fibra                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras                                                                               |
| 274     | 1573                   | T34                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 285,1              | 3               | 8332       | 349                  | 4962 | 34,2 | 281                      | 4000 | 27,6 | 124,0         | 20,3              | Entrepiso 3 fibra                          | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras                                                                               |
| 274     | 1574                   | T35                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 289,6              | 4               | 8171       | 361                  | 5139 | 35,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 128,5         | 19,1              | Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1575                   | T35                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 286,5              | 5               | 8171       | 358                  | 5085 | 35,1 | 281                      | 4000 | 27,6 | 127,1         | 19,1              | Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1576                   | T35                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 307,0              | 3               | 8171       | 383                  | 5450 | 37,6 | 281                      | 4000 | 27,6 | 136,2         | 19,1              | Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras, La muestra 1576, presenta dispersión con respecto a las muestras 1574 y 1575 |
| 274     | 1577                   | T36                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 294,7              | 4               | 8091       | 371                  | 5282 | 36,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 132,1         | 20,3              | Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1578                   | T36                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 293,6              | 3               | 8171       | 366                  | 5211 | 35,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 130,3         | 20,3              | Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                                                                            |
| 274     | 1579                   | T36                    | 4                     | 27-mar-25     | 03-abr-25    | 7           | 272,0              | 4               | 8332       | 333                  | 4734 | 32,6 | 281                      | 4000 | 27,6 | 118,4         | 20,3              | Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas               | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibras, La muestra 1579, presenta dispersión con respecto a las muestras 1577 y 1578 |

REVISÓ  
*Karen Sofía Mosquera G.*  
**KAREN SOFÍA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 19516000791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                                                                             |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                                                                                           |
| 256     | 1474                   | T33                    | 4                     | 21-mar-25     | 29-mar-25    | 8           | 302,7              | 5               | 8171       | 378                  | 5372 | 37,0 | 281                      | 4000 | 27,6 | 134,3         | N.S               | C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3                    | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                              |
| 256     | 1475                   | T33                    | 4                     | 21-mar-25     | 29-mar-25    | 8           | 315,6              | 3               | 8332       | 386                  | 5493 | 37,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 137,3         | N.S               | C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3                    | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente                                                              |
| 256     | 1476                   | T33                    | 4                     | 21-mar-25     | 29-mar-25    | 8           | 290,1              | 4               | 8171       | 362                  | 5149 | 35,5 | 281                      | 4000 | 27,6 | 128,7         | N.S               | C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3                    | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Presenta dispersión con respecto a las muestras 1474 y 1475 |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A  
**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (N) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                       |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                              |
| 223     | 1154                   | T32                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 275,6              | 3               | 8171       | 344                  | 4891 | 33,7 | 281                      | 4000 | 27,6 | 122,3         | N.S               | PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R                 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1155                   | T32                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 282,4              | 3               | 8252       | 349                  | 4963 | 34,2 | 281                      | 4000 | 27,6 | 124,1         | N.S               | PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R                 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1156                   | T32                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 301,0              | 4               | 8495       | 361                  | 5138 | 35,4 | 281                      | 4000 | 27,6 | 128,5         | N.S               | PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R                 | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1157                   | T31                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 323,2              | 5               | 8332       | 396                  | 5626 | 38,8 | 281                      | 4000 | 27,6 | 140,7         | N.S               | PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3                | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1158                   | T31                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 304,5              | 4               | 8171       | 380                  | 5404 | 37,3 | 281                      | 4000 | 27,6 | 135,1         | N.S               | PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3                | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 223     | 1159                   | T31                    | 4                     | 08-mar-25     | 15-mar-25    | 7           | 309,6              | 3               | 8171       | 386                  | 5496 | 37,9 | 281                      | 4000 | 27,6 | 137,4         | N.S               | PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3                | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera G.*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO**  
**NTC 673**

**FGLR-67**  
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet  
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José  
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca  
**CONTRATISTA:** N.A  
**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA |      |      | RESISTENCIA ESPECIFICADA |      |      | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAMIENTO (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES                                                                |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|------|------|--------------------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                        |                        |               |              |             |                    |                 |            | Kg/cm²               | PSI  | Mpa  | Kg/cm²                   | PSI  | Mpa  |               |                   |                                            |                           |                                                                              |
| 204     | 1067                   | T25                    | 4                      | 10-feb-25     | 11-mar-25    | 29          | 311,9              | 3               | 8171       | 389                  | 5537 | 38,2 | 281                      | 4000 | 27,6 | 138,4         | 63,0              | C10 - PW1 9 10 PISO 2                      | Premezclado Geoacopio     | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ  
*Karen Sofia Mosquera Gomez*  
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**  
GEOTECNÓLOGO  
M.P. # 1951600791 CAU

APROBÓ  
*Fernando Muñoz Fuentes*  
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**  
GERENTE TÉCNICO  
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO  
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

