

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte				
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023					
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023					
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00				\$	-
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial	VEINTE (20) MESES					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES					
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses veintitún (21) días.					

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Informe N°	16	Periodo comprendido entre el	25 de mayo de 2025	y el	25 de junio de 2025
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA		
Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPOPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.			Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPOPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato N°:	358 DE 2023			Contrato N°:	078 DE 2024
Contratista:	CONSORCIO EVOLET			Contratista:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
Plazo Inicial:	VEINTE MESES			Plazo Inicial:	VEINTE MESES
Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024			Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024
Fecha de terminación:	13 de mayo de 2025			Nueva fecha de terminación:	13 de mayo de 2026
Valor Inicial:	\$ 32.473.928.569,00			Valor Inicial:	\$ 1.280.412.030,00
Valor Anticipo:	(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).			Valor Anticipo:	No tiene anticipo
Forma de Pago	El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.			Forma de Pago	El Hospital Universitario San José pagará el interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aprobada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado: ANTICIPO	\$ 9.742.178.571,00			Valor pagado:	
Nombre del Supervisor	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO			Nombre Interventor:	CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPS, LEGAL MICHELLE PROAÑO

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Anticipo del 30%	25/10/2024	\$ 9.742.178.571.00			Anticipo		No tiene anticipo		
Acta Parcial No. 1	15/05/2025	\$ 4.113.300.273.00	\$ 2.879.310.191.00		Acta Parcial No. 1		\$ 162.183.000.00		
Acta Parcial No. 2	23/05/2025	\$ 1.331.595.292.00	\$ 932.116.704.00		Acta Parcial No. 2		\$ 52.503.368.00		
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
		\$ -	\$ -						
TOTAL PAGADO OBRA		\$ 13.553.605.466.00	\$ 3.811.426.895.00		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ 214.686.368.00		
SALDO POR EJECUTAR		\$ 18.920.323.103.00	\$ 18.920.323.103.00		SALDO POR EJECUTAR		\$ 1.065.725.662.00		

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	35.56%	4.20%	30.76%	% Programado	\$ 0.00	\$ 0.00	40.79%
% Ejecutado	26.74%	4.02%	30.76%	% Ejecutado	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
Diferencia	0.18%	-0.18%	0.00%	Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00	-40.79%

ENERO	70.431.445,28	4/03/2024
FEBRERO	203.993.673,19	19/03/2024
MARZO	208.633.571,44	24/04/2024
ABRIL	202.093.483,45	24/05/2024
MAYO	208.790.623,36	19/06/2024
JUNIO	201.885.740,41	25/07/2024
JULIO	208.826.681,81	15/08/2024
AGOSTO	184.554.631,58	13/09/2024
SEPTIEMBRE	175.042.999,95	28/10/2024
OCTUBRE	136.309.883,96	20/11/2024
NOVIEMBRE	104.670.805,05	27/12/2024
DICIEMBRE	109.613.127,45	29/01/2025
ENERO 2025	105.664.801,55	25/02/2025
FEBRERO 2025	90.759.981,61	26/03/2025
MARZO 2025	100.318.299,23	23/04/2025
ABRIL 2025	97.074.375,99	23/05/2025
MAYO 2025	91.642.086,28	25/06/2025

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

8. REGISTRO FOTOGRAFICO




1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	16
Fecha	25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00				\$ -
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial	VEINTE (20) MESES				
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses veintún (21) días.				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

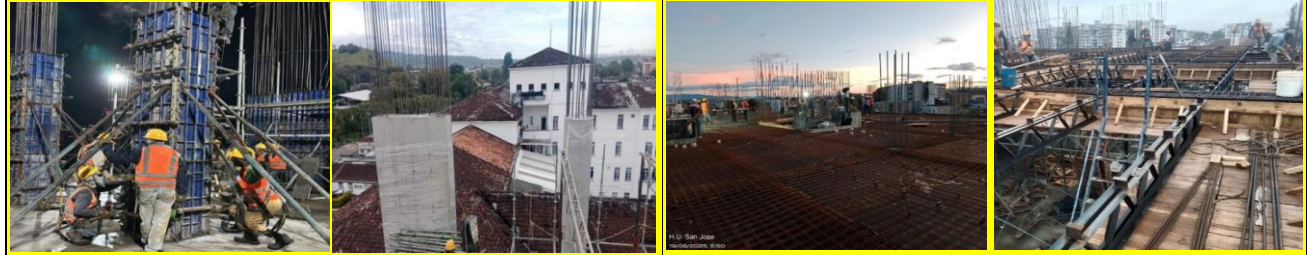

Fundición pantallas y columnas N +19.30 a N +23.20

Armado de acero vigas y losa de entrepiso 7 N +23.20- Instalacion de vigas joists



Fundición losa entrepiso N+23.20

Instalacion de acero escaleras principales y emergencia



Instalacion redes hidrosanitarias

Instalacion red contraincendio nivel 1



Mampostería nivel 3

Excavacion y relleno anden perimetral

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideran importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideran importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA						
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO						
RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023						
Informe No.	16					
Fecha	25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025					
Departamento	CAUCA					
Municipio	POPAYAN					
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.					
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"					
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023					
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023					
COFINANCIACION	MSPS					
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	-
Fecha de giro proyecto Inicial						
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES					
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses veintún (21) días.					
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias						
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia	Nombre: Juan Francisco Mora Obando		Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero		Fecha de Elaboración:	25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervision	Cargo: Supervisor		Cargo: Contratista MSPS		Pag. 1	
