



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18 – JULIO 26 – AGOSTO 25 DE 2025	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 18 (PERIODO JULIO 26 - AGOSTO 25 DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 18
CONSORCIO INTERSALUD PZ

	
Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M. Representante legal Consortio Intersalud PZ

AGOSTO 25 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	7
2.1. Localización.....	8
2.2. Justificación.....	9
2.3. Características del Proyecto.....	10
3.1. Contrato de Obra.....	11
3.2. Póliza del Contrato de Obra.	12
3.3. Contrato de Interventoría.....	14
3.4. Pólizas de Interventoría.....	15
4.1. Gestión Administrativa.....	16
4.1.1 Personal de Interventoría	16
4.1.2 Personal del contratista de obra.	17
4.1.3. Comités de obra.	17
4.1.4 Correspondencia Cruzada.....	18
4.2. Gestión Técnica.....	22
4.2.1 Avance de obra	22
4.3. Gestión Financiera	77
4.4. Gestión Socioambiental	84
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	98
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA	119
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.	119
8. CONCLUSIONES	125

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.	8
Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1.	26
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5	27
Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.	28
Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.	29
Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.	30
Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.	31
Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2	32
Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.	33
Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.	34
Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.	35
Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.	36
Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.	37
Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.	38
Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.	39
Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.	40
Ilustración 17. Disposición de vigas joist entrepiso 8 N+31.00	42
Ilustración 18. Detalle joist VT 02.....	43
Ilustración 19. Detalle joist VT 03.....	43
Ilustración 20. Detalle joist VT 04.....	44
Ilustración 21. Detalle joist VT 05.....	44
Ilustración 22. Detalle joist VT 06.....	45
Ilustración 23. Detalle joist VT 07.....	45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

<i>Ilustración 24. Detalle vigas de entrepiso 8 N+31,00</i>	<i>46</i>
Ilustración 25. Disposición de refuerzo viga A.	47
Ilustración 26. Disposición de refuerzo viga A'	47
Ilustración 27. Disposición de refuerzo viga B	48
Ilustración 28. Disposición de refuerzo viga C	49
Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga D (1-6).....	50
Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga D' (1'-2)	51
Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga D' ' (3-4)	51
Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga E (1-6).....	52
Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E)	53
Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E)	53
Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)	54
Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E)	54
Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)	55
Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 4 (C-D)	55
Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E)	56
Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E).....	56
Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E)	57

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra	12
Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra.....	12
Tabla 3. Póliza de cumplimiento Contratista de obra.....	13
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra.....	14

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Tabla 5. Contrato de Interventoría	14
Tabla 6. Pólizas de Interventoría	15
Tabla 7. Personal de Interventoría.....	16
Tabla 8. Personal del contratista de obra.	17
Tabla 9. Actas de comité	17

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.....	14
Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.....	15
Anexo 3. Planillas personal Interventoría.....	17
Anexo 4. Actas de comité julio- agosto de 2025	18
Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.	22
Anexo 6. Informe mensual del periodo del 26 julio al 25 de agosto de 2025 del contratista de obra.....	119
Anexo 7. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA.....	124
Anexo 8. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA	125

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE JULIO A 25 DE AGOSTO DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	CONSORCIO INTER-SALUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km², el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Otro si del 10 de septiembre de 2024	Otro si modificatorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), c) CONSTRUCCION LOSA ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, e) LOSA CONCRETO ALIGERADA ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3" Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Otro si del 15 de abril de 2025	Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025.
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 4	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	13-sept-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	13-sept-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	13-may-2029	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 4	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO INTERSALUD PZ
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. (\$1.280.412.030) incluido iva.
Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Otro si del 15 de abril de 2025	Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días.
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días.
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030

Tabla 5. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47- 994000056187 ANEXO 2	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-may-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	\$256.082.406,00

Tabla 6. Pólizas de Interventoría

Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría.

Póliza ampliación de plazo de interventoría OTROSI N°01.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47- 994000056187 ANEXO 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	10-nov-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	10-may-2029	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	13-may-2031	\$256.082.406,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE JULIO al 25 DE AGOSTO DE 2025.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Rafael Antonio Salcedo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Augusto Guzmán Enríquez
Ingeniero eléctrico	Juan José Mosquera
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixsa Angulo Agudelo.
Abogado Jurídico	José Alexander Romero
Contador publico	Fernando Trujillo Lopez
Personal Adicional	
Ingeniera Apoyo Técnico	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniera Ambiental	Andrés Felipe Orozco

Tabla 7. Personal de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Suplente representante legal	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	Fabio Humberto Carvajal
Ingeniero residente de obra	Wilmar Andrés Goyes Araujo
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastián Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Marlene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Lorena Falla Falla
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria
Ingeniero civil apoyo técnico.	Diana Magaly Arango

Tabla 8. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizó un (1) comité técnico

COMITÉ	FECHA
55	06-08-2025

Tabla 9. Actas de comité

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de julio al 25 de agosto de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Anexo 4. Actas de comité julio- agosto de 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de JULIO al 25 de AGOSTO de 2025.

• CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA

4/08/2025	CIPZ-078-0364-2025	RESPUESTA OFICIO DEL 30 DE JULIO DE 2025 Y REMISIÓN OFICIO EV-C358-23-0492-25 DEL 23 DE JULIO DE 2025 – “AJUSTE A LA REPROGRAMACIÓN”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
5/08/2025	CIPZ-078-0365-2026	REITERACION OFICIO CIPZ-078-0205-2025 DEL 8 DE ABRIL DE 2025 – CORRESPONDENCIA CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
5/08/2025	CIPZ-078-0366-2025	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS CAUSAL OTRO SI DE APROBACION PARA PAGO DE ITEMS NO PREVISTOS.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
6/08/2025	CIPZ-078-0367-2026	DEFINICIÓN OPERADOR DE RED PROYECTO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
8/08/2025	CIPZ-078-0368-2025	REITERACION OFICIO CIPZ-078-0336-2025 Y SOLICITUD DE ACLARACIONES TECNICAS HELIPUERTO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

9/08/2025	CIPZ-078-0369-2026	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0486-25 DEL 17 DE JULIO – ELEMENTOS DE FACHADA PISOS 2 Y 3	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
8/08/2025	CIPZ-078-0370-2025	REMISION OFICIO ENTIDAD 06 DE AGOSTO 2025 – “SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA 358 2023 – INFORME DE EQUIPO MINIMO VINCULADO”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
9/08/2025	CIPZ-078-0371-2026	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
9/08/2025	CIPZ-078-0372-2027	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0491-25 DEL 23 DE JULIO - AJUSTE PLANOS HIDROSANITARIOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
11/08/2025	CIPZ-078-0373-2025	RESPUESTA EV-C358-23-0499-25 DEL 8 DE AGOSTO 2025 - SOLICITUD PARA LA MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

11/08/2025	CIPZ-078-0374-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0504-25 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 – “RESPUESTA A REQUERIMIENTO SOBRE DAÑOS EN EL TECHO DEL HOSPITAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
12/08/2025	CIPZ-078-0375-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0505-25 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 - SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS CAUSAL OTRO SI DE APROBACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
16/08/2025	CIPZ-078-0376-2026	AVANCE REDES SECAS Y AJUSTE AL COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
15/08/2025	CIPZ-078-0377-2027	INFORMACIÓN SOBRE COMITÉ CITADO EL DÍA 15/08/2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	INGENIERO FELIPE SOSSA SUPERVISOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
19/08/2025	CIPZ-078-0378-2028	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0506-25 – APROBACION PROFESIONAL EQUIPO MINIMO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

20/08/2025	CIPZ-078-0379-2028	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0489-25 DEL 22 DE JULIO 2025 – “SOLICITUD DE APROBACIÓN PLANOS ASCENSOR”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
21/08/2025	CIPZ-078-0380-2029	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/08/2025	CIPZ-078-0381-2029	CONVOCATORIA COMITÉ TECNICO COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

21/08/2025	CIPZ-078-0382-2030	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0510-25 DEL 13 DE AGOSTO 2025 - “REQUERIMIENTOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/08/2025	CIPZ-078-0383-2025	OFICIO ENTIDAD DEL 20 DE AGOSTO 2025 – “OFICIO APROBACIÓN PARA ADELANTAR Y EFECTUAR LOS AJUSTES PERTINENTES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/08/2025	CIPZ-078-0384-2026	REITERACION OFICIO CIPZ-078-0367-2025 DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 – DEFINICIÓN OPERADOR DE RED	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

2/08/2025	N.A	2/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Invitación a reunión técnica – Redes hidrosanitarias y eléctricas
4/08/2025	EV-C358-23-0498-25	4/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud.
2/08/2025	N.A	2/08/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD EQUIPO MINIMO EVOLET
11/08/2025	EV-C358-23-0503-25	11/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de entrepiso No 8.

2/08/2025	N.A	2/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Invitación a reunión técnica – Redes hidrosanitarias y eléctricas
4/08/2025	EV-C358-23-0498-25	4/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud.
2/08/2025	N.A	2/08/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD EQUIPO MINIMO EVOLET
11/08/2025	EV-C358-23-0503-25	11/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de entrepiso No 8.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

13/08/2025	EV-C358-23-0508-25	13/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO No. CIPZ-078-0363-2025 [Reprogramación de obra].
13/08/2025	n.a	13/08/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Convocatoria mesa tecnica
13/08/2025	EV-C358-23-0508-25	13/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REMISION DE POLIZAS Y ATENCION AL OFICIO CIPZ-078-0375-2025

13/08/2025	EV-C358-23-0510-25	13/08/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	RESPUESTA OFICIOS CIPZ-078-0348- 2025 y No. CIPZ-078-0329-2025– “REQUERIMIENTOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO”
19/08/2025	EV-C358-23-0513-25	19/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.
19/08/2025	EV-C358-23-0512-25	19/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión memorias de cantidades correspondientes al acata de obra No. 6.- paquete No. 1
20/08/2025	n.a	20/08/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Mesa de seguimiento proyecto
19/08/2025	EV-C358-23-0514-25	19/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.
21/08/2025	EV-C358-23-0515-25	21/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de columnas y pantallas
21/08/2025	EV-C358-23-0515-25	21/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio No. CIPZ-078-0372- 2025- planos hidrosanitario.

21/08/2025	EV-C358-23-0516-25	21/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio No. CIPZ-078-0380- 2025, y remisión del informe No. 18.
20/08/2025	n.a	22/08/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Autorización para adelantar y efectuar los ajustes pertinente encaminados a la optimización de los productos de consultoría del contrato 366 2020
22/08/2025	EV-C358-23-0518-25	22/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración solicitud definición de punto de conexión red hidráulica y red contra incendios– Proyecto en ejecución
22/08/2025	EV-C358-23-0517-25	22/08/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración solicitud definición de punto de conexión y operador de red – Proyecto en ejecución contrato de

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 26 de JULIO al 25 de AGOSTO de 2025, el contratista de obra terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso 9 N +31.00, el armado de aceros de las vigas de entrepiso 9 N +31.00, la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso 9 N +31.00, se instalaron las vigas joist de entrepiso 9 N +31.00.

Se realizó la instalación de formaleta para columnas y columnas y pantallas del piso 9 N+31.00 a N+34.90

Se realizó la instalación de concretos de columnas y columnas y pantallas para el piso piso 9 N+31.00 a N+34.90

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas de emergencia del nivel 6 a 7 N+19.30 a N+23.20.

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas centrales del nivel nivel 6 a 7 N+19.30 a N+23.20

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas centrales del nivel nivel 6 a 7 N+19.30 a N+23.20.

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas de emergencia del nivel nivel 6 a 7 N+19.30 a N+23.20

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Se han construido muros en mampostería estructural en las fachadas y muros confinados en las zonas húmedas y muros perimetrales de las gradas centrales y de emergencia en los pisos 2, 3 y 4

Se ha realizado la instalación de redes sanitarias bajo el piso 2 y piso 3.

Los aceros de vigas y losas fueron verificados que cumplieran en diámetro, cuantía, longitud, espaciamientos, posición conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría.

Se verificó que las vigas joist de los entresijos cumplieran en dimensión, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales, para lo cual se utilizó flexómetro y calibrador.

Se verificó que el acero de la malla electrosoldada, cumplieran con lo estipulado en los diseños aprobados por la curaduría, se verificó las dimensiones de las formaletas de las vigas de entrepiso cumplieran con los diseños estructurales se verificó los niveles de la formaleta de la losa de entrepiso entrepiso 8 N+31.00

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las vigas y losa de entrepiso entrepiso 8 N+31.00, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, para lo cual los asentamientos de los concretos de cada vehículo de suministro se encontraron dentro del margen de las 7" más o menos 1", se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima exigida conforme a los diseños estructurales.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1



Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Se verificó que los aceros de las columnas y pantallas del piso 9 N+31.00 a N+34.90 cumplieran con el diámetro, longitud, cuantía, disposición, espaciamiento, conforme a lo establecido en los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las columnas y pantallas de entrepiso piso 9 N+31.00 a N+34.90, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 8" más o menos 1".

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas de emergencia del entrepiso 6 N+19,30 a N+23.20 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento y espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las de las gradas de emergencia del entrepiso 6 N+19,30 a N+23.2, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 3000 psi de resistencia.

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas centrales del entrepiso 6 N+19,30 a N+23.20 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento y espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las de las gradas centrales del entrepiso 6 N+19,30 a N+23.2, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 3000 psi de resistencia.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Para los muros de mampostería, se realizó control de localización y dimensiones, se verificó la instalación de los anclajes de los arranques de los refuerzos a la losa inferior,

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- COLUMNA C3

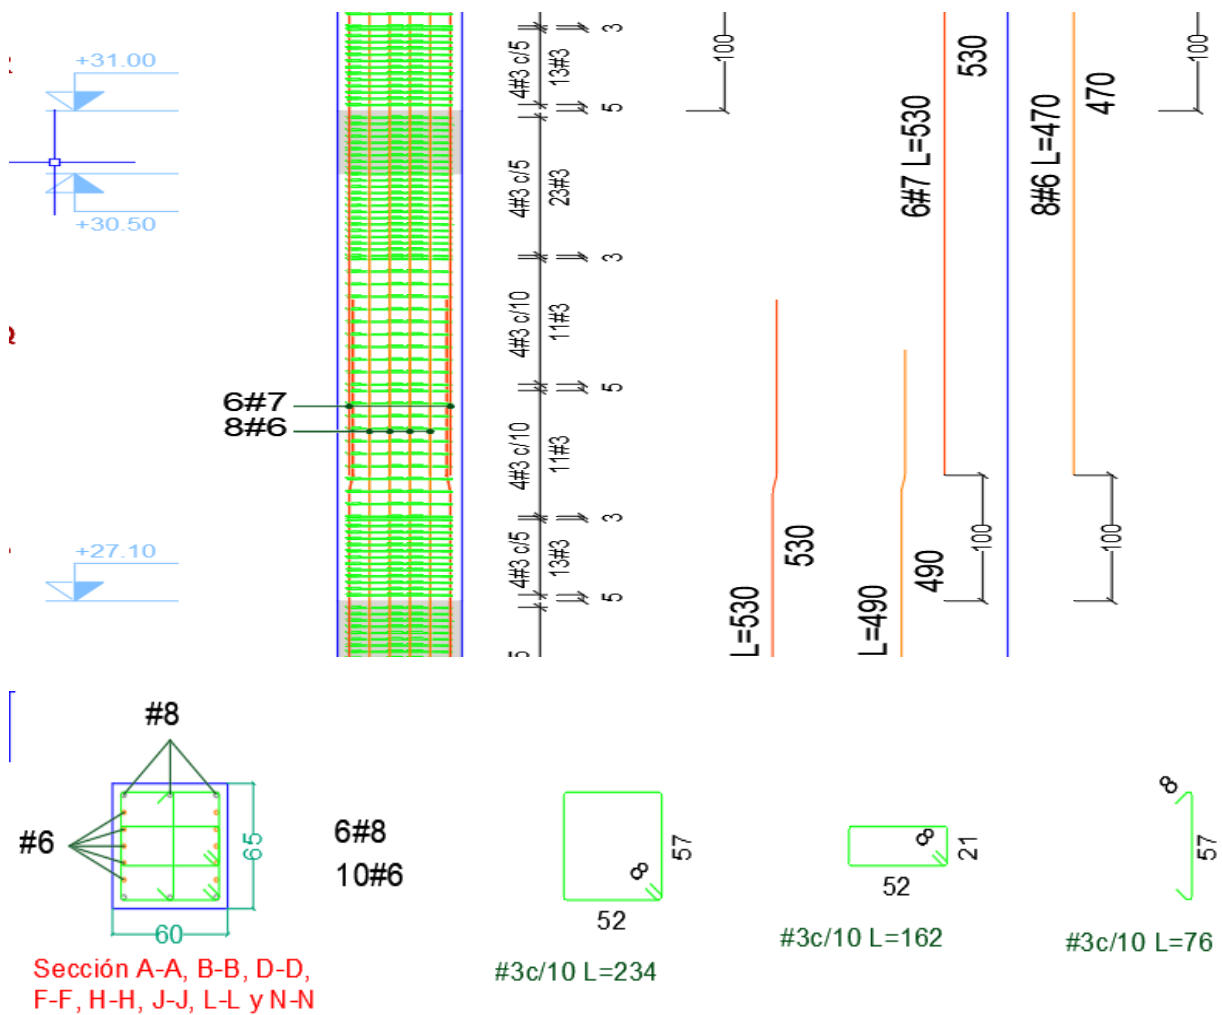


Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- COLUMNA C9 y C10



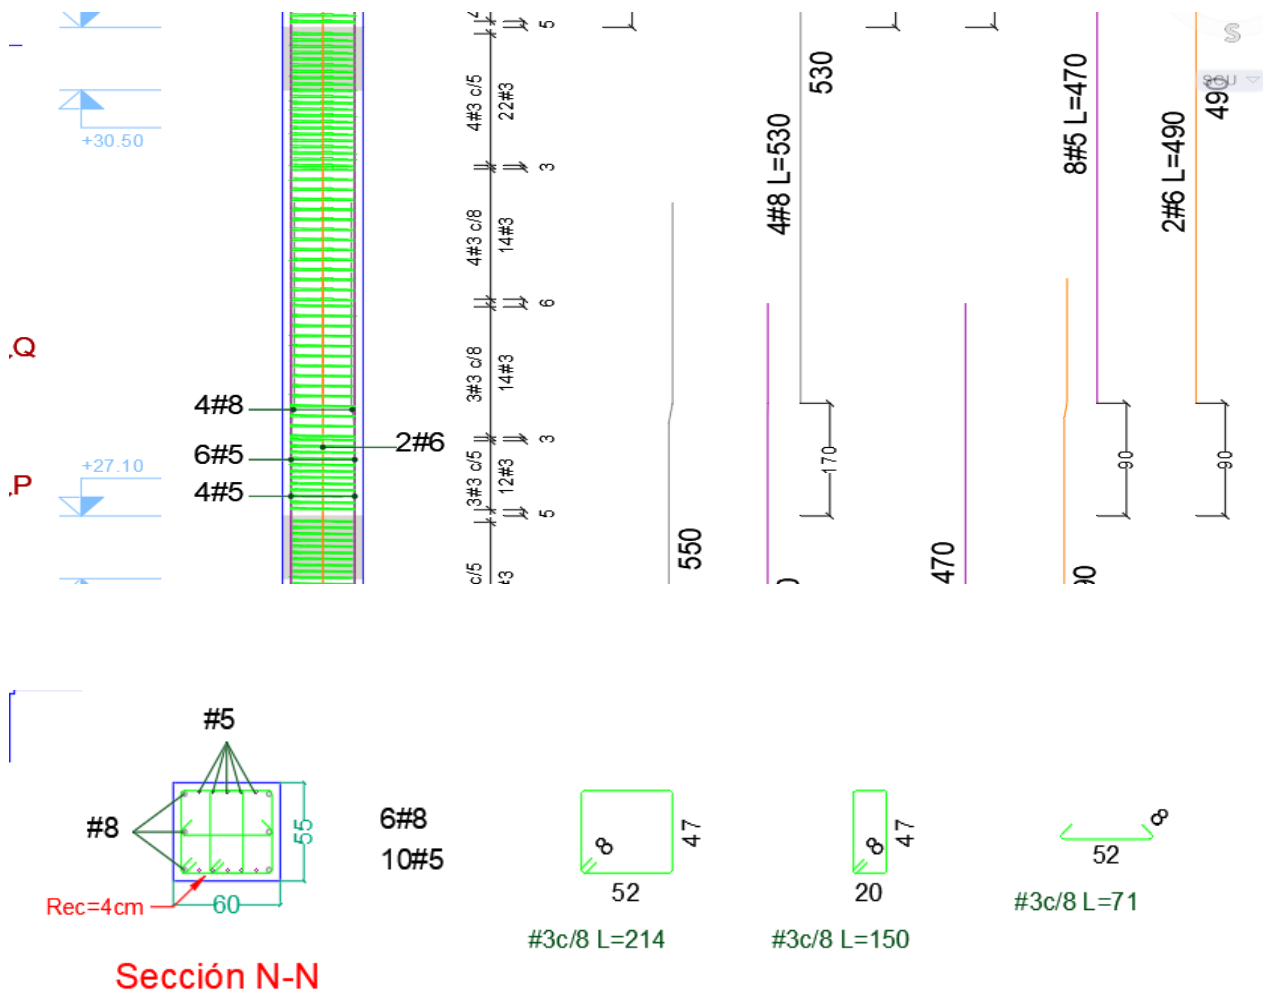


Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +31.00 A N +34.90

- PANTALLA PW1**

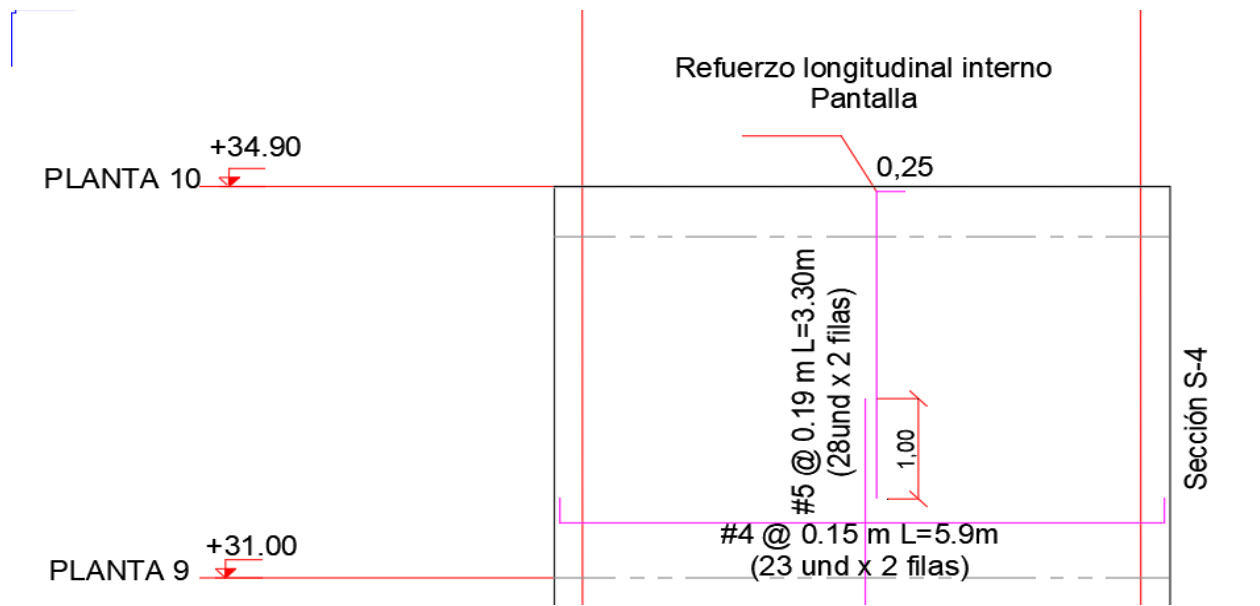


PLANTA 7, PLANTA, PLANTA 9, PLANTA 10 ESCALA

Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW2**


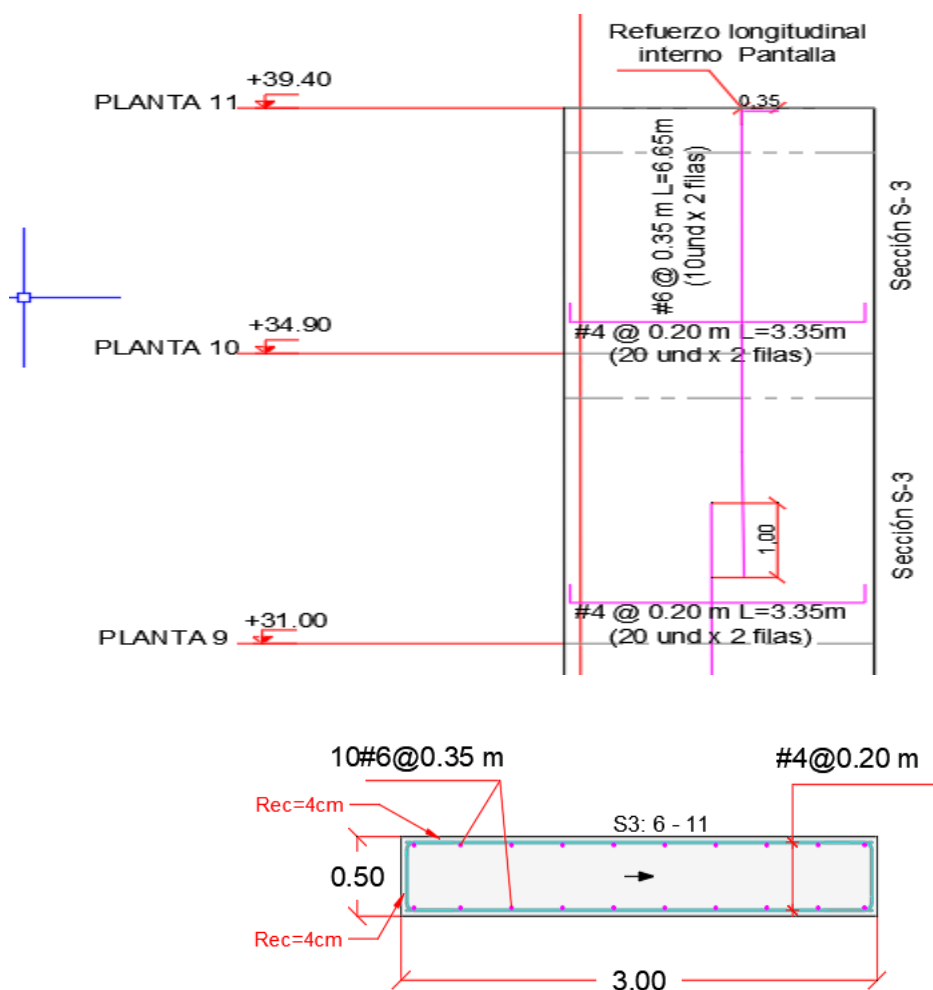


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW3**

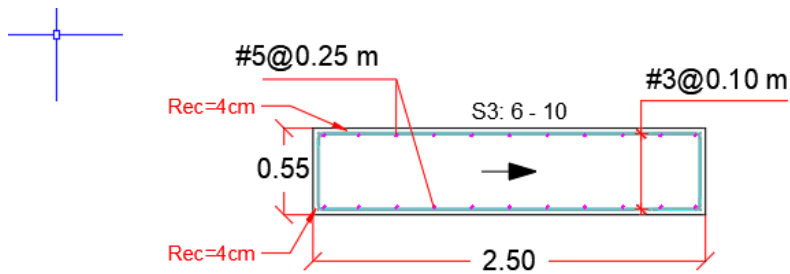
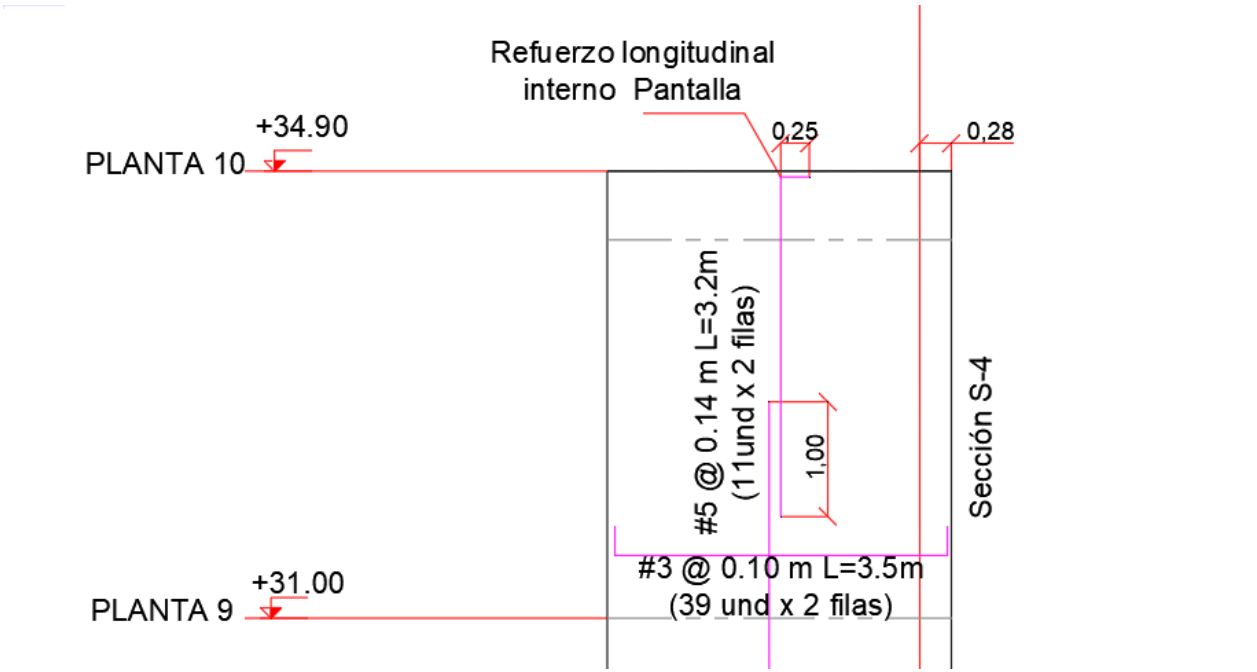


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW4


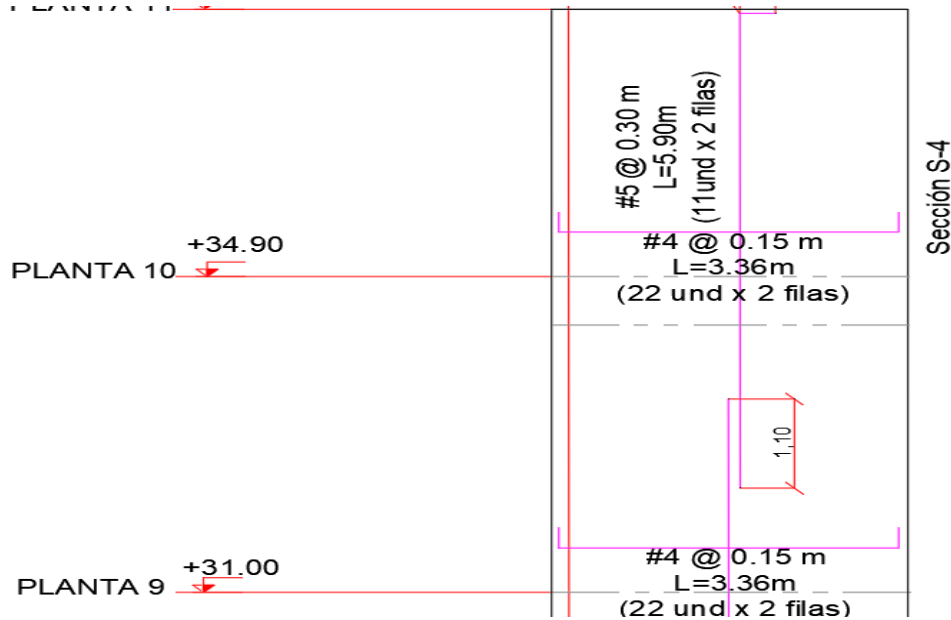


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9, PLANTA 10 Y PLANTA 11

Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW5

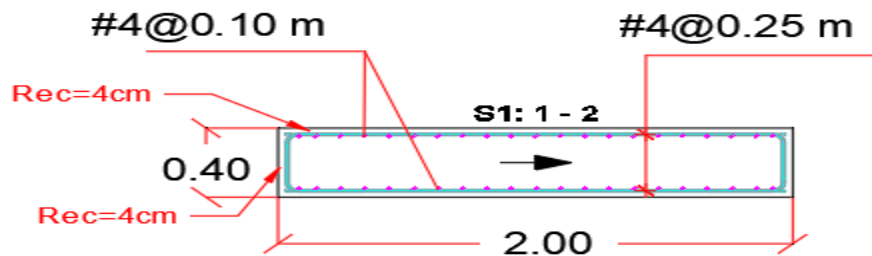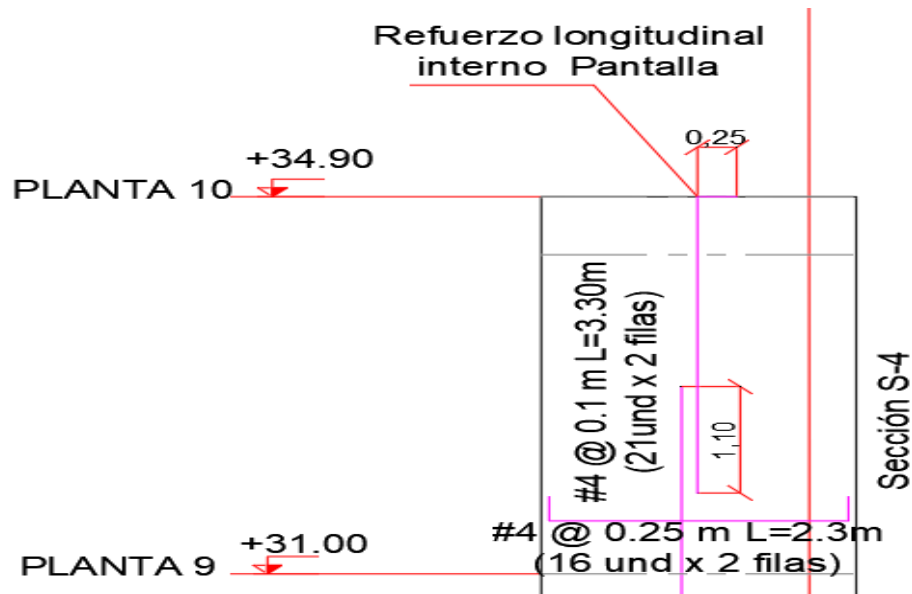


PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW6


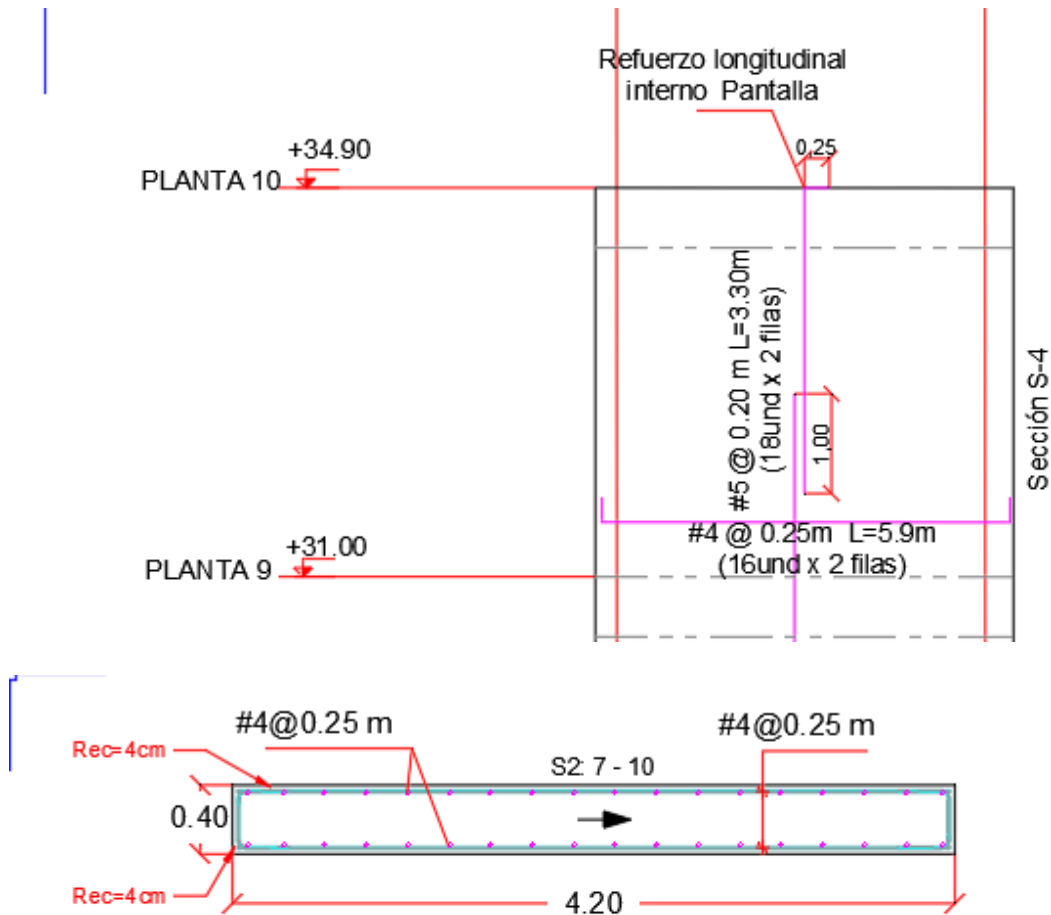


PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW7**

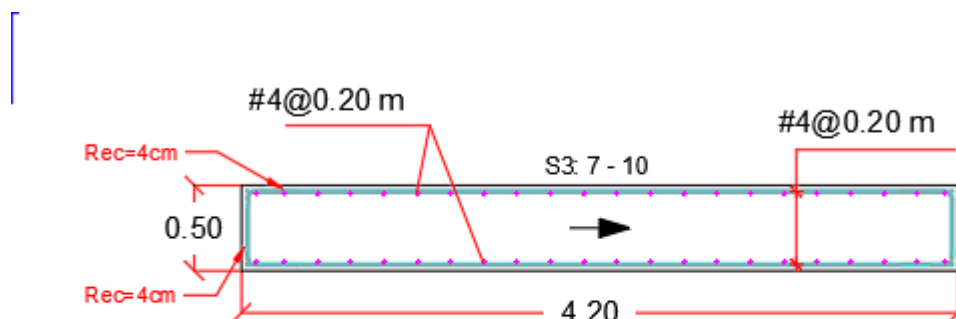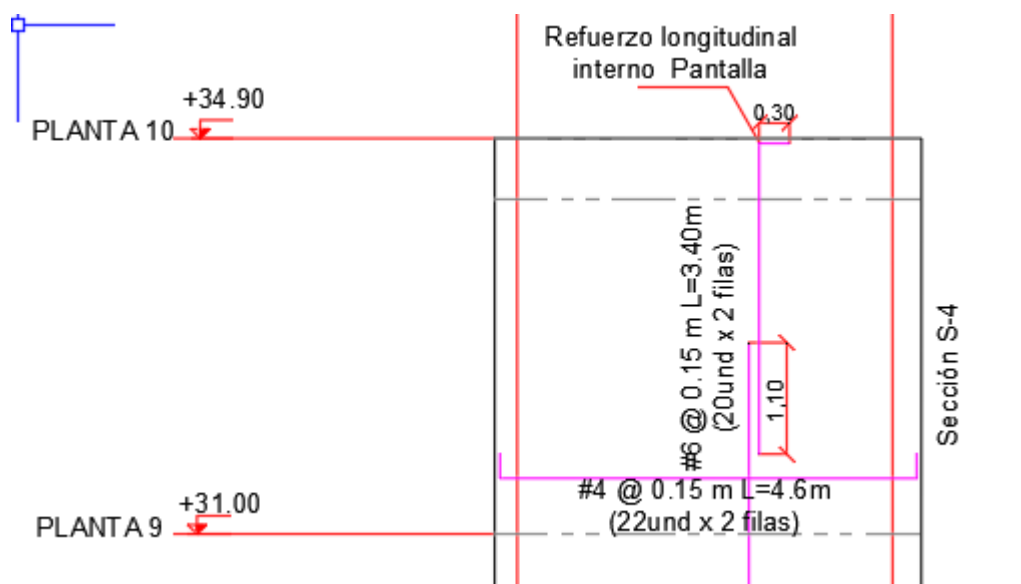


PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW9

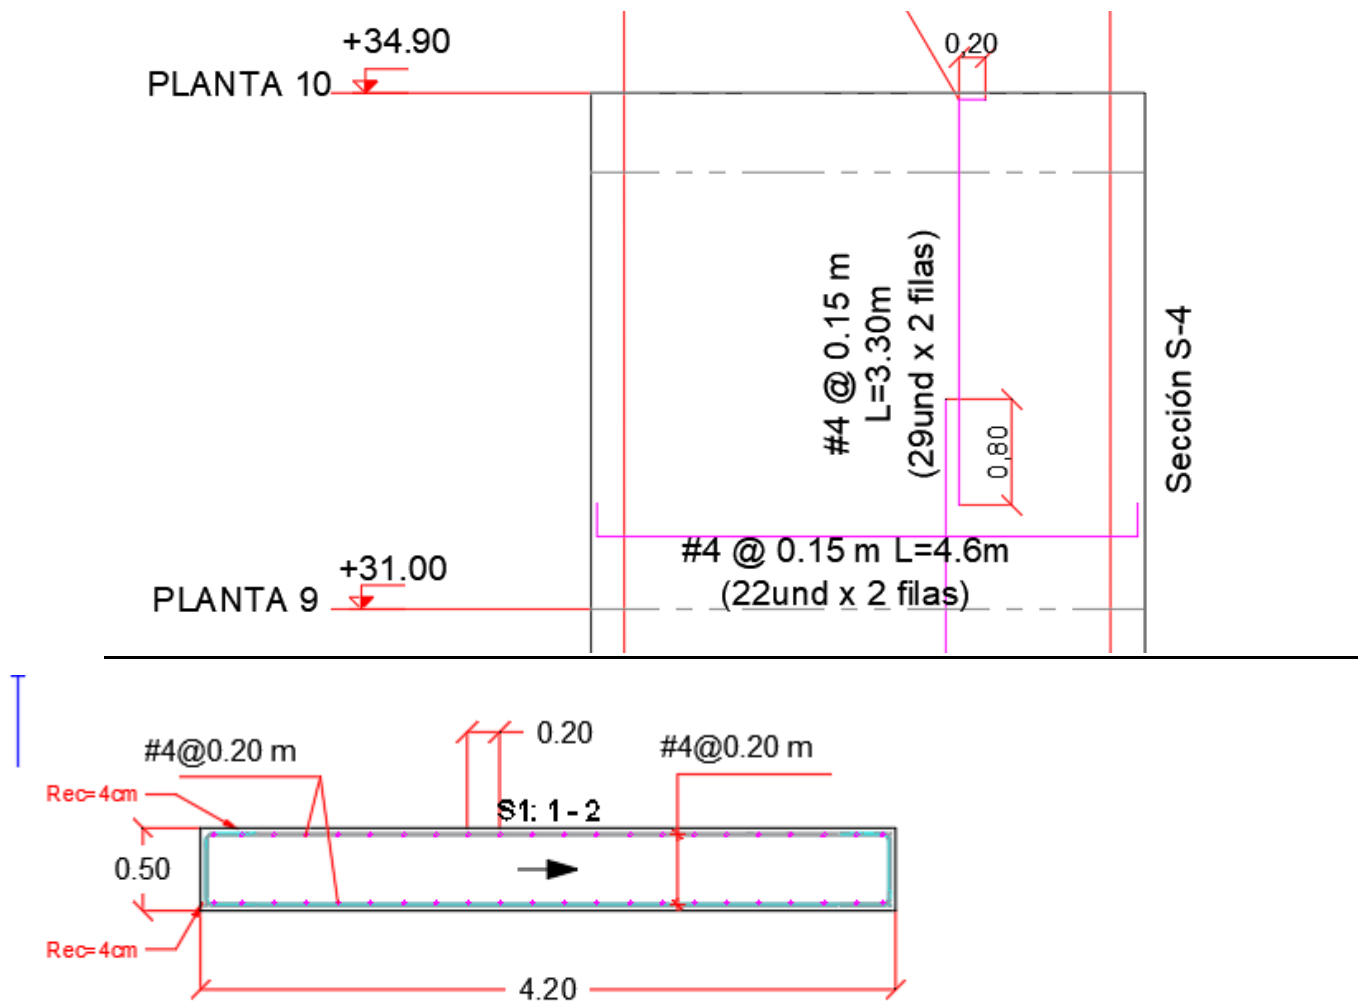

PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- PANTALLA PW10


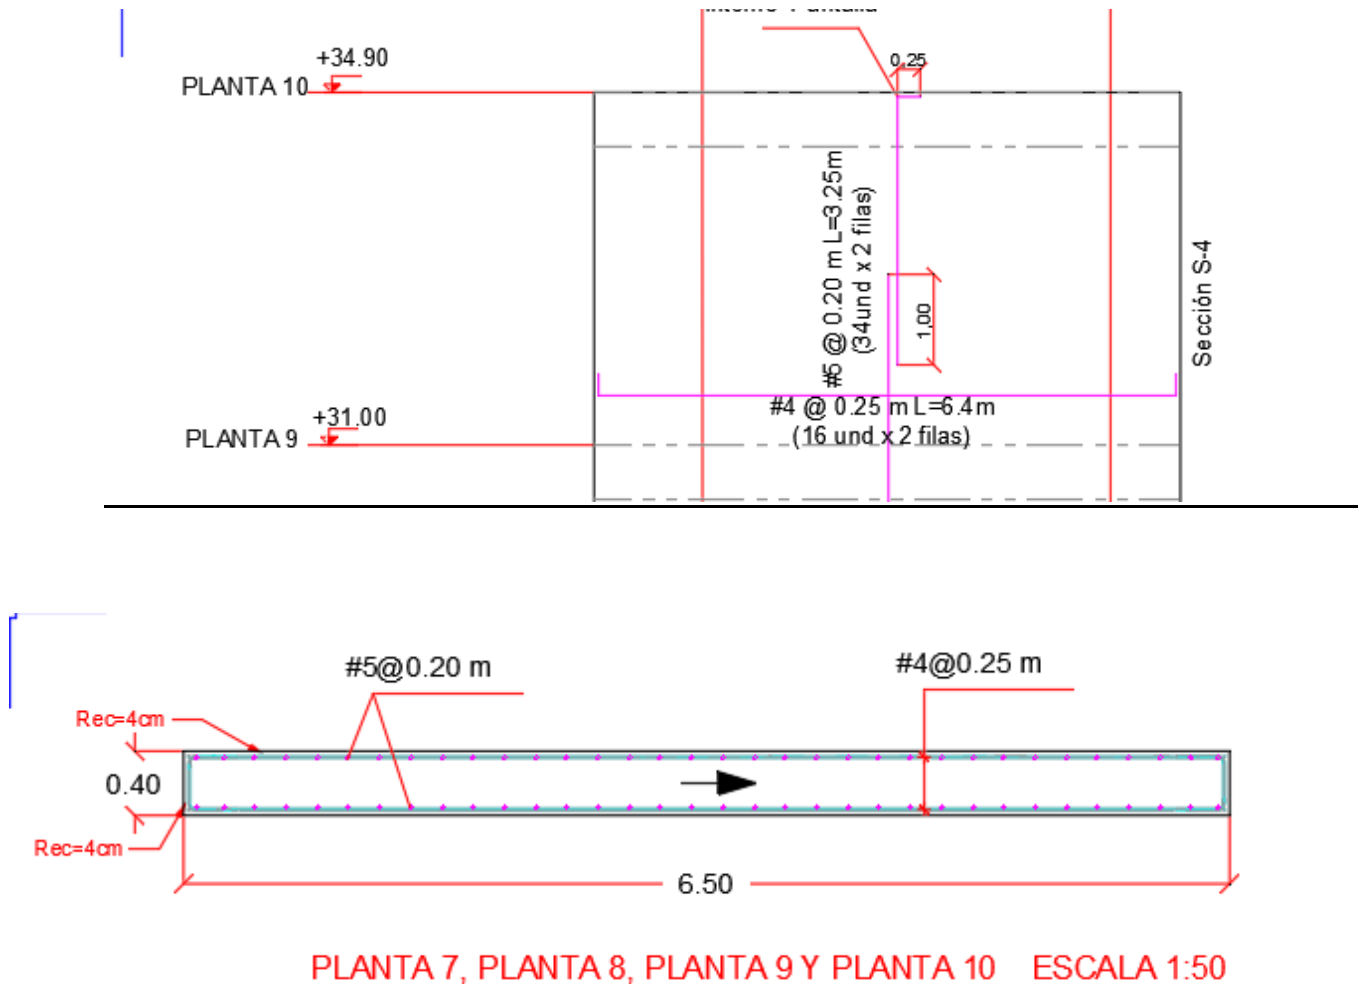


Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	CONSORCIO INTERSALUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO LSOA DE ENTREPISO 8 N +31.00

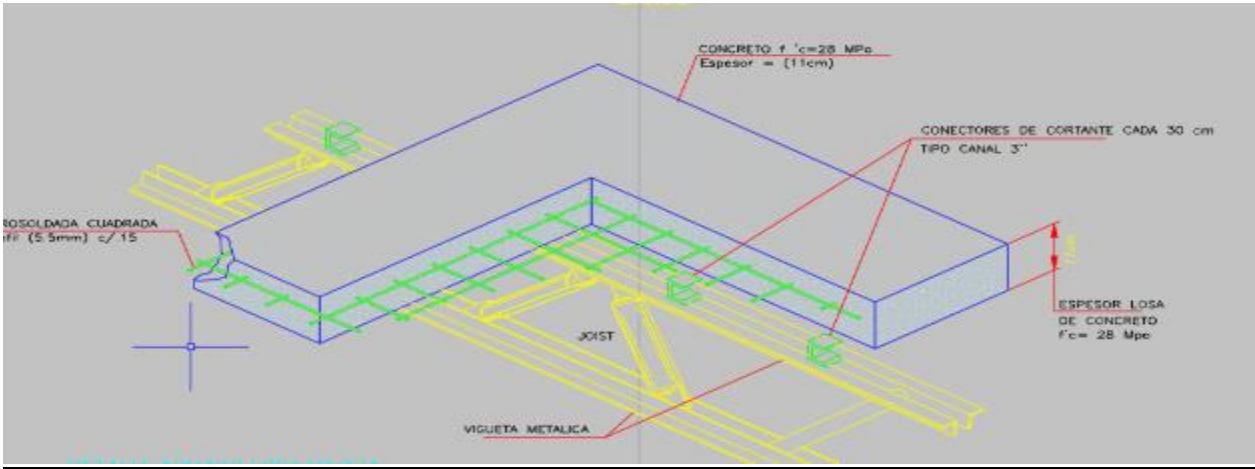

RESUMEN DE LA LOSA	
ITEM	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR DE LA LOSA (cm)	11.0
Malla de retracción para la placa:	Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 - Doble

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

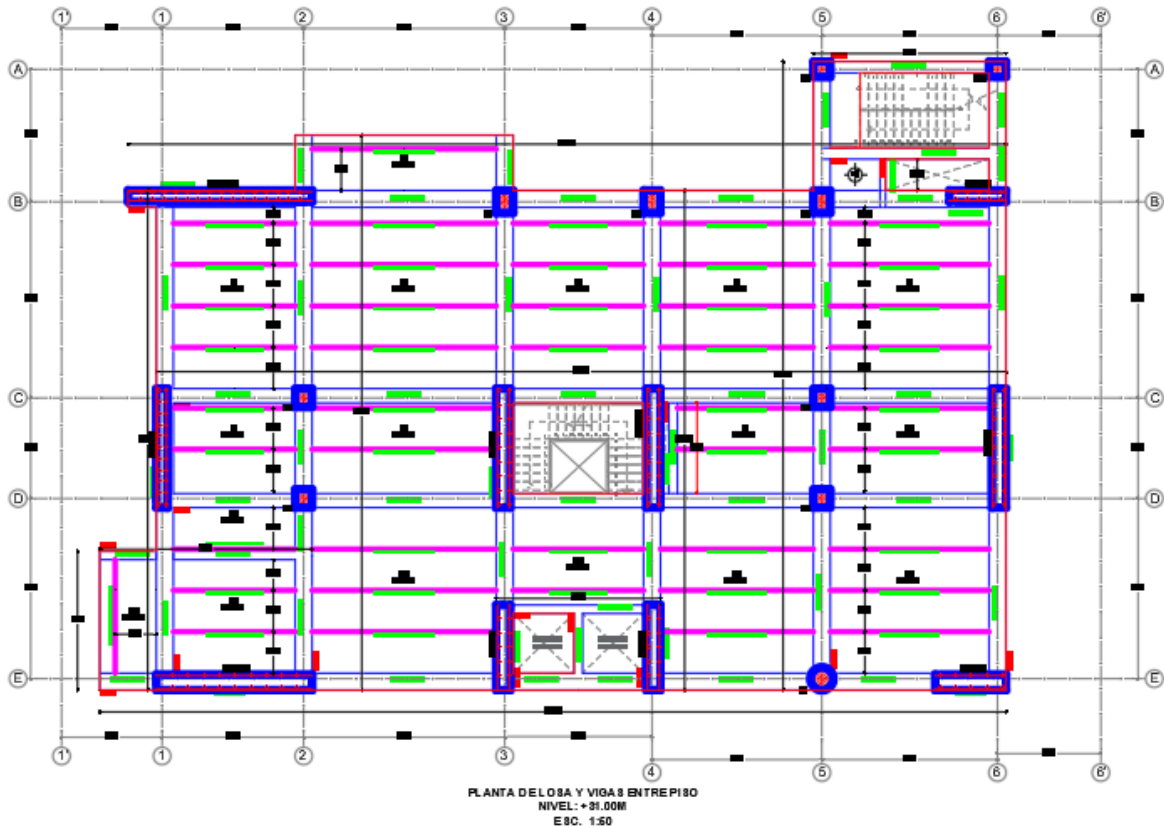


Ilustración 17. Disposición de vigas joist entre piso 8 N+31.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

DETALLE VIGAS JOIST VIGA ENTREPISO 8 N +31.00

DETALLE VIGA TEC VT 02

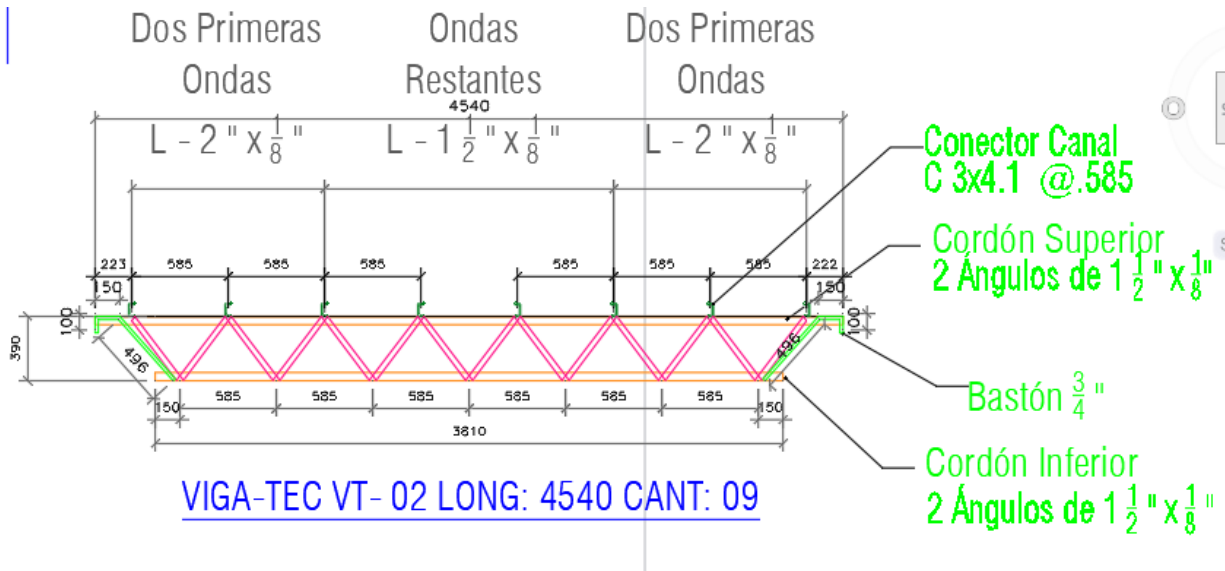


Ilustración 18. Detalle joist VT 02

DETALLE VIGA TEC VT 03

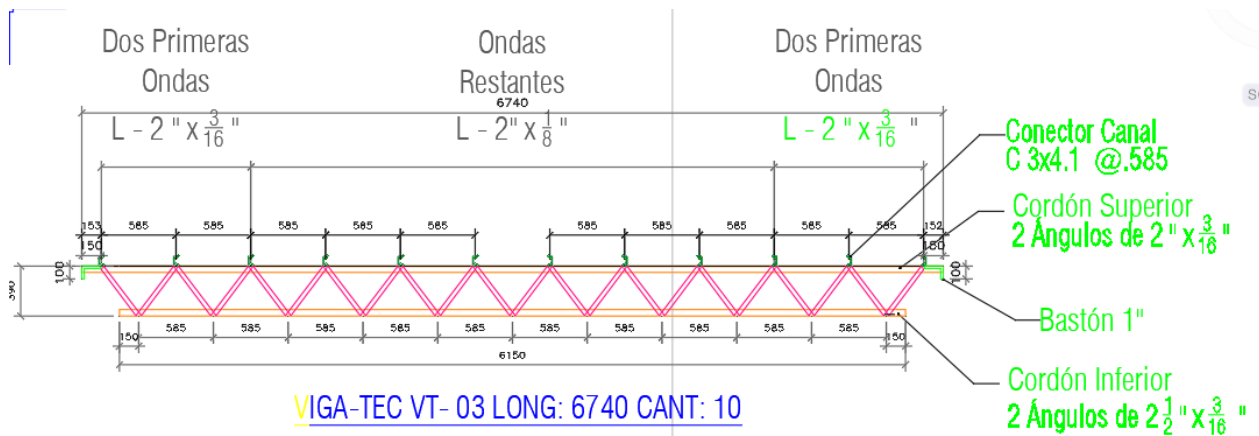


Ilustración 19. Detalle joist VT 03.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”



Documento
Versión 1

Technical drawing of a VIGA-TEC VT-04 bridge structure. The drawing shows a side elevation of a truss bridge with a total length of 4840 mm. The structure is divided into three sections: "Dos Primeras Ondas" (Two First Waves) on the left, "Ondas Restantes" (Remaining Waves) in the middle, and "Dos Primeras Ondas" (Two First Waves) on the right. The total length is 4840 mm. The drawing includes dimensions for the top chord (Cordón Superior) and bottom chord (Cordón Inferior), both made of 2 angles of 1 1/2 inches by 3/8 inch. The bridge is supported by two 3/4 inch diameter rods (Bastón). The drawing also shows the dimensions for the top and bottom flanges (390 mm and 100 mm respectively) and the spacing between the waves (585 mm). The drawing is labeled "VIGA-TEC VT-04 LONG: 4840 CANT: 06".

DETALLE VIGA TEC VT 05

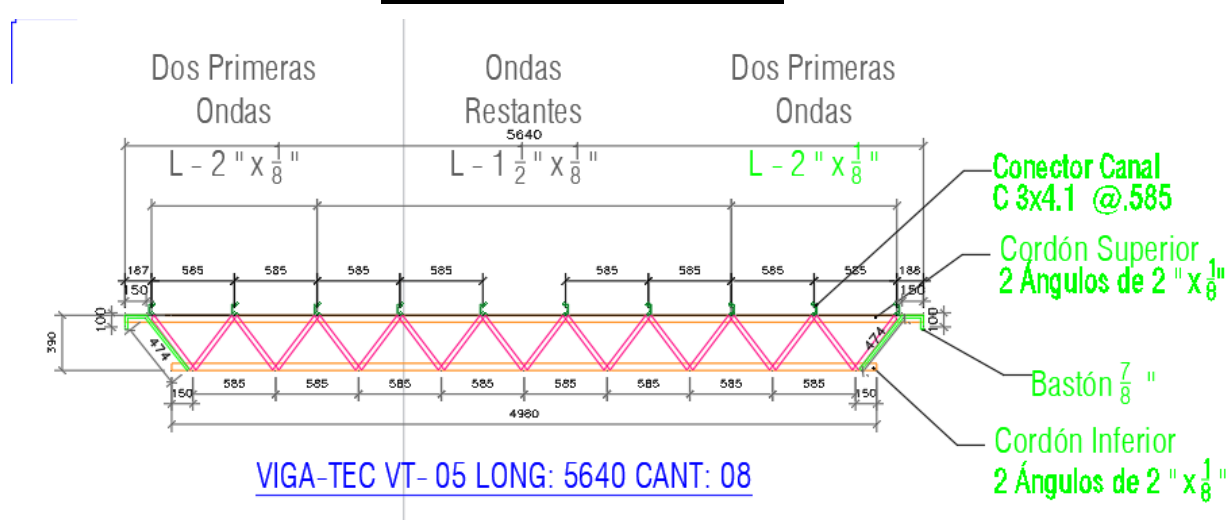


Ilustración 21. Detalle joist VT 05.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

DETALLE VIGA TEC VT 06

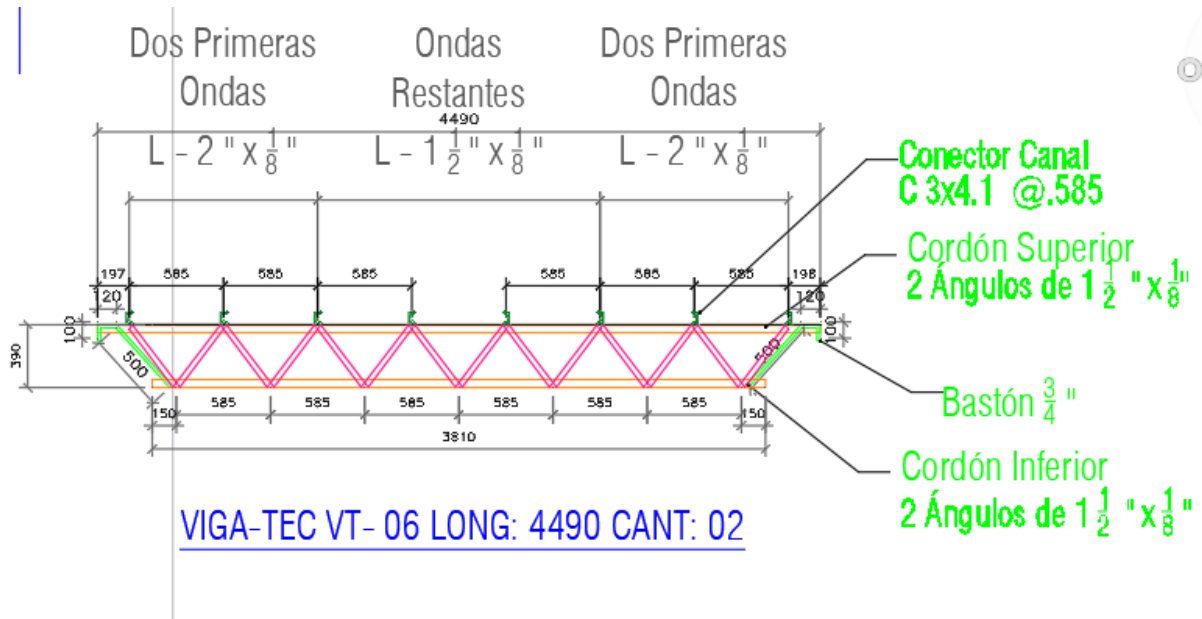


Ilustración 22. Detalle joist VT 06.

DETALLE VIGA TEC VT 07

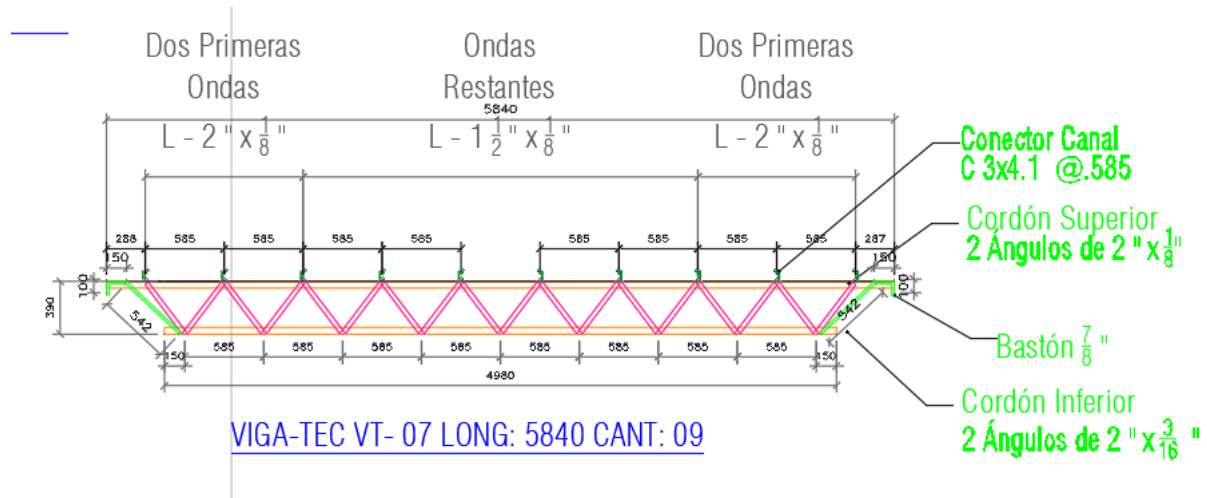


Ilustración 23. Detalle joist VT 07.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

DETALLE VIGAS DE ENTREPISO 8 N+31,00

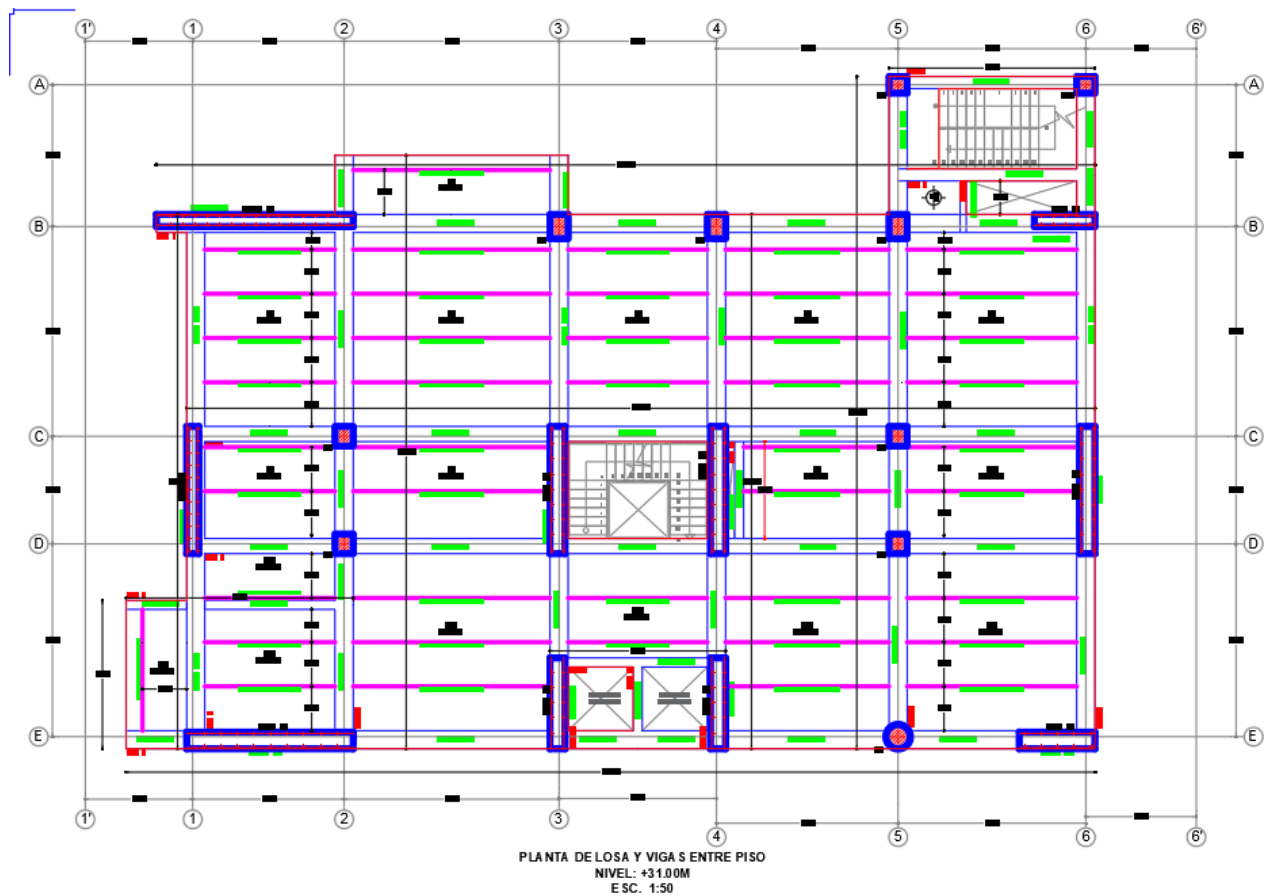


Ilustración 24. Detalle vigas de entrepiso 8 N+31,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6)

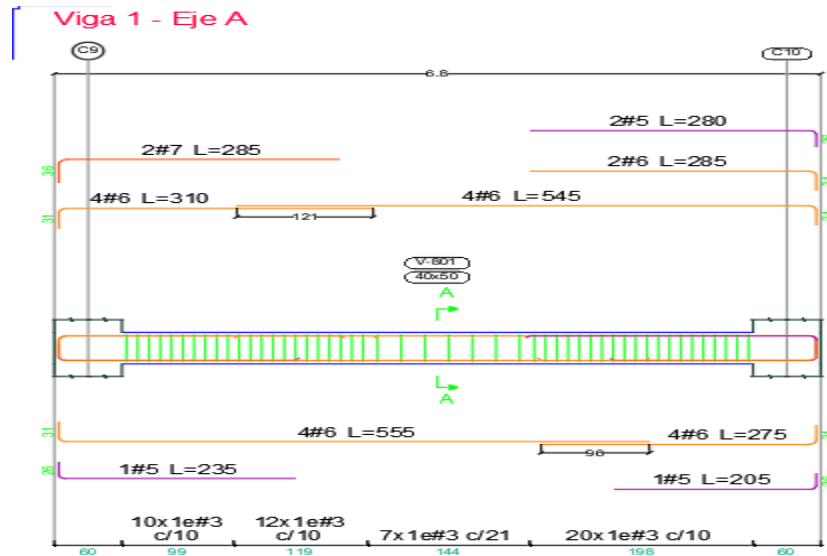


Ilustración 25. Disposición de refuerzo viga A.

- DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6)

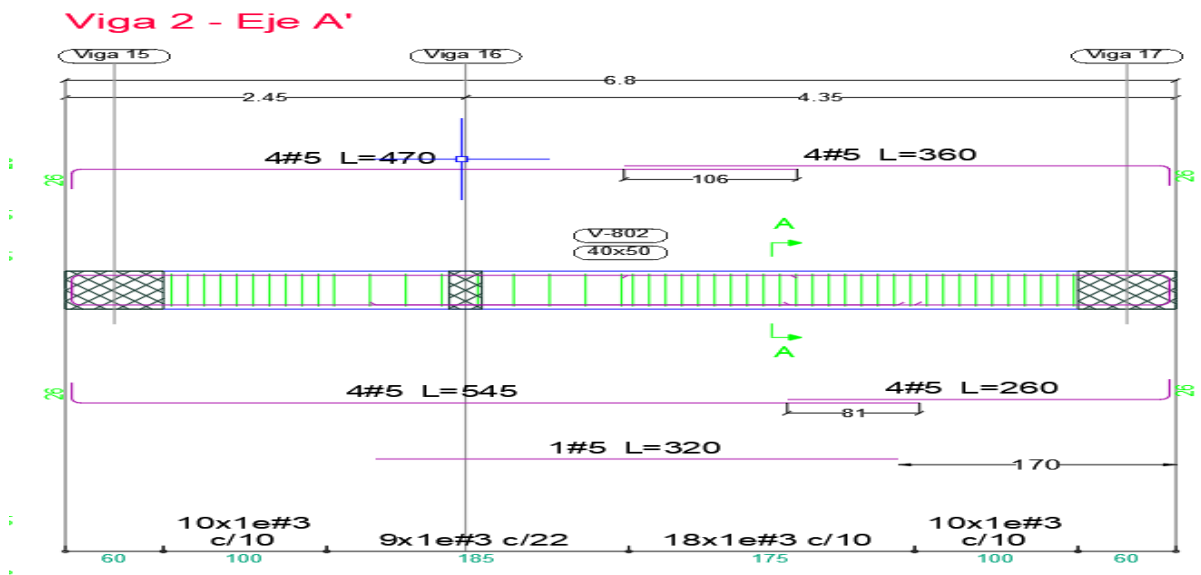


Ilustración 26. Disposición de refuerzo viga A'

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

**INFORME MENSUAL No. 18**

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6')

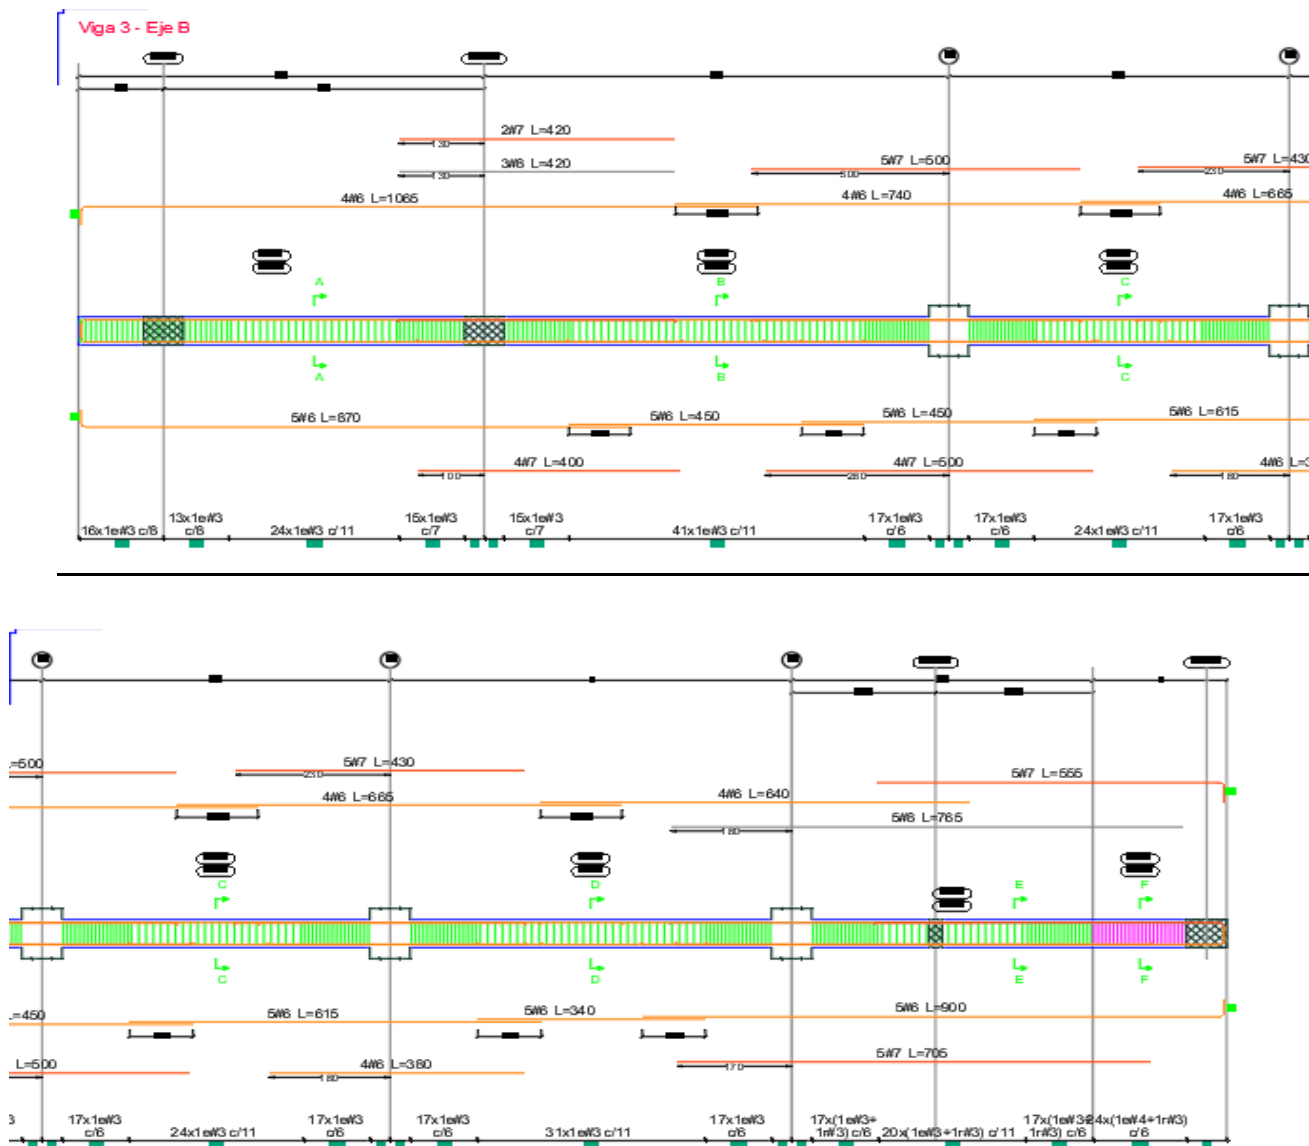


Ilustración 27. Disposición de refuerzo viga B

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA C (1' -6')

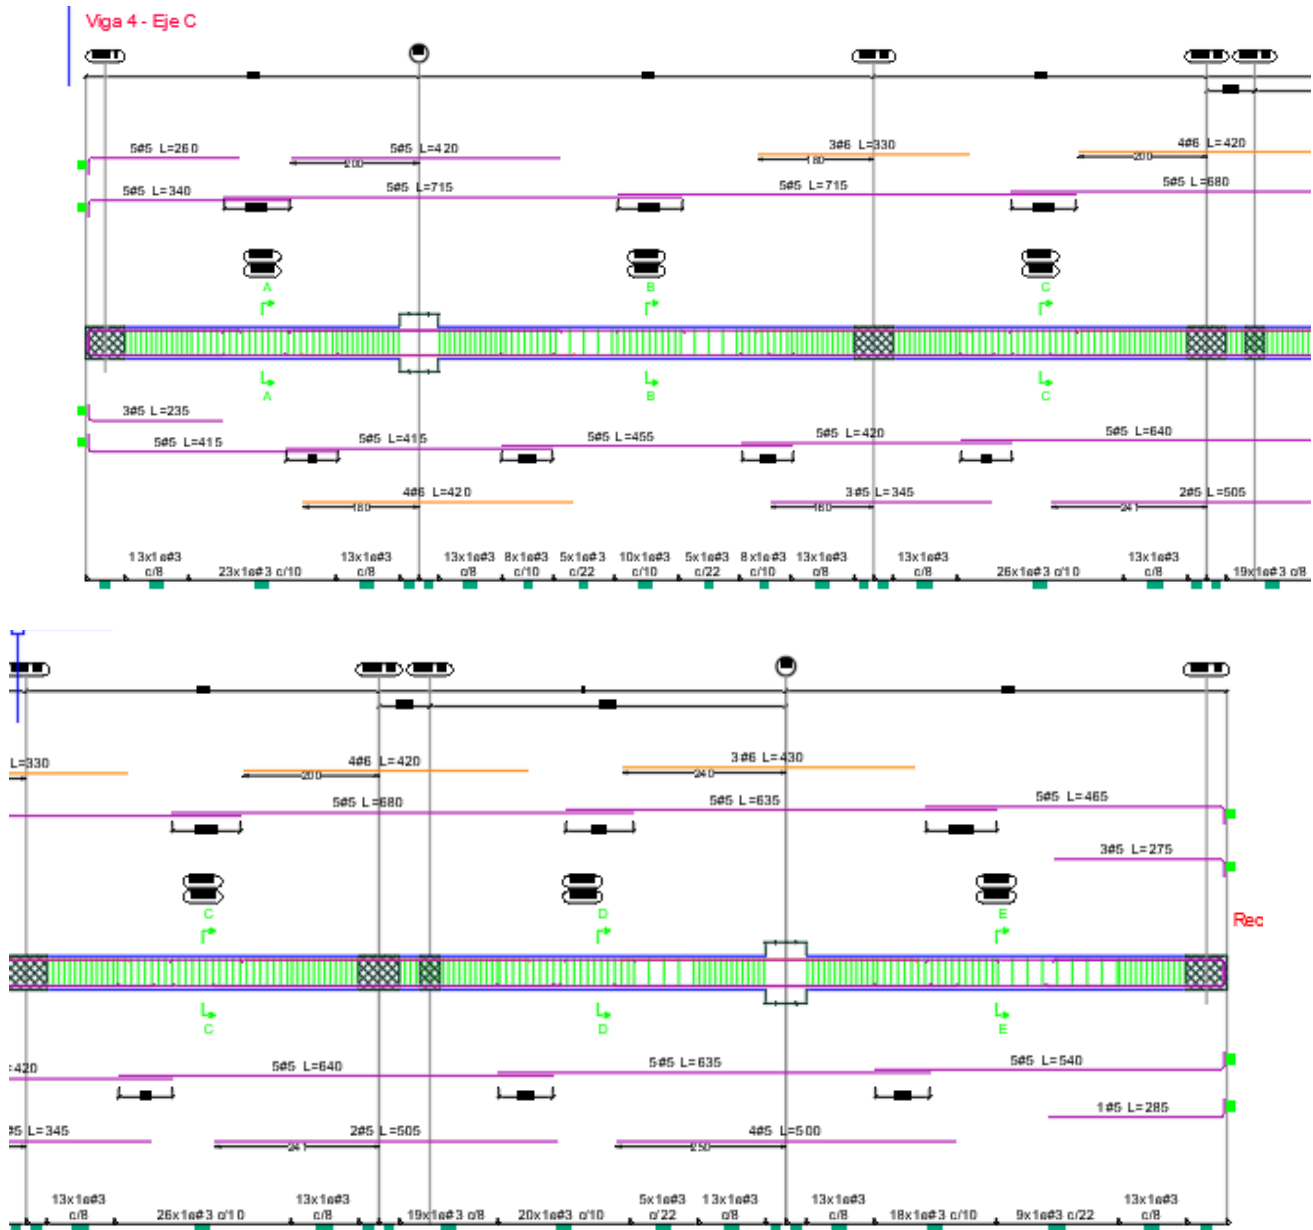


Ilustración 28. Disposición de refuerzo viga C

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”



Documento
Versión 1

Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga D (1-6)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

- DETALLE REFUERZO VIGA D' (1'-2)**

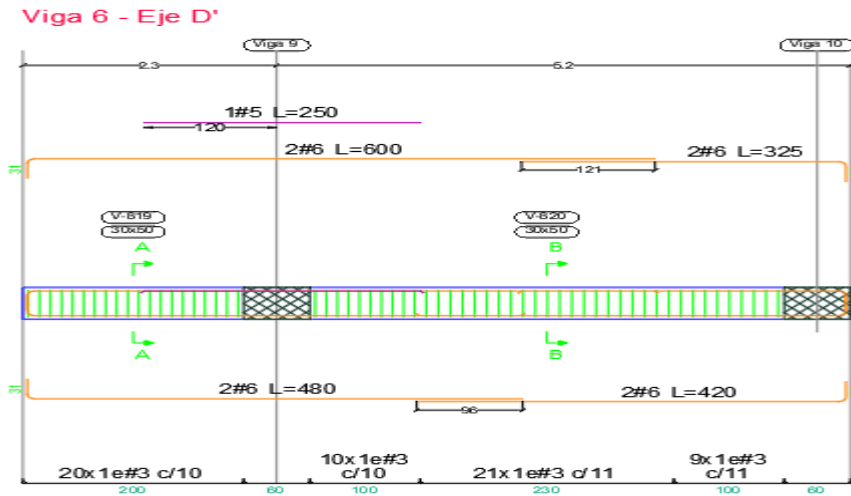


Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga D' (1'-2)

- DETALLE REFUERZO VIGA D' (3-4)**

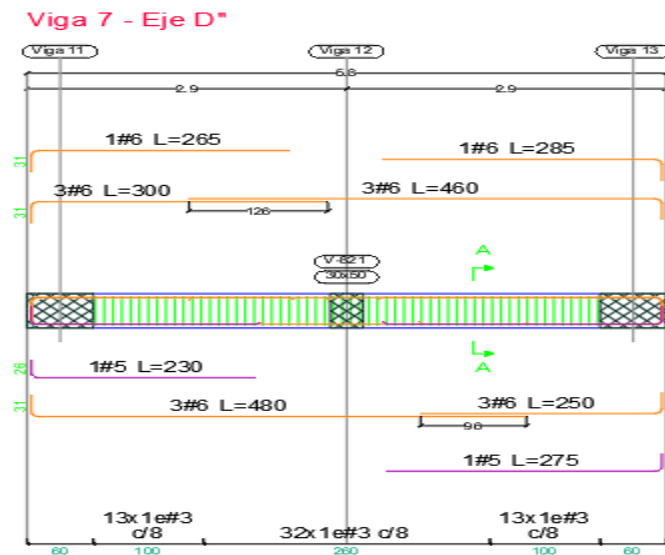


Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga D' (3-4)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• **DETALLE REFUERZO VIGA E**

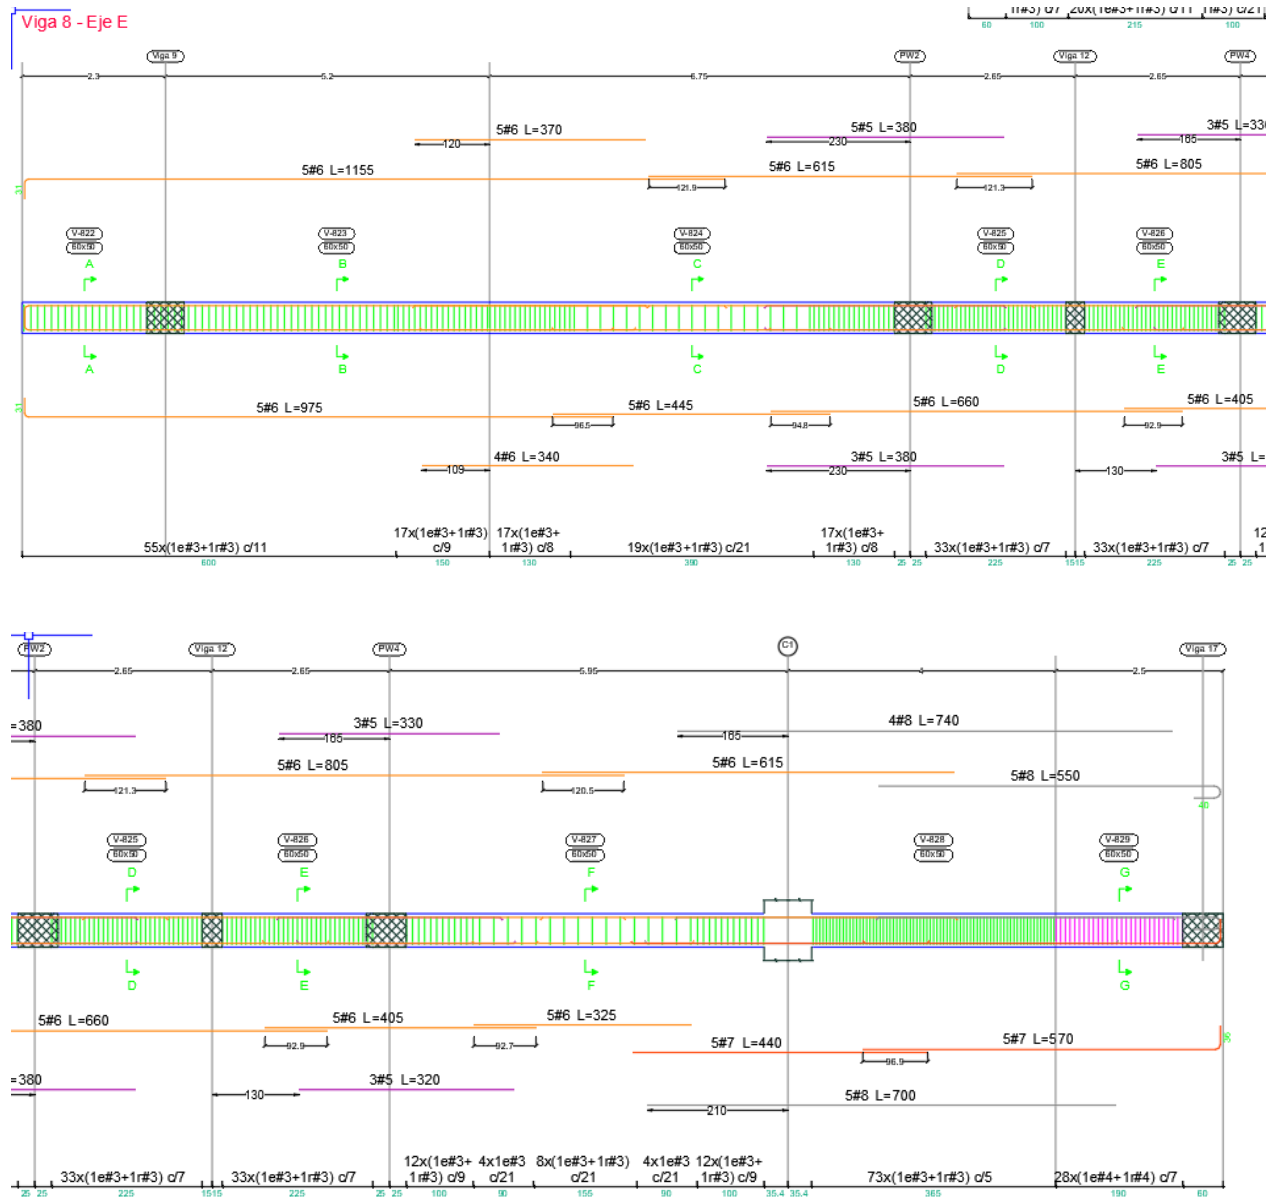


Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga E (1-6)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• **DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E)**

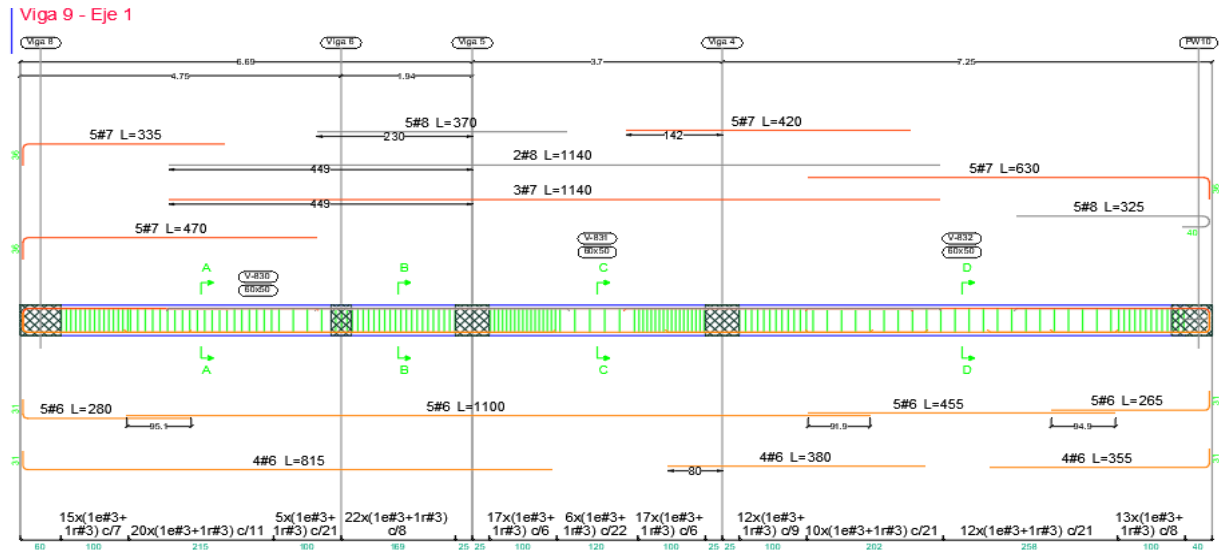


Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E)

• **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E)**

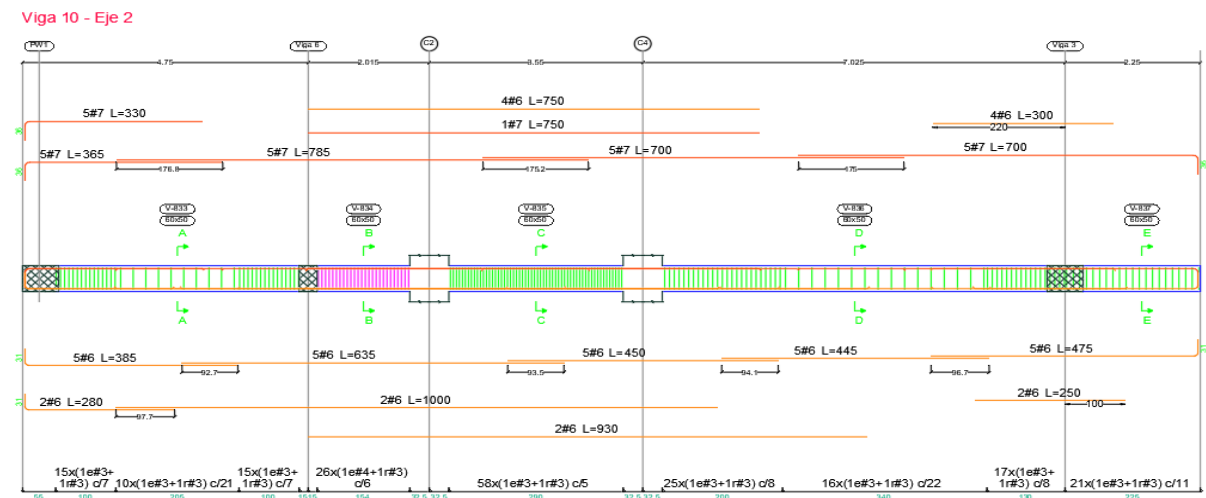


Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• **DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E)**

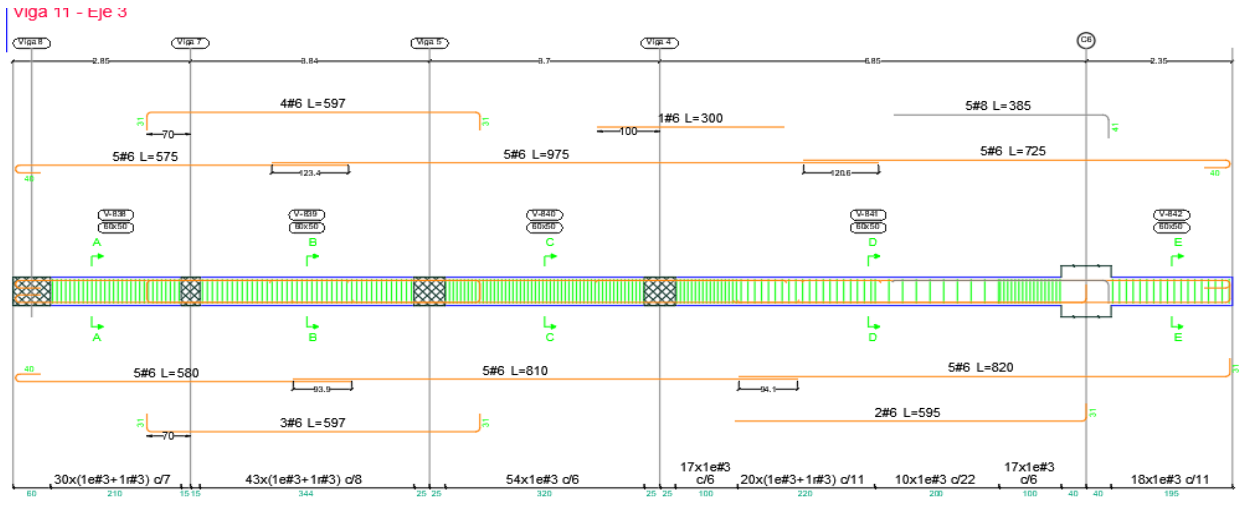


Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)

• **DETALLE REFUERZO VIGA 3* (B-E)**

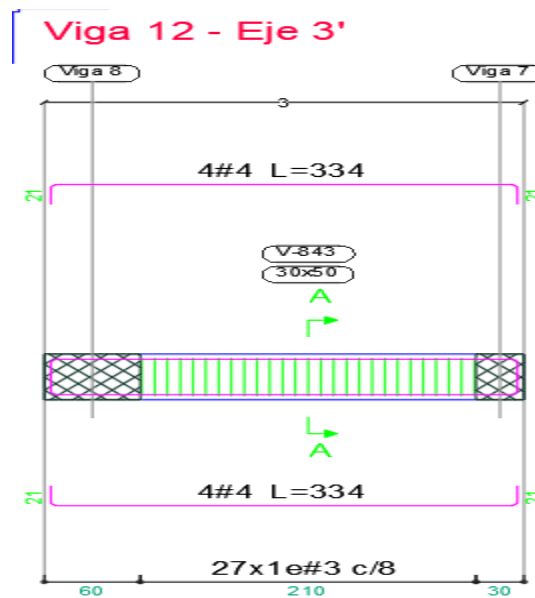


Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)*

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E)

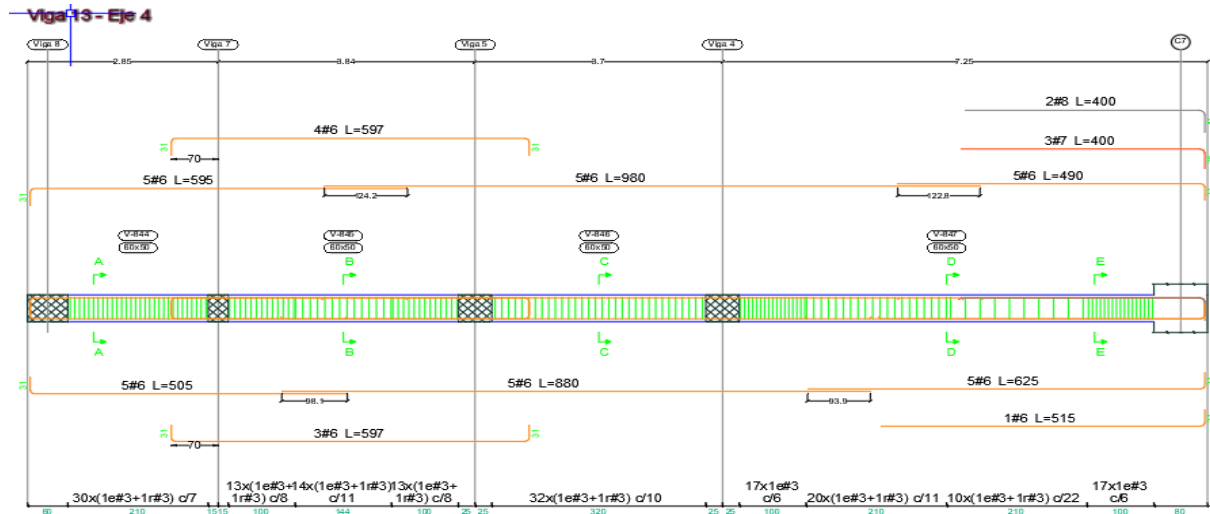


Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)

• DETALLE REFUERZO VIGA 4' (C-D)

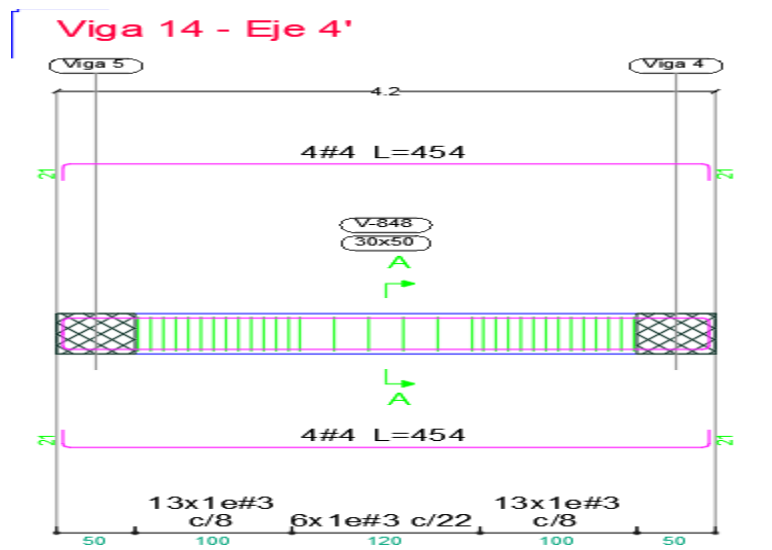


Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 4 (C-D)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• **DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E)**

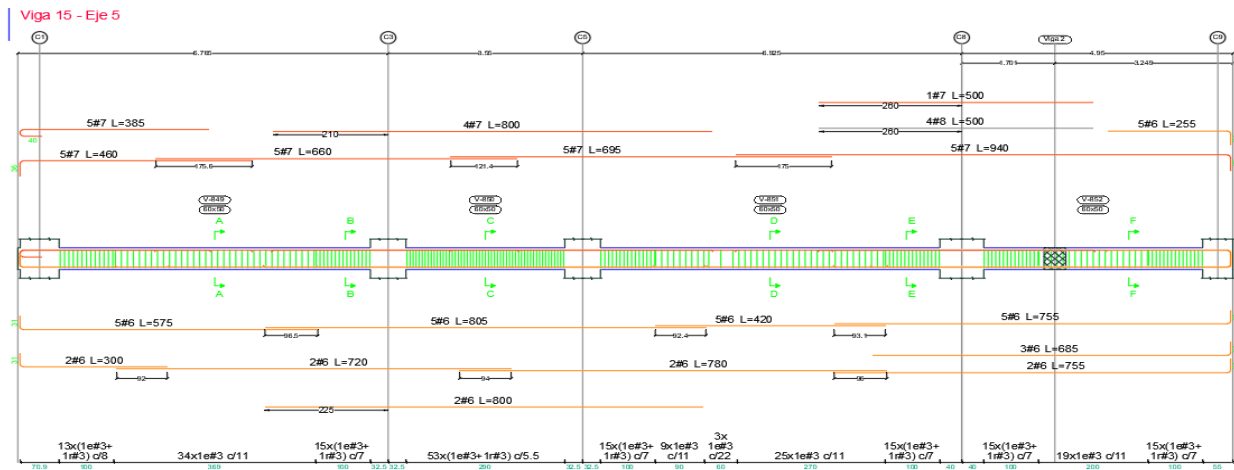


Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E)

DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E)

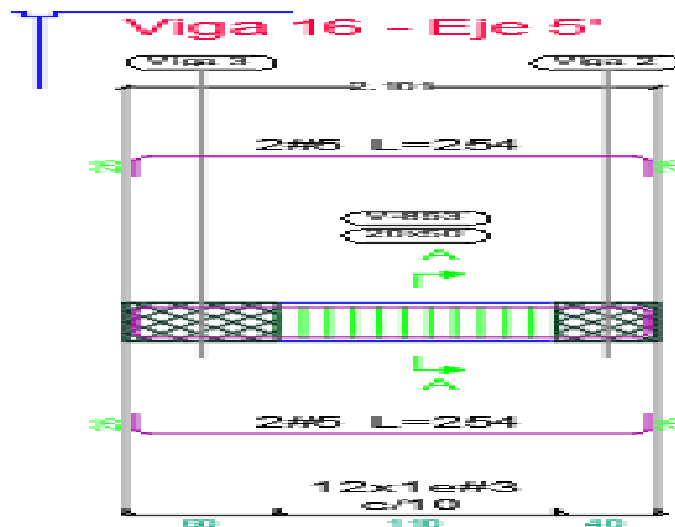


Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

• DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E)

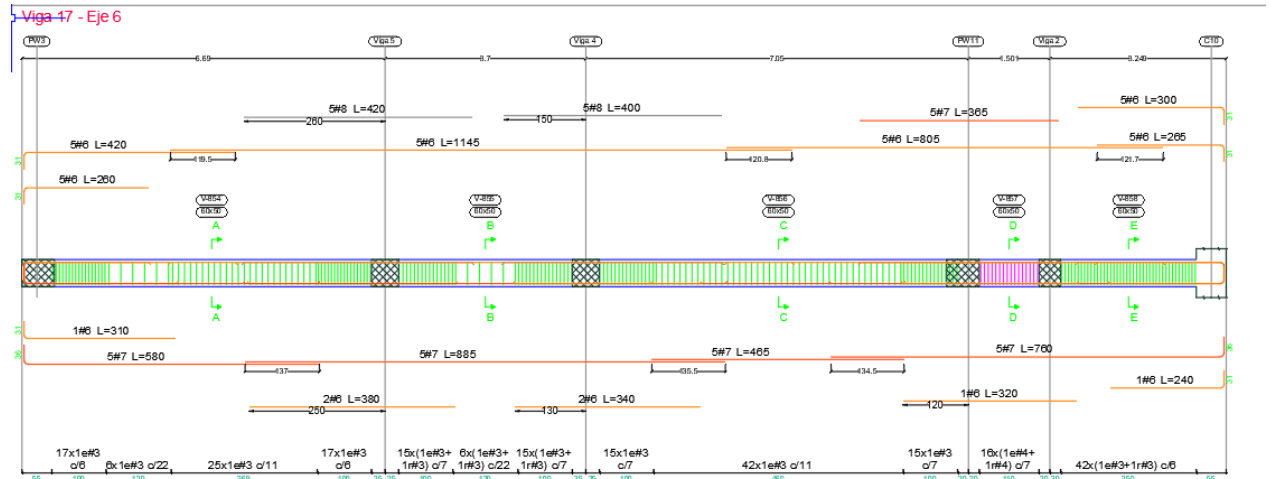


Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E)

ACERO ESTRUCTURAS

REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 5 dispuestas en 2 filas, espaciado .19 mts, acero transversal de varilla No 4 espaciado 0.15 mts dispuesto en dos filas, con estribos N°3.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 6 dispuestas en 2 filas, y acero transversal de varilla N°4 dispuesto en 2 filas, espaciado 0.20 mts, con estribos N°3.
- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°5 dispuestas en 2 filas, refuerzo transversal en varilla No 3 espaciados 0.10 mts en dos filas, con estribos N°3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°5 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal No 4 en 2 filas espaciadas 0.15 mt, con estribos N°3.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.25 mts, con estribos N°3.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 5 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 2 filas, con estribos No3.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas con espaciamiento 0.15 mts, con estribos No 4.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas, con espaciamiento 0.15 mts con estribos No 4.
- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.15 mts, con estribos No 4.
- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 5 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varillas No 4 en 2 filas espaciadas 0.25 mt, con estribos No4.

REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

conforman un ángulo de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, con batón de refuerzo en varilla lisa $\frac{3}{4}$ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{3}{16}$, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de $2\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, las ondas restantes la conforman un ángulo de $2 \times \frac{3}{16}$, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1" en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de $2 \times \frac{1}{8}$, las ondas restantes la conforman un ángulo de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, con bastón de refuerzo en varilla lisa $\frac{3}{4}$ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{1}{8}$, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{3}{16}$, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de $2 \times \frac{1}{8}$, las ondas restantes la conforman un ángulo de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, con bastón de refuerzo en varilla lisa $\frac{7}{8}$ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{1}{8}$, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{3}{16}$, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de $2 \times \frac{1}{8}$, las ondas restantes la conforman un ángulo de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, con bastón de refuerzo en varilla lisa $\frac{7}{8}$ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{1}{8}$, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de $2 \times \frac{3}{16}$, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de $2 \times \frac{1}{8}$, las ondas restantes la conforman

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO 8 N+31.00

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5 y 6, en la parte inferior varilla No 5 y 6, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.

REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+31.00 a N+34.90

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 5 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 5 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 5, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO N+ 31.00

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas A, A*, tienen una dimensión de 0.40 x 0.50; las vigas B, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen dimensión de 0.60x0.50 mt, las vigas C Y D tienen dimensión de 0.50x0.50, viga 3*, 4*, D* y D** tienen una dimensión de 0.30x0.50 con agregado máximo de ½".

CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso 8 N +31.00, con agregado máximo de ½" y microfibra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 9.

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 9.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 9.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 9.

La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 9.

La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 9.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 9.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 9.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

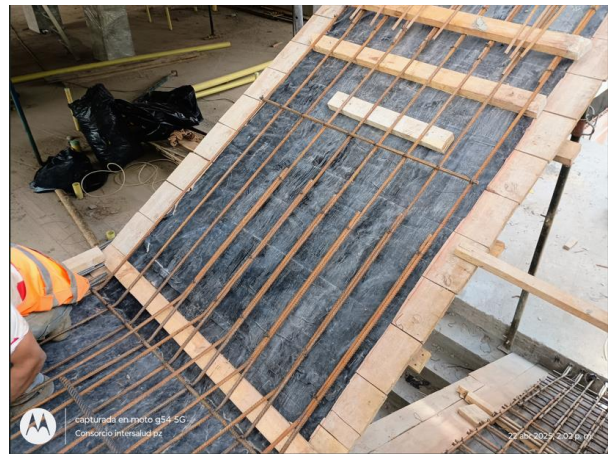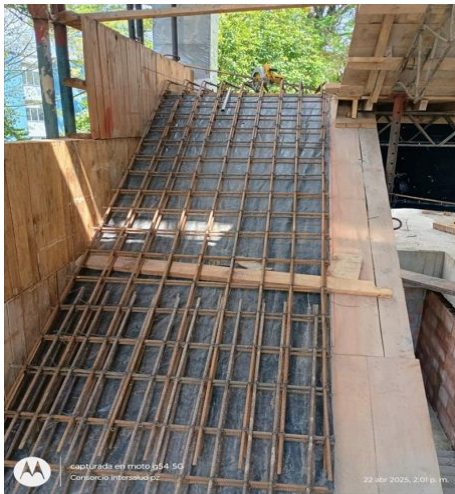

ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa GRADAS DE EMERGENCIA



ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa GRADAS CENTRALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



CONCRETO PARA ESCALERAS DE EMERGENCIAS 3000 PSI



CONCRETO PARA GRADAS CENTRALES 3000 PSI


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

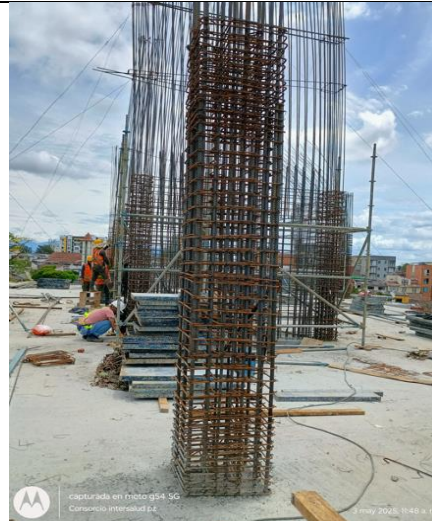

ACERO DE REFUERZO $F_y=420$ Mpa COLUMNAS



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1

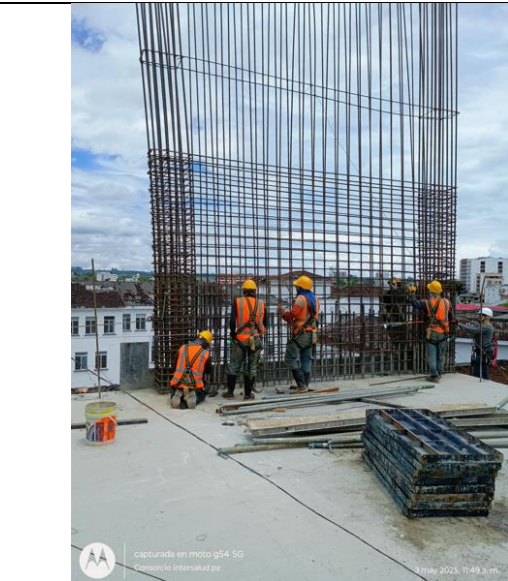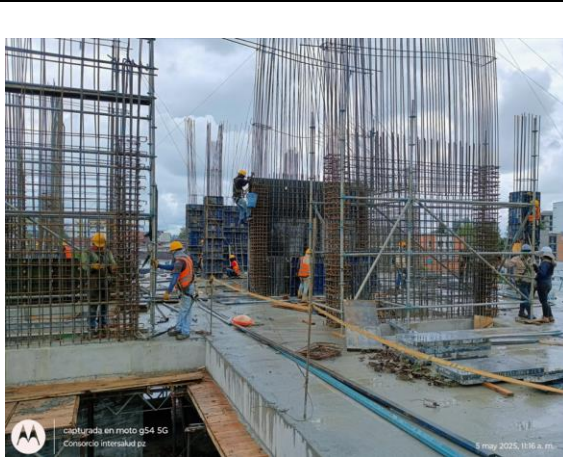

ACERO DE REFUERZO $F_y=420$ Mpa PANTALLAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



ACERO REFUERZO $F_y=420$ Mpa VIGAS JOIST

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa VIGAS ENTREPISO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



**LOSA DE ENTREPISO CTO 4000 PSI- MALLA ELECTROSOLDADAS 15X15 $F_u=550\text{MPa}$,
 $S_y=485\text{MPa}$**

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



VISTA GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



MAMPOSTERIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



RED SANITARIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado en obra y con lo estipulado en dichos documentos.

Para la verificación y seguimiento de lo anterior se hizo uso de flexómetros y calibradores para medir directamente las dimensiones, longitudes, diámetros y espaciamientos de los elementos estructurales y el acero de refuerzo en sitio. Esto incluyó la verificación de las vigas joist, las formaletas de vigas y losas, los aceros de la malla electrosoldada, los aceros de columnas y pantallas, y los aceros de las gradas.

Para realizar el control del concreto en sitio, se realizaron ensayos de asentamiento (Slump) y toma de muestras.

- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**


El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de agosto de 2025 del 37.12% frente un avance programado acumulado del 39.48%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de julio al 25 de agosto de 2025 es de 2.54% frente a un avance programado del 4.9%, por lo cual, se presenta un atraso del 2,36%.

Lo anterior, debido a que, no se han iniciado actividades correspondientes al componente eléctrico, aire acondicionado, acometidas de energía, subestación. Causado por lo que, a la fecha, no se ha definido el punto de conexión con el proveedor de energía, de lo cual, ya ha sido previamente solicitado mediante los oficios CIPZ-078-0154-2025, CIPZ-078-0367-2025, CIPZ-078-0384-2025, CIPZ-078-0385-2025 y demás ajustes requeridos a los diseños que se realizarían por parte del contratista según oficio de autorización del 22 de agosto del año en curso, enviado por la entidad.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	\$109,503,404	0.33%	\$363.707.100	1.12%
30-09-2024	\$858,324,856	2.16%	\$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	\$1.948.435.571	6.00%	\$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	\$2.636.884.000	8.12%	\$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	\$3.299.608.964	10.13%	\$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	\$4.715.214.428	14.52%	\$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	\$5.260.776.428	16.2%	\$5.260.776.428	16.2%
25-3-2025	\$6.189.530.785	19.06%	\$6.423.343.071	19.78%
25-4-2025	\$7.546.940.999	23.24%	\$7.579.414.928	23.34%
25-5-2025	\$8.917.340.785	27.46%	\$8.917.340.785	27.46%
25-6-2025	\$9.605.788.071	29.58%	\$9.605.788.071	29.58%
25-7-2025	\$11.229.484.499	34.58%	\$11.229.484.499	34.58%
25-8-2025	\$12.820.706.999	39.48%	\$12.054.322.284	37.12%
AVANCE	\$1.591.222.500	4.9%	\$824.837.785	2.54%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 18	

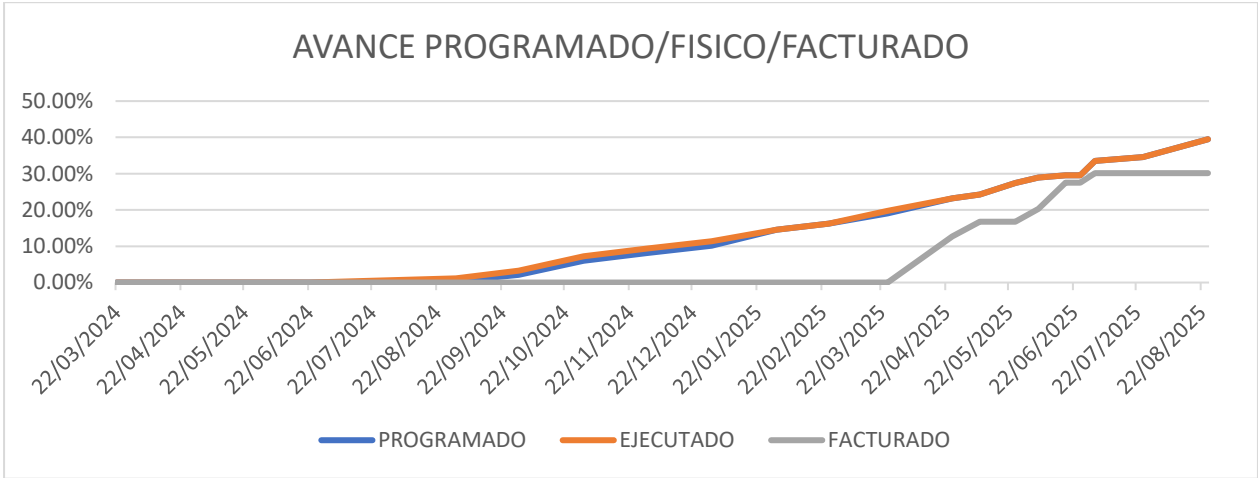

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo \$9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de agosto de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

AUTORIZACIONES DE PAGO		
PROVEEDOR	VALOR/CONCEPTO	ITEM PLAN DE INVERSION

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	\$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
2. FERRETERÍA GYJ	\$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
3. URIEL PALTA AMA	\$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo	Transporte
4. UBANER PEREZ	\$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
5. PEDRO ROMO	\$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo	Alquiler de equipos
6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
7. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
8. FERRETERÍA FERROESTACIÓN	\$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo.	Materiales
9. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	\$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
11. DIANA CAROLINA VIVAS	\$133.865.096 m/cte	Mano de obra
12. SILOGISTICA	\$103.240.000 m/cte	Transporte
13. LA ALIANZA GROUP SAS	\$309.835.612 m/cte.	Mano de obra
14. UBANER PEREZ	\$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo	Mano de obra
15. UBANER PEREZ	\$30.000.000 m/cte	Mano de obra
16. G Y J FERRETERIAS S.A.	\$71.110.589 m/cte	Materiales
17. IMCOMERSA LUD SAS	\$27.620.616 m/cte	
18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA	\$26.064.505 m/cte	
19.EQUIPAR GLEASON	\$29.741.279	Alquiler de equipos
20. SILOGISTICA S.A.S	\$21.600	Transporte
21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	\$1	Mano de obra
22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	\$34.228	Materiales

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 85,500,000.00	\$ 85.500.000.00	0.02%	\$ 0
2	TRANSPORTE	\$ 105,400,000.00	\$ 105.400.000.00	1.08%	\$ 0
3	MATERIALES	\$ 7,205,599,277.00	\$ 7,205.599.277.00	73.23%	\$ 0
4	MANO DE OBRA	\$ 2,345,679,294.00	\$ 2,345,679,293.00	24.08%	\$ 0
	TOTAL	\$ 9,742,178,571.00	\$ 9,742,178,571 .00	100%	\$ 0

Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidós (22) solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia.

Cabe destacar que, al término del periodo del 26 de julio al 25 de agosto de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".




INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1


**CONTRATO 358-2023
AVANCE FISICO**

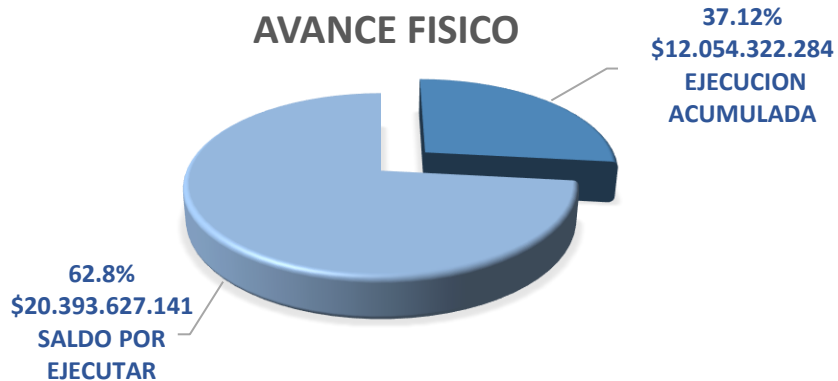

**CONTRATO DE OBRA
358-2023
AVANCE FINANCIERO**

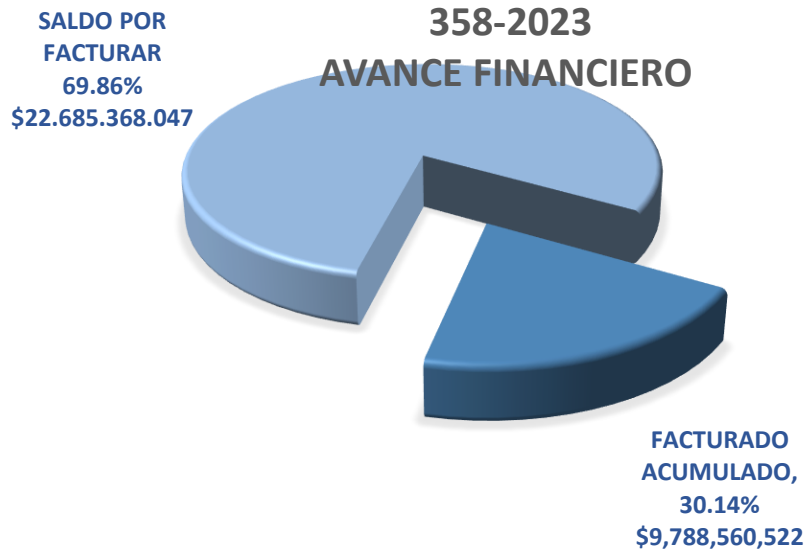

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

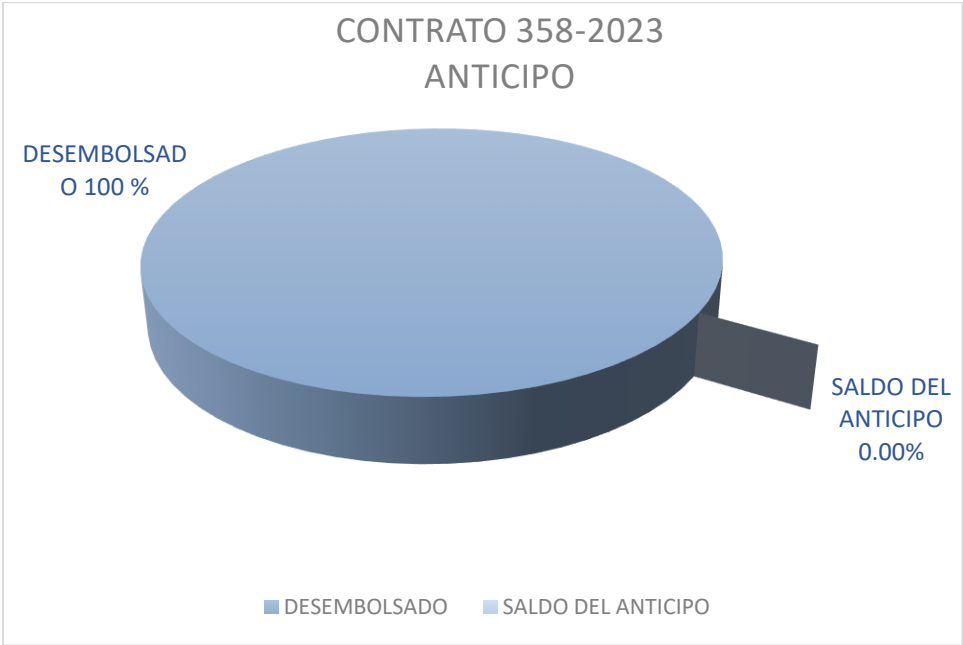


Desembolsado: \$9,742,178,571.0 m/cte	Anticipo \$ 9,742,178,571.00 m/cte
--	---

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024

BALANCE A LA FECHA 25-08-2025			BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR CONTRATO PPAL		\$ 1,280,412,030	VALOR ANTICIPO	-	-
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 1,280,412,030	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	-	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 385,938,068		SALDO POR AMORTIZAR	-	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 894,459,631				
SUMAS IGUALES	\$ 1,280,412,030	\$ 1,280,412,030	SUMAS IGUALES \$	-	-

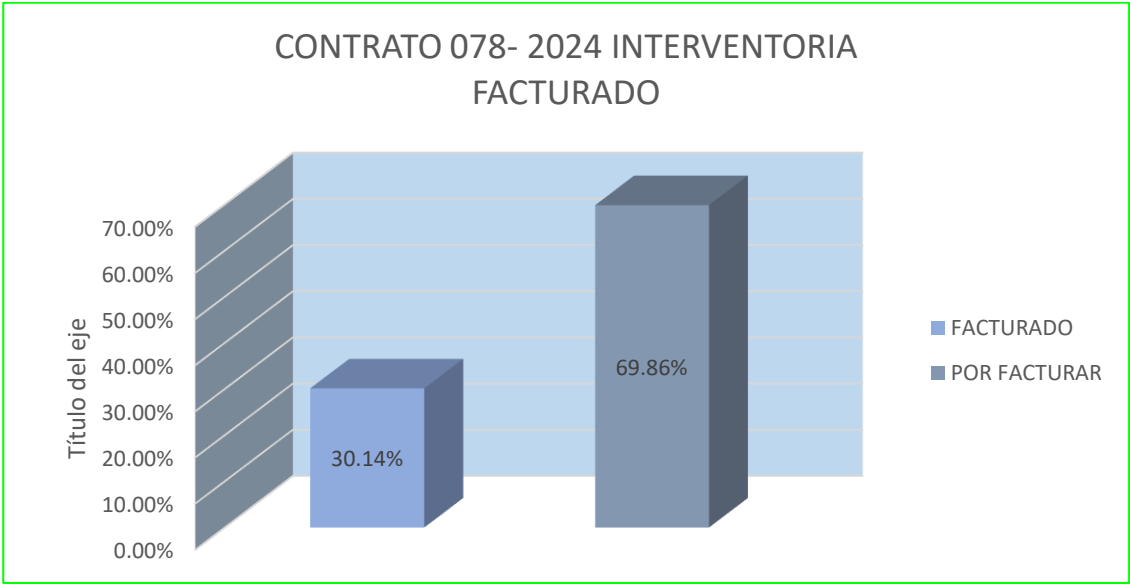

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del periodo del 26 de julio al 25 de agosto de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

PROGRAMA No 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la totalidad de las actividades autorizadas de aprovechamiento forestal, las cuales comprendieron tanto la tala de individuos arbóreos como la siembra de las plántulas exigidas en la resolución expedida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Sin embargo, el contratista manifestó no haber adelantado labores de mantenimiento de dichas plántulas, argumentando que el permiso ya había sido ejecutado al 100%. Frente a esta situación, la interventoría solicitó de manera formal los soportes técnicos y fotográficos que evidencien la supervivencia de las especies sembradas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida compensatoria. Es importante precisar que la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 establecen la obligatoriedad de realizar seguimiento a los procesos de restauración ecológica, así como la verificación del éxito de las siembras como condición fundamental para el cierre del permiso de aprovechamiento.

PROGRAMA No 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

En el frente de obra se observó la correcta instalación de recipientes diferenciados para la disposición de residuos sólidos, siguiendo el código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019, lo cual facilita la separación en la fuente y promueve el aprovechamiento de materiales reciclables. Asimismo, se evidenció la ubicación de dos puntos ecológicos estratégicamente dispuestos dentro del proyecto. Como parte de las

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

acciones de fortalecimiento en gestión de residuos, el contratista desarrolló una capacitación dirigida a 27 colaboradores, orientada al manejo adecuado de residuos ordinarios y especiales, en cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1076 de 2015.

No obstante, en la inspección se identificó la dispersión de residuos de construcción y demolición (RCD) en diferentes áreas de la obra, especialmente en pisos superiores y zonas de tránsito, lo cual genera riesgos en la seguridad de los trabajadores y en la organización del frente de obra. Igualmente, se constató que el ducto de evacuación de RCD no cuenta con recubrimiento después del cuarto piso, incrementando el riesgo de caída de materiales desde altura. De acuerdo con la Resolución 472 de 2017, es obligación de los generadores implementar planes de gestión integral de RCD que aseguren su almacenamiento temporal, recolección, transporte y disposición final por gestores autorizados.

Registro fotográfico de recipientes



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1



Se evidencia el uso del punto de acopio de residuos sólidos, con materiales que son susceptibles de transformación el cual será entregado a un gestor autorizado.



En cuanto al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se evidencia la dispersión de este tipo de materiales en varios sectores de la obra, incluyendo zonas de tránsito, áreas de trabajo y espacios próximos a cerramientos provisionales, lo que no solo afecta la organización del frente de obra, sino que también representa un riesgo para

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

la seguridad de los trabajadores y un posible incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

La mayor parte de RCD se encuentran en los pisos superiores, donde se evidencia la falta de evacuación de dichos residuos. También se evidencia que el ducto de evacuación de los mismos debe ser acondicionado para los pisos superiores, ya que no presenta cubrimiento después del piso 4 lo que representa un riesgo para los pisos superiores.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

PROGRAMA No 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Los recorridos de seguimiento evidenciaron un cumplimiento parcial en el manejo y almacenamiento de los materiales de construcción. Si bien se observaron coberturas temporales sobre los materiales pétreos para un tiempo máximo de tres jornadas, aún se presentan sectores con material expuesto a la intemperie, lo que representa riesgos de dispersión de partículas y contaminación cruzada. Positivamente, se resalta la adecuada organización del acero de refuerzo, bloques y formaletas, que fueron dispuestos en áreas de bajo tránsito peatonal y vehicular, disminuyendo riesgos de accidentes. Estas acciones se encuentran alineadas con lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019, que establece medidas preventivas en seguridad y salud laboral.

Se recomienda reforzar las medidas de control mediante humectación de superficies, cubrimiento permanente de materiales sueltos y la instalación de señalización visible en las zonas de acopio. Todo lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 948 de 1995 y el Decreto 1076 de 2015, que fijan parámetros para el control de emisiones contaminantes en proyectos de construcción.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 18

Documento
Versión 1



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

PROGRAMA No 4 PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

En el frente de obra se implementaron coberturas plásticas tipo poliuretano, con el fin de evitar procesos erosivos y la degradación del suelo natural. Durante los recorridos no se evidenció almacenamiento de residuos peligrosos (RESPEL), lo que refleja una adecuada gestión de sustancias como combustibles, aceites o solventes. Esta práctica se encuentra enmarcada dentro de la Ley 1252 de 2008, la Resolución 1362 de 2007 y la Ley 99 de 1993, que regulan la prevención de la contaminación del suelo y el manejo seguro de residuos peligrosos.

A pesar de los avances, se recomienda fortalecer la impermeabilización de las áreas destinadas a productos químicos, disponer bandejas de contención en almacenamiento de líquidos, implementar demarcación visible en las zonas críticas y realizar inspecciones periódicas de posibles filtraciones, en coherencia con los lineamientos de la normativa vigente y los principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

PROGRAMA No 5: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.

Durante el periodo reportado, no se registraron visitas por parte de universidades, centros académicos u otro tipo de personal externo a la obra. No obstante, se constató que el contratista mantiene disponibles los elementos de protección personal (EPP), como cascos, chalecos reflectivos y, en algunos casos, gafas de seguridad, almacenados adecuadamente en un área de fácil acceso y en condiciones óptimas para su utilización inmediata. Esta preparación evidencia un enfoque preventivo y el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos para el ingreso de personas externas, ya sea de manera programada o imprevista.

Esta práctica está en concordancia con lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que establece los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre ellos, la entrega obligatoria de EPP a cualquier persona que ingrese a zonas con riesgos laborales. Asimismo, se ajusta a los principios del Decreto 1072 de 2015, el cual contempla la responsabilidad de proporcionar ambientes seguros para todos los trabajadores y visitantes.

Adicionalmente, se verificó la disponibilidad de un botiquín de primeros auxilios tipo B, dotado con los insumos médicos básicos exigidos por la normativa, una camilla rígida para la movilización de personas lesionadas, un extintor con su carga vigente y señalización correspondiente, y una reserva de EPP para su uso inmediato en situaciones de emergencia.

Se sugiere al contratista continuar con la actualización permanente de los protocolos de ingreso, implementar un sistema de registro de visitantes y fortalecer las inducciones en seguridad dirigidas a terceros. Estas acciones contribuirán al cumplimiento de la normativa aplicable y a la prevención de incidentes en caso de visitas técnicas, académicas o institucionales a la obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1



PROGRAMA No 6. REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto. Sin embargo, continúan en funcionamiento los canales de comunicación previamente establecidos para garantizar la atención oportuna de inquietudes, sugerencias y reclamos de la ciudadanía. Entre estos mecanismos se destaca el correo electrónico habilitado por el contratista, el cual permanece activo para recibir mensajes en cualquier momento, así como el buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), instalado en el acceso principal de la obra, claramente identificado y accesible para los habitantes del sector cercano.

Estas alternativas permiten mantener el vínculo con la comunidad y asegurar el ejercicio del control social y la supervisión sobre el desarrollo del proyecto, incluso en aquellos momentos en los que no se programan espacios de interlocución directa. Es fundamental continuar incentivando la participación ciudadana mediante la difusión constante de estos canales a través de medios impresos y digitales, con el acompañamiento de las autoridades locales y líderes comunitarios.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Adicionalmente, se sugiere fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de los medios de participación, a través de un registro organizado de las comunicaciones recibidas, la identificación de temas frecuentes, el análisis de las inquietudes manifestadas y la respuesta oportuna, clara y documentada a cada una. Esta práctica no solo da cumplimiento al Plan de Manejo Social y Ambiental del proyecto, sino que también fomenta la confianza comunitaria y el principio de transparencia y rendición de cuentas, en concordancia con la Ley 1757 de 2015 sobre participación ciudadana y el Decreto 1077 de 2015, en lo relativo a la gestión de proyectos de infraestructura con implicaciones sociales.

Finalmente, se sugiere evaluar la posibilidad de reanudar encuentros presenciales o virtuales en los siguientes periodos, siempre y cuando las condiciones logísticas y de seguridad lo permitan, con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la comunidad y promover una gestión social participativa e incluyente. Se ratifica que el canal para la atención de PQRs continúa abierto y disponible para la comunidad.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

PROGRAMA No 7. SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En el seguimiento realizado, se verificó la instalación de barreras físicas y mallas de protección en los niveles 2 al 7 de la estructura, así como cerramientos perimetrales que restringen el acceso a áreas de alto riesgo. Estas acciones son coherentes con los lineamientos del PMA, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la Resolución 1409 de 2012 sobre trabajo seguro en alturas.

Se recomienda reforzar las inspecciones periódicas para verificar la estabilidad de las mallas y cerramientos, implementar señalización fotoluminiscente y planes de evacuación actualizados, además de fortalecer la capacitación al personal en prevención de accidentes.

Estas intervenciones corresponden a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y cumplen con los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), particularmente en lo relacionado con la prevención de accidentes laborales y el control de peligros asociados a la ejecución de obras civiles.


Adicionalmente, se observaron cerramientos perimetrales en diferentes áreas del proyecto, los cuales buscan restringir el acceso a zonas de alto riesgo, delimitando adecuadamente las áreas de intervención activa. Estos cerramientos permiten mantener un entorno más seguro y organizado dentro del frente de trabajo, y evidencian una gestión adecuada del riesgo por parte del contratista.

Se recomienda continuar con la implementación y mantenimiento de estas medidas de seguridad, así como realizar inspecciones periódicas para verificar su efectividad, estabilidad y correcto uso. De igual manera, es pertinente reforzar los procesos de sensibilización y formación del personal en temas de prevención de riesgos, conforme a

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

lo estipulado en la Resolución 1409 de 2012, relacionada con trabajo seguro en alturas, y demás normas aplicables en materia de seguridad industrial.

A continuación, se presenta registro fotográfico que da cuenta de las acciones descritas.

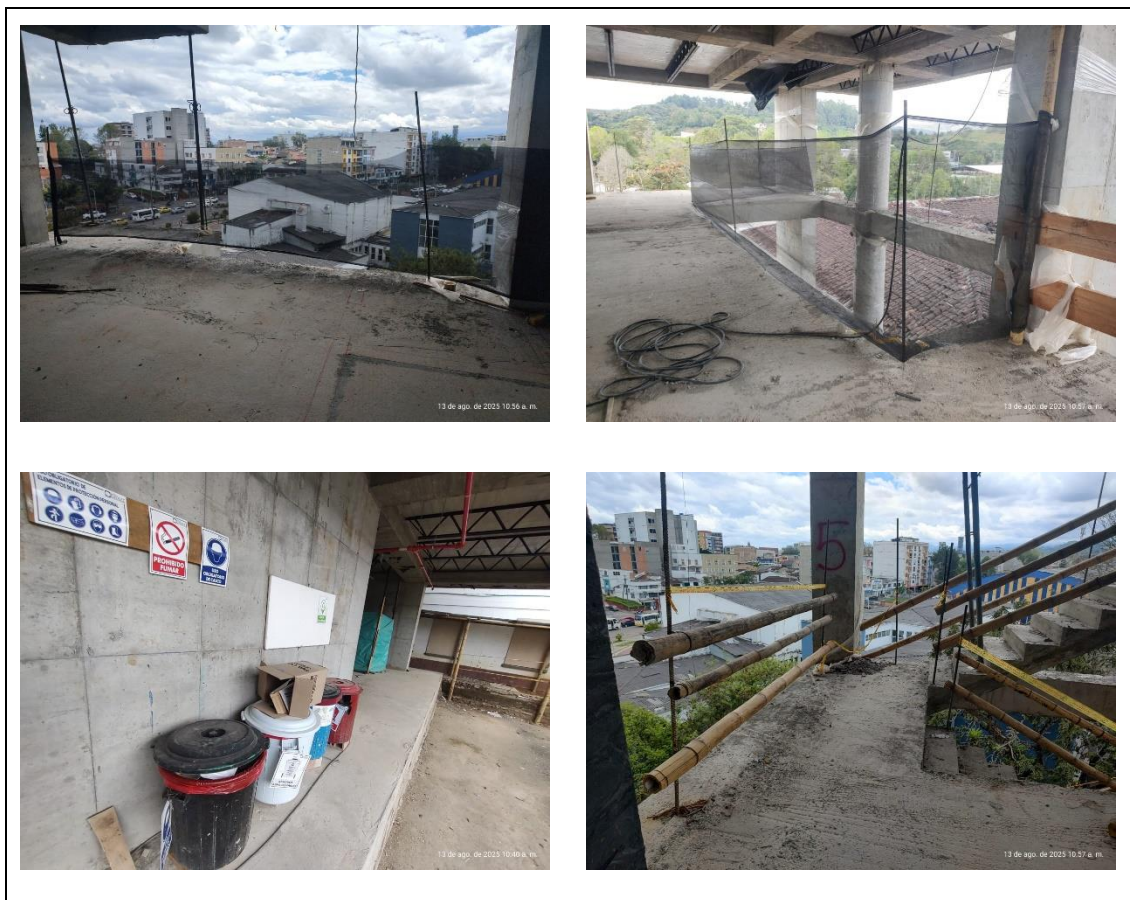

PROGRAMA No 8 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Se observa un avance significativo en la gestión de las aguas estancadas que, en periodos anteriores, se acumulaban en el área lateral contigua al Hospital San José,

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

específicamente en el sector donde se encontraban ubicados los asesores de la torre. La interventoría verificó una reducción notable en el volumen de agua retenida, así como el retiro de residuos sólidos presentes en dicha acumulación, lo cual representa una mejora frente a las condiciones previamente reportadas.

No obstante, se recomienda al contratista intensificar las labores de drenaje en esta zona, con el fin de asegurar el secado completo de la fosa y evitar posibles afectaciones por proliferación de vectores, generación de malos olores o deterioro de las condiciones del terreno. La continuidad en estas acciones contribuirá a mantener condiciones ambientales y sanitarias adecuadas en el entorno de la obra, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en concordancia con la normatividad vigente en materia de salud pública y control de aguas residuales.

También se evidencio la mejora de las llaves de agua que anteriormente presentaban goteos por daños en sus empaques.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE AGOSTO DE 2025

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, es requisito fundamental contar con la aprobación oficial del documento PMA. A la fecha, dicho documento aún se encuentra en proceso de ajustes por parte del contratista, lo que ha impedido su validación final por parte de la interventoría y las autoridades competentes.

Si bien se ha evidenciado la ejecución de varios programas y actividades ambientales en el área del proyecto, la ausencia de un PMA aprobado impide definir con precisión los indicadores, metas y cronogramas oficiales que permitan medir objetivamente el nivel de cumplimiento. En consecuencia, hasta tanto no se cuente con la versión definitiva y avalada del PMA, no es posible establecer porcentajes formales de avance en la ejecución de los compromisos ambientales.

Esta situación resalta la importancia de agilizar el proceso de revisión y ajuste del documento, ya que su aprobación no solo es una exigencia normativa, sino que también es una herramienta clave para el seguimiento técnico, el control ambiental del proyecto y la toma de decisiones informadas frente a la gestión de impactos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 26 julio al 25 de agosto 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL		
No.	NORMATIVA	ASPECTO LEGAL
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales correponden al pago del mes de Julio 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9490003040	JULIO	04/08/2025	5	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL					
2	9490003544	JULIO	04/08/2025	12	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL					
3	9489987764	JULIO	4/08/2025	1	APORTES EN LINEA
4	9489120920	JULIO	30/07/2025	1	APORTES EN LINEA
5	7979008559	JULIO	14/07/2025	1	APORTES EN LINEA
6	9489771994	JULIO	31/07/2025	1	SOI
7		JULIO		1	APORTES EN LINEA
8	9489195575	JULIO	30/07/2025	1	APORTES EN LINEA
9	4614622330	JULIO	28/07/2025	1	APORTES EN LINEA
10	9489294697	JULIO	8/08/2025	1	SOI
11	9489987764	JULIO	4/08/2025	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION					
13	NO SE PRESENTA PLANILLAS INDEPENDIENTE			1	APORTES EN LINEA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
	UBANER PEREZ GOMEZ				
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ					
14	9488144503	JULIO	2025/08/03	21	APORTES EN LINEA
15	INGRESOS	JULIO		1	
16	RETIRO	JULIO		2	
CONTRATIST- TOPOGRAFIA					
17	9488033103			2	NO PRESENTA PLANILLAS VIGENTES AL PERIODO
CONTRATIST- TOPOGRAFIA- INDEPENDIENTE					
18	INDEPENDIENTE	JULIO		0	SIN NOVEDAD
19	INGRESOS	JULIO		0	SIN NOVEDAD
20	RETIRO	JULIO		0	SIN NOVEDAD
CONTRATISTA- MAMPOSTERIA1-2-3					
21	TRABAJADORES	JULIO		6+3=9	NO PRESENTA PLANILLAS VIGENTES AL PERIODO
22	INGRESO	JULIO		2+1=3	SE RELACIONA DOCUMENTOS
23	RETIRO	JULIO		0	SIN NOVEDAD
CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS					
24	TRABAJADORES	JULIO		6	NO PRESENTA PLANILLAS VIGENTES AL PERIODO
25	INGRESO	JULIO		0	SIN NOVEDAD

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA	OPERADOR
26	RETIRO	JULIO		0	SIN NOVEDAD
TOTAL				59	

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
1	WILINSON ANDRES QUILINDO CHARO	1.007.410.693	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUC A
2	HARLEY RUIZ GAVIRIA	76.323.117	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUC A
3	JUAN CARLOS MENESES ARBOLEDA	1.004.248.033	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUC A
4	JOSE REINEL CONEJO SANCHEZ	4789024	AIC	PORVENIR	SURA	
5	DIANA MAGALI ARANGO CORREA	1.144.138.374	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
6	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10.302.884	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
7	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
8	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	LORENA FALLA FALLA	1.019.092.020	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
10	JULIO CESAR MAYA BASTIDAS	98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
11	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
12	ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ	34.533.693	SANITAS	PENS VEJ ACT	SURA	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

13	JULIAN ANDRES SANCHEZ SANTACRUZ	76.332.823	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO						
14	LAURA TATIANA OLIVEROS AVIRAMA	1.061.804.547	ASMET SALUD	-	SURA	
15	JUAN SEBASTIAN SENDOYA VIVEROS	1.002.819.784	NUEVA EPS	-	SURA	
16	FABIAN ANDRES VIVAS CEBALLOS	10.498.268	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- RETIRO						
0	SIN NOVEDAD					
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP						
17	PEREZ GOMEZ UBANER	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
18	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
19	LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
20	MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
21	ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES	1081595473	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
22	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
23	WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
24	WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
25	WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
26	DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
27	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
28	CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
29	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
30	CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
31	JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
32	ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

33	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
34	OBER FERNEY SANCHEZ SOL	1061761500	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
35	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
36	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
37	JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ	1061017769	SANITAS	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
38	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76334379	SANITAS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
39	PAULINO ANGULO MUÑOZ	76336476	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS						
40	JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
41	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS						
CONTRATISTA TOPOGRAFIA						
42	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
43	FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- RETIRO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
44	JAIME JUNIAN MUÑOZ GUASAMALLI	4.617.575	SURA	COLPENSIONES	SURA	
45	JOSE CLAUDIO IETER RENGIFO	76.190.347	ASMED SALUD	COLPENSIONES	SURA	
46	LUISA FERNANDA MORENO ORTEGA	1.088.651.098	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	
47	ROLANDO BURBANO CALIBIO	15.571.993	SANITAS	PORVENIR	SURA	
48	FERNANDO ANDRES CHACON CABARICO	1.130.607.657	SANITAS		SURA	
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- INGRESOS						
49	JULIAN ANDRES VALENCIA	1002964418	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- RETIROS						
CONTRATISTA - MAMPOSTERIA						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"



Documento
Versión 1

INFORME MENSUAL No. 18

CONTRATISTA – MAMPOSTERIA						
50	WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO	76.325.832	SANITAS	PORVENIR	SURA	
51	JESUS EDUARDO GUERRERO VIERA	PPT 5403220	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
52	FRANCISCO JAVIER URIBE VALENCIA	1.061.707.344	SANITAS	PORVENIR	SURA	
53	JESUS ALDEMER VELASCO GARZON	1.002.960.492	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
54	JULIO CESAR DORADO MUÑOZ	1061817436	ASMED SALUD	COLPENSIONES	SURA	
55	OLIVER ISAI DORADO MUÑOZ	1118308478	SOS	PORVENIR	SURA	
56	JOSE GUILLERMO GUZMAN OROZCO	10.296.024	SANITAS		POSITIVA	
57	EDINSON EDUARDO PAZ MENA	10611710033	ASMED SALUD	PORVENIR	SURA	
58	EDWIN OSWALDO VELASCO HURTADO	1.061.693.732	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- INGRESO						
0						
0						
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- RETIRO						
59	JOSE ARTURO PADILLA PAY	10.541.497	NUEVA EPS	PENSIONADO	POSITIVA	
TOTAL 59						

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

RELACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO							
CONTRATISTA – ALKIEQUIPOS DEL CAUCA L&L SAS							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF	
1	JUAN MERCADO	1.143.266.051	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		
2	FRANK MARTINEZ	1.143.137.874	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		
3	CRISTHIAN FERLEY ASTAIZA BERMUDEZ	1.061.698.522	ASMETSALUD	PORVENIR	SURA		
4	CRISTIAN DAVID DELGADO MOLINA	1.061.787.468	SANITAS	PROTECCION	SURA		
5	RODRIGO IVAN LEMOS MERA	10.294.152	S.O.S	COLPENSIONES	SURA		
6	JOSE ANDRES LEMOS MERA	1.002.777.501	EMSSANAR	PORVENIR	SURA		
7	NORBERTO ORTIZ	76.330.136	SANITAS	PROTECCION	SURA		
8	DIEGO LUIS BARCO RIVAS	1.010.148.551	S.O.S	PORVENIR	SURA		
9	YHON ELLIOT OLIVERO CHAVERRA	1.107.534.922	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		
10	FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	SANITAS	PORVENIR	SURA		
TOTAL 10							

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	14
Antiguo	48
Retiro	0
Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuenta para los datos estadísticos)	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	10
TOTAL, DE PERSONAL	69
TOTAL, DE PERSONAL SIN PERSONAL TRANSITORIO	59

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:
FORMULA	$\frac{\text{Nº de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{\text{No de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los siguientes ingresos:

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	Consortio EVOLET	Ingreso /no se relaciona exámenes de ingreso	2
2	PEREZ GOMEZ UBANER	Ingreso / se relaciona exámenes de ingreso sin recomendaciones	1
3	MAMPOSTERIA- JOSE MELLIZO	Sin Novedad	0
4	MAMPOSTERIA- GUILLERMO GUZMAN	Sin Novedad	0
5	WILLIAM MUÑOZ	Ingreso /no se relaciona exámenes de ingreso	0
6	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	Sin Novedad	0
7	HSA INGENIERIA SAS	Sin Novedad	1
8	Personal transitorio	Novedad de trabajo	10
TOTAL			14

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP's mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1, pr-04Fr-02, Entrega de Dotación y Elementos de Protección, relacionados en la carpeta SST. para los trabajadores de los subcontratistas UBANER PEREZ GOMEZ y HSA INGENIERIA SAS del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Entrega de dotación y EPP al personal
FORMULA	$\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP}}{\text{Numero de trabajadaores contratados}} \times 100 = 100\%$

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	ACTIVIDAD	No. TOTAL, DE TRABAJADORES	OBSERVACIONES
1	Consortio EVOLET	ADMINISTRATIVOS	17	
	PEREZ GOMEZ UBANER	ESTRUCTURAL	24	
2	JOSE MELLIZO	MAMPOSTERIA- 1	0	
3	GUILLERMO GUZMAN	MAMPOSTERIA-2	6	
	WILLIAM MUÑOZ	MAMPOSTERIA-3	4	
	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	TOPOGRAFIA	2	
4	HSA INGENIERIA SAS	HIDRAHULICOS	6	
5	TRANSITORIOS	OPERARIOS	10	NO SE TENDRA EN CUENTA PARA CALCULAR LOS DATOS ESTADISTICOS.
TOTAL			69	
TOTAL, SIN PERSONAL TRANSITORIO			59	

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL. La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, el ingreso de 7 colaboradores, y se evidencia el registró de inducciones en el formato de entrenamiento, correspondientes al periodo del Consorcio EVOLET y sus contratista de 6 colaboradores.

- MAMPOSTERIA- GUILLERMO GUZMAN: 3
- MAMPOSTERIA- WILLIAM MUÑOZ: 3
- HSA INGENIERIA SAS: 1

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Cobertura Inducción y reinducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 14}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes } 14} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

FORMULA	$\frac{\text{No.de Inducciones y reinducciones ejecutadas } 14 + 0}{\text{No.de Inducciones y reinducciones programadas } 14 + 0} \times 100 = 85\%$
----------------	--

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 4 actividades de capacitación con el área SST, con el tema asociado a la atencion de emergencias, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitación del personal
FORMULA	$\frac{\text{No.de trabajadores prom asisten capacitación al mes } 30}{\text{No.de trabajadaores en el mes } \text{PROMED}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No.de capacitaciones ejecutadas } 4}{\text{No.de de capacitaciones programas } 4} \times 100 = 100\%$

COMITÉ PARITARIO DE SST.

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADO RES ASISTENTES	No. TRABAJADO RES PROGRAMA DOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	24/07/2025	PELIGRO MECANICO	34	34	100
2	31/07/2025	EVALUACION CAPACITACIONES	25	25	100
3	14/08/2025	RESIDUOS PELIGROSOS	27	27	100
4	15/08/2025	PREVENCION RIESGOS EN ALTURAS	34	34	100
PROMEDIO			30	30	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

En el informe presentado para el periodo correspondiente se evidencia el acta de la reunión del COPASST del mes de agosto con fecha del 12 del 2025.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

El contratista aclara que por el número de personal dependiente que es inferior a 10 colaboradores, no está obligado a su conformación, se relaciona lo comentado que lo justifica: *"Según la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo de Colombia, modificada por la Resolución 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral es obligatorio para: • Empresas públicas y privadas con 10 o más trabajadores. Las empresas sí debe cumplir con el deber general de prevenir el acoso laboral y promover un ambiente sano, conforme a la Ley 1010 de 2006".*

Plan de acción propuesto por el contratista para la intervención en caso de acoso laboral:

Plan de Gestión:

- Se realizarán periódicamente charlas al personal enfocadas en temas como primeros auxilios emocionales, el respeto interpersonal y la importancia de mantener un ambiente laboral sano y equilibrado.
- Para la atención de situaciones relacionadas con la convivencia laboral, se habilitará un canal confidencial mediante un buzón físico ubicado en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual será revisado semanalmente. En caso de presentarse alguna eventualidad, se garantizará la confidencialidad del proceso.
- Se dejará constancia del caso y se realizará el seguimiento correspondiente con el apoyo del prevencionista de SST, el jefe inmediato y la representante legal del consorcio.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- Se documentarán las acciones correctivas adoptadas, los compromisos adquiridos y el seguimiento a su cumplimiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Imagen No. 1, 2, 3 Capacitación Peligro mecánico, Peligro en riesgo en altura, Evaluación de capacitaciones <i>FUENTE: CONSORCIO EVOLET</i>		

El contratista en el periodo no relaciona situaciones presentadas asociadas a acoso laboral.

AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO			
No.	ORIGEN	EMPRESA	TIEMPO REPORTADO
1	ACCIDENTE LABORAL	SIN NOVEDAD	1
2	INCAPACIDAD X A. T	CONSORCIO EVOLET, UBANER	12+12+13=37
3	ENFERMEDAD LABORAL	SIN NOVEDAD	0
4	INCAPACIDAD X A. L	SIN NOVEDAD	0
5	ENFERMEDAD COMUN	SIN NOVEDAD	0
6	PERMISOS	UBANER PEREZ GOMEZ	25 DIAS
7	INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS	SIN NOVEDAD	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

TOTAL, DE AUSENTISMO	62 DIAS
-----------------------------	----------------

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 21 Julio – 20 Agosto 2025	
DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	59
Número de accidentes laborales durante el periodo	1
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	12+12+13=37
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante el periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	3+1=4
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	216+37=253
Frecuencia de Accidentalidad = = <u>No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100</u> No de trabajadores en el mes	1/59*100 =1.6%
Severidad de Accidentalidad = <u>No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes</u> *100 # de trabajadores en el mes	37+0/59*100=62 %
Índice de lesiones incapacitantes = lfxIS / 1000	1.6*62/1000 = 0,0992
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	37/25*100 =148

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

Como parte del plan de capacitaciones se evidencia mediante registro fotográfico la realización de pausas activas en las áreas operativas y administrativas.

Se presenta en el periodo un accidente laboral asociado al riesgo de manejo de cargas, posturas forzadas con un total de 12 días de incapacidad del señor PEREZ GAVIRIA UBANER del día 30/07/2025.

Narración de los hechos:

El trabajador se encontraba cargando unas piezas de andamio para trasladarlas de un lugar a otro, al levantar la carga sintió un tirón en la espalda baja, lo que le causó dolor en el momento, pensó que se le iría pasando, pero al día siguiente le empezó a molestar al agacharse y mientras caminaba y manifestó no haber podido dormir por el dolor, se realiza reporte y se traslada el colaborador a un centro asistencial.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Relación de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos

La interventoría verifica que se anexa los permisos de los subcontratistas así:

ITEM	EMPRESA	REGISTRO	No.	
1	Consorcio EVOLET	40.V2	1. 8 AL 9 DE AGOSTO 2. 11 AL 15 DE AGOSTO	
2	GUILLERMO GUZMAN	Sin codificar	1. 4 AL 9 DE AGOSTO 2. 11 AL 16 DE AGOSTO	
3	H.S.A INGENIERIA S.A.S	SST-Pr-02-Fr.01- ATS SIN CODIFICAR- PERMISOS	1. 4 AL 9 DE AGOSTO 2. 11 AL 16 DE AGOSTO	
4	INGENIO TOPOGRAFICO	FOR-SI-004	1. 1 /8 /2025 2. 2 /8 /2025 3. 4/08/2025 4. 5 /8 /2025	5. 8 /8 /2025 6. 11/8/2025 7. 12/8/2025
5	VIGA TEC	F-SST-33 F-SST-24	1. 21/07/2025 AL 25/07/2025	
6	WILLIAM MUÑOZ	F-SST-TA-33	1. 11/07/2025 AL 16/07/2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 18	

	CONSTRUCCIONES PEREZ	SST-FT-01 SST-FT-02	1. 21 AL 26 JULIO 2025 2. 28 JULIO AL 2 AGOSTO 2025 3. 4 AL 9 DE AGOSTO 4. 11 AL 16 DE AGOSTO
--	----------------------	------------------------	--

La interventoría relaciona la gestión presentada por el contratista:

La intervención envía oficio Radicado No. CIPZ-078-0343-2025 el día 15 de julio del 2025, solicitado la inclusión por parte del consorcio EVOLET de la revisión de las medidas preventivas colectivas mediante inspecciones y estas sean anexadas al informe correspondiente del periodo, la interventoría verifica que se anexan las inspecciones solicitadas.

ORDEN Y ASEO

La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden y aseo, se evidencia la realización de jornadas de orden y aseo en los pisos superiores, pero se continúan con los requerimientos permanente.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No. 3 y 4. Orden y Aseo en Obra

FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- agosto 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Imagen No. 5, 6 y 7. Disposición de recipientes para recolección de residuos del baño, según su clasificación, Servicios de baños para el personal de obra.

FUENTE: propia -Informe CONSORCIO EVOLET- agosto 2025

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de emergencia, son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina -administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra
---	---	-------------------------------

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos

BRIGADA DE EMERGENCIA

El CONSORCIO EVOLET cuenta con la brigada de emergencia conformación por los siguientes integrantes:

BRIGADA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
JEFE DE BRIGADA	Jesús Trubal	76.334.339	JESUS TRUBA
JEFE DE EVACUACIÓN	Guillermo León Escobar	79.3395308	Guil.
BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	Ubner Perez	1061600546	Ubner P.
BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Ricardo Bolaños	4754652	Ricardo
PERSONAL DE APOYO	Jose Revelo	1061725247	Jose Revelo

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacidad de respuesta
FORMULA	$\frac{\text{Numero de emergencias atendidas oportunamente}}{\text{Numero de emergencias presentadas}} \times 100 = N.A.$
INDICADOR	% de simulacros realizados
FORMULA	$\frac{\text{Numero de simulacros efectuados}}{\text{Numero de simulacros programados}} \times 100 = N.A$

INSPECCIONES.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, la programación del plan de trabajo SG-SST para este año, las inspecciones realizadas fueron:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- Inspección andamios, escaleras con fecha del 12 de agosto del 2025, con registro SST-FT-10, por parte del consorcio EVOLET
- Inspección de EPP, realizada el día 5/08/2025, con registro CV-SGSST-63.5 V.1.
- Inspección de preoperacional de equipo de protección contra caída, realizada el día 11 al 15 del 08/2025, con registro SST-FT-03, por parte del consorcio EVOLET
- Inspección general de obra, realizada el día 30/07/2025, con registro CV. SGSST-63.7-V1, por parte del consorcio EVOLET.
- Inspección general de Oficina, realizada el día 12/08/2025, con registro CV. SGSST-63.7-V1, por parte del consorcio EVOLET
- Inspección de herramientas y equipos menores, realizada el día 01/08/2025, registro CV-SGSST-63.6-V1.
- Inspección para grúa pluma y accesorios, realizada el día 08/08/2025, radicado F-VI-44
- Se verifica inspección de herramientas mediante formato SST-FT-33, con fechas del 29 julio al 2 de agosto del 2025, 5 al 9 de agosto del 2025, Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- inspección de instalaciones, realizada 23/07/2025, 6/08/2025 con radicado SST-FT-32, Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- Se verifica el registro del formato SST-FO-33 INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, con fecha de 21, 23, 26 julio, 11, 15, de agosto del 2025. Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- Inspección en obra registro SST-FT-10 INSPECCION DE ACCESO PARA TRABAJOS DE ALTURAS, con fecha 21 al 26, 28 julio al 2, 4 al 9, 11 al 16, de agosto del 2025, Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

- Se relaciona inspección de los equipos eléctricos mediante registro SST-ST-05, con fecha del 28 de Julio al 2, 4 al 9, de agosto del 2025, de los equipos DELWALT

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”



Documento
Versión 1

[illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

No TOMA	NOMBRE	EXPANSIÓN	FECHA TOMA	7 DÍAS	14 DÍAS	28 DÍAS	No. Cilindros	FECHA PRUEBA	DÍAS	RESISTENCIA	CUMPLIMIENTO
T64	Mamposteria piso 2	N.A.	7/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	4/08/2025	3	18-jul-25	11	1256	CUMPLE
								18-jul-25	11	1194	CUMPLE
								18-jul-25	11	1280	CUMPLE
T65	LOSA ENTREPISO 7	8" (Asentamiento)	18/07/2025	25/07/2025	1/08/2025	15/08/2025	3	25-jul-25	7	4497	CUMPLE
								25-jul-25	7	4305	CUMPLE
								25-jul-25	7	4348	CUMPLE
T66	VIGA 1-3 LOSA 7	9" (asentamiento)	18/07/2025	25/07/2025	1/08/2025	15/08/2025	3	25-jul-25	7	4279	CUMPLE
								25-jul-25	7	4376	CUMPLE
								25-jul-25	7	4421	CUMPLE
T67	VIGA 3-6 LOSA 7	9" (asentamiento)	18/07/2025	25/07/2025	1/08/2025	15/08/2025	3	25-jul-25	7	4244	CUMPLE
								25-jul-25	7	4176	CUMPLE
								25-jul-25	7	4001	CUMPLE
T68	ESCALERA PISO 5 CENTRAL Y EMERGENCIA	7"(asentamiento)	18/07/2025	25/07/2025	1/08/2025	15/08/2025	3	25-jul-25	7	3894	CUMPLE
								25-jul-25	7	3771	CUMPLE
								25-jul-25	7	3811	CUMPLE
T69	PW1-PW2-PW6-PW7-PW10 Y C2-C4-C6	N.A.	25/07/2025	1/08/2025	8/08/2025	22/08/2025	3	1-ago-25	7	5221	CUMPLE
								1-ago-25	7	5330	CUMPLE
								1-ago-25	7	5260	CUMPLE
T70	PW3-PW4-PW5-PW8-PW9 Y C3-C5-C6-C7-C8-C9-C10	N.A.	25/07/2025	1/08/2025	8/08/2025	22/08/2025	3	1-ago-25	7	5336	CUMPLE
								1-ago-25	7	5262	CUMPLE
								1-ago-25	7	5126	CUMPLE

No TOMA	NOMBRE	EXPANSIÓN	FECHA TOMA	7 DÍAS	14 DÍAS	28 DÍAS	No. Cilindros	FECHA PRUEBA	DÍAS	RESISTENCIA	CUMPLIMIENTO
T71	LOSA 8 CON FIBRA	8" (Asentamiento)	13/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	10/09/2025	3	20-ago-25	7	3423	CUMPLE
								20-ago-25	7	3261	CUMPLE
								20-ago-25	7	3264	CUMPLE
T72	LOSA 8 CON FIBRA	8" (Asentamiento)	13/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	10/09/2025	3	20-ago-25	7	3090	CUMPLE
								20-ago-25	7	3273	CUMPLE
								20-ago-25	7	3188	CUMPLE
T73	VIGAS LOSA 8	9" (asentamiento)	13/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	10/09/2025	3	20-ago-25	7	3960	CUMPLE
								20-ago-25	7	3824	CUMPLE
								20-ago-25	7	3884	CUMPLE
T74	VIGAS LOSA 8	9" (asentamiento)	13/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	10/09/2025	3	20-ago-25	7	3155	CUMPLE
								20-ago-25	7	3131	CUMPLE
								20-ago-25	7	3123	CUMPLE

Se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos necesarios para su aceptación.

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas entrepiso N°8 , del contratista de obra.

Al realizar un análisis los resultados del contratista de obra, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para aceptación.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c .

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c , sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las partes.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Anexo 7. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA

- Resultados resistencia concreto interventoría

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
								Mpa	PSI		
1	1	LOSA PISO 6 (N +19,30)	26/05/2025	23/07/2025	58	288,9	8171,3	35,4	5050	126,3	SI
2	2	VIGAS DE ENTREPISO PISO 6 (N +19,30)	26/05/2025	23/07/2025	58	336,6	8251,6	40,8	5827	145,7	SI
3	3	PANTALLAS PISO 6 (N +19,30)	4/06/2025	23/07/2025	49	406,7	8171,3	49,8	7110	177,8	SI
4	4	COLUMNAS PISO 6 (N +19,30)	4/06/2025	23/07/2025	49	429,7	8171,3	52,6	7512	187,8	SI
5	5	LOSA PISO 7 (N +23,20)	19/06/2025	23/07/2025	34	348,5	8251,6	42,2	6033	150,8	SI
6	6	VIGAS DE ENTREPISO PISO 7 (N +23,20)	19/06/2025	23/07/2025	34	340,5	8348,5	40,8	5826	145,7	SI

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
								Mpa	PSI		
7	7	PANTALLA PISO 7 (N +23,20)	1/07/2025	23/07/2025	22	380,8	8251,6	46,1	6692	164,8	SI
8	8	COLUMNAS PISO 7 (N +23,20)	1/07/2025	23/07/2025	22	374,1	8413,4	44,5	6352	158,8	SI

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)
								Mpa	PSI	
1	1	LOSA PIOS 8 (N+27,10)	18/07/2025	23/08/2025	36	325,7	8332,3	39,1	5584	139,6
2	2	VIGAS DE ENTREPISO PISO 8 (N+27,10)	18/07/2025	23/08/2025	36	320,9	8091,4	39,7	5665	141,6
3	3	PANTALLAS PISO 8 (N+27,10)	25/07/2025	23/08/2025	29	301,5	8171,3	36,9	5271	131,8
4	4	COLUMNAS PISO 8 (N+27,10)	25/07/2025	23/08/2025	29	310,9	8251,6	37,7	5382	134,6

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
								Mpa	PSI		
1	1	LOSA PISO 9 (N+31,00)	13/08/2025	27/08/2025	14	230,1	8171,3	28,2	4022	100,6	SI
	2		13/08/2025	27/08/2025	14	232,4	8011,8	29,0	4143	103,6	SI

Anexo 8. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA

8. CONCLUSIONES

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de julio de 2025 del 37.12 % por valor de \$12.054.322.284 frente un avance programado del 39.48%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025 es de 2.54% frente a un avance programado del 4.9%.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°4, con fecha de corte al 18 de junio de 2025, por un valor de \$ 2,351,833,475 correspondiente al 7.24% del valor contractual la cual incluye cobro de Nps de la cimentación y losas de entepiso, un acta parcial de obra No 5 con fecha de corte del 2 de julio de 2025, por un valor de \$860,740,433 correspondiente al 2.65%, para un acumulado facturado de

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

\$9,788,560,522 correspondiente al 30.14%, quedando un saldo por facturar de \$22,685,368,047 correspondiente al 69.86% en la cual se incluye el cobro de mayores cantidades de obra y Nps, las cuales están soportadas con el acta de modificación No 2 de mayores y menores cantidades de obra del 9 de junio de 2025 . Se realiza una amortización del anticipo por un valor acumulado de \$2,936,568,157, quedando pendiente por amortizar \$6,805,610,414 del anticipo.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 26 de julio al 25 de agosto de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el periodo del 26 de julio de 2025 al 25 de agosto de 2025, se realizó el suministro e instalación de aceros para el piso 8 N+31.00 a N+34.90 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, suministro e instalación de aceros de vigas y losa de entrepiso 8 N+31.00.

Se suministró e instaló las vigas joist de la losa de entrepiso 8 N+31.00.

Se realizó el suministro e instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, piso 9 N+31.00 A N+34.90 y para vigas y losa de entrepiso 8 N+31.00

Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo en cuenta el procedimiento indicado en el aparte C.5.6. EVALUACION Y ACEPTACION DE CONCRETOS DE LA NSR 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

La gestión socioambiental del proyecto muestra avances importantes en seguridad industrial, manejo inicial de residuos ordinarios y prevención de contaminación de agua y suelo.

Persisten falencias críticas en el manejo de RCD, la cobertura de materiales de construcción y el mantenimiento de plántulas forestales, aspectos que deben corregirse de manera inmediata.

El marco normativo colombiano en materia ambiental, laboral y de participación ciudadana (Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Ley 1757 de 2015, entre otros) constituye una guía obligatoria que debe cumplirse estrictamente.

La falta de aprobación del PMA limita el seguimiento técnico, la definición de metas claras y la toma de decisiones basadas en indicadores objetivos.

Se recomienda fortalecer el relacionamiento comunitario mediante la sistematización de PQRS, el uso de herramientas digitales y la programación de reuniones presenciales o virtuales.

El refuerzo de la señalización, el control de emisiones, el almacenamiento adecuado de materiales y la gestión responsable de RCD serán determinantes para alcanzar un mayor nivel de cumplimiento ambiental y social.

Finalmente, el estricto cumplimiento del PMA, una vez aprobado, y la aplicación rigurosa de la normatividad vigente garantizarán la sostenibilidad ambiental, la seguridad de los trabajadores y la aceptación social del proyecto.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. Asimismo, ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 18	Documento Versión 1

Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.

Para el periodo correspondiente al informe se evidencia la realización de simulacro de evacuación con el personal de obra y el consorcio EVOLET, realizado el día 11 /04/2025.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP's mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.
