

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21 – OCTUBRE 21 – NOVIEMBRE 25 DE 2025	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 21 (PERIODO OCTUBRE 21 – NOVIEMBRE 25 DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 21
CONSORCIO INTERSALUD PZ**

	
Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M. Representante legal Consortio Intersalud PZ

NOVIEMBRE 25 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	7
2.1. Localización.....	8
2.2. Justificación.....	9
2.3. Características del Proyecto.....	10
3.1. Contrato de Obra.....	11
3.2. Póliza del Contrato de Obra.	12
3.3. Contrato de Interventoría.....	14
3.4. Pólizas de Interventoría.....	15
4.1. Gestión Administrativa.....	16
4.1.1 Personal de Interventoría	16
4.1.2 Personal del contratista de obra.....	17
4.1.3. Comités de obra.	17
4.1.4 Correspondencia Cruzada.....	18
4.2. Gestión Técnica.....	23
4.2.1 Avance de obra	23
4.3. Gestión Financiera	35
4.4. Gestión Socioambiental	42
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	61
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA	79
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.	79
8. CONCLUSIONES	83

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.	8
Ilustración 2. Acero losa de entrepiso	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 3. Disposición de vigas joist entrepiso 9 N+34.90	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 4. Detalle joist VT 02.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 5. Detalle joist VT 03.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 6. Detalle joist VT 04.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 7. Detalle joist VT 05.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 8. Detalle joist VT 06.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 9. Detalle joist VT 07.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 10. Detalle vigas de entrepiso 9 N+34.90.	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 11. Disposición de refuerzo viga A.	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 12. Disposición de refuerzo viga A'.....	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 13. Disposición de refuerzo viga B	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 14. Disposición de refuerzo viga C	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 15. Disposición de refuerzo viga D (1-6)...	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 16. Disposición de refuerzo viga D	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 17. Disposición de refuerzo viga E (1-6)...	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 18. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E)	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 19. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) ..	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 20. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) ...	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 21. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E) ..	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 22. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) .	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 23. Disposición de refuerzo viga 4 (C-D) ..	¡Error! Marcador no definido.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Ilustración 24. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) ..**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 25. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)..**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 26. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) ..**¡Error! Marcador no definido.**

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra	12
Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra	12
Tabla 3. Póliza de cumplimiento Contratista de obra	13
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra	14
Tabla 5. Contrato de Interventoría	14
Tabla 6. Pólizas de Interventoría	15
Tabla 7. Personal de Interventoría	16
Tabla 8. Personal del contratista de obra.	17
Tabla 9. Actas de comité	18

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra	14
Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría.	15
Anexo 3. Planillas personal Interventoría	17
Anexo 4. Actas de comité julio- agosto de 2025	18
Anexo 5. Trazabilidad de correspondencia Cruzada.	23
Anexo 6. Informe mensual del periodo del 26 julio al 25 de agosto de 2025 del contratista de obra	¡Error! Marcador no definido.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Anexo 7. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA 82

Anexo 8. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA; **Error! Marcador no definido.**

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 21 DE OCTUBRE A 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km², el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Otro si del 10 de septiembre de 2024	Otro si modificadorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), c) CONSTRUCCION LOSA ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, e) LOSA CONCRETO ALIGERADA ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3" Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Otro si del 15 de abril de 2025	Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025.
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 4	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	13-sept-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	13-sept-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	13-may-2029	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 4	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO INTERSALUD PZ
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. (\$1.280.412.030) incluido iva.
Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Otro si del 15 de abril de 2025	Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días.
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días.
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030

Tabla 5. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-may-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	\$256.082.406,00

Tabla 6. Pólizas de Interventoría

Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría.

Póliza ampliación de plazo de interventoría OTROSI N°01.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	10-nov-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	10-may-2029	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	13-may-2031	\$256.082.406,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 21 DE OCTUBRE al 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Rafael Antonio Salcedo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Augusto Guzmán Enríquez
Ingeniero eléctrico	Juan José Mosquera
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixsa Angulo Agudelo.
Abogado Jurídico	José Alexander Romero
Contador publico	Fernando Trujillo Lopez
Personal Adicional	
Ingeniera Apoyo Técnico	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniero Ambiental	Andrés Felipe Orozco

Tabla 7. Personal de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Director técnico de obra	Fabian Andres Vivas
Ingeniero residente de obra	Wilmar Andrés Goyes Araujo
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastián Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Marlene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Brenda Viviana Alegría
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Ingeniera civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria
Ingeniera civil apoyo técnico.	Diana Magaly Arango
Ingeniero civil apoyo técnico.	Juan Carlos Meneses

Tabla 8. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizó un (1) comité técnico de seguimiento realizado por el ministerio de salud y protección social.

COMITÉ	FECHA
---------------	--------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

COMITÉ ELECTRICO	4-10-2025
COMITÉ ELECTRICO	5-10-2025
COMITÉ SEGUIMIENTO MINISTERIO	19-11-2025

Tabla 9. Actas de comité

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 21 de octubre a 25 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Anexo 4. Actas de comité noviembre de 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 21 de octubre a 25 de noviembre de 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO
27/10/2025	CIPZ-078-0427-2025	REMISION INFORMES MENSUALES OCTUBRE 2025 – CONTRATO N° 358 2023 – CONTRATO N° 078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
28/10/2025	CIPZ-078-0428-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°7 DE OBRA CONTRATO N°358 2023 - ENTREGA ACTA PARCIAL N°7 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
29/10/2025	CIPZ-078-0429-2025	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS MESA DE SEGUIMIENTO MINISTERIO 28 OCTUBRE 2025 – COMPONENTE REDES SECAS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
29/10/2025	CIPZ-078-0431-2025	COMPROMISOS MESA DE SEGUIMIENTO MINISTERIO 28 OCTUBRE 2025 – COMPONENTE AIRE ACONDICIONADO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
29/10/2025	CIPZ-078-0432-2025	INSPECCIÓN AMBIENTAL A OBRA OCTUBRE DE 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
31/10/2025	CIPZ-078-0433-2025	REVISION BALANCE COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RCI – RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0573-25 DEL 15 DE OCTUBRE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
6/11/2025	CIPZ-078-0434-2025	AJUSTES AL PMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 358 DE DICIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0592-25 DEL 27 DE OCTUBRE 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

7/11/2025	CIPZ-078-0435-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
7/11/2025	CIPZ-078-0436-2025	REVISION BALANCE PRESUPUESTAL AIRE ACONDICIONADO – RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0579-25 DEL 4 DE NOVIEMBRE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
10/11/2025	CIPZ-078-0437-2025	RECORRIDO E INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
10/11/2025	CIPZ-078-0438-2025	REVISIÓN BALANCE E ÍTEMS NO PREVISTOS AIRE ACONDICIONADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, SIN OFICIO DE RESPALDO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
10/11/2025	CIPZ-078-0439-2025	RESPUESTA CORREO ENTIDAD 10 NOVIEMBRE 2025 – CONVOCATORIA URGENTE A MESA TECNICA REVISIÓN DE AJUSTE DEL COMPONENTE MECÁNICO (CONTRATO 358 DE 2023)	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
11/11/2025	CIPZ-078-0440-2025	APROBACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL VERSIÓN N° 6 - RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0607-25 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

21/11/2025	CIPZ-078-0441-2025	SOLICITUD COPIA ACTAS DE COBRO Y ACTAS DE MODIFICACION FIRMADAS – CONTRATO N° 358 2023, CONTRATO N° 078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
11/11/2025	CIPZ-078-0442-2025	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 078 DE 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIEGO ANDRES CASTRO SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
24/11/2025	CIPZ-078-0443-2025	REVISION INFORME MENSUAL OCTUBRE - NOVIEMBRE 2025 – RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0613-25 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
27/10/2025	EV-C358-23-0592-25	27/10/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio CIPZ-078-0421-2025 – Ajustes al PMA del Contrato de Obra Pública No. 358 de diciembre de 2023.
29/10/2025	EV-C358-23-0595-25	29/10/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.
28/10/2025	EV-C358-23-0599-25	31/10/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cuadro comparativo del estudio de mercado- Componente de aire acondicionado.
2/11/2025	N.A	2/11/2025	ASOCIACION DE USUARIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE POPAYAN	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de acceso a la información pública CONSTRUCCION TORRE 10 PISOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
4/11/2025	EV-C358-23-0600-25	4/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficio con radicado CIPZ-078-0432-2025 del 29 de octubre de 2025, respecto a inspección ambiental octubre de 2025.
4/11/2025	EV-C358-23-0601-25	4/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión diseño, APUS y balance de aire acondicionado
4/11/2025	EV-C358-23-0602-25	4/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión diseños componente eléctrico
5/11/2025	EV-C358-23-0602-25	5/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD- INICIO ACTIVIDADES MEDIA TENSION

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

5/11/2025	n.a	5/11/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - DIEGO CASTRO BETANCOURTH	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Convocatoria a Comité de Avance de Obra y Mesa Técnica – Ajuste final del componente eléctrico de la Torre de Consulta Externa.
5/11/2025	EV-C358-23-0604-25	5/11/2025	CONSORCIO EVOLET	UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD MEDICINA CON COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO	Solicitud ingreso de comisión topográfica.
5/11/2025	EV-C358-23-0604-25	5/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD- INICIO ACTIVIDADES MEDIA TENSION
5/11/2025	N.A	5/11/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - DIEGO CASTRO BETANCOURTH	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de información y trazabilidad de gestiones adelantadas con la Secretaría de Salud Departamental del Cauca y el Ministerio de Salud y
6/11/2025	N.A	6/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTA DE VISITA DE OBRA
6/11/2025	N.A	6/11/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - DIEGO CASTRO BETANCOURTH	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Convocatoria urgente a reunión en obra – Balance del componente mecánico de la Torre.
10/11/2025	n.a	10/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Convocatoria urgente a Mesa Técnica – Revisión de ajuste del componente mecánico (Contrato 358 de 2023)
10/11/2025	EV-C358-23-0607-25	10/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficio con radicado CIPZ-078-0434-2025, respecto a ajustes al PMA del contrato de obra pública N°
12/11/2025	EV-C358-23-0610-25	12/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta a Derecho de Petición – Solicitud de Información sobre la obra torre 10 pisos hospital universitario san José de
12/11/2025	EV-C358-23-0611-25	12/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Traslado Derecho de Petición – Solicitud de Información sobre la obra torre 10 pisos hospital universitario san José de
12/11/2025	EV-C358-23-0612-25	12/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión balance general contrato de obra pública No. 358 de diciembre de 2023.
14/11/2025	N.A	14/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO SG-SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

20/11/2025	EV-C358-23-0613-25	20/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión informe mensual No 21
20/11/2025	EV-C358-23-0614-25	20/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud.
21/11/2025	N.A	21/11/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - DIEGO CASTRO BETANCOURTH	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de información para anexar al Otrosí de cesión – Interventoría Contrato 358 de 2023
24/11/2025	N.A	24/11/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - DIEGO CASTRO BETANCOURTH	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Balance general Contrato 358 de 2023
25/11/2025	EV-C358-23-0618-25	25/11/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Acta de obra No. 8

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 21 de octubre a 25 de noviembre de 2025, el contratista de obra.

Se ha realizado la instalación de redes hidráulicas bajo el piso 4, 5, 6, 7

Se ha realizado la instalación de redes sanitarias bajo el piso 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Se ha realizado la instalación de redes del sistema contraincendios en los pisos 3,4

Se ha realizado la instalación de redes pluviales bajo el piso 10.

Se ha realizado la construcción de mampostería en los pisos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9

Se ha realizado la construcción de repello de muros en los pisos 1,2,3,4

Se ha realizado la construcción de repello para enchape de pisos en los niveles 1,2,3,4

Se ha realizado trabajos de estuco de muros en los pisos 1,2,3,4

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Se ha realizado trabajos de repello y estuco en la fachada occidental.

Se ha realizado trabajos de enchape en baños del piso 1.

Se ha realizado trabajos de corrección de defectos en las pantallas PW1, PW6, PW10.

Se ha realizado trabajos de entubado con tubería emt eléctrica para salidas de tomas e iluminación, en los pisos 1,2,3,4,5,6,7.

Se realizó trabajos de excavación y relleno con material de préstamo para la canalización de tubería 2x3" de la acometida de media tensión desde el punto de conexión al sistema de suministro de energía hasta el sitio donde está determinada la construcción de la subestación.

Se ha realizado trabajos de estructura para muros board en los pisos 2 y 3.

Se ha realizado trabajos de instalación de placas board de 10 mm en los pisos 2 y 3.

Para los muros de mampostería, se realizó control de localización y dimensiones, se verificó la instalación de los anclajes de los arranques de los refuerzos a la losa inferior, se controló el correcto vaciado de las dovelas y de las columnetas de confinamientos, se verificó la correcta instalación de los aceros de refuerzo tanto en dovelas como en columnetas.

Para la tubería sanitaria, se ha llevado control del sentido de flujo de la tubería, pendientes y dimensiones, conforme a los diseños, se ha verificado que no existan filtraciones con ensayos de estanquidad de la tubería.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.	 Documento Versión 1
INFORME MENSUAL No. 21	

REGISTRO FOTOGRAFICO

 capturada en moto g54 5G Consorcio Intersalud pz 24 oct 2025, 9:43 a.m.	 capturada en moto g54 5G Consorcio Intersalud pz 22 oct 2025, 8:00 a.m.
 capturada en moto g54 5G Consorcio Intersalud pz 24 oct 2025, 9:43 a.m.	 capturada en moto g54 5G Consorcio Intersalud pz 22 oct 2025, 8:00 a.m.
MAMPOSTERIA	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1



RED SANITARIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1



RED CONTRA INCENDIOS


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1

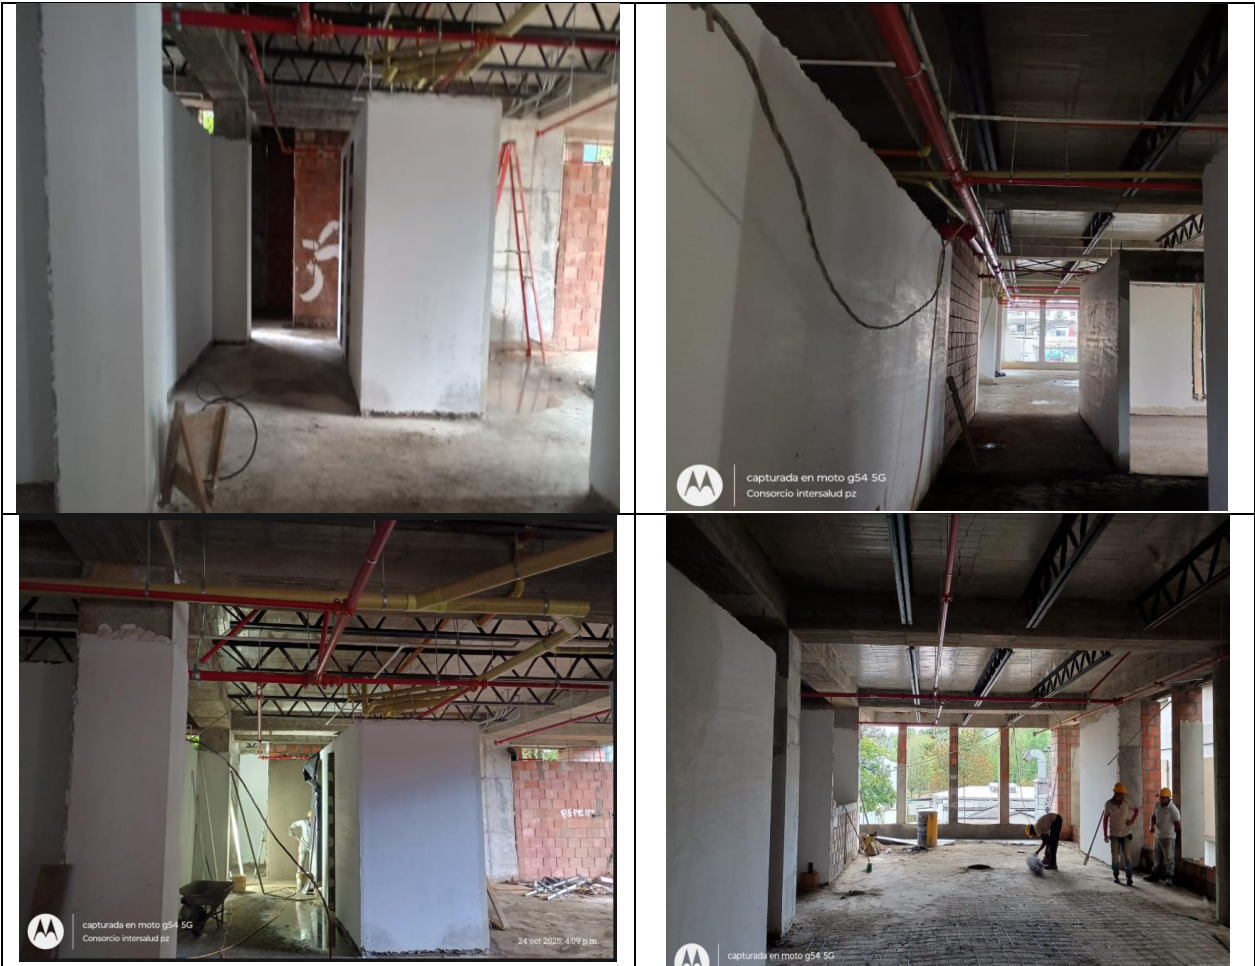

REPELLOS Y ESTUCOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1



MUROS ESTRUCTURADOS BOARD

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1



RED ELECTRICA


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1

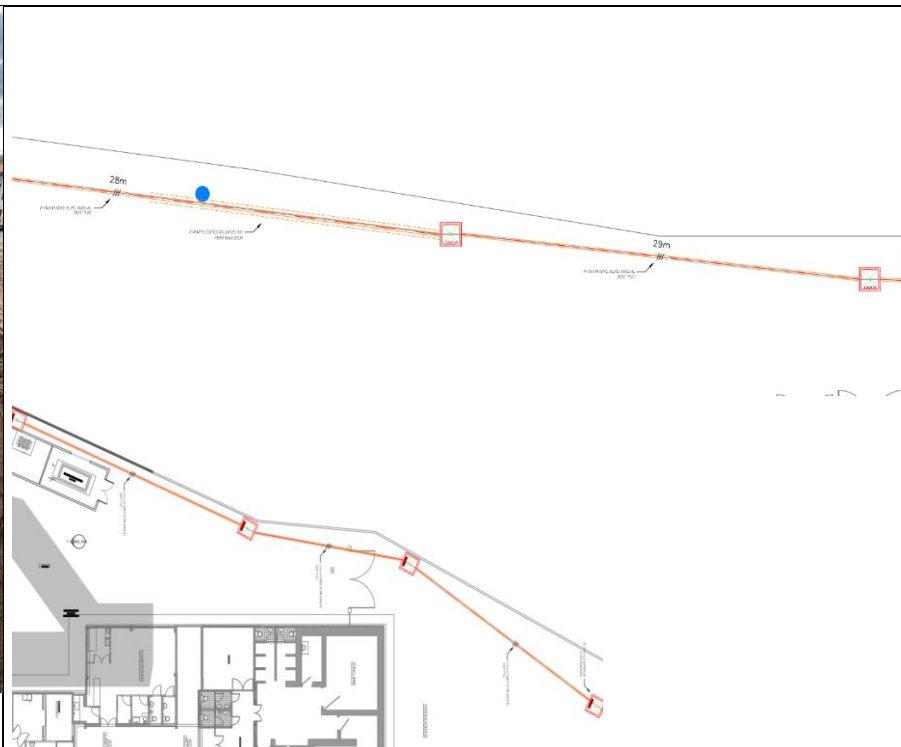

ACOMETIDA MT

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado en obra y con lo estipulado en dichos documentos.

- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**


El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de noviembre de 2025 del 46.5% frente un avance programado acumulado del 46.5%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2025 es de 0.90% frente a un avance programado del 0.90%.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	\$109,503,404	0.33%	\$363.707.100	1.12%
30-09-2024	\$858,324,856	2.16%	\$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	\$1.948.435.571	6.00%	\$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	\$2.636.884.000	8.12%	\$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	\$3.299.608.964	10.13%	\$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	\$4.715.214.428	14.52%	\$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	\$5.260.776.428	16.2%	\$5.260.776.428	16.2%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

25-3-2025	\$6.189.530.785	19.06%	\$6.423.343.071	19.78%
25-4-2025	\$7.546.940.999	23.24%	\$7.579.414.928	23.34%
25-5-2025	\$8.917.340.785	27.46%	\$8.917.340.785	27.46%
25-6-2025	\$9.605.788.071	29.58%	\$9.605.788.071	29.58%
25-7-2025	\$11.229.484.499	34.58%	\$11.229.484.499	34.58%
25-8-2025	\$12.820.706.999	39.48%	\$12.054.322.284	37.12%
20-9-2025	\$14.499.609.106	44.65%	\$14.499.609.106	44.65%
20-10-2025	\$14.778.884.892	45.51%	\$14.778.884.892	45.51%
20-11-2025	\$15.100.376.785	46.5%	\$15.100.376.785	46.5%
AVANCE	\$289.017.964	0.90%	\$289.017.964	0.90%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

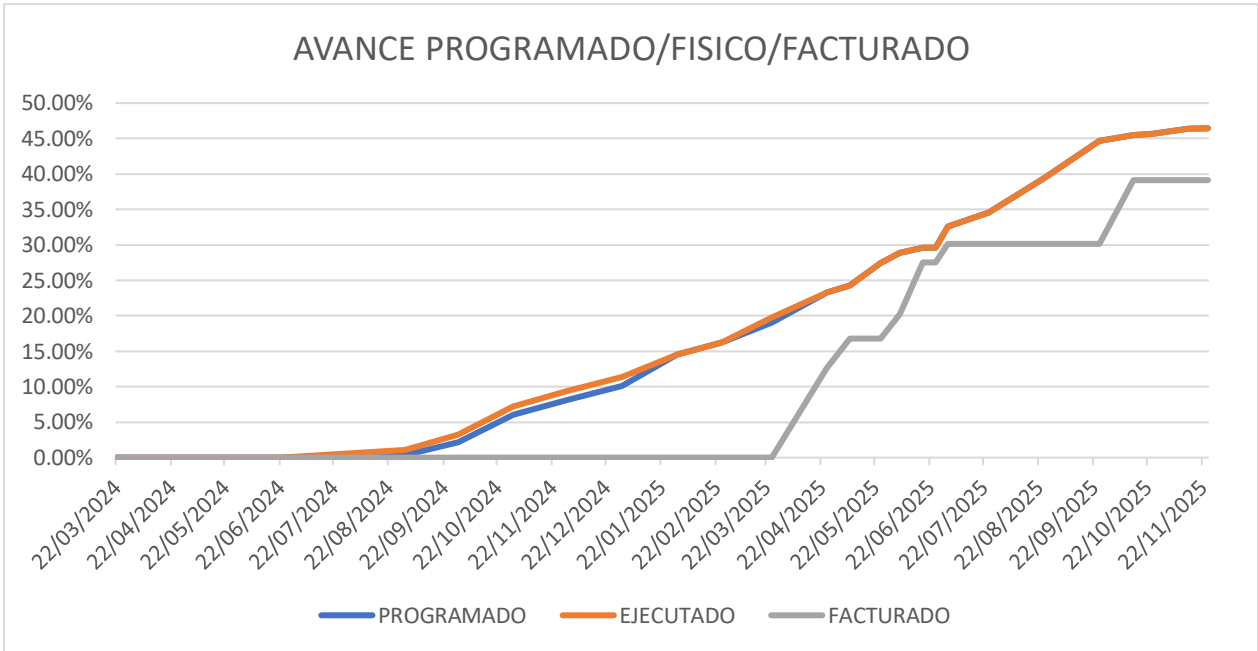

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo \$9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de agosto de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

AUTORIZACIONES DE PAGO		
PROVEEDOR	VALOR/CONCEPTO	ITEM PLAN DE INVERSION
1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	\$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
2. FERRETERÍA GYJ	\$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
3. URIEL PALTA AMA	\$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo	Transporte
4. UBANER PEREZ	\$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
5. PEDRO ROMO	\$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo	Alquiler de equipos
6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN	\$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo.	Materiales

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	\$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
11. DIANA CAROLINA VIVAS	\$133.865.096 m/cte	Mano de obra
12. SILOGISTICA	\$103.240.000 m/cte	Transporte
13. LA ALIANZA GROUP SAS	\$309.835.612 m/cte.	Mano de obra
14. UBANER PEREZ	\$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo	Mano de obra
15. UBANER PEREZ	\$30.000.000 m/cte	Mano de obra
16. G Y J FERRETERIAS S.A.	\$71.110.589 m/cte	Materiales
17. IMCOMERSA LUD SAS	\$27.620.616 m/cte	
18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA	\$26.064.505 m/cte	
19.EQUIPAR GLEASON	\$29.741.279	Alquiler de equipos
20. SILOGISTICA S.A.S	\$21.600	Transporte
21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	\$1	Mano de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	\$34.228	Materiales
--	--------------------------------	----------------------------------

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 85,500,000.00	\$ 85.500.000.00	0.02%	\$ 0
2	TRANSPORTE	\$ 105,400,000.00	\$ 105.400.000.00	1.08%	\$ 0
3	MATERIALES	\$ 7,205,599,277.00	\$ 7,205.599.277.00	73.23%	\$ 0
4	MANO DE OBRA	\$ 2,345,679,294.00	\$ 2,345,679,293.00	24.08%	\$ 0
	TOTAL	\$ 9,742,178,571.00	\$ 9,742,178,571 .00	100%	\$ 0

Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidós (22) solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia.

Cabe destacar que, al término del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".




INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1


**CONTRATO
358-2023
AVANCE FISICO**

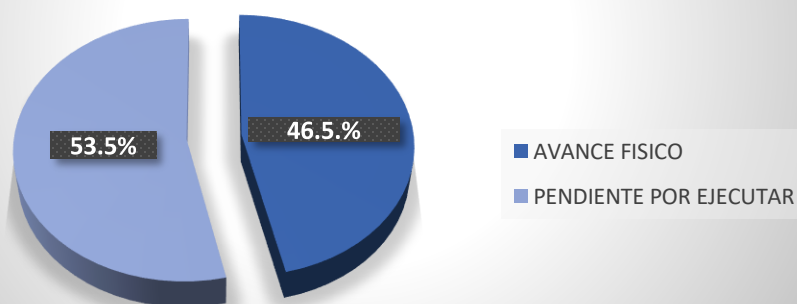

**CONTRATO
358-2023
AVANCE FINANCIERO**

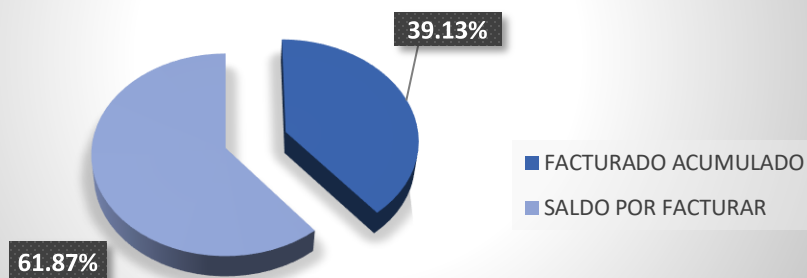

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

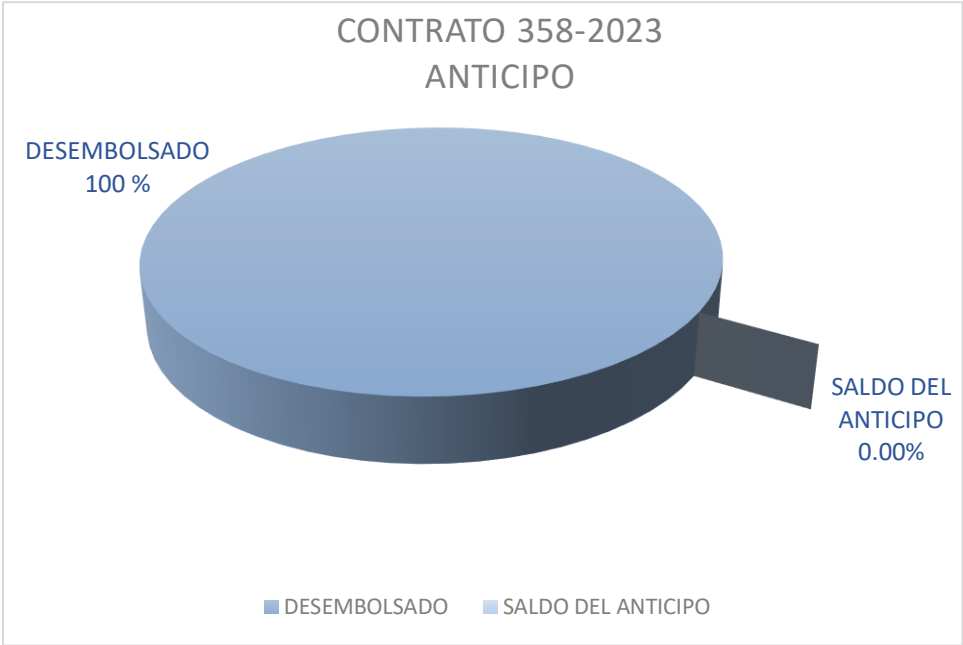


Desembolsado: \$9,742,178,571.0 m/cte	Anticipo \$ 9,742,178,571.00 m/cte
---	------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024

BALANCE A LA FECHA 14-10-2025			BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR CONTRATO PPAL		\$ 1,280,412,030	VALOR ANTICIPO	-	-
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 1,280,412,030	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	-	
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	\$ 501.090.838		SALDO POR AMORTIZAR	-	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 94.269.122		SALDO POR AMORTIZAR	-	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 595.359.960		SALDO POR AMORTIZAR	-	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 685.052.070				
SUMAS IGUALES	\$ 1,280,412,030	\$ 1,280,412,030	SUMAS IGUALES \$	-	-

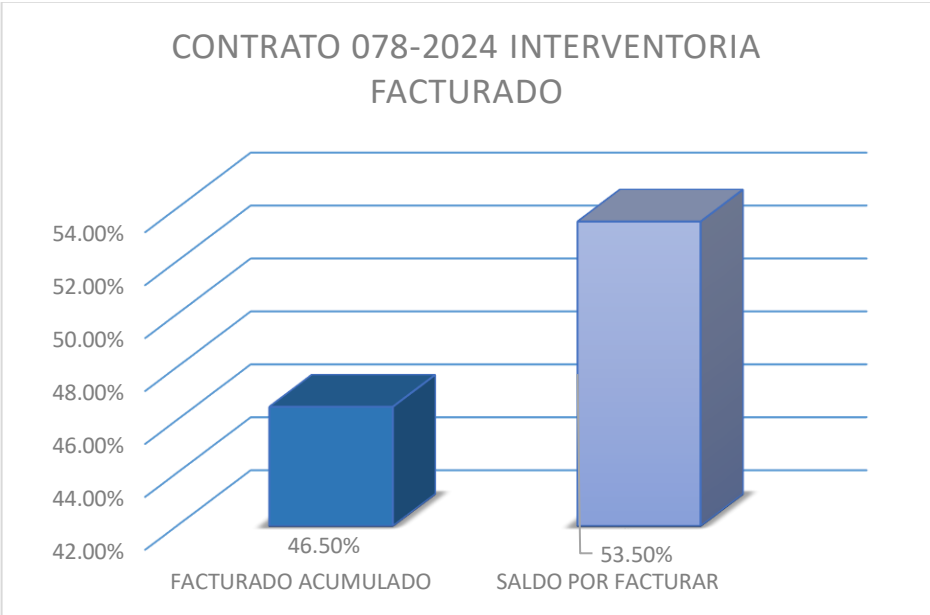

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental aprobado, las cuales se describen a continuación.

- PROGRAMA 1.3: programa de Gestión Ambiental
- PROGRAMA 1.2: Programa de aprovechamiento forestal
- PROGRAMA 1.3: Programa de manejo de residuos sólidos de construcción y demolición de RCD
- PROGRAMA 1.4: Programa de manejo de residuos solidos
- PROGRAMA 1.5: Programa de almacenamiento adecuado de materiales de construcción
- PROGRAMA 1.6: Programa de manejo de campamento
- PROGRAMA 1.7: Programa de señalización y seguridad industrial
- PROGRAMA 1.8: Programa de reuniones con la comunidad

PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El programa de gestión ambiental es el encargado de implementar, hacer el seguimiento y el control de las medidas establecidas en el PMA, así como garantizar la presencia de un profesional en ingeniería y en la seguridad y salud en el trabajo.

Para la obra se cuenta con dos profesionales designadas para la Gestión Ambiental, La Ingeniera Ambiental Nancy Torres Barrera y la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Brenda Viviana Alegría Trujillo, las cuales realizan la atención a las PQRS, que para el periodo del presente informe no reportan PQRS.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron en su totalidad las actividades autorizadas dentro del permiso de aprovechamiento forestal, las cuales incluyeron tanto la tala controlada de individuos arbóreos como la siembra de las plántulas compensatorias, conforme a lo establecido en la resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Estas acciones se realizaron en cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas al proyecto y bajo los lineamientos técnicos aprobados por la autoridad competente.

La interventoría reiteró nuevamente al contratista la solicitud de gestionar el cierre formal del permiso de aprovechamiento forestal ante la CRC, proceso que ya había sido requerido en el periodo anterior. En respuesta, el contratista manifestó que, según información interna de la Corporación, el expediente correspondiente ya se encuentra cerrado. No obstante, la interventoría solicitó de manera formal el soporte documental que acredite dicho cierre, con el fin de incorporarlo al expediente del proyecto y garantizar el cumplimiento técnico y administrativo del cierre ambiental.

Para el presente periodo no se realizaron actividades forestales de mantenimiento.

Indicadores

$$\text{Informes de avance mensual entregados} = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

Cumplimiento 100%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Los recorridos de seguimiento permitieron evidenciar avances significativos en el cumplimiento de las medidas relacionadas con el manejo y almacenamiento de materiales de construcción. Se observó la implementación de coberturas temporales sobre los materiales pétreos, las cuales se mantienen por un periodo máximo de tres jornadas laborales, contribuyendo a minimizar la dispersión de polvo. No obstante, aún se identifican áreas donde algunos materiales permanecen expuestos a la intemperie, situación que puede favorecer la emisión de partículas y la contaminación cruzada, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.

Durante la inspección también se evidenció una disminución en el riesgo de contaminación cruzada debido a la separación adecuada entre el punto de acopio de RCD y el punto de acopio de materiales pétreos. Se recomendó al contratista mantener inspecciones periódicas para prevenir la mezcla involuntaria de materiales y evitar pérdidas, así como implementar acciones que permitan conservar la diferenciación entre materiales aprovechables, RCD y agregados. Esto contribuye al orden, la sostenibilidad y al cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Estas acciones se desarrollan en concordancia con la Resolución 0312 de 2019, normativa que establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y promueve la adopción de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad, el orden y la protección de la salud de los trabajadores en el entorno de obra.

En atención a las acciones contempladas en el Programa de Manejo de Residuos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el jueves 13 de noviembre de 2025 a las 07:00 a. m. se realizó una jornada de capacitación ambiental dirigida al personal de obra. El propósito

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

de esta actividad fue fortalecer las habilidades del equipo en el manejo adecuado de los Residuos Sólidos (RS) y los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), fomentando prácticas responsables y acordes con la normativa ambiental vigente.



PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Durante el periodo evaluado, se realizó la dotación y reposición de herramientas destinadas a las actividades de aseo y apoyo operativo en la obra, en cumplimiento del componente PMA 1.4.4. Asimismo, se ejecutaron jornadas de limpieza, organización del

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

frente de obra y manejo inicial de residuos sólidos. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las prácticas de aseo, a la reducción de riesgos asociados con la acumulación de residuos y al mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad y salubridad en el área de intervención del proyecto.

En cumplimiento del ítem PMA 1.4.5 y con el fin de asegurar la correcta segregación de los residuos sólidos generados en la obra, durante el periodo reportado se efectuó el suministro de bolsas plásticas en cuatro colores (verde, blanco, negro y rojo), de acuerdo con la codificación establecida para el manejo integral de residuos. Se entregaron treinta (30) unidades por cada color, garantizando la reposición oportuna en los puntos ecológicos y la continuidad de las actividades de separación en la fuente.

Esta acción facilita la clasificación de residuos aprovechables, no aprovechables, ordinarios y peligrosos, optimiza el sistema interno de gestión de residuos y contribuye al cumplimiento de los lineamientos del PMA y de la normativa ambiental vigente.




CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

En el frente de obra se verificó la instalación de recipientes diferenciados para la correcta disposición de residuos sólidos, dando cumplimiento al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019, normativa que regula la separación en la fuente y la gestión integral de residuos en Colombia. Sin embargo, se evidenció que varios de estos recipientes se encuentran parcialmente obstruidos por otros contenedores o materiales, situación que dificulta su adecuado uso, genera desorden en el área de trabajo y limita el aprovechamiento de los residuos reciclables.

Estas acciones buscan reforzar la cultura ambiental dentro del proyecto, garantizar el orden y la limpieza en los frentes de trabajo, y asegurar el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Registro fotográfico de recipientes y áreas pisos superiores

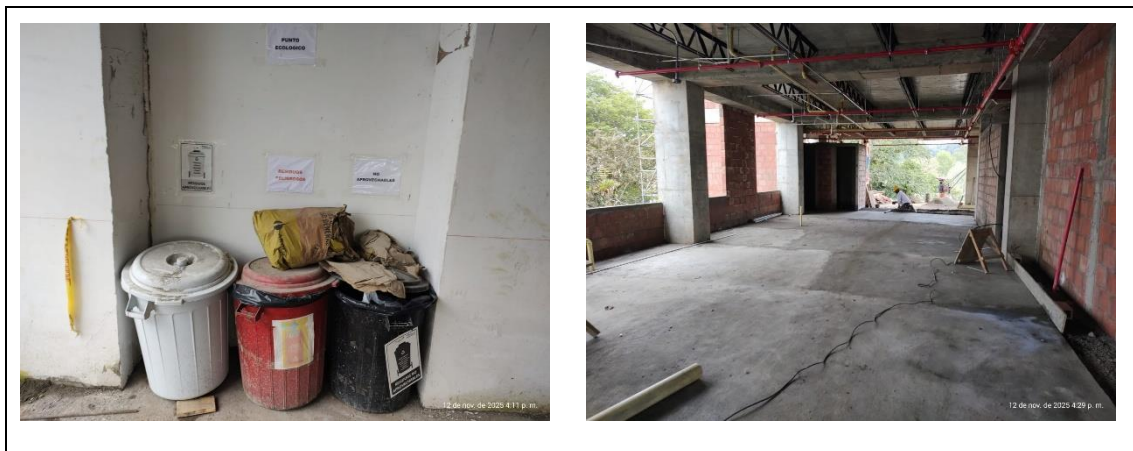

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21


Documento
Versión 1



Se evidencia el acopio de residuos sólidos, con materiales que son susceptibles. Se solicito al contratista adelantar las entregas a los gestores de cada material.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

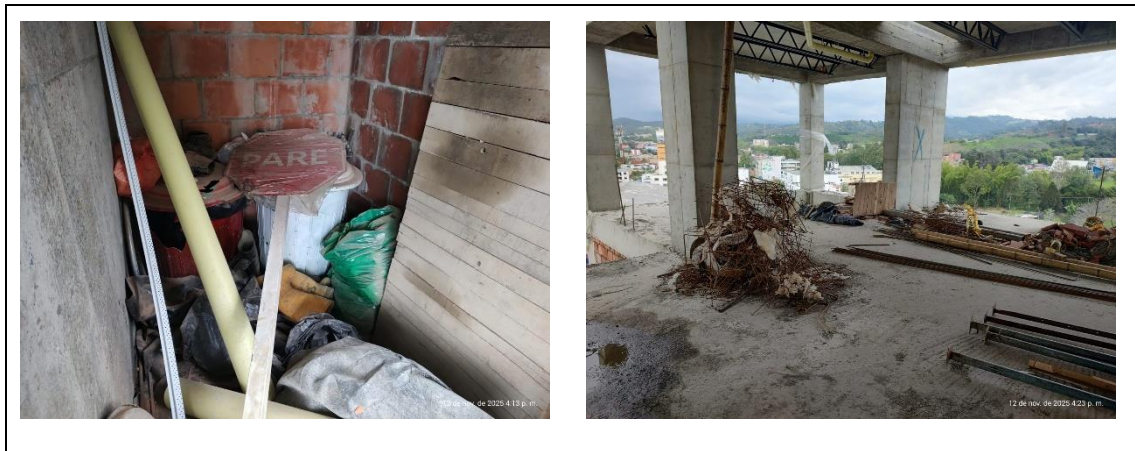

PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Como complemento a la jornada de capacitación ambiental realizada el 13 de noviembre de 2025, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se llevó a cabo la entrega de material pedagógico en formato de folleto, elaborado como herramienta de apoyo para reforzar los conocimientos impartidos durante la actividad formativa.

El folleto, diseñado con un enfoque práctico y didáctico, desarrolló los principales temas abordados en la capacitación, entre ellos: la clasificación de los RS y RCD según su naturaleza y características; la correcta separación en la fuente y la identificación de puntos ecológicos y zonas de acopio; las buenas prácticas para el almacenamiento temporal, haciendo énfasis en el orden, la señalización y la prevención de impactos; las rutas internas de recolección, el transporte externo y los requisitos aplicables a los gestores autorizados; las acciones orientadas a la reducción y aprovechamiento de materiales; las medidas preventivas frente a los impactos ambientales asociados a la

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

contaminación del suelo, los recursos hídricos y la afectación paisajística; así como las responsabilidades del personal de obra en relación con el cumplimiento del PMA y de la normativa ambiental vigente.

Este material educativo fue entregado a los participantes con el propósito de promover la apropiación del conocimiento ambiental, facilitar la implementación y réplica de buenas prácticas dentro del proyecto y fortalecer el compromiso individual y colectivo con la conservación del entorno.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO.

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron jornadas de inspección ocular ambiental orientadas a verificar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados en la obra, mediante el diligenciamiento de los formatos "Anexo AA4 – Actividades de Limpieza en Puntos Ecológicos" y "Actividades de Limpieza en Puntos de Acopio".

El uso continuo y sistemático de estos instrumentos permitió consolidar diariamente las actividades de limpieza, recolección, clasificación y segregación en la fuente, asegurando la trazabilidad, el control y el registro de los residuos sólidos generados durante el desarrollo de las labores constructivas.

Es importante señalar que los formatos fueron diligenciados de manera permanente hasta la fecha de emisión del presente informe ambiental (18 de noviembre de 2025); por esta razón, no se incluye la totalidad de los registros en su versión final consolidada.

Como resultado, estas jornadas han fortalecido el control operativo ambiental en la obra, promoviendo buenas prácticas de manejo de residuos, el cumplimiento de la jerarquía de gestión (reducción, reutilización y reciclaje) y la minimización de impactos negativos sobre el entorno.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1



PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el seguimiento realizado para el corte del mes de octubre de 2025, se verificaron deficiencias en la instalación de barreras físicas y mallas de protección en los niveles 2 al 9 de la estructura, así como en algunos cerramientos perimetrales destinados a restringir el acceso a zonas de alto riesgo. Estas condiciones no se ajustan a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) ni a los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) definidos en la Resolución 0312 de 2019.

Asimismo, se observó que el aumento del personal operativo ha generado una mayor demanda de control por parte del equipo de inspección de SST, reduciendo su campo de acción y aumentando el riesgo potencial de incidentes o accidentes, especialmente en labores desarrolladas en alturas. La ausencia o deficiencia en las medidas colectivas de protección representa un riesgo significativo para la integridad física de los trabajadores, ya que no garantiza la contención ante caídas ni la restricción de accesos a zonas de riesgo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Ante esta situación, se recomienda implementar de manera inmediata acciones correctivas, tales como la instalación de barandas, redes de seguridad, mallas perimetrales y señalización restrictiva en los bordes de los niveles superiores, en cumplimiento de lo establecido en:

- Resolución 1409 de 2012, que regula las condiciones de seguridad en trabajo en alturas.
- Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y refuerza las medidas de prevención en ambientes de alto riesgo.
- Decreto 1072 de 2015, en lo relativo a la gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo.
- Ley 9 de 1979, Título III, sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.
- Resolución 5018 de 2019, que define las competencias de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en procesos de capacitación y control de trabajo en alturas.
- Norma Técnica Colombiana (NTC) 1735, que establece los requisitos mínimos de diseño, instalación y resistencia de sistemas de protección contra caídas.

Acciones verificadas

Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de seguimiento y control en seguridad industrial, destacando la implementación de:

- Señalización preventiva, restrictiva e informativa en las zonas de tránsito y operación.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- Delimitación física de áreas de trabajo y senderos peatonales, garantizando desplazamientos más seguros.
- Adecuación de pasos peatonales y accesos temporales, con materiales estables y debidamente demarcados.
- Ejecución de controles complementarios de prevención de accidentes, conforme a los procedimientos internos del contratista.

Estas acciones se encuentran respaldadas mediante registro fotográfico, evidenciando avances en organización y control, en cumplimiento con los lineamientos del PMA, el SG-SST y las disposiciones del Ministerio del Trabajo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico que sustenta las observaciones y avances reportados.




CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 21

Documento
Versión 1

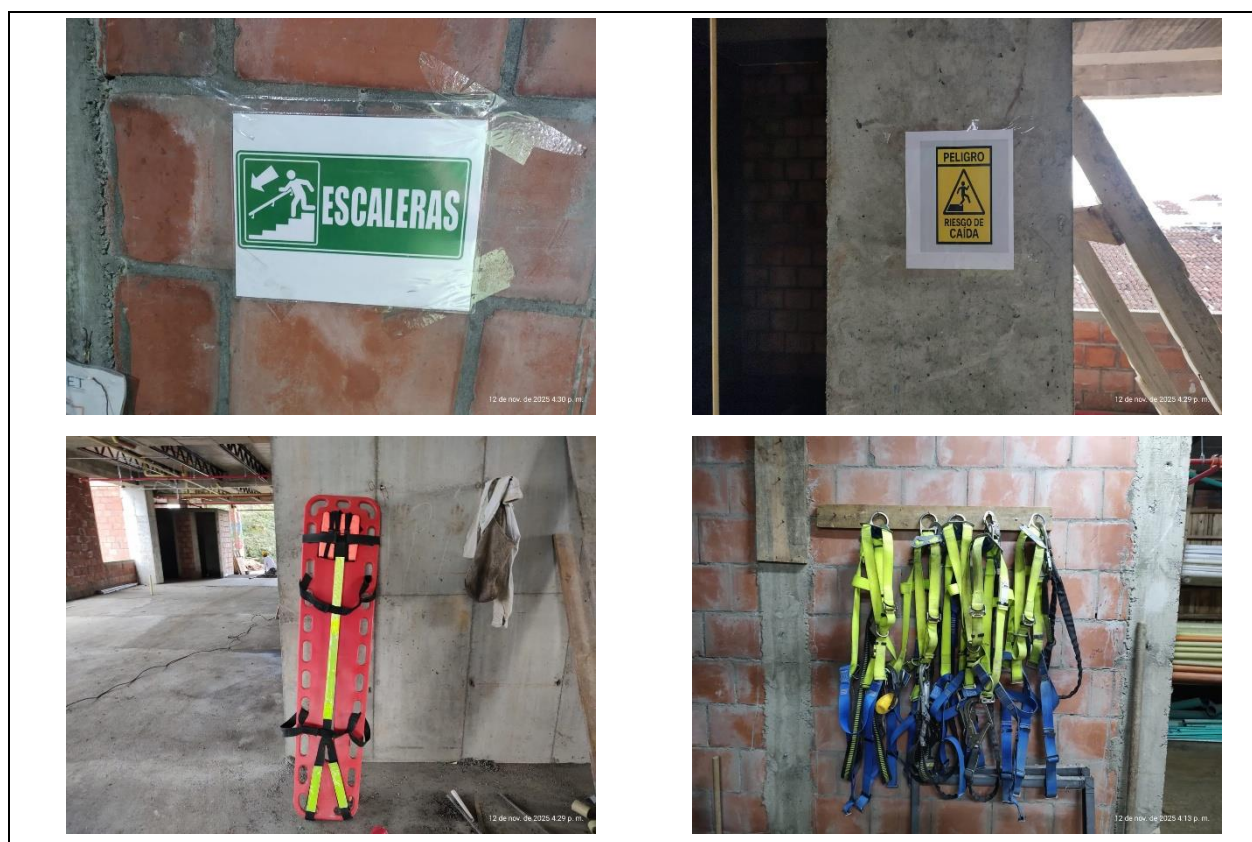

PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad del área de influencia directa del proyecto. No obstante, se mantuvieron activos los canales de comunicación establecidos para garantizar la atención oportuna de inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía.

Entre estos mecanismos se destacan:

- El correo electrónico institucional habilitado por el contratista, disponible permanentemente para la recepción de mensajes y solicitudes.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- El buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ubicado en el acceso principal de la obra, debidamente identificado, accesible y en condiciones adecuadas de conservación, lo que facilita su uso por parte de los habitantes del sector.

El mantenimiento y operatividad de estos canales favorece la comunicación bidireccional entre el proyecto y la comunidad, permitiendo preservar la confianza, promover el control social y garantizar la transparencia en la ejecución de las actividades constructivas, incluso durante los periodos en los que no se programan espacios de interlocución directa.

Se resalta la importancia de continuar difundiendo y visibilizando estos medios de comunicación mediante carteleras informativas, piezas impresas o mensajes digitales, con el acompañamiento de líderes comunitarios, autoridades locales y representantes de la veeduría ciudadana. Esto contribuye a mantener una relación participativa y de respeto mutuo entre las partes interesadas.

De igual forma, se recomienda fortalecer la trazabilidad y seguimiento de los canales de participación, mediante la implementación de un registro sistematizado de las comunicaciones recibidas, la clasificación por tipo de solicitud o tema, el análisis de los asuntos recurrentes y la respuesta oportuna y documentada a cada requerimiento. Estas acciones permiten evaluar el nivel de satisfacción ciudadana y mejorar continuamente la gestión social del proyecto.

Las actividades descritas se desarrollan en cumplimiento del Plan de Manejo Social y Ambiental (PMSA) y de la normativa vigente, entre ellas:

- La Ley 1757 de 2015, que promueve el derecho a la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- El Decreto 1077 de 2015, que reglamenta aspectos relacionados con la participación comunitaria en la ejecución de proyectos de infraestructura.
- La Ley 850 de 2003, que regula el funcionamiento de las veedurías ciudadanas.

Finalmente, se recomienda valorar la posibilidad de reanudar encuentros presenciales o virtuales en los próximos periodos, siempre que las condiciones de seguridad, logística y avance del proyecto lo permitan, con el fin de fortalecer el diálogo directo, la confianza institucional y la participación efectiva de la comunidad en el seguimiento ambiental y social del proyecto. Se ratifica que el canal para la atención de PQRS continúa abierto, disponible y funcional para los habitantes del área de influencia.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se realiza el acumulado de los indicadores de gestión, los cuales se relacionan a continuación.

PROGRAMA 1.1		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		79.2
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Comite mensual	14	7/14	50	
Informes mensuales entregados	27	21/24	87.5	
Profesionales contratados	2	2/2	100	Ejecutada al 100%

PROGRAMA 1.2		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		90
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Tramite ente CRC	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Siembras de diez arboles	10	10/10	100	Ejecutada al 100%
Tala de arbol (Guayacan)	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Mantenimiento de cobertura vegetal	5	3/5	60	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

**INFORME MENSUAL No. 21**

Documento
Versión 1

PROGRAMA 1.3		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		78.56
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Tramite ente CRC programa RCD	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Disposicion de material RCD	1981	1981/1981	100	Ejecutada al 100%
Informes trimestrales ante CRC	7	5/7	71.4	
Shut de escombros	2	1/2	50	
Capacitación ambiental	14	10/14	71.4	

PROGRAMA 1.4		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		61.26
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Punto de acopio estructura en guadua	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Canecas plasticas	6	6/6	100	Ejecutada al 100%
Disposicion de RESPEL	200	25.6/200	26.3	
Herramientas para limpieza	6	3/6	50	
Bolsas de colores puntos ecologicos	100	30/100	30	

PROGRAMA 1.5		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		84.7
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Lavado de llantas vehiculos	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Rollo plastico negro	4	4/4	100	Ejecutada al 100%
Herramientas pedagogicas	500	271/500	54.2	

PROGRAMA 1.6		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		89.6
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Personal de limpieza	24	19/24	79.17	
Cerramiento 179.89 con lamina	179.89	179.89/179.89	100	Ejecutada al 100%

PROGRAMA 1.7		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		92.31
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Casco Dielectrico amarillo	13	13/13	100	Ejecutada al 100%
Casco Dielectrico Blanco	17	17/17	100	Ejecutada al 100%
Casco Dielectrico Gris	3	3/3	100	Ejecutada al 100%
Chalecos director, ingenieros, residentes	8	8/8	100	Ejecutada al 100%
Chalecos reflectivos	72	72/72	100	Ejecutada al 100%
Chaleco economico	40	40/40	100	Ejecutada al 100%
Guante tipo vaqueta	104	104/104	100	Ejecutada al 100%
Botiquin	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Extintor	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Arnes y lineas de vida	12	12/12	100	Ejecutada al 100%
Malla anticaidas	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Señaletica preventiva	80	40/80	50	
Cinta de peligro	20	10/20	50	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

PROGRAMA 1.8		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		75.0
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Reuniones con comunidad	2	1/2	50	
Entrega de refrigerios	400	400/400	100	Ejecutada al 100%

RECOMENDACIONES

1. Cierre formal del aprovechamiento forestal: Solicitar con carácter prioritario al contratista la entrega del documento oficial de cierre emitido por la CRC, indispensable para el cierre ambiental del proyecto.
2. Fortalecer el control en el manejo de RCD y materiales pétreos:
 - Incrementar la frecuencia de inspecciones de orden y limpieza.
 - Garantizar la cobertura permanente de materiales expuestos.
 - Reforzar la separación estricta entre pétreos, RCD y materiales aprovechables.
3. Mejorar la operatividad de los puntos ecológicos:
 - Retirar elementos que obstruyen los recipientes.
 - Reubicar los contenedores para garantizar su uso funcional.
 - Implementar controles diarios para el retiro oportuno de residuos reciclables.
4. Consolidación del registro de limpieza y residuos: Completar el banco de datos con la totalidad de formatos AA4 y puntos de acopio, permitiendo evaluar el comportamiento mensual del manejo de residuos.
5. Reforzar los sistemas colectivos de protección en niveles altos:
 - Instalar barandas, mallas, redes y cerramientos donde persisten riesgos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- Asegurar cumplimiento estricto de la Resolución 1409 de 2012 y demás normativa SST.

6. Optimizar la gestión social:

- Continuar difundiendo los canales PQRS de manera visible.
- Evaluar la posibilidad de reuniones presenciales o virtuales con la comunidad.
- Implementar un registro sistematizado de comunicaciones recibidas y atendidas.

7. Fortalecer la cultura ambiental en obra:

- Continuar con jornadas de capacitación cada mes o según necesidad.
- Implementar campañas visuales permanentes (carteleras, señalización educativa).
- Mantener el uso de folletos pedagógicos entregados al personal.

8. Seguimiento integral al cumplimiento del PMA Realizar una matriz consolidada de brechas y acciones correctivas por cada programa, permitiendo medir el avance real y orientar esfuerzos a los componentes con menor desempeño.

Dichas recomendaciones fueron previamente manifestadas al contratista de obra mediante oficio CIPZ-078-0432-2025 del 29 de octubre del presente.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL		
No.	NORMATIVA	ASPECTO LEGAL
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales corresponden al pago del mes de OCTUBRE 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9494342350	OCTUBRE	2025/11/04	5	APORTE EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL					
2	PENDIENTE	OCTUBRE		14	APORTE EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL					
3	9493418747	OCTUBRE	29/10/2025	1	APORTE EN LINEA
4	7987510506	OCTUBRE	15/10/2025	1	APORTE EN LINEA
5	9493973506	OCTUBRE	29/10/2025	1	SOI
6	4627500854	OCTUBRE	27/10/2025	1	APORTE EN LINEA
7	9494189061	OCTUBRE	31/10/2025	1	APORTE EN LINEA
8	9493944075	OCTUBRE	19/11/2025	1	SOI
9	9492497638	OCTUBRE	28/10/2025	1	APORTE EN LINEA
10	PENDIENTE	OCTUBRE		7	APORTE EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – INGRESO					

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADO RES POR PLANILLA	OPERADOR
11	REPORTA COBERTURA 13/11/2025	OCTUBRE	N/A	1	
12	REPORTA COBERTURA 14/11/2025	OCTUBRE	N/A	1	
CONTRATIST- TOPOGRAFIA					
17	9494459715	OCTUBRE	2025/11/06	2	APORTE EN LINEA
CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS					
18	9494459715	OCTUBRE	7/11/2025	11	APORTE EN LINEA
CONTRATIST- DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA – ELECTRO SISTEMA DEL CAUCA					
18	PENDIENTE PLANILLA	OCTUBRE		11	
CONTRATISTA- IMPERPLAST					
27	PENDIENTE PLANILLA	OCTUBRE		11	SOI
CONTRATIST-IMPO HERRAJES OSCAR GUZMAN					
	9494443321	OCTUBRE	2025/11/06	11	
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA – WILLIAM MUÑOZ					
	9493634167-9494317305	OCTUBRE	2025/11/05-2025/11/05	22	
CONTRATISTA- PERSONAL TRANSITORIOS					
21	SIN NOVEDAD	OCTUBRE			APORTE EN LINEA
CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS					
TOTAL				90	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS			CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
1	WILINSON ANDRES QUILINDO CHARO			1.007.410.693	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAU CA
2	HARLEY RUIZ GAVIRIA			76.323.117	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAU CA
3	DIANA MAGALI ARANGO CORREA			1.144.138.374	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAU CA
ESTUDIANTES								
4	LAURA TATIANA OLIVEROS AVIRAMA			1.061.804.547	ASMET SALUD	-	Sura	
5	JUAN SEBASTIAN SENDOYA VIVEROS			1.002.819.784	NUEVA EPS	-	Sura	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP								
6	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ			10.302.884	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
7	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO			93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
8	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA			1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	JULIO CESAR MAYA BASTIDAS			98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
10	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ			1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N/A
11	ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ			34.533.693	SANITAS	PENS VEJ ACT	SURA	N/A
12	JULIAN ANDRES SANCHEZ SANTACRUZ			76.332.823	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
13	FABIAN ANDRES VIVAS CEBALLOS			10.498.268	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
14	JUAN CARLOS MENESES ARBOLEDA			1.004.248.033	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
15	BRENDA VIVIANA ALEGRIA TRUJILLO			1.061.756.223	SANITAS	PORVENIR	SURA	
16	ESTIVEN GAVIRIA MAJIN			1.002.959.974	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
17	EDELIO NAVIA GALINDEZ			76.223.730	ASMET SALUD	COLPENSIONES	SURA	

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"



Documento
Versión 1

INFORME MENSUAL No. 21

18	GENTIL LEDEZMA	76.236.273	SANITAS	PORVENIR	SURA	
19	YEISON ATOY	1.002.925.583	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO						
20	YAN CARLOS MANQUILLO	1002926684	FAMILIAR COLOMBIA	PORVENIR	SURA	
21	ELGAR NAVARRETE	9940078	SOS	COLPENSIONES	SURA	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- RETIRO						
0	SIN NOVEDAD					

CONTRATISTA TOPOGRAFIA						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
22	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
23	FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- RETIRO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
24	JAIME JUNIAN MUÑOZ GUASAMALLI	4.617.575	SURA	COLPENSIONES	SURA	
25	JOSE CLAUDIO IETER RENGIFO	76.190.347	ASMED SALUD	COLPENSIONES	SURA	
26	LUISA FERNANDA MORENO ORTEGA	1.088.651.098	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	
27	ROLANDO BURBANO CALIBIO	15.571.993	SANITAS	PORVENIR	SURA	
28	FERNANDO ANDRES CHACON CABARICO	1.130.607.657	SANITAS		SURA	
29	JULIAN ANDRES VALENCIA	1002964418	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	
30	HAROLD EVER ZAPATA VALENCIA	10.593.026		PORVENIR	SURA	
31	FABIAN ANDRES ZAPATA	1.002.843.199	ASMET SALUD		SURA	
32	FRANCISCO ANTONIO BASTIDAS	5621523	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
33	JANNER ALVEAR CHAMIZO	1.061.782.146	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
34	JESUS OLMEDO	10.694.559				
35CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- INGRESOS						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- RETIROS						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- WILLIAM MUÑOZ						

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

35	WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO	76.325.832	SANITAS	PORVENIR	SURA	
36	JESUS EDUARDO GUERRERO VIERA	PPT 5403220	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
37	FRANCISCO JAVIER URIBE VALENCIA	1.061.707.344	SANITAS	PORVENIR	SURA	
38	JOSE ARTURO PADILLA PAY	10.541.497	NUEVA EPS	PENSIONADO	POSITIVA	
39	YINEER QUINAYAS	10.298.885	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
40	ANDRES CAMILO QUINAYAS	1.029.600.516	NUEVAEPS	PORVENIR	POSITIVA	
41	ALIRIO HERNANDEZ RUIZ	1.003.815.472		PORVENIR	POSITIVA	
42	ROVI YATA LAME	10.305.399	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
43	HERNAN RUIZ	1.063.813.472			POSITIVA	
44	JAIRO BASTIDAS	4.664.656	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
45	JOSE REINEL CAICEDO	76.325.832			POSITIVA	
46	LUZ AIDA VELASCO	1.061.733.538	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
47	OLIVER ISAI DORADO	1.118.308.478	EMSSANAR	PORVENIR	POSITIVA	
48	SEGUNDO LIVARDO RIASCOS	94.490.998	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
49	WILLIAM ALEXANDER CHANTRE	4.788.852	AIC	PORVENIR	POSITIVA	
50	BERNEY ANTONIO JOJOA	76.321.720	ASMET SALUD	PORVENIR	POSITIVA	
51	CARLOS FLOR	10.751.255	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
52	JOSE MIGUEL HERNANEZ	1143936483	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	
53	FREIMAN FLOR CAMAYO	1.002.917.971	ASMET SALUD	PORVENIR	POSITIVA	
54	JESUS ODIOLIO VILLOTA	76.358.159	ASMET SALUD	PORVENIR	POSITIVA	
55	YEISON LOPEZ	1.061.748.534	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
56	JOSE ANGULO	16.825.893			POSITIVA	
CONTRATISTA – IMPO HERRAJES						
57	YEISON A ESCOBAR	10.306.897	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	POSITIVA	
58	OSCAR GUZAMAN ROSERO	1.061.729.622	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	POSITIVA	
59	JAHIR ANDRES OTERO	1.061.713.494	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	
60	DIEGO VELAZCO GOMEZ	1.002.971.512			SURA	
61	JULIAN CAMILO BETANCURT	1.061.684.401			POSITIVA	
62	JOHAN HURTADO ORDOÑEZ	1061753839	S.O.S.	PORVENIR	POSITIVA	
63	JOSE VICENTE HURTADO	10.307.777	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

RELACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO							
CONTRATISTA –							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF	
	SIN NOVEDAD						
TOTAL							

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	16
Antiguo	72
Retiro	0
Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuenta para los datos estadísticos)	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	89
TOTAL, DE PERSONAL SIN PERSONAL TRANSITORIO	89

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:
FORMULA	$\frac{\text{Nº de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{\text{No de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	ADMINISTRACION	Ingreso	2
2	PERSONAL TRANSITORIO	Ingreso	0
3	WILLIAM MUÑOZ	Ingreso	4
4	IMPETPLAS	Ingreso	0
5	DIEGO CASTRO	Ingreso	2
6	HIPO HERRAGES	Ingreso	8

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los exámenes sin restricciones para la labor, tener en cuenta los exámenes con recomendaciones generales para su socialización y seguimiento.

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista se relaciona la entrega de EPP's mediante el registro del formato de código SST-FT-35, Entrega de Dotación y Elementos de Protección, relacionados en la carpeta SST. para los trabajadores del subcontratista UBANER PEREZ, se solicita mediante el oficio de las observaciones del informe los registros de entrega del resto de subcontratistas del Consorcio EVOLET.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Entrega de dotación y EPP al personal
FORMULA	$\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP}}{\text{Numero de trabajadaores contratados}} \times 100 = 100\%$

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	No. TOTAL, DE TRABAJADORES	OBSERVACIONES
1	EVOLET - ADMINISTRATIVO	20	
2	TOPOGRAFIA	2	
3	MAMPOSTEROS	23	
4	HSA	11	
5	IMPERTPLAST	11	
6	TRANSITORIO	0	NO SE TENDRA EN CUENTA PARA CALCULAR LOS DATOS ESTADISTICOS
7	ELECTRICOS	11	
8	HIPO HERRAGES	11	
TOTAL			89

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

TOTAL, SIN PERSONAL TRANSITORIO	89
--	-----------

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL. La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, los registros de 24 inducciones, de las cuales se evidencia el ingreso de 16 colaboradores con el listado de relación del personal y la entrega de documentos soportes de inducción mediante los registros de inducciones en el formato de entrenamiento, CV-SGSST-14-V1 correspondientes al periodo del Consorcio EVOLET y sus contratista.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Cobertura Inducción y reintucción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes}}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes}} \times 100 = \frac{24}{24} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reintucción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de Inducciones y reintucciones ejecutadas}}{\text{No. de Inducciones y reintucciones programadas}} \times 100 = \frac{24 + 0}{24 + 0} \times 100 = 100\%$

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 5 actividades de capacitación con el área SST, con el tema asociado a la atencion de emergencias, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitación del personal

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores prom asisten capacitación al mes 33}}{\text{No. de trabajadaores en el mes PROMED 33}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reintucción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de capacitaciones ejecutadas 4}}{\text{No. de de capacitaciones programas 4}} \times 100 = 100\%$

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADORES ASISTENTES	No. TRABAJADORES PROGRAMADOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	23/10/2025	Prevención e importancia del auto cuidado examen de mamas	31	31	100
2	30/10/2025	definición de Accidente de trabajo, rutas para informar eventos, incidentes y accidentes, enfermedad general y laboral uso adecuado de EPP	54	54	100
3	6/11/2025	Socialización políticas SG-SST y Políticas de no consumo de sustancias psicoactivas, peligro mecanico-biomecanico uso adecuado de EPP	29	29	100

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Imagen No. 1, 2, 3 capacitaciones realizadas en el periodo		
FUENTE: CONSORCIO EVOLET		

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

La interventoría verifica que en el periodo no se evidencia actas ni gestión correspondiente a la actualización del comité según corresponde a la norma Resolución 3461 de 2025, continuando con la observación sin dar solución.

El contratista en el periodo no relaciona situaciones presentadas asociadas a acoso laboral.

AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO			
No.	ORIGEN	EMPRESA	TIEMPO REPORTADO
1	ACCIDENTE LABORAL	SIN NOVEDAD	0
2	INCAPACIDAD X A. T	CONSORCIO EVOLET,	18

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

		UBANER	
3	ENFERMEDAD LABORAL	SIN NOVEDAD	0
4	INCAPACIDAD X A. L	SIN NOVEDAD	0
5	ENFERMEDAD COMUN	SIN NOVEDAD	0
6	PERMISOS	UBANER PEREZ GOMEZ	5 DIAS
7	INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS	SIN NOVEDAD	0
TOTAL, DE AUSENTISMO			23 DIAS

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	
DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	89
Número de accidentes laborales durante el periodo	0
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	18
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	4
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	412+18=430
Frecuencia de Accidentalidad = = <u>No de accidentes de trabajo presentados en el mes</u> x100 No de trabajadores en el mes	0/89*100 =0%
Severidad de Accidentalidad = <u>No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes</u> *100 # de trabajadores en el mes	18+0/89*100=20.2 %
Índice de lesiones incapacitantes = $I_{f x I S} / 1000$	0*20.2/1000 = 0
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	18/25*100 =72

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

Como parte del plan de capacitaciones se evidencia mediante registro fotográfico la realización de pausas activas en las áreas operativas y administrativas.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Relación de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- Inspección de EPP y equipos
- Corrección de Actos y condiciones inseguras
- Acta de reunión con el personal de ayudante de seguridad para trabajose en alturas
- Reporte de actos y condiciones inseguras presentadas durante la ejecución de la obra.

La interventoría verifica que se anexa los permisos de trabajo en alturas correspondientes al periodo

Por el Consorcio EVOLET, HSA, INGENIO TOPOGRAFICO, WILLIAM MUÑOZ

ORDEN Y ASEO

La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden y aseo, se evidencia la realización de jornadas de estas, pero se continúan con los requerimientos permanente, por la dinámica de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Imagen 1,2 y 3, Actividades Orden y Aseo en obra <i>FUENTE: Propia</i>		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
Imagen No. 5, 6 y 7. Disposición de recipientes para recolección de residuos del baño, según su clasificación, Servicios de baños para el personal de obra.		
<i>FUENTE: propia</i>		

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de emergencia, son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina -administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.
Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos

BRIGADA DE EMERGENCIA

El CONSORCIO EVOLET cuenta con la brigada de emergencia conformación por los siguientes integrantes:

BRIGADA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
JEFE DE BRIGADA	Jesús Truba	76.334.379	JESUS TRUBA
JEFE DE EVACUACIÓN	Guillermo León Escobar	79.3395308	Guil.
BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	Ubner Pérez	1061600546	Ubner P.
BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Ricardo Bolaños	4754652	Ricardo
PERSONAL DE APOYO	Jose Revelo	1061725247	Jose Revelo

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacidad de respuesta
FORMULA	$\frac{\text{Numero de emergencias atendidas oportunamente}}{\text{Numero de emergencias presentadas}} \times 100 = N.A.$
INDICADOR	% de simulacros realizados
FORMULA	$\frac{\text{Numero de simulacros efectuados}}{\text{Numero de simulacros programados}} \times 100 = N.A$

INSPECCIONES.

La intervención verifica las inspecciones presentadas en el periodo correspondiente al informe:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- Inspección de sistemas de acceso para trabajos en alturas con fecha del 4 noviembre del 2025, 7 /10/2025 al 9/10/2025
- Inspección de E.P.P, con fecha del 27/10/2025
- Inspección preoperacional de equipos de protección contra caídas, con fecha 27-31 de octubre 2025
- Inspección de la Puma Grúa, con fecha del 10 noviembre del 2025
- Inspección general de obra, con fecha del 24 de octubre del 2025
- Inspección de Oficina, con fecha del 11 de noviembre del 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2025.

Anexo 6. Informe mensual del periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2025.

7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c —

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c .

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c , sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las partes.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Anexo 7. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

8. CONCLUSIONES

- El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de noviembre de 2025 del 46.5 % por valor de \$15.099.574.487 frente un avance programado del 46.5%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025 es de 0.89% frente a un avance programado del 0.89%.
- El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra No 8, con fecha de corte 14 de noviembre de 2025, por un valor de \$2.390.862.204 correspondiente al 7.36%, para un acumulado facturado de \$15.099.574.487 correspondiente al 46.5%, del valor contractual, quedando un saldo por facturar de \$17.374.354.082 correspondiente al 53.5%. Se tiene una amortización del anticipo acumulado por valor de \$4.529.872.346, quedando pendiente por amortizar \$5.212.306.225 del anticipo.
- La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.
- Durante el periodo evaluado (21 de octubre al 25 de noviembre de 2025), se evidenció la ejecución de actividades contempladas en los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), destacándose avances en el manejo de residuos sólidos, la protección del suelo, la señalización y cerramiento de obra, así como en la prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos.
- El contratista implementó medidas de control ambiental como la disposición de coberturas plásticas, la correcta segregación de residuos bajo el código de colores de la Resolución 2184 de 2019, la entrega de residuos peligrosos a gestores autorizados y la realización de capacitaciones en separación y aprovechamiento

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

de residuos, lo que refleja un compromiso con la gestión ambiental y la seguridad en la obra.

- A nivel de seguridad y salud en el trabajo, se verificó la disponibilidad de equipos de protección personal (EPP), botiquín de primeros auxilios, extintores y señalización preventiva, lo cual demuestra un cumplimiento de las disposiciones del SG-SST y de las normas aplicables en materia de seguridad laboral.
- Gestión Ambiental: Se mantiene la presencia de las profesionales responsables de Gestión Ambiental y SST, quienes realizaron el seguimiento continuo al PMA y atendieron los canales de PQRS, sin reportes durante el periodo
- Aprovechamiento Forestal: Las actividades autorizadas en el permiso fueron ejecutadas en su totalidad y se reiteró al contratista la necesidad de presentar el soporte del cierre formal ante la CRC. Aún no se anexa dicho soporte, lo cual es necesario para el cierre documental del proyecto
- Manejo de RCD: Se observan avances estructurados en la cobertura y almacenamiento de materiales pétreos, disminuyendo la contaminación cruzada. Sin embargo, persisten áreas con exposición a la intemperie y riesgo de mezcla de materiales que requieren mayor control operativo. Se realizó una capacitación ambiental en manejo de RS y RCD el 13 de noviembre de 2025
- Manejo de Residuos Sólidos: Se efectuó la dotación de bolsas y herramientas para aseo, además de jornadas de limpieza. Aun así, algunos recipientes permanecen obstruidos o mal ubicados, lo que limita la segregación en la fuente y el orden del frente de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

- **Almacenamiento de Materiales:** Se entregó material pedagógico para reforzar los temas de clasificación, almacenamiento y rutas de manejo de residuos, fortaleciendo la cultura ambiental del personal de obra
- **Manejo de Campamento:** Los formatos de control de limpieza fueron diligenciados de forma continua, favoreciendo el seguimiento y la trazabilidad de residuos, aunque aún no se presenta el consolidado final debido a la fecha de corte del informe
- **Señalización y Seguridad Industrial:** Se identificaron deficiencias previas en barreras físicas y protecciones colectivas en niveles superiores. Durante el periodo se evidenciaron mejoras en señalización, delimitación y pasos peatonales, aunque persiste la necesidad de reforzar medidas colectivas para trabajo en alturas y control de accesos a zonas de riesgo
- **Relación con la Comunidad:** No se realizaron reuniones presenciales; sin embargo, los canales de comunicación permanecieron activos y funcionales, garantizando la atención a inquietudes ciudadanas. Se resalta la importancia de mantener su difusión y trazabilidad
- **Cumplimiento del PMA:** Se evidencia avance en la mayoría de los programas, con actividades ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos. No obstante, se identifican aspectos que requieren fortalecimiento operativo para alcanzar niveles óptimos de cumplimiento.
- **El contratista de obra** ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. Asimismo, ha hecho entrega en forma oportuna de los

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 21	Documento Versión 1

documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

- Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.
- La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.
