

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27 – ABRIL 26 – MAYO 25 DE 2026	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO AND GLOBAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 26 (PERIODO ABRIL 26 DE 2026 – MAYO 25 DE 2026)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 27
CONSORCIO ADN GLOBAL

Elaboró: Ricardo Iragorri V. Residente de Interventoría Consortio ADN GLOBAL	Martha Lucia Castro Burbano. Aprobó: Representante legal Consortio ADN GLOBAL

MAYO 25 DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 27	1
TABLA DE CONTENIDO	2
1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.1. Localización.....	7
2.2. Justificación.....	8
2.3. Características del Proyecto.	9
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	10
3.1. Contrato de Obra.....	10
3.2. Póliza del Contrato de Obra.....	11
3.3. Contrato de Interventoría.	13
3.4. Pólizas de Interventoría.	14
4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.	15
4.1. Gestión Administrativa	15
4.1.1 Personal de Interventoría.....	15
4.1.2 Personal del contratista de obra.	16
4.1.3. Comités de obra.	17
4.1.4 Correspondencia	17
● CORRESPONDENCIA MENSUAL.....	18
4.2. Gestión Técnica	18
4.2.1 Avance de obra	18
REGISTRO FOTOGRAFICO	26
● BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.....	52
4.3. Gestión Financiera	54

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION	57
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024	59
4.4. Gestión Socioambiental	61
PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	61
PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL.....	62
PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD	62
PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	65
PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	66
PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO.	67
PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	69
PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD	71
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE FEBRERO DE 2026	72
5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	75
RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO.....	82
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).....	83
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL..	84
CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	84
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.....	86
AUSENTISMO LABORAL	86
Control a programas epidemiológicos.....	87
Control a programas osteomuscular	88
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:	88
Relación de actividades ejecutadas durante el periodo.....	88
ORDEN Y ASEO.....	92
PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.....	93

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

INSPECCIONES..... 93

RECOMENDACIONES – OBSERVACIONES 94

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO ADN GLOBAL cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE MARZO DE 2025 A 25 DE ABRIL DE 2026, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto

la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km², el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotaré, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotaré, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte (\$32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Otro si del 10 de septiembre de 2024	Otro si modificadorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), c) CONSTRUCCION LOSA ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, e) LOSA CONCRETO ALIGERADA ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3" Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Otro si del 15 de abril de 2025	Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025.
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 4	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	13-sept-2026	\$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	13-sept-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	13-may-2029	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 3. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 4	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	13-may-2031	\$ 1.623.696.428,45

Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO ADN GLOBAL
NIT	902.016.266-4
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. (\$1.280.412.030) incluido iva.
Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Inicio cesión	01 de diciembre 2025
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Otro si del 15 de abril de 2025	Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días.
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días.
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030

Tabla 5. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435 47 994000062355 ANEXO 1	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	01/12/2025	13/11/2026	\$155.864.238,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	01/12/2025	13/05/2029	\$38.966.059,60
Calidad del Servicio	12/05/26	12/05/2031	\$155.864.238,40

Tabla 6. Pólizas de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE ABRIL DE 2026 al 25 DE MAYO DE 2026.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Martha Lucia Castro Burbano
Director de Interventoría	Gustavo Adolfo Gualteros
Residente de Interventoría	Ricardo Iragorri Velasco
Inspector de Obra	Abel Enrique Rodríguez
Ingeniero eléctrico	Juan José Mosquera
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Guicelle Talaga Chávez
Abogado Jurídico	Diana Marcela Barbosa
Contador publico	Yuli Vanessa González
Personal Adicional	
Arquitecto Apoyo Técnico	Jose Luis Agredo Palacios
Ingeniera Ambiental	Carolina Fernández

Tabla 7. Personal de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Director técnico de obra	Fabian Andrés Vivas
Ingeniero residente de obra	Wilmar Andrés Goyes Araujo
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastián Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Marlene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Brenda Viviana Alegría
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Ingeniera civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria
Ingeniero civil apoyo técnico.	Juan Carlos Meneses

Tabla 8. Personal del contratista de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron cuatro (2) comités técnicos de seguimiento realizados por la interventoría, el contratista y la supervisión del Hospital Universitario San José.

COMITÉ	FECHA
COMITÉ TECNICO DE OBRA	30-04-26
COMITÉ TECNICO DE OBRA	15-05-26

Tabla 9. Actas de comité

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de abril a 25 de mayo de 2026 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Anexo 4. Actas de comité mayo de 2026

4.1.4 Correspondencia

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de abril al 25 de marzo de 2026.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

● **CORRESPONDENCIA MENSUAL**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 <u>OBJETO:INTERVENTORÍA</u> TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN <u>SOCIAL</u>, RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO ADN GLOBAL	

MES CORRESPONDIENTE: Mayo 2026

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
29-04-2026	N/A	ENTREGA ACTA PARCIAL N°14 DE OBRA DEL 20 ENERO 2026. CONTRATO N°358 2023	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	SUPERVISION HUSJ				
30-04-2026	N/A	REQUERIMIENTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA – ACTIVIDADES DE IZAJE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA HELIPUERTO	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	CONSORCIO EVOLET				
27-04-2026	N/A	REITERACIÓN DE SOLICITUDES Y OBSERVACIONES	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	CONSORCIO EVOLET SUPERVISION HUSJ				
30-04-2026	N/A	REVISION DEL COMPONENTE DE REDES SECAS GENERADO POR EL CONTRATISTA EVOLET.	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	CONSORCIO EVOLET SUPERVISION HUSJ				
27-04-2026	N/A	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA – SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA No. 358 DE 2023	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	SUPERVISION HUSJ				
27.04.2026	N/A	SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 078 DE 2024, EN GARANTÍA DE LA CONTINUIDAD DEL CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 358 DE 2023, Y EN CORRESPONDENCIA CON LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PROPUESTA PARA SU EJECUCIÓN.	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	SUPERVISION HUSJ				
06-05-2026	N/A	REITERACIÓN DE OBSERVACIONES, ADOPCIÓN INMEDIATA DE CORRECTIVOS, FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE OBRA Y SOLICITUD DE RELACIÓN DE PERSONAL	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	CONSORCIO EVOLET SUPERVISION HUSJ				
13-05-2026	N/A	NOTIFICACIÓN DE FORMALIZACIÓN Y PUESTA EN FIRME DE OTROSÍ NO. 03 – CONTRATO NO. 358 DE 2023 / SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN FINAL DE OBRA.	INTERVENTORIA CONSORCIO ADN GLOBAL	CONSORCIO EVOLET SUPERVISION HUSJ				

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

Periodo: 26 de abril al 25 de mayo de 2026.

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de abril del 2026 del 92.0% frente un avance programado acumulado del 92.0%, lo cual deja la ejecución en un porcentaje igual frente al programado.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

COMPONENTE TÉCNICO

Avance de Obra

En el periodo comprendido entre el **26 de abril y el 25 de mayo de 2026**, se ejecutaron las siguientes actividades en obra:

Primer piso

- Se realizan actividades de estructurado y tapado de cielo zona posterior
- Se realizan actividades de conexiones de redes secas en piso zona recepción y auditorio
- Se realizan actividades de relleno, y graniplas en fachadas de la subestación
- Se realizan muros en mampostería en el auditorio y muros complementarios zona escalera de emergencias
- Se realizan actividades de montajes de gabinetes para equipos especializados eléctricos en cuarto técnico
- Se realizan actividades de excavaciones para acometida eléctrica de los tanques de almacenamiento
- Se realizan actividades de excavaciones para acometidas red contra incendios a tanques de almacenamientos
- Se realizan actividades de enchape de pisos zona hall recepción y alistado de piso y enchape andén exterior frontal
- Se realizan actividades de relleno con material seleccionado en la parte frontal externa para desarrollo del urbanismo
- Se realizan actividades de estructura y muros board en auditorio
- Se realizan actividades de alistado de piso en zona auditorio y pasillos
- Se realizan actividades de instalación se acometida en buitrón escaleras de emergencias para red contra incendios a tanques de almacenamiento
- Se realizan actividades de excavaciones, instalación de textil, tubería y agregado grueso para filtro perimetral en la subestación eléctrica
- Se realizan actividades de repellos en muro mampostería zona auditorio
- Se realizan actividades de relleno de muros en concreto zona auditorio
- se realizan actividades de fundición de losa complementaria hall de escaleras de emergencias

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- Se realizan actividades de instalación de bombas de achique en los fosos de los ascensores
- Se realizan actividades de instalación de redes secas en auditorio y zonas comunes
- Se realizan actividades de alistado de piso de las escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia

Segundo piso

- Se realizan actividades de construcción de bordillo perimetral balcón frontal zona escaleras de emergencias
- Se realizan actividades de tratamiento de juntas y estucado cielo rasos
- Se realizan actividades de redes extractores
- Se realizan actividades de instalación de extractores para baños
- Se realizan actividades de instalación de puertas de madera en cubículos
- Se realizan actividades de detallado de muros
- Se realizan actividades de acabados de cielo rasos
- Se realizan actividades de instalación de puertas en maderas de consultorios
- Se realizan actividades de instalación parcial de aparatos de iluminación en consultorios y zonas comunes
- Se realizan actividades de alistado de piso de las escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia

Tercer piso

- Se realizan actividades de tapado de cielo raso
- Se realizan actividades de masillado de cielo rasos
- Se realizan actividades de instalación de redes secas
- Se realizan actividades de instalación de aparatos extractores de baños
- Se realizan actividades de instalación de guarda escobas y bocapuestas
- Se realizan actividades de instalaciones de redes para extractores de baños
- Se realizan actividades de instalación de extractores en baños
- Se realizan actividades de instalación de gabinete contra incendios en pasillo
- Se realizan actividades de instalación parcial de aparatos de iluminación en consultorios y zonas comunes
- Se realizan actividades de conexión de acometidas red contra incendios a gabinetes de pasillos
- Se realizan actividades de instalación de puertas de madera

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- Se realizan actividades de alistado de piso de las escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia

Cuarto piso

- Se realizan actividades de impermeabilización de losa de terraza frontal
- Se realizan actividades de enchape de terraza frontal
- Se realizan actividades de construcción de bordillo perimetral terraza posterior
- Se realizan actividades de enchapes pisos
- Se realizan actividades de estucado de muros board
- Se realizan actividades de tratamiento de juntas y estucado de cielos en board
- Se realizan actividades de instalaciones de redes para extractores de baños
- Se realizan actividades de instalación de extractores en baños
- Se realizan actividades de instalación de niples y aspersores para red contra incendios
- Se realizan actividades de instalación de gabinete contra incendios en pasillo
- Se realizan actividades de conexión de acometidas red contra incendios a gabinetes de pasillos
- Se realizan actividades parciales de instalación de aparatos de iluminación
- Se realizan actividades de instalación de puertas de madera
- Se realizan actividades de alistado de piso de las escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de alistado de piso de escaleras principales
- Se realizan actividades de enchape de escaleras principales

Quinto piso

- Se realizan actividades de relleno y estucos de muros en mampostería y estructura en concreto
- Se realizan actividades de instalación de bandejas para redes secas
- Se realizan actividades de enchapes de pisos
- Se realizan actividades de instalación de boca puertas y guarda escobas
- Se realizan actividades de instalación de redes para extractores de baños
- Se realizan actividades de instalación de extractores de baños
- Se realizan actividades de instalación de niples y aspersores para red contra incendios
- Se realizan actividades de instalación de gabinete contra incendios en pasillo
- Se realizan actividades de conexión de acometidas red contra incendios a gabinetes de pasillos

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- Se realizan actividades de alistado de piso de las escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de alistado de piso de escaleras principales
- Se realizan actividades de enchape de escaleras principales

Sexto piso

- Se realizan actividades de instalación de cableado redes secas
- Se realizan actividades de enchapes de pisos
- Se realizan actividades de instalación de guarda escobas y bocapuestas
- Se realizan actividades de instalación estructurado de cielo rasos
- Se realizan actividades de instalación de cielo raso en board
- Se realizan actividades de instalación de redes para extractores de olores
- Se realizan actividades de instalación de extractores de olores baños
- Se realizan actividades de instalación de estructura y tapado de dinteles en board para puertas
- Se realizan actividades de instalación de niples y aspersores para red contra incendios
- Se realiza el estructurado para mesones de laboratorios en super board
- Se realizan conexiones eléctricas en mesones para laboratorios
- Se realizan actividades de instalación de gabinete contra incendios en pasillo
- Se realizan actividades de instalación de mesones en cuarstone en laboratorios
- Se realizan actividades de alistado de piso de las escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia
- Se realizan actividades de alistado de piso de escaleras principales
- Se realizan actividades de enchape de escaleras principales

Séptimo piso

- Se realizan actividades de estucos en muros mampostería y estructura en concreto
- Se realizan actividades de enchapes de muros baños
- Se realizan actividades de instalación de ductos para aires acondicionados
- Se realizan actividades de enchapes pisos
- Se realizan actividades de estructuración de cielo raso
- Se realizan actividades de tapado de cielo rasos en super board
- Se realizan actividades de instalación de red contra incendios
- Se realizan actividades de cableado de redes secas
- Se realizan actividades de redes para extractores de olores baños

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- Se realizan actividades de instalación de extractores baños
- Se realiza el estructurado para mesones de laboratorios en super board
- Se realizan conexiones eléctricas en mesones para laboratorios
- Se realizan actividades de estucados en muros
- Se realizan actividades de conexiones de redes secas en pisos
- Se realizan actividades de instalación de gabinete contra incendios en pasillo
- Se realizan actividades de instalación de mesones en cuarstone en laboratorios

Octavo piso

- Se realizan actividades de tapado muros board
- Se realizan actividades de acabado muros board
- Se realizan actividades de enchapes de pisos
- Se realizan actividades de cableado de redes secas
- Se realizan actividades de redes para extractores de olores baños
- Se realizan actividades de instalación de extractores baños
- Se realizan actividades de conexiones red contra incendios

Noveno piso

- Se realizan actividades de conexiones eléctricas pisos
- Se realizan actividades de tapados de muros en board
- Se realizan actividades de estucos de muros board
- Se realizan instalaciones de bandejas para instalación de redes secas
- Se realizan actividades de cableado de redes secas
- Se realizan actividades de redes para extractores de olores baños
- Se realizan actividades de instalación de extractores baños
- Se realizan actividades de conexiones red contra incendios

Décimo piso

- Se realizan actividades de estructura de cubierta para el cuarto eléctrico
- Se realizan actividades de impermeabilización en terraza zona donde va ubicada la estructura del componente fotovoltaico
- Se realizan actividades de impermeabilización de la losa hall acceso del helipuerto

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- Se realizan actividades de impermeabilización de la losa de sobre recorrido del ascensor
- se realizan actividades de izaje parcial de estructura metálica del helipuerto
- se realizan actividades de instalación de alambrado desde el piso 10 hasta el piso 1 para protección atmosférica sobre las fachadas

Fachadas

Frontal

- Se realizan actividades de instalación de ventanearía piso 4 sobre terraza

Posterior

- Se realizan actividades de instalación de ventanearía
- Se realizan actividades de rellenos y fondeo en mampostería y estructura de concreto
- Se realizan actividades de acabado en textura graniplas

Lateral derecha

- Se realizan actividades de instalación de sobre fachada en lamina microperforada
- Se realizan actividades de instalación de ventanearía
- Se realizan actividades de acabado en graniplas

Lateral izquierda

- Se realizan actividades de texturizado de muros en graniplas
- Se realizan actividades de instalación de ventanearía
- Se realizan actividades de instalación de sobre fachadas en laminas microperforadas

CONCLUSIONES GENERALES

1. Avance significativo en acabados arquitectónicos y urbanismo: Durante el periodo reportado se evidenció un importante progreso en actividades de acabados, incluyendo enchapes de pisos y escaleras, estucos, tratamientos de juntas, instalación de cielo rasos, guardaescobas, bocapuestas y urbanismo exterior. Estas labores reflejan la transición de la obra hacia etapas finales de terminación arquitectónica en la mayoría de los pisos intervenidos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

2. Desarrollo integral de redes técnicas y sistemas especiales:
Se ejecutaron actividades relacionadas con redes secas, instalaciones eléctricas, sistemas de extracción, red contra incendios y protección atmosférica, incluyendo acometidas, gabinetes, aspersores, extractores y cableado estructurado. Lo anterior evidencia un avance coordinado en la implementación de los sistemas técnicos y de seguridad indispensables para la operación del proyecto.

3. Continuidad de actividades estructurales y complementarias en zonas específicas:
Aunque gran parte del proyecto se encuentra en fase de acabados, continúan desarrollándose actividades estructurales y complementarias como fundición de losas, construcción de bordillos, rellenos, excavaciones, impermeabilizaciones y montaje de estructuras metálicas, especialmente en zonas técnicas, terrazas, helipuerto y subestación eléctrica, garantizando la culminación integral de los componentes constructivos.

4. Avance simultáneo en fachadas y cerramientos exteriores:
Se observó progreso en la instalación de ventanearía, sobre fachadas microperforadas, aplicación de acabados tipo graniplas y tratamiento de muros exteriores en las diferentes fachadas del proyecto. Estas actividades permiten mejorar las condiciones de cerramiento, protección y apariencia arquitectónica de la edificación, acercando el proyecto a su etapa final de ejecución.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



MAMPOSTERIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



ACOMETIDA TANQUES HIDRAULICA Y RCI

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



SUBESTACION ELECTRICA EXTERNA


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

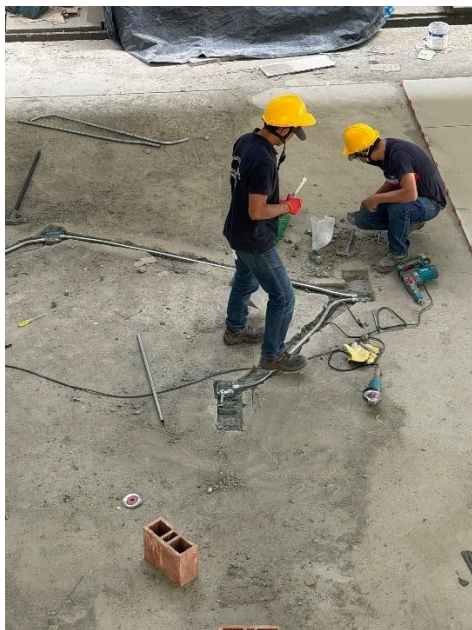

CONEXIONES ELECTRICAS INTERNAS


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

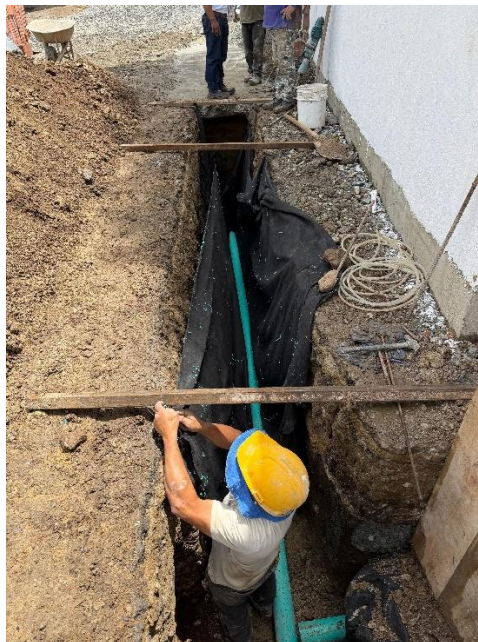

CONEXIONES ELECTRICAS EXTERNAS



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

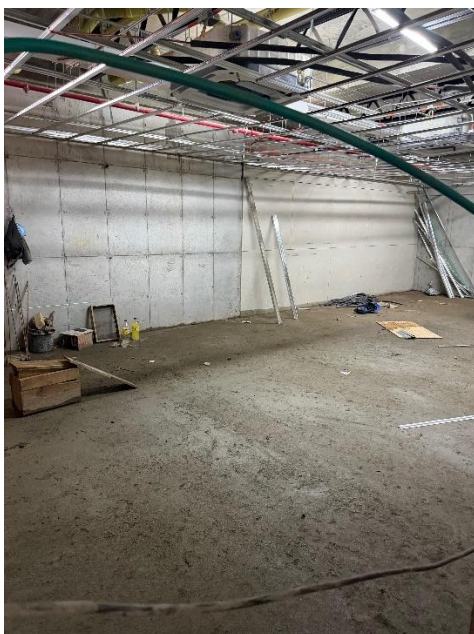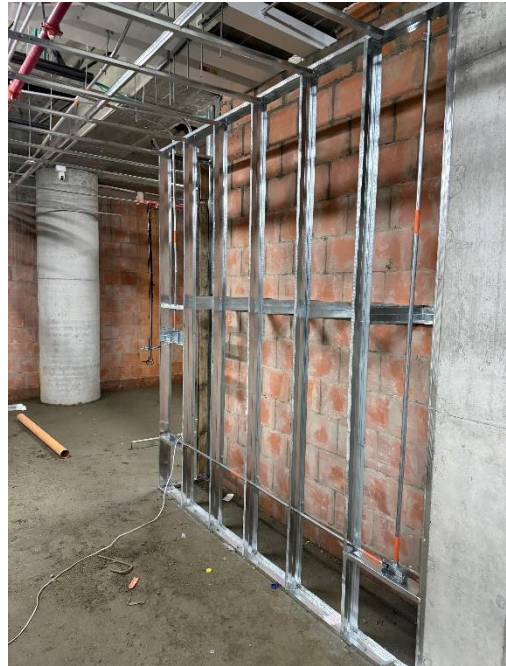

ESTRUCTURA MUROS Y CIELOS SUPER BOARD

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



MUROS Y CIELOS EN SUPER BOARD

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



RED CONTRA INCENDIOS



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

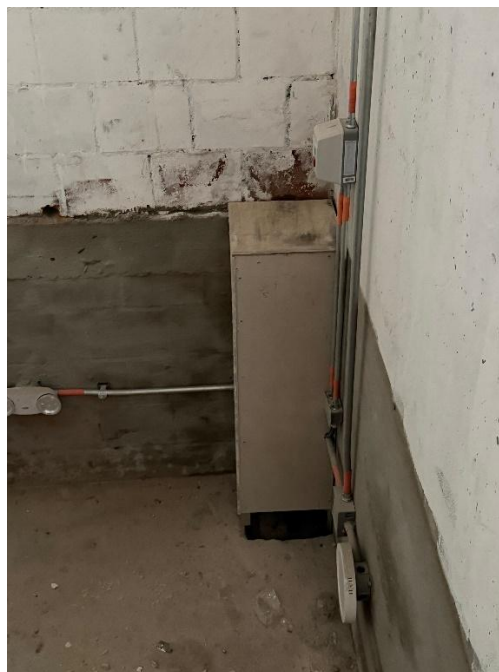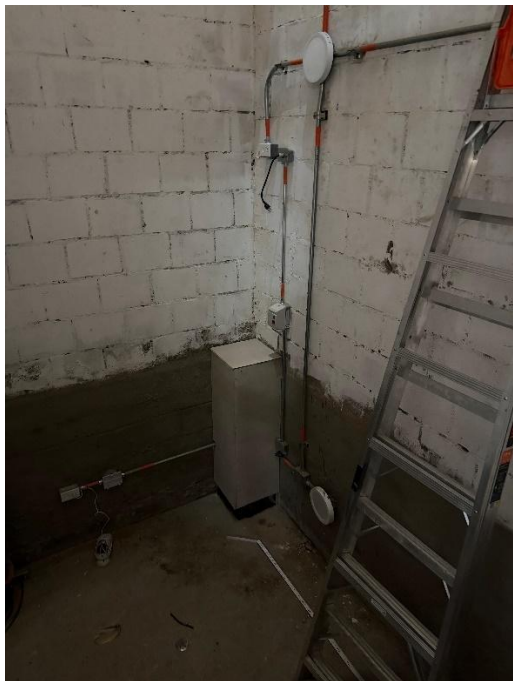

BOMBAS DE ACHIQUE FOSO ASCENSORES

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



ALISTADO DE PISOS



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

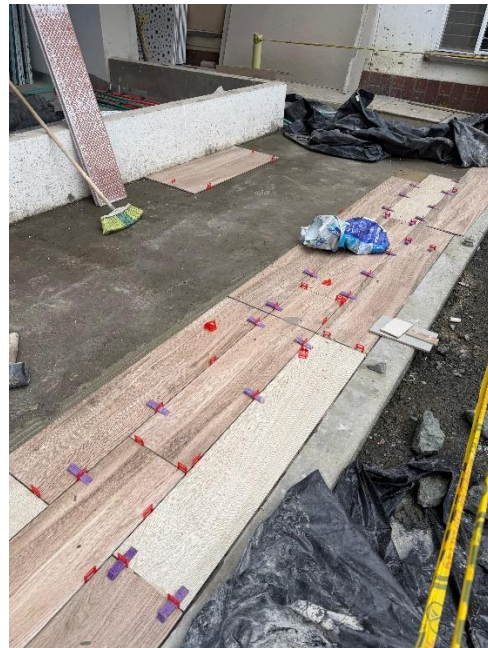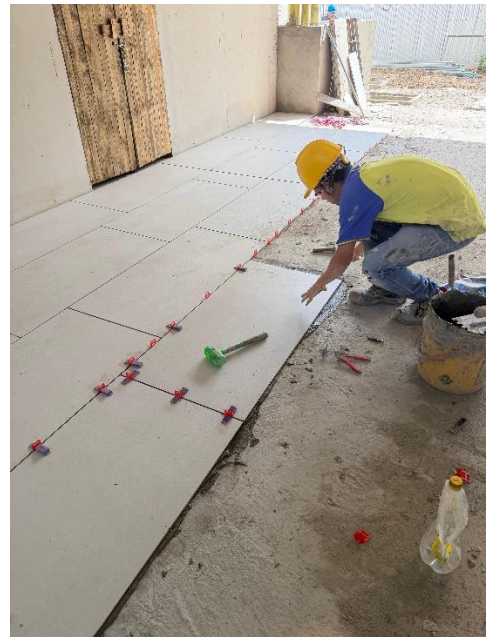

ENCHAPES DE PISOS


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

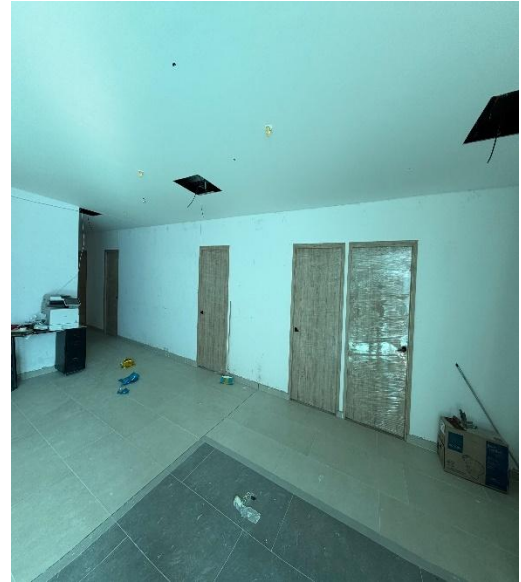

INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

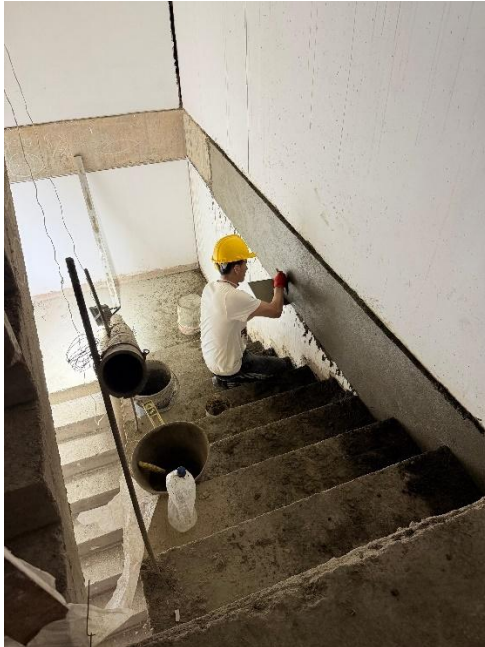

RELLENO Y ESTUCOS DE MUROS PUNTOS FIJOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



INSTALACION APARATOS DE ILUMINACION


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

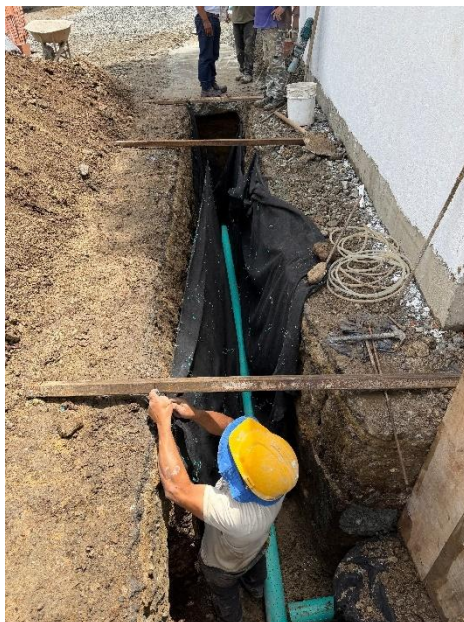

FILTRO PERIMETRAL SUBESTACION ELECTRICA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



IMPRIMANTE PARA IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y LOSAS TECNICAS


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

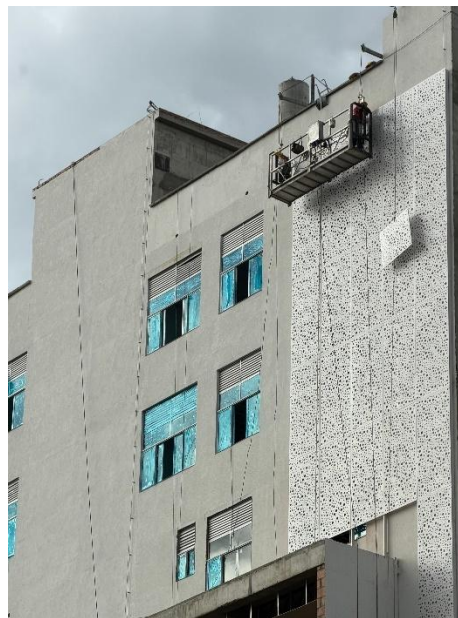

APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



CONDENSADORAS AIRES ACONDICIONADOS


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

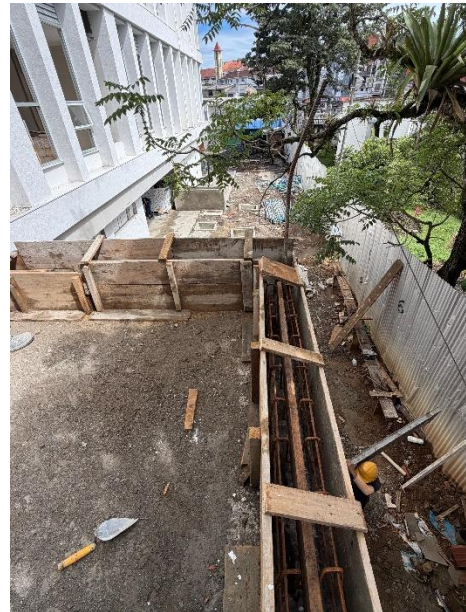

BORDILLOS EN BALCONES



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

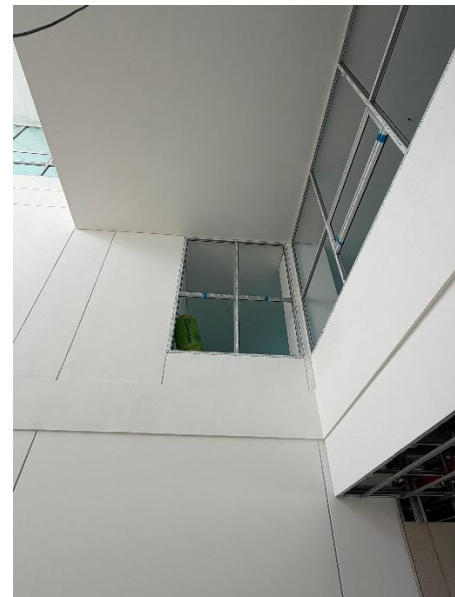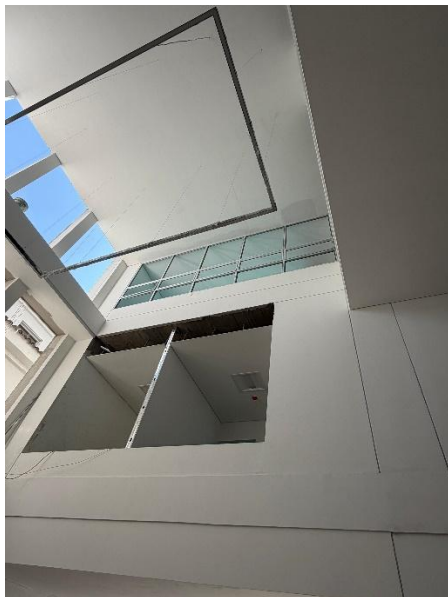

VENTANERIA INTERNA Y EXTERNA


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

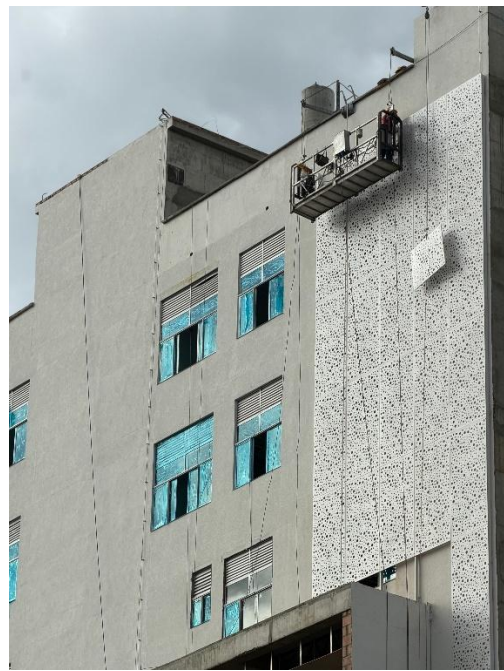

FACHADAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



EXTERIORES

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

• **CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD CONCRETOS**

Una vez el concreto fue recibido en la obra, se realizó la toma de muestras necesarias para la elaboración de 12 cilindros de 4 pulgadas, los cuales se destinaron a ensayos de resistencia a la compresión. Este procedimiento fue ejecutado por el personal del consorcio Evolet directamente en sitio. Posteriormente, las probetas fueron sometidas a proceso de curado mediante inmersión en agua y, una vez cumplidos los tiempos establecidos para cada ensayo, se remitieron al laboratorio Geofísica S.A.S. con el fin de determinar su resistencia a compresión.

De igual manera, se efectuó el seguimiento correspondiente a cada uno de los ensayos realizados, verificando el cumplimiento de la resistencia especificada, como se describe a continuación:

✓ Ensayos de resistencia a la compresión del concreto premezclado de 4000 PSI, suministrado por Geoacopio, utilizado en la fundición de pantallas y columnas.

En el cuadro adjunto se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de compresión del concreto, llevados a cabo por el laboratorio Geofísica S.A.S., los cuales evidencian el cumplimiento de la resistencia exigida conforme a lo establecido en los planos de diseño.

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado en obra y con lo estipulado en dichos documentos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

CONTROL DE CONCRETOS/ RESULTADOS DE LABORATORIO											
DATOS								RESULTADOS			
No TOMA	NOMBRE	EXPANSIÓN	FECHA TOMA	7 DÍAS	14 DÍAS	28 DÍAS	No. Cilindros	FECHA PRUEBA	DÍAS	RESISTENCIA	CUMPLIMIENTO
T33	PW1-26-7-10C2C4 PISO 3		8/03/2025	15/03/2025	22/03/2025	5/04/2025	3	29-mar-25	21.00	6372	CUMPLE
								29-mar-25	21.00	5493	CUMPLE
								29-mar-25	21.00	5149	CUMPLE
T34	C3.6.7.8.9.10 PW8 PISO 3	65CM	21/03/2025	28/03/2025	4/04/2025	18/04/2025	3	3-abr-25	13.00	3983	CUMPLE
								3-abr-25	13.00	4739	CUMPLE
								3-abr-25	13.00	4962	CUMPLE
T35	ENTREPISO 3 FIBRA	8 (Asentamiento)	27/03/2025	3/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	3	3-abr-25	7.00	5139	CUMPLE
								3-abr-25	7.00	5085	CUMPLE
								3-abr-25	7.00	5450	CUMPLE
T36	ENTREPISO 3 EJES VIGAS 1" A 3 VIGAS	7.5 (Asentamiento)	27/03/2025	3/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	3	3-abr-25	7.00	5282	CUMPLE
								3-abr-25	7.00	5211	CUMPLE
								3-abr-25	7.00	4734	CUMPLE
T37	ENTREPISO 3 EJES 6" VIGAS	8 (Asentamiento)	27/03/2025	3/04/2025	10/04/2025	24/04/2025	3	11-abr-25	15.00	5968	CUMPLE
								11-abr-25	15.00	5662	CUMPLE
								11-abr-25	15.00	6069	CUMPLE
T38	PW-1-7-8-10. piso 4	55CM	12/04/2025	19/04/2025	26/04/2025	10/05/2025	3	21-abr-25	9.00	6160	CUMPLE
								21-abr-25	9.00	6269	CUMPLE
								21-abr-25	9.00	6711	CUMPLE
T39	ENTREPISO 4 VIGAS	7" (Asentamiento)	29/04/2025	6/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	4	6-may-25	7.00	4512	CUMPLE
								6-may-25	7.00	4417	CUMPLE
								6-may-25	7.00	4322	CUMPLE
T40	ENTREPISO 4 VIGAS	8" (Asentamiento)	29/04/2025	6/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	4	6-may-25	7.00	4496	CUMPLE
								6-may-25	7.00	4477	CUMPLE
								6-may-25	7.00	4365	CUMPLE
T41	ENTREPISO 4 FIBRA	8" (Asentamiento)	29/04/2025	6/05/2025	13/05/2025	27/05/2025	4	6-may-25	7.00	4145	CUMPLE
								6-may-25	7.00	4027	CUMPLE
								6-may-25	7.00	4138	CUMPLE

- CONTROL DE MEDICION DE ESPESORES DE LAMINAS CON PIE DE REY DIGITAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

**INFORME MENSUAL No. 27**Documento
Versión 1

MEDICIÓN DE ESPESORES DE LAMINAS CON PIE DE REY DIGITAL						FGSAR-14 Versión 01
CLIENTE:	Consortio Evolet					ORDEN SERVICIO No.: 190
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José					
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6#10N-142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca					
CONTRATISTA:	N.A					
INTERVENTORIA:	N.A					
FECHA DE RECIBO:	24-mar-2026					FECHA DE ENSAYO: 24-mar-2026

LAMINA N°	IDIOTE LAMINA	TIPO DE ACERO	CALIBRE LAMINA	ESPEJOR NOMINAL mm	PUNTO N°	MEDICIÓN 1 mm	MEDICIÓN 2 mm	MEDICIÓN 3 mm	PROMEDIO PUNTO mm	PROMEDIO LAMINA mm	DESVIACIÓN mm
1	Lamina micro perforada para fachada	Acero galvanizado	18	1,21	1	1,20	1,22	1,19	1,20	1,22	0,01
					2	1,23	1,22	1,22	1,22		
					3	1,23	1,24	1,22	1,23		
					4	1,21	1,22	1,23	1,22		
					5	1,22	1,20	1,21	1,21		
2	Lamina micro perforada para fachada	Acero galvanizado	18	1,21	6	1,25	1,25	1,26	1,25	1,24	0,03
					7	1,22	1,23	1,23	1,23		
					8	1,24	1,24	1,22	1,23		
					9	1,24	1,23	1,24	1,24		
					10	1,24	1,23	1,23	1,23		
3	Lamina micro perforada para fachada	Acero galvanizado	18	1,21	11	1,22	1,21	1,23	1,22	1,22	0,01
					12	1,22	1,22	1,21	1,22		
					13	1,22	1,23	1,21	1,22		
					14	1,22	1,23	1,22	1,22		
					15	1,23	1,22	1,21	1,22		

OBSERVACIONES: Datos suministrados por el cliente. Ensayo realizado por personal de Geofísica.

REVISÓ
Karen Sofía Mosquera G.
KAREN SOFÍA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 10619028791 CAU

APROBO
Fernando Muñoz Fuentes
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001284 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co

e-mail:info@geofisica.com.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1



MEDICION DE ESPESORES DE LAMINAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

● **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**


El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de abril del 2026 del 92.0% frente un avance programado acumulado del 92.0%, lo cual deja la ejecución en un porcentaje igual frente al programado.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	\$109,503,404	0.33%	\$363.707.100	1.12%
30-09-2024	\$858,324,856	2.16%	\$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	\$1.948.435.571	6.00%	\$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	\$2.636.884.000	8.12%	\$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	\$3.299.608.964	10.13%	\$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	\$4.715.214.428	14.52%	\$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	\$5.260.776.428	16.2%	\$5.260.776.428	16.2%
25-3-2025	\$6.189.530.785	19.06%	\$6.423.343.071	19.78%
25-4-2025	\$7.546.940.999	23.24%	\$7.579.414.928	23.34%
25-5-2025	\$8.917.340.785	27.46%	\$8.917.340.785	27.46%
25-6-2025	\$9.605.788.071	29.58%	\$9.605.788.071	29.58%
25-7-2025	\$11.229.484.499	34.58%	\$11.229.484.499	34.58%
25-8-2025	\$12.820.706.999	39.48%	\$12.054.322.284	37.12%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".				
INFORME MENSUAL No. 27				Documento Versión 1

20-9-2025	\$14.499.609.106	44.65%	\$14.499.609.106	44.65%
20-10-2025	\$14.778.884.892	45.51%	\$14.778.884.892	45.51%
20-11-2025	\$15.100.376.785	46.5%	\$15.100.376.785	46.5%
20-12-2025	\$16.675.362.321	51.35%	\$15.850.524.534	48.81%
20-01-2026	\$19.162.865.248	59.01%	\$21.117.795.748	65.03%
20-02-2026	\$21.117.795.748	65.03%	\$22.747.986.962	70.05%
20-03-2026	\$24.615.237.855	75.8%	\$24.615.237.855	75.8%
20-04-2026	\$29.323.957.497	90.3%	\$28.447.161.426	87.6%
20-05-2026	\$29.876.014.283	92.00%	\$29.876.014.283	92.00%
AVANCE	\$552.056.785	1.7%	\$1.428.852.857	4,4%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

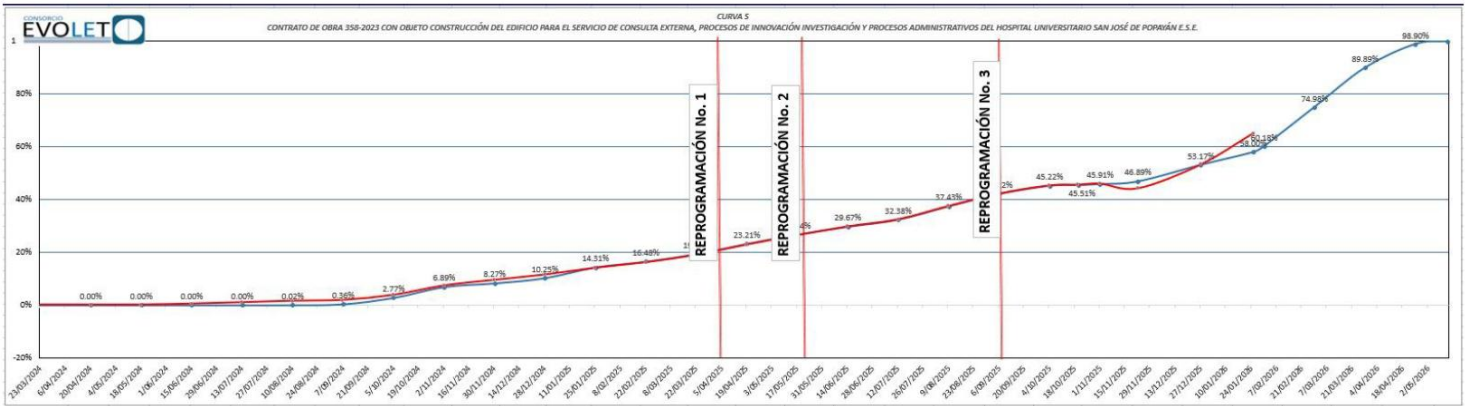

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

AUTORIZACIONES DE PAGO		
PROVEEDOR	VALOR/CONCEPTO	ITEM PLAN DE INVERSION
1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	\$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
2. FERRETERÍA GYJ	\$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
3. URIEL PALTA AMA	\$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo	Transporte
4. UBANER PEREZ	\$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
5. PEDRO ROMO	\$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo	Alquiler de equipos
6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN	\$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo.	Materiales

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	\$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	\$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
11. DIANA CAROLINA VIVAS	\$133.865.096 m/cte	Mano de obra
12. SILOGISTICA	\$103.240.000 m/cte	Transporte
13. LA ALIANZA GROUP SAS	\$309.835.612 m/cte.	Mano de obra
14. UBANER PEREZ	\$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo	Mano de obra
15. UBANER PEREZ	\$30.000.000 m/cte	Mano de obra
16. G Y J FERRETERIAS S.A.	\$71.110.589 m/cte	Materiales
17. IMCOMERSA LUD SAS	\$27.620.616 m/cte	
18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA	\$26.064.505 m/cte	
19.EQUIPAR GLEASON	\$29.741.279	Alquiler de equipos
20. SILOGISTICA S.A.S	\$21.600	Transporte
21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	\$1	Mano de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	\$34.228	Materiales
--	--------------------------------	----------------------------------

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 85,500,000.00	\$ 85.500.000.00	0.02%	\$ 0
2	TRANSPORTE	\$ 105,400,000.00	\$ 105.400.000.00	1.08%	\$ 0
3	MATERIALES	\$ 7,205,599,277.00	\$ 7,205.599.277.00	73.23%	\$ 0
4	MANO DE OBRA	\$ 2,345,679,294.00	\$ 2,345,679,293.00	24.08%	\$ 0
	TOTAL	\$ 9,742,178,571.00	\$ 9,742,178,571 .00	100%	\$ 0

Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidós (22) solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia.

Cabe destacar que, al término del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

AVANCE FINANCIERO CONTRATO 358-2023

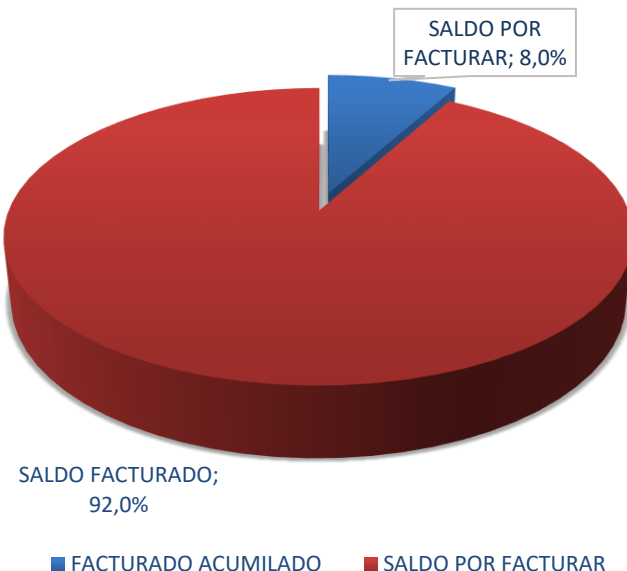

**CONTRATO 358-2023
ANTICIPO**



• Desembolsado: \$9,742,178,571.0 m/cte


Anticipo \$ 9,742,178,571.00 m/cte

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024

BALANCE A LA FECHA 20-12-2025			BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR CONTRATO PPAL		\$ 1,280,412,030	VALOR ANTICIPO	-	-
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 1,280,412,030	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	-	
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	\$ 595.391.594		SALDO POR AMORTIZAR	-	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 29.577.517,9		SALDO POR AMORTIZAR	-	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 624.969.111,9		SALDO POR AMORTIZAR	-	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 655.442.918,1				
SUMAS IGUALES	\$ 1,280,412,030	\$ 1,280,412,030	SUMAS IGUALES \$	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	 CONSORCIO ADN GLOBAL
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

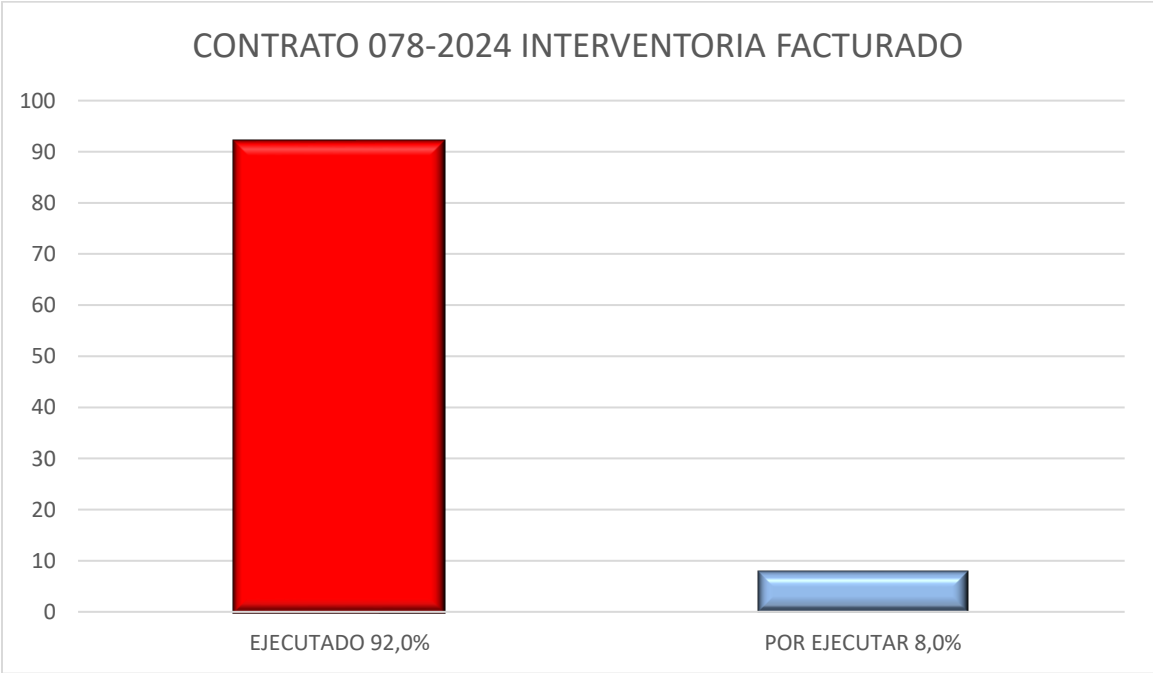

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

4.4. Gestión Socioambiental

En el marco del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto para el desarrollo de la obra, en el presente informe se relaciona el seguimiento a las actividades realizadas para cada programa del plan en el periodo correspondiente entre el 26 de enero y el 25 de febrero del 2026. De acuerdo con los programas que se relacionan a continuación:

- PROGRAMA 1.3: programa de Gestión Ambiental
- PROGRAMA 1.2: Programa de aprovechamiento forestal
- PROGRAMA 1.3: Programa de manejo de residuos sólidos de construcción y demolición de RCD
- PROGRAMA 1.4: Programa de manejo de residuos solidos
- PROGRAMA 1.5: Programa de almacenamiento adecuado de materiales de construcción
- PROGRAMA 1.6: Programa de manejo de campamento
- PROGRAMA 1.7: Programa de señalización y seguridad industrial
- PROGRAMA 1.8: Programa de reuniones con la comunidad

PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El programa de gestión ambiental busca implementar acciones destinadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales generados durante la ejecución de las actividades constructivas de la obra. Para este fin, se cuenta con dos profesionales designadas, la Ingeniera Ambiental Nancy Torres Barrera y la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Brenda Viviana Alegría Trujillo, quienes lideran el comité ambiental y de SST en donde se abordan las estrategias para la implementación del PMA, además se realiza la atención a las PQRS, que para el periodo del presente informe no se reportan ninguna recepción.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

El informe del contratista no presenta información de este programa.

Respecto al estado del cumplimiento del aprovechamiento forestal, se solicita información al contratista si se realizó el proceso de mantenimiento de la cobertura vegetal, que según el informe anterior (N°23) se realizaría en este periodo. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con la meta del programa 1.2.4.

A su vez, se solicita información acerca de la solicitud de cierre del expediente del permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca realizada.

PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

De acuerdo con el recorrido de obra e inspección se evidencian deficiencias en la clasificación, acopio y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto. Particularmente se observó:

- Mezcla de residuos aprovechables (concreto, acero, madera, plástico) con residuos no aprovechables.
- Falta de señalización y delimitación adecuada de las zonas de acopio temporal.
- Ausencia de separación en la fuente conforme a lo establecido en el PMA y el PGIRCD del proyecto.
- No se relacionan los certificados de disposición final con gestores autorizados.



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

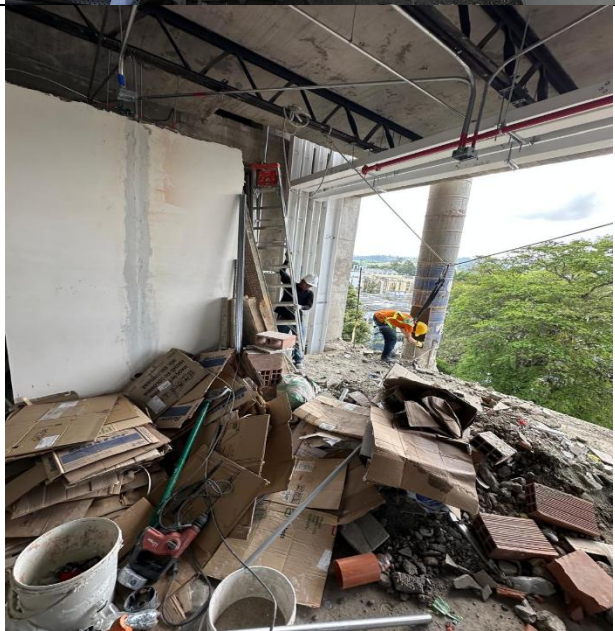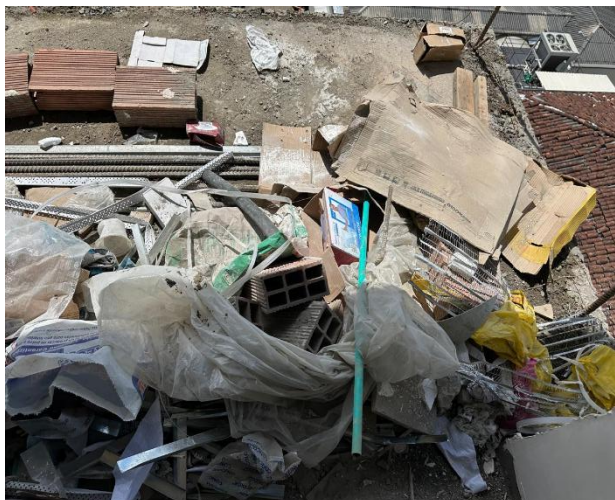

Inadecuada clasificación y acopio de RCD

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

En este sentido, se solicita al contratista de obra

- Implementar la correcta clasificación en la fuente de los RCD conforme a su tipología (aprovechables, no aprovechables y peligrosos, si aplica).
- Adecuar y señalizar debidamente las áreas de acopio temporal, garantizando orden, estabilidad y prevención de arrastre de material particulado.
- Realizar la disposición final de RCD con gestores autorizados, remitiendo a la interventoría los certificados de disposición final.

En atención a las acciones contempladas en el Programa de Manejo de Residuos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el día 10 de febrero del 2026 a las 08:00 a. m. se realizó una jornada de capacitación dirigida al personal de obra sobre el manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y residuos sólidos. El objetivo principal fue fortalecer las buenas prácticas ambientales del personal, minimizando impactos negativos y garantizando el cumplimiento de los requisitos legales del proyecto. En la actividad participaron 10 personas del personal de obra, quienes recibieron orientación teórico-práctica sobre el manejo integral de RCD y residuos sólidos en obra.




Capacitación al personal de obra en manejo de RCD y residuos sólidos

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

El proyecto constructivo cuenta con contenedores para la clasificación y acopio de residuos sólidos convencionales, sin embargo, estos no se encuentran rotulados de acuerdo al código de colores vigentes y con las especificaciones del tipo de material a contener.

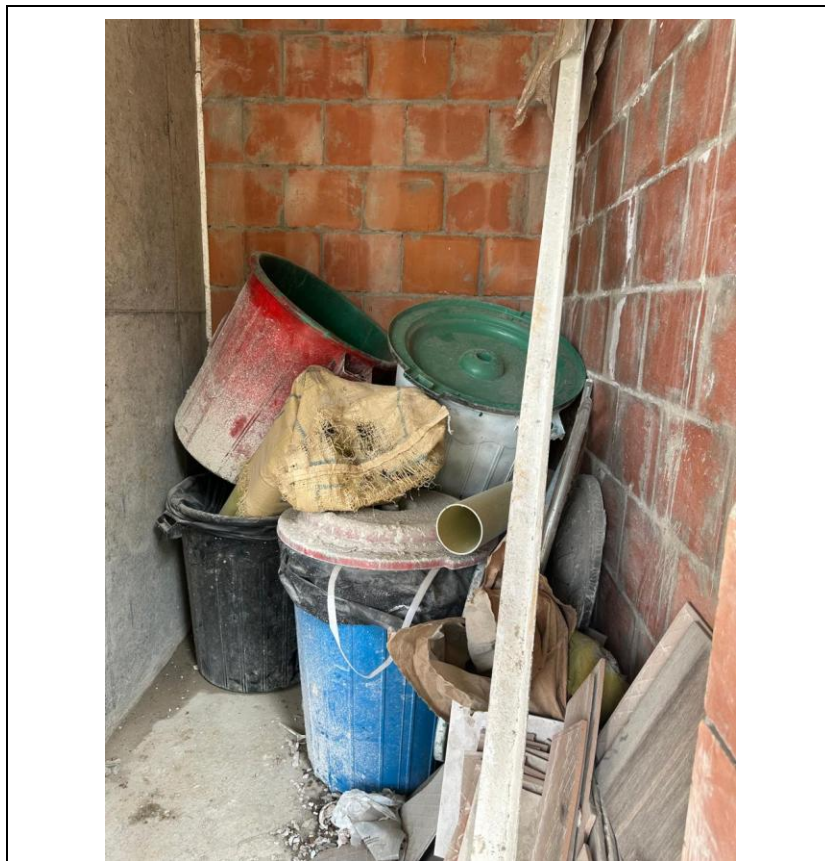

Acopio temporal de residuos sólidos convencionales


De este modo, se solicita al contratista de obra, la adecuación del punto ecológico y sitio de acopio temporal de los residuos incluyendo la limpieza de los contenedores, la dotación con las bolsas plásticas adquiridas y que sean tapados para evitar la propagación de vectores y olores ofensivos. De igual forma, se recomienda la ubicación de contenedores con las mismas características en los pisos superiores para facilitar la clasificación y almacenamiento de los residuos convencionales.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Con el fin de fortalecer las prácticas de aseo y la minimización de riesgos asociados a la acumulación de residuos y al mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad y salubridad dentro del área de intervención del proyecto, se desarrollaron jornadas de limpieza, ordenamiento del frente de obra y manejo inicial de residuos sólidos. A pesar de esto, se recomienda al contratista de obra promover las jornadas diarias de orden y aseo al finalizar la jornada laboral para evitar acumulación de residuos y favorecer el orden en los sitios de trabajo.

PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se cuenta con almacén que permite el almacenamiento y protección de materiales sensibles bajo cubierta y sobre estibas, evitando contacto directo con el suelo.

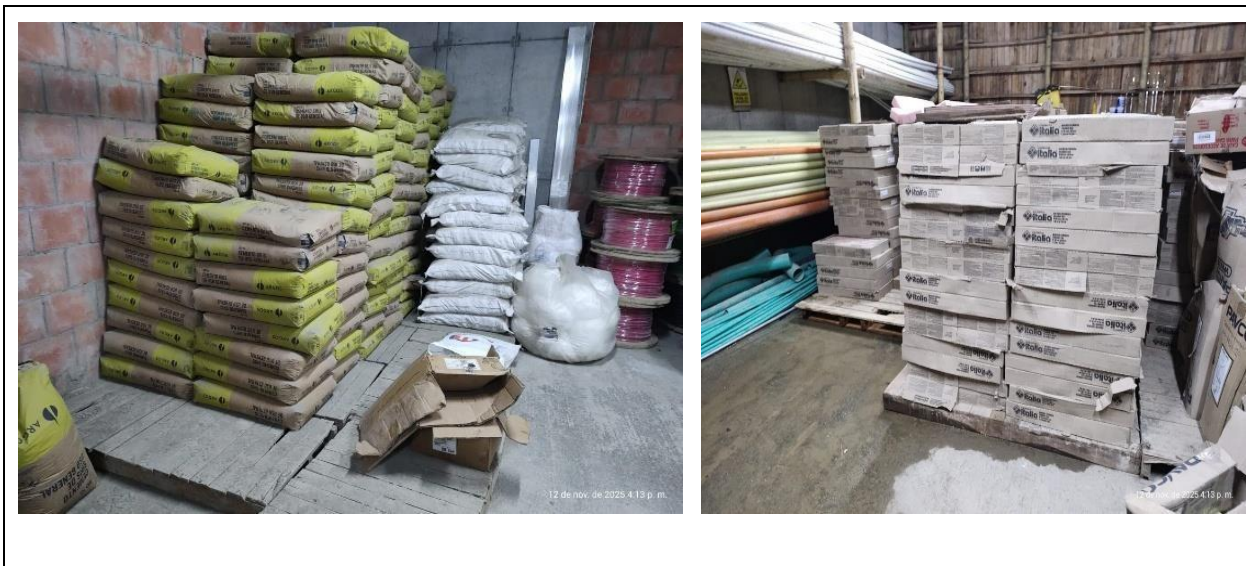

Por otra parte, se recomienda al contratista de obra:

- Almacenar materiales en áreas delimitadas, señalizadas y sobre superficies firmes.
- Mantener agregados pétreos separados por tipo (arena, grava, triturado) para evitar contaminación cruzada.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- Realizar la cobertura del material fino cuando no estén en uso para evitar la dispersión de material particulado.

Durante la jornada de capacitación ambiental realizada el 10 de febrero del 2026, se entregó material pedagógico en formato de folleto, elaborado como herramienta de apoyo para reforzar los conocimientos impartidos durante la actividad formativa relacionado con buenas prácticas para el uso eficiente del agua y la energía en obra. Con el fin de fomentar la recordación en el personal de obra sobre las siguientes temáticas:

- ✓ Uso racional del recurso hídrico en actividades constructivas.
- ✓ Buenas prácticas para evitar fugas y desperdicios de agua.
- ✓ Manejo adecuado de equipos eléctricos y consumo responsable de energía.
- ✓ Importancia del mantenimiento preventivo de maquinaria.
- ✓ Apagado y desconexión de equipos fuera de uso.
- ✓ Impactos ambientales asociados al consumo excesivo de recursos.
- ✓ Responsabilidades del personal en la reducción de la huella ambiental del proyecto.

PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO.

Para el manejo del campamento se cuenta con una cuadrilla conformada por dos (2) trabajadores encargados de las actividades de orden, limpieza y manejo interno de residuos en la obra, quienes se encargan de la segregación en la fuente, recolección y disposición interna de residuos, limpieza de vías internas y externas, mantenimiento de zonas comunes, apoyo en el control de material particulado y conservación del aseo general del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Estas actividades buscan mantener pasillos y zonas de tránsito libres de materiales, así como evitar acumulaciones innecesarias que representen riesgo ambiental y de seguridad.



Actividades de orden y limpieza

Se garantiza la disponibilidad y acceso a baterías sanitarias, realizándose el respectivo manenimiento, limpieza y desinfección, además de la dotación de los insmuos higiénicos sanitarios respectivos.



Limpieza y desinfección de baterías sanitarias

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de seguimiento y control en seguridad industrial, destacando la implementación de:

- ✓ Señalización preventiva, restrictiva e informativa en las zonas de tránsito y operación.
- ✓ Delimitación física de áreas de trabajo y senderos peatonales, garantizando desplazamientos más seguros.
- ✓ Adecuación de pasos peatonales y accesos temporales, con materiales estables y debidamente demarcados.
- ✓ Ejecución de controles complementarios de prevención de accidentes, conforme a los procedimientos internos del contratista.
- ✓ La mayoría de los frentes de obra permanecieron demarcados y señalizados con el fin de mantener el orden y el aseo, evitando la afectación a la salud de los trabajadores y la contaminación ambiental.


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

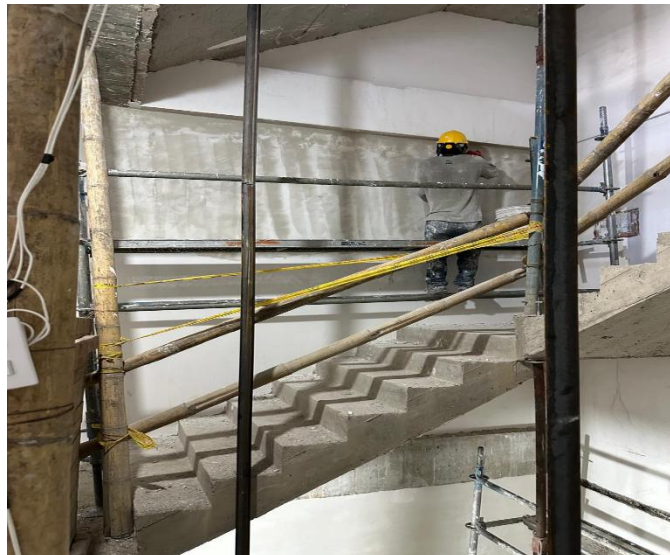

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1
	
Señalización frentes de obra	

Sin embargo, se recomienda implementar la instalación de barandas, redes de seguridad, mallas perimetrales y señalización restrictiva en los bordes de los niveles superiores, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad del área de influencia directa del proyecto. No obstante, se mantuvieron activos los canales de comunicación establecidos para garantizar la atención oportuna de inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía.

Entre estos mecanismos se destacan:

- El correo electrónico institucional habilitado por el contratista, disponible permanentemente para la recepción de mensajes y solicitudes.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

- El buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ubicado en el acceso principal de la obra, debidamente identificado, accesible y en condiciones adecuadas de conservación, lo que facilita su uso por parte de los habitantes del sector.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se realiza el acumulado de los indicadores de gestión, los cuales se relacionan a continuación.

PROGRAMA 1.1		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		92,58
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Comite mensual	27	24/27	88,89	
Informes mensuales entregados	27	24/27	88,89	
Profesionales contratados	2	2/2	100	Ejecutada al 100%

PROGRAMA 1.2		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		90
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Tramite ente CRC	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Siembras de diez arboles	10	10/10	100	Ejecutada al 100%
Tala de arbol (Guayacan)	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Mantenimiento de cobertura vegetal	5	3/5	60	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".				
INFORME MENSUAL No. 27			Documento Versión 1	

PROGRAMA 1.3		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		82,86
ACTIVIDAD	META	INDICADO R	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Tramite ente CRC programa RCD	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Disposición de material RCD	1981	1981/1981	100	Ejecutada al 100%
Informes trimestrales ante CRC	7	5/7	71.43	
Shut de escombros	2	1/2	50	
Capacitación ambiental	14	13/14	92,86	

PROGRAMA 1.4		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		71,13
ACTIVIDAD	META	INDICADO R	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Punto de acopio estructura en guadua	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Canecas plásticas	6	6/6	100	Ejecutada al 100%
Disposición de RESPEL	200	52,6/200	26.3	
Herramientas para limpieza	6	5/6	83,33	
Bolsas de colores puntos ecológicos	100	46/100	46	

PROGRAMA 1.5		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		90,26
ACTIVIDAD	META	INDICADO R	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Lavado de llantas vehículos	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Rollo plastico negro	4	4/4	100	Ejecutada al 100%
Herramientas pedagogicas	500	354/500	70,8	

PROGRAMA 1.6		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		97,92
ACTIVIDAD	META	INDICADO R	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Personal de limpieza	24	23/24	95,83	
Cerramiento 179.89 con lamina	179.89	179.89/179.89	100	Ejecutada al 100%

PROGRAMA 1.7		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		96,57
ACTIVIDAD	META	INDICADO R	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Casco Dielectrico amarillo	13	13/13	100	Ejecutada al 100%
Casco Dielectrico Blanco	17	17/17	100	Ejecutada al 100%
Casco Dielectrico Gris	3	3/3	100	Ejecutada al 100%
Chalecos director, ingenieros, residentes	8	8/8	100	Ejecutada al 100%
Chalecos reflectivos	72	72/72	100	Ejecutada al 100%
Chaleco economico	40	40/40	100	Ejecutada al 100%
Guante tipo vaqueta	104	104/104	100	Ejecutada al 100%
Botiquin	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Extintor	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Arnes y lineas de vida	12	12/12	100	Ejecutada al 100%
Malla anticaidas	1	1/1	100	Ejecutada al 100%
Señaletica preventiva	80	58/80	72,5	
Cinta de peligro	20	16/20	80	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

PROGRAMA 1.8		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		75.0
ACTIVIDAD	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Reuniones con comunidad	2	1/2	50	
Entrega de refrigerios	400	400/400	100	Ejecutada al 100%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoría realizó el seguimiento, verificación y control a las actividades desarrolladas por el Consorcio EVOLET y sus contratistas durante el periodo comprendido entre el 2 y el 23 de abril de 2026, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 4272 de 2021, entre otras disposiciones vigentes.

Durante el periodo evaluado, la Interventoría efectuó la revisión de las actividades ejecutadas en campo relacionadas con el SG-SST, incluyendo las administrativas como afiliaciones, exámenes médicos ocupacionales, inducciones y capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, orden y aseo, saneamiento básico, inspecciones de seguridad y seguimiento a los indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral.

No obstante, se deja constancia que durante el periodo evaluado al igual que los anteriores no fue posible realizar la verificación documental de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR), entrega de dotación y EPP mantenimiento de equipos correspondiente al programa de prevención contra caídas; dicha documentación no fue remitida a la Interventoría por parte del contratista, situación que limita la validación integral del control de riesgos críticos conforme a la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

MARCO LEGAL		
No.	NORMATIVA	ASPECTO LEGAL
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Se realizó la verificación correspondiente al período reportado, con base en las planillas presentadas en el informe, las cuales corresponden al pago de seguridad social del mes de **ABRIL de 2026**.

Al efectuar la comparación entre las planillas aportadas y el listado de personal relacionado en el documento denominado *Informe Mensual – Afiliación al Sistema de Seguridad Social del Personal del Contratista*, se evidenció que el personal reportado en las planillas no coincide en su totalidad con el personal incluido en dicho listado.

Adicionalmente, se identificó que algunas de las planillas aportadas no registran fecha de pago, lo cual dificulta la verificación efectiva del cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia de seguridad social.

A continuación, se relacionan los números de las planillas correspondientes al Consorcio EVOLET y sus contratistas:

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE - INDEPENDIENTE					
1	9504344358	ABRIL	5/05/2026	12	APORTES EN LINEA
2	9504010102	ABRIL	29/04/2026	1	APORTES EN LINEA
3	6013505691	MARZO	30/04/2026	1	SOI
4	4647628628	MARZO	16/04/2026	1	SOI
5	9502465673	MARZO	29/04/2026	1	APORTES EN LÍNEA
6	36886399	MARZO	29/04/2026	1	ASOPAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NÚMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADOS POR PLANILLA	OPERADOR
CONTRATIST- DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA – ELECTRO SISTEMA DEL CAUCA					
7	-	-	-	-	-
CONTRATISTA-IMPO HERRAJES OSCAR GUZMAN					
8	-	-	-	-	-
CONTRATISTA – CONDOR AIRES ACONDICIONADOS					
9	80407557	ABRIL	5/05/2026	11	COMPENSAR MIPLANILLA
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA – WILLIAM MUÑOZ					
10	9504541979	ABRIL	14/04/2026	20	APORTES EN LÍNEA
11	9503501027	ABRIL	12/05/2026	1	APORTES EN LÍNEA
CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS					
12	9504341691	ABRIL	5/05/2026	5	APORTES EN LINEA
TOTAL				54	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
1	EDWIN ANACONA	1058788841	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
2	WILLIAM CHANTRE	4788852	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
3	DAGUA SERAFIN	1064432366	A.I.C	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
4	ANDRES MENDEZ	1061780935	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
5	ELGAR NAVARRETE	9940078	EMSSAN AR	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
6	EDELIO NAVIA	76223730	AMET SALUD	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
7	JESUS MONCAYO	1061693041	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
8	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
10	BRENDA VIVIANA ALEGRIA TRUJILLO	1.061.756.223	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
11	JUAN SEBASTIAN OROZCO	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N/A
12	JUAN CARLOS MENESES	1004248033	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	N/A
13	ELSA MARLENE OSORIO	34533693	SANITAS		POSITIVA	N/A
14	JULIAN SANCHEZ	76332823			POSITIVA	N/A
15	FABIAN VIVAS	100498268			POSITIVA	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	AFP	ARL	CCF
14	ANDERSON ARGOTE	1002835406	-	COLPENSIONES	SURA	
15	JHEFRY BURBANO	1125408081	-	PORVENIR	SURA	
16	MELISSA GUTIERREZ	101013356	SURA	COLPENSIONES	SURA	
17	JUAN JOJOA	1143993034	SURA	PORVENIR	SURA	
18	ASTRID MUNOZ	34331417	-	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA - MAMPOSTERIA- WILLIAM MUNOZ						
19	VICTOR PANCHO	1111545200	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	
20	FRANKI LEON	1061792278	S.O. S	PROTECCION	POSITIVA	
21	WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO	76.325.832	SANITAS	PORVENIR	SURA	
22	EDGAR ANDRADE	1192717733	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	
23	STIVEN CABEZAS	1087784466	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
24	SIRLEY CAMAYO	1061691297	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	
25	JUAN DORADO	10298202	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
26	YEISON GUACA	1002972280	S.O. S	PROTECCION	POSITIVA	
27	JESUS GUERRERO	5403220	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
28	PAULO NAVARRO	10296994	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
29	YILSON NAVARRO	10308299	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
30	JOSE PADILLA	10541497	NUEVA EPS		POSITIVA	
31	JESUS RODRIGUEZ	1168540	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
32	JIMMY TOMBE	94428412	COLPENSI ONES	ASMET SALUD	POSITIVA	
33	SEBASTIAN TOMBE	1061700474	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
34	MUSULINE TROCHEZ	1002920508	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
35	FRANCISCO URIBE VALENCIA	1.061.707.34 4	SANITAS	PORVENIR	SURA	
36	ROVI YATA LAME	10.305.399	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
37	ALVEIRO SANTIAGO	76330475	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

**INFORME MENSUAL No. 27**

Documento
Versión 1

38	JHON LLANTEN	76328974	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
39	CARLOS BARRERA	10541349	EMSSANAR		POSITIVA	
CONTRATISTA – CONDOR AIRES ACONDICIONADOS						
40	STIVEN CERON	1061732250	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	
41	SANTIAGO ORDOÑEZ	1105370748	EPS SURA	PORVENIR	SURA	
42	SEBASTIAN SANTAMARIA	1107511147	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
43	JOSE ANDRES IBARRA	1130648789	EPS SURA	PORVENIR	SURA	
44	DIEGO FERNANDO CANO	1143838174	EPS SURA	COLPENSIONES	SURA	
45	RUBEN DARIO ORDOÑEZ	1143841338	EPS SURA	PORVENIR	SURA	
46	JUAN DAVID VALOY	1143875014	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	
47	JHON LEWIS PACHECO	1144041693	EPS SURA	EPS SURA	SURA	
48	GUSTAVO MARIN	1148956337	EPS SURA	EPS SURA	SURA	
49	BRAYAN DAVID ABARBO	1193550600	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	
50	HECTOR FABIO CARVAJAL	14677660	SURA	PORVENIR	SURA	
JUAN DIEGO CASTRO						
51	LINA ANACONA	1061781283	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
52	INGRID ARIAS	1005875549	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
53	JHON BURBANO	1061702827	S.O.S	PORVENIR	POSITIVA	
54	LEANDRO CAMPO	1061811070	ASMET	COLPENSIONES	POSITIVA	
55	JUAN CASTRO	1061813168	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
56	YESICA CHAGUENDO	1061763479	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
57	BRAYAN ILES	1061815957	ASMET	PORVENIR	POSITIVA	
58	DORIS LUNA	34548783	NUEVA EPS		POSITIVA	
59	JUAN MOPAN	1002969436	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
60	DIDIER MOSQUERA	76327619	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	
61	ANGELA PAZ	1061820075	MALLAMAS	PORVENIR	POSITIVA	
62	JUAN POVEDA	1077175633	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	1
Antiguo	62
Retiro	0
Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuenta para los datos estadísticos)	0
Incapacidad laboral	0
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:
FORMULA	$\frac{\text{N° de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social } 16}{\text{No de trabajadores contratados } 16} \times 100 = 100\%$

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	ADMINISTRACION	-	12
2	WILLIAM MUÑOZ	-	25
3	HSA INGENIERIA SAS	-	9
4	AIRES ACONDICIONADOS	-	13
5	ELECTROSISTEMAS	-	16

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).

Se verificó en el periodo correspondiente al informe se presentaron exámenes, en lo cual se deja constancia, tener en cuenta los exámenes con recomendaciones generales para su socialización y seguimiento.

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Se realiza verificación de entrega de dotación para el periodo correspondiente, y NO se relaciona ninguna evidencia ni pasada ni actual desde el inicio de la presente interventoría; la entrega de Epp's mediante el registro del formato de código SST-FT-35, Entrega de Dotación y Elementos de Protección por parte de los contratistas.

Se evidencia del contratista MUÑOZ, se solicita mediante el oficio de las observaciones del informe los registros de entrega de los subcontratistas del Consorcio EVOLET.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Entrega de dotación y EPP al personal
FORMULA	$\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP } 89}{\text{Numero de trabajadaores contratados } 89} \times 100 = 100\%$

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	No. TOTAL, DE TRABAJADORES	OBSERVACIONES
1	EVOLET - ADMINISTRATIVO	12	
2	AIRES ACONDICIONADOS	11	
3	MAMPOSTEROS	20	
4	HSA	5	
5	IMPERTPLAST	-	
6	TRANSITORIO	0	
7	ELECTRICOS	14	
8	HIPO HERRAGES	-	
TOTAL			64

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.

Se verificó que, para el periodo correspondiente al presente informe y de acuerdo con las evidencias recibidas y el informe presentado por EVOLET, se ejecutaron ocho (8) inducciones a partir del 18 de abril. No obstante, no se evidencian los registros correspondientes ni los documentos soporte de dichas inducciones, específicamente los formatos de entrenamiento CV-SGSST-14-V1, correspondientes al periodo evaluado tanto del Consorcio EVOLET como de su contratista.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Cobertura Inducción y reinducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 24}{\text{No. de trabajadores ingresan en el mes } 24} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de Inducciones y reinducciones ejecutadas } 24 + 0}{\text{No. de Inducciones y reinducciones programadas } 24 + 0} \times 100 = 100\%$

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó que, para el periodo correspondiente, el contratista evidenció en sus anexos únicamente una (1) actividad de capacitación relacionada con el área de SST, debido a que los temas asociados corresponden a meses anteriores. No obstante, en el informe presentado se indica la realización de dos (2) capacitaciones con las mismas temáticas evidenciadas anteriormente en los anexos aportados, generando inconsistencia entre la información reportada y los soportes documentales entregados.

- ¿El registro fotográfico enviado corresponde al informe enviado en el mes pasado?

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	% Capacitación del personal

FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores prom asisten capacitación al mes 33}}{\text{No. de trabajadaores en el mes PROMED}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% cumplimiento del programa de Inducción y reintroducción del personal
FORMULA	$\frac{\text{No. de capacitaciones ejecutadas 4}}{\text{No. de de capacitaciones programas 4}} \times 100 = 100\%$

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADO RES ASISTENTES	No. TRABAJADO RES PROGRAMAS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	4/03/2026	Lumbalgia asociada a peligro Biomecánico	35	35	
2	11/03/2026	- Política SG-SST - Importancia del orden y aseo del área de trabajo	27	27	

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
---	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1



Fotos presentadas en informe pasado para capacitación de POLITICA SG-SST



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

La interventoría verifica que en el periodo se evidencia acta correspondiente al comité según corresponde a la norma Resolución 3461 de 2025.

El contratista en el periodo relaciona situaciones presentadas asociadas a las funciones del vigía

AUSENTISMO LABORAL

No presentan información basada en ausentismos:

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO			
No.	ORIGEN	EMPRESA	TIEMPO REPORTADO
1	ACCIDENTE LABORAL	SIN NOVEDAD	0
2	INCAPACIDAD X A. T	CONSORCIO EVOLET,	0
3	ENFERMEDAD LABORAL	SIN NOVEDAD	0
4	INCAPACIDAD X A. L	SIN NOVEDAD	0
5	ENFERMEDAD COMUN	SIN NOVEDAD	0
6	PERMISOS		0
7	INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS	SIN NOVEDAD	0
TOTAL, DE AUSENTISMO			0 DIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	
DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	84
Número de accidentes laborales durante el periodo	0
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	0
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante el periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	6
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	430+13=443
Frecuencia de Accidentalidad = = <u>No de accidentes de trabajo presentados en el mes</u> x100 No de trabajadores en el mes	1/89*100 =1,1%
Severidad de Accidentalidad = <u>No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes</u> *100 # de trabajadores en el mes	13+0/89*100=14.6 %
Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000	
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	13/25*100 =52

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente no se reporta información de casos, por ausentismo esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Control a programas osteomuscular

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Relación de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos
- Corrección de Actos y condiciones inseguras
- Acta de reunión con el personal de ayudante de seguridad para trabajos en alturas
- Reporte de actos y condiciones inseguras presentadas durante la ejecución de la obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

Tabla 9. Gestión contra caídas

GESTION PROGRAMA CONTRA CAIDAS	
FECHA	CAPACITACION
12/02/2025	ARMADO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS
20/02/2025	REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS
28/02/2025	INSPECCION PARA EPPCC
30/04/2025	ACTOS INSEGUROS EN TRABAJOS EN ALTURAS
26/05/2025	PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE PLUMA GRUA
30/05/2025	IAJE DE CARGAS
26/06/2025	PREVENCION DE CAIDAS
10/07/2025	REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS - EPPCC
15/08/2025	PREVENCION DE RIESGOS Y SEGURIDAD EN ALTURAS
EXAMENES OCUPACIONALES REALIZADOS CON ENFASIS EN ALTURAS	
ENERO	4
FEBRERO	5
MARZO	11
ABRIL	9
MAYO - JUNIO	9
JUNIO - JULIO	6
JULIO - AGOSTO	6
AGOSTO- SEPTIEMBRE	11
SEPTIEMBRE- OCTUBRE	15
NOVIEMBRE- DICIEMBRE	1

La interventoría verifica que se anexa los permisos de trabajo en alturas correspondientes al periodo se deja la novedad en la verificación en la respectiva plataforma del ministerio que personal de diferentes contratistas que firman el permiso de trabajo en alturas no cuentan con reentrenamiento o curso alguno lo cual se recuerda que por norma y por seguridad no está permitido.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES AUTORIZADOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD		
NO. PERMISO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	24/04/2024	04/05/2024
2	24/04/2024	04/05/2024
3	24/04/2024	04/05/2024
4	24/04/2024	04/05/2024
5	24/04/2024	04/05/2024
6	24/04/2024	04/05/2024
7	24/04/2024	04/05/2024
8	24/04/2024	04/05/2024
9	24/04/2024	04/05/2024
10	24/04/2024	04/05/2024
11	24/04/2024	04/05/2024
12	24/04/2024	04/05/2024
13	24/04/2024	04/05/2024
14	24/04/2024	04/05/2024
15	24/04/2024	04/05/2024
16	24/04/2024	04/05/2024
17	24/04/2024	04/05/2024
18	24/04/2024	04/05/2024
19	24/04/2024	04/05/2024
20	24/04/2024	04/05/2024
21	24/04/2024	04/05/2024
22	24/04/2024	04/05/2024
23	24/04/2024	04/05/2024
24	24/04/2024	04/05/2024
25	24/04/2024	04/05/2024
26	24/04/2024	04/05/2024
27	24/04/2024	04/05/2024
28	24/04/2024	04/05/2024
29	24/04/2024	04/05/2024
30	24/04/2024	04/05/2024
31	24/04/2024	04/05/2024
32	24/04/2024	04/05/2024
33	24/04/2024	04/05/2024
34	24/04/2024	04/05/2024
35	24/04/2024	04/05/2024
36	24/04/2024	04/05/2024
37	24/04/2024	04/05/2024
38	24/04/2024	04/05/2024
39	24/04/2024	04/05/2024
40	24/04/2024	04/05/2024
41	24/04/2024	04/05/2024
42	24/04/2024	04/05/2024
43	24/04/2024	04/05/2024
44	24/04/2024	04/05/2024
45	24/04/2024	04/05/2024
46	24/04/2024	04/05/2024
47	24/04/2024	04/05/2024
48	24/04/2024	04/05/2024
49	24/04/2024	04/05/2024
50	24/04/2024	04/05/2024
51	24/04/2024	04/05/2024
52	24/04/2024	04/05/2024
53	24/04/2024	04/05/2024
54	24/04/2024	04/05/2024
55	24/04/2024	04/05/2024
56	24/04/2024	04/05/2024
57	24/04/2024	04/05/2024
58	24/04/2024	04/05/2024
59	24/04/2024	04/05/2024
60	24/04/2024	04/05/2024
61	24/04/2024	04/05/2024
62	24/04/2024	04/05/2024
63	24/04/2024	04/05/2024
64	24/04/2024	04/05/2024
65	24/04/2024	04/05/2024
66	24/04/2024	04/05/2024
67	24/04/2024	04/05/2024
68	24/04/2024	04/05/2024
69	24/04/2024	04/05/2024
70	24/04/2024	04/05/2024
71	24/04/2024	04/05/2024
72	24/04/2024	04/05/2024
73	24/04/2024	04/05/2024
74	24/04/2024	04/05/2024
75	24/04/2024	04/05/2024
76	24/04/2024	04/05/2024
77	24/04/2024	04/05/2024
78	24/04/2024	04/05/2024
79	24/04/2024	04/05/2024
80	24/04/2024	04/05/2024
81	24/04/2024	04/05/2024
82	24/04/2024	04/05/2024
83	24/04/2024	04/05/2024
84	24/04/2024	04/05/2024
85	24/04/2024	04/05/2024
86	24/04/2024	04/05/2024
87	24/04/2024	04/05/2024
88	24/04/2024	04/05/2024
89	24/04/2024	04/05/2024
90	24/04/2024	04/05/2024
91	24/04/2024	04/05/2024
92	24/04/2024	04/05/2024
93	24/04/2024	04/05/2024
94	24/04/2024	04/05/2024
95	24/04/2024	04/05/2024
96	24/04/2024	04/05/2024
97	24/04/2024	04/05/2024
98	24/04/2024	04/05/2024
99	24/04/2024	04/05/2024
100	24/04/2024	04/05/2024

ACTOR RECURSOS: NO

CONDICIONES DE TRABAJO: TRABAJO CON CONDICIONES REGULARS

FECHA: 24/04/2024

FIRMA: [Firma]

MP: 2023-406

CENTROS DE FORMACIÓN EN EMPRESA



CONSULTAS / CENTROS DE FORMACIÓN EN EMPRESA

RESULTADO CONSULTA:

- ▲ NOMBRE DEL USUARIO: CARLOS ALBERTO BARRERA
- NÚMERO DEL DOCUMENTO DEL USUARIO: 10541349
- TIPO DOCUMENTO DEL USUARIO: CC

CONSTANCIAS

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	10541349	25/06/2024	25/06/2024	SAOS ALTURAS SAS	SAOS ALTURAS S.A.S.	GENERAR CONSTANCIA

Vencido

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	1061708377	14/10/2022	26/10/2022	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL 9221	Centro de Telemática y Producción Industrial	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	1061708377	25/06/2024	25/06/2024	SAOS ALTURAS SAS	SAOS ALTURAS S.A.S.	GENERAR CONSTANCIA

CONSTANCIAS FORMACION EN EMPRESA



CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.



INFORME MENSUAL No. 27

Documento
Versión 1

COLOMBIA
PODEREN LA
VIDA

Trabajo

CONSULTAS / CENTROS DE FORMACIÓN EN EMPRESA

RESULTADO CONSULTA :

NOMBRE DEL USUARIO: JOHN JAIRO LLANTEN HARVAEZ

NÚMERO DEL DOCUMENTO DEL USUARIO: 76328974

TIPO DOCUMENTO DEL USUARIO: CC

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	76328974	04/03/2022	05/03/2022	ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD EN ALTURAS SAS	ETSA SOACHA	⚠ GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	76328974	12/12/2019	16/12/2019	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA CENTRO AGROPECUARIO 9113	Centro Agropecuario	⚠ GENERAR CONSTANCIA

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	76328974	11/03/2023	11/03/2023	ASEQI CEPEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL EMPRESARIAL Y LABORAL	ASEQICEPEL SAS	⚠ GENERAR CONSTANCIA

COLOMBIA
PODEREN LA
VIDA

Trabajo

CONSULTAS / CENTROS DE FORMACIÓN EN EMPRESA

RESULTADO CONSULTA :

NOMBRE DEL USUARIO: JOHN JAIRO LLANTEN HARVAEZ

NÚMERO DEL DOCUMENTO DEL USUARIO: 76328974

TIPO DOCUMENTO DEL USUARIO: CC

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	76328974	04/03/2022	05/03/2022	ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD EN ALTURAS SAS	ETSA SOACHA	⚠ GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	76328974	12/12/2019	16/12/2019	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA CENTRO AGROPECUARIO 9113	Centro Agropecuario	⚠ GENERAR CONSTANCIA

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	76328974	11/03/2023	11/03/2023	ASEQI CEPEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL EMPRESARIAL Y LABORAL	ASEQICEPEL SAS	⚠ GENERAR CONSTANCIA

COLOMBIA
PODEREN LA
VIDA

Trabajo

CONSULTAS / CENTROS DE FORMACIÓN EN EMPRESA

RESULTADO CONSULTA :

NOMBRE DEL USUARIO: YILSON ERALDO NAJARRO CARVAJAL

NÚMERO DEL DOCUMENTO DEL USUARIO: 10308299

TIPO DOCUMENTO DEL USUARIO: CC

CONSTANCIAS

CONSTANCIAS

PROGRAMA	NIVEL	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE DE LA ORGANIZACION	NOMBRE DE LA SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	10308299	14/10/2024	17/10/2024	SERPROI SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S. SERPROI COLOMBIA S.A.S.	SERPROI COLOMBIA SAS	⚠ GENERAR CONSTANCIA

CONSTANCIAS FORMACION EN EMPRESA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

ORDEN Y ASEO

En los controles realizados en obra se efectuaron observaciones relacionadas con las condiciones de orden y aseo. Se evidencia la implementación de jornadas orientadas al fortalecimiento y mejoramiento de este proceso, observándose avances positivos; no obstante, se continúan generando requerimientos y recomendaciones de manera permanente, debido a la dinámica y continuidad de las actividades ejecutadas en obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	
FUENTE: Propia	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de emergencia, son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina -administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.
Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos

INSPECCIONES.

Se verificaron las inspecciones presentadas para el periodo correspondiente al informe, evidenciándose que algunos de los soportes aportados corresponden a periodos anteriores. En este sentido, se deja constancia de que la inspección general de obra presentada pertenece al mes de abril, sin evidenciarse otras inspecciones correspondientes al periodo objeto de revisión.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

RECOMENDACIONES – OBSERVACIONES

- Trabajo en alturas:

Garantizar que todo el personal que ejecute estas actividades cuente con certificación vigente durante la verificación del personal en permisos de trabajo en altura se encuentra la firma de personal que no tiene cursos vigentes en la plataforma de validación del ministerio de trabajo, se recomienda supervisión permanente y uso adecuado de los sistemas de protección contra caídas, hasta el momento sin respuesta a esta observación.

- Equipos y Herramientas

Se evidencia durante los recorridos el uso de herramientas sin protecciones lo cual es un peligro inminente, adicionalmente se recomienda realizar mantenimiento a los equipos de trabajo en alturas como lo son los andamios móviles que se encuentran con residuos de material lo que puede causar que el equipo no funcione de manera correcta.

- Uso de EPP

Fortalecer el control en campo del uso correcto y obligatorio de los Elementos de Protección Personal, debido a los actos inseguros evidenciados mediante inspecciones continúan y se observa personal realizando diferentes actividades con herramientas de corte sin guantes ni gafas.

- Orden y aseo en obra

Mantener condiciones permanentes de orden y aseo en los frentes de trabajo, teniendo en cuenta las observaciones y evidencias fotográficas que incrementan el riesgo de caídas, golpes y atrapamientos.

- Tener en cuenta en el área de circulación correspondiente a las gradas y pasillos de acceso, se evidenció deficiencia en los niveles de iluminación, observándose zonas con visibilidad reducida que pueden afectar el desplazamiento seguro de los trabajadores y

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 27	Documento Versión 1

demás personal presente en la obra.

Se recomienda realizar la verificación y mejoramiento de las condiciones de iluminación en las áreas comunes y de circulación, garantizando niveles adecuados de visibilidad conforme a las actividades desarrolladas y asegurando condiciones seguras para el tránsito del personal sin obstáculos.



Con base en la verificación realizada y la documentación efectivamente remitida, la Interventoría considera que el Consorcio EVOLET cumple de manera general con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; **sin embargo, se evidencian observaciones relevantes**, especialmente de trabajo en alturas y de la matriz de riesgos, las cuales deberán ser atendidas de manera prioritaria en el siguiente periodo de ejecución.
