

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.	28					
Fecha	25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026					
Departamento	CAUCA					
Municipio	POPAYAN					
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.					
Objeto del Proyecto:	*CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA. PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023*					
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959.000	Treinta y tres millones quinientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto		18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto		19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION		MSPS	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN	POPAYAN	CAUCA	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959.000			\$	-
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959.000	\$	-	\$	-
Fecha de giro proyecto Inicial						
Plazo Inicial de Ejecución:		VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:		Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.				
* Inserte las filas que requiere de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias						

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°		28	Periodo comprendido entre el	25 de mayo de 2026	y el	25 de junio de 2026
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS						
CONTRATO DE OBRA						
Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPOPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.			Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPOPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.	
Contrato N°:	388 DE 2024			Contrato N°:	078 DE 2024	
Contratista:	CONSORCIO EVOLUT			Contratista cesionario:	CONSORCIO ADN GLOBAL	
Plazo Inicial:	VEINTE MESES			Plazo Inicial:	VEINTE MESES	
Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024			Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024	
Fecha de terminación:	11 de septiembre de 2026			Nueva fecha de terminación:	11 de septiembre de 2026	
Valor Inicial:	\$ 32.473.928.569,00			Valor Inicial:	\$ 1.280.412.030,00	
Valor Anticipo:	(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).			Valor Anticipo:	No tiene anticipo	
Forma de Pago:	El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras. El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recto a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.			Forma de Pago:	El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.	
Valor pagado:	\$ 27.588.671.061,50			Valor pagado:	\$ 1.047.857.569,00	
Nombre del Supervisor	CONSORCIO ADN GLOBAL			Nombre Interventor:	CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL, MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO	
Insertar las firmas y sellos según el número de sustituciones, prórrogas, prórrogas, adiciones presupuestales, etc. - Sumar las casillas innecesarias						

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo del 30%	25/10/2024	\$ 9.742.178.571			Anticipo		No fene anticipo
Acta Parcela No. 1	15/05/2025	\$ 4.113.300.273	\$ 2.879.310.191		Acta Parcela No. 1	20/05/2025	\$ 162.183.000,00
Acta Parcela No. 2	23/05/2025	\$ 1.331.359.292	\$ 932.116.704		Acta Parcela No. 2	9/06/2025	\$ 52.933.388,00
Acta Parcela No. 3	18/07/2025	\$ 1.131.091.048	\$ 791.183.724		Acta Parcela No. 3	4/08/2025	\$ 44.591.710,00
Acta Parcela No. 4	31/07/2025	\$ 2.351.833.475	\$ 1.646.383.453		Acta Parcela No. 4	4/08/2025	\$ 92.730.251,00
Acta Parcela No. 5	4/08/2025	\$ 860.740.433	\$ 602.518.303		Acta Parcela No. 5	4/08/2025	\$ 33.938.068,00
Acta Parcela No. 6	7/10/2025	\$ 1.934.592.860	\$ 1.354.456.002		Acta Parcela No. 6	16/10/2025	\$ 76.294.665,00
Acta Parcela No. 7	11/11/2025	\$ 985.158.901	\$ 689.611.231		Acta Parcela No. 7	24/11/2025	\$ 38.843.754,00
Acta Parcela No. 8	12/12/2025	\$ 2.360.862.204	\$ 1.673.630.631		Acta Parcela No. 8	28/11/2025	\$ 94.129.122,00
Acta Parcela No. 9	22/01/2026	\$ 3.683.366.953	\$ 2.844.377.885		Acta Parcela No. 9	23/01/2026	\$ 50.178.939,00
Acta Parcela No. 10	25/03/2026	\$ 710.024.544	\$ 497.204.181		Acta Parcela No. 10	7/04/2026	\$ 68.030.000,00
Acta Parcela No. 11	25/03/2026	\$ 1.030.167.541	\$ 721.117.279		Acta Parcela No. 11	27/04/2026	\$ 95.360.696,00
Acta Parcela No. 12	8/04/2026	\$ 916.010.037	\$ 641.207.026		Acta Parcela No. 12	25/05/2026	\$ 128.297.285,00
Acta Parcela No. 13	23/04/2026	\$ 1.601.720.000	\$ 1.051.204.000				
Acta Parcela No. 14	30/04/2026	\$ 923.797.414	\$ 646.668.190				
Acta Parcela No. 15	16/08/2026	\$ 1.290.288.555	\$ 875.201.989				
		\$ 25.494.989.270					
TOTAL PAGADO OBRA		\$ 27.588.671.861,50	\$ 17.846.492.490,50		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ 1.047.857.568,00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 4.885.257.507,50			SALDO POR EJECUTAR		\$ 232.554.461,00

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

3. SEGUIMIENTO AL AVANCE				AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría			
AVANCE FISICO (%)							
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	92.13%	1.07%	93.20%	% Programado	92.13%	1.07%	93.20%
% Ejecutado	92.13%	1.07%	93.20%	% Ejecutado	74.91%	7.31%	82.22%
Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%	Diferencia	17.22%	-6.24%	-10.98%

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente		
ENERO	70.433.446,28	4/03/2024
FEBRERO	203.993.673,19	19/03/2024
MARZO	208.633.571,44	24/04/2024
ABRIL	202.993.483,85	24/05/2024
MAYO	208.790.633,39	19/06/2024
JUNIO	201.885.740,41	25/07/2024
JULIO	208.826.681,81	15/08/2024
AGOSTO	184.504.631,58	13/09/2024
SEPTIEMBRE	175.042.509,95	28/10/2024
OCTUBRE	136.309.883,96	20/11/2024

DICIEMBRE	109.613.127,45	29/01/2025
ENERO 2025	105.664.801,55	25/02/2025
FEBRERO 2025	90.759.981,61	26/03/2025
MARZO 2025	100.318.299,23	23/04/2025
ABRIL 2025	97.074.375,99	23/05/2025
MAYO 2025	91.642.086,28	25/06/2025
JUNIO 2025	78.847.939,85	21/07/2025
JULIO 2025	81.211.780,13	26/08/2025
AGOSTO 2025	74.000.127,11	24/09/2025
SEPTIEMBRE 2025	68.148.633,51	20/10/2025
OCTUBRE 2025	66.958.394,00	24/11/2025
NOVIEMBRE 2025	62.053.648,22	24/12/2025
DICIEMBRE 2025	59.816.458,89	20/01/2026
ENERO 2026	50.971.003,33	12/02/2026
FEBRERO 2026	39.787.384,70	17/03/2026
MARZO 2026	46.262.965,09	21/04/2026
ABRIL 2026	40.872.510,00	25/05/2026
MAYO 2026	35.973.522,94	26/06/2026

TOTAL	3,205,210,779.36
-------	------------------

* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.

28

Fecha

25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026

Departamento

CAUCA

Municipio

POPAYAN

Entidad Beneficiaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Objeto del Proyecto:

«CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023»

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:

\$

33.764.596.959,00

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Fecha de Presentación Proyecto

18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto

19 de octubre de 2023

COFINANCIACION

MSPS

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

POPAYAN

CAUCA

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación

\$

33.764.596.959,00

\$

-

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:

\$

33.764.596.959,00

\$

-

\$

-

\$

-

\$

33.764.596.959,00

Fecha de giro proyecto Inicial

Pleazo Inicial de Ejecución:

VEINTE (20) MESES

Pleazo de Ejecución Final:

Ventinueve (29) meses y diecinueve (19) días

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Entre el 25 de mayo y el 25 de junio de 2026, la obra correspondiente al Contrato No. 338 de 2023 continuo desarrollandose de manera satisfactoria, alcanzando un avance fisico acumulado aproximado del 93,5 % del total del proyecto, lo cual evidencia el progreso constante en las actividades de terminación de la infraestructura y la consolidación de los diferentes componentes constructivos, técnicos y arquitectónicos de la nueva torre hospitalaria.

Durante el presente periodo se logró avanzar de manera significativa en la culminación de las actividades correspondientes a los diferentes sistemas que conforman la infraestructura, alcanzándose porcentajes de ejecución cercanos al 96 % en los componentes eléctricos, hidrosanitarios, redes de protección contra incendios (RCI), sistemas mecánicos, acabados arquitectónicos, ventanería, fachadas y demás redes técnicas indispensables para la operación de la nueva torre.

En relación con el componente eléctrico, se informa que las actividades asociadas a redes internas, canalizaciones, tableros, acometidas, sistemas de respaldo y articulación con la infraestructura principal presentan un nivel de ejecución cercano al 97 %. Durante el presente periodo se destaca igualmente el ingreso a obra de la planta eléctrica, encontrándose actualmente en proceso de instalación, actividad que representa un avance fundamental para garantizar la autonomía energética, continuidad del servicio y puesta en funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.

Respecto al componente arquitectónico, se evidencia la culminación prácticamente total de los acabados interiores y exteriores del edificio, incluyendo pisos, cielorrasos, enchapes, pintura, ventanería, carpintería metálica y sobrefachada. De igual manera, las fachadas del edificio se encuentran completamente consolidadas, permitiendo el cierre definitivo de la envolvente arquitectónica y garantizando las condiciones de protección, funcionalidad y eficiencia propias del proyecto.

En cuanto a las redes técnicas, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, protección contra incendios y demás sistemas complementarios presentan un estado de ejecución superior al 93 %, encontrándose actualmente en actividades de pruebas, ajustes finales, integración entre sistemas y preparación para su puesta en servicio. Así mismo, los sistemas mecánicos correspondientes a climatización, extracción y manejo de aire continúan en fase de ajuste y pruebas operacionales, permitiendo la habilitación progresiva de las diferentes áreas funcionales del edificio.

Con respecto al helipuerto, durante el periodo evaluado se registró un avance importante en su ejecución, encontrándose actualmente construida la estructura correspondiente al último nivel de la torre, desde donde se desarrollarán las actividades finales para la conformación de la plataforma aérea. Este avance constituye un hito relevante dentro del proyecto, permitiendo dar continuidad a las labores especializadas requeridas para su terminación y posterior proceso de certificación.

Así mismo, se informa que durante el presente periodo se adelantaron las actuaciones administrativas y técnicas necesarias para garantizar la construcción del sistema independiente de almacenamiento de agua potable y de la red contra incendios requerido para la operación de la nueva torre hospitalaria. En tal sentido, durante la semana siguiente al cierre del presente informe se tiene prevista la contratación del constructor de los tanques de almacenamiento de agua potable, tanque de la red contra incendios y casa de máquinas, etapa que permitirá posteriormente adelantar la ejecución de estas obras complementarias indispensables para la entrada en funcionamiento de la infraestructura.

En términos generales, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 25 de junio de 2026 se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, concentrando los esfuerzos en la culminación de los sistemas técnicos, la instalación de equipos estratégicos y el desarrollo de las obras complementarias necesarias para la puesta en operación de la nueva torre hospitalaria. El estado actual del proyecto evidencia un nivel de ejecución altamente avanzado, consolidando las condiciones técnicas, funcionales y operativas requeridas para su terminación y

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO













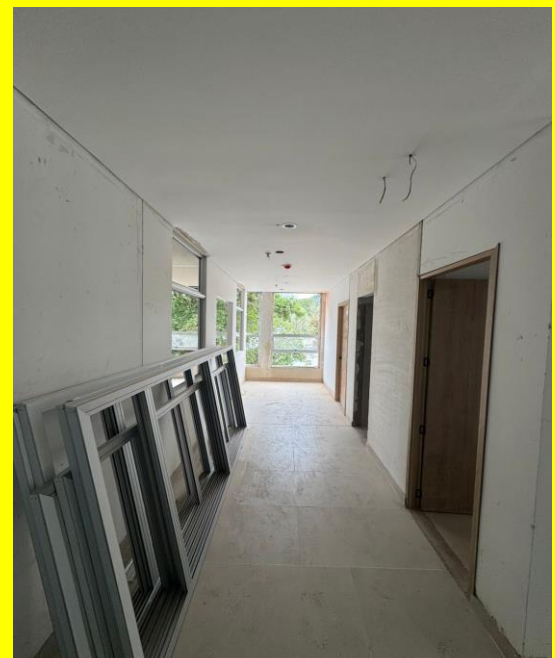
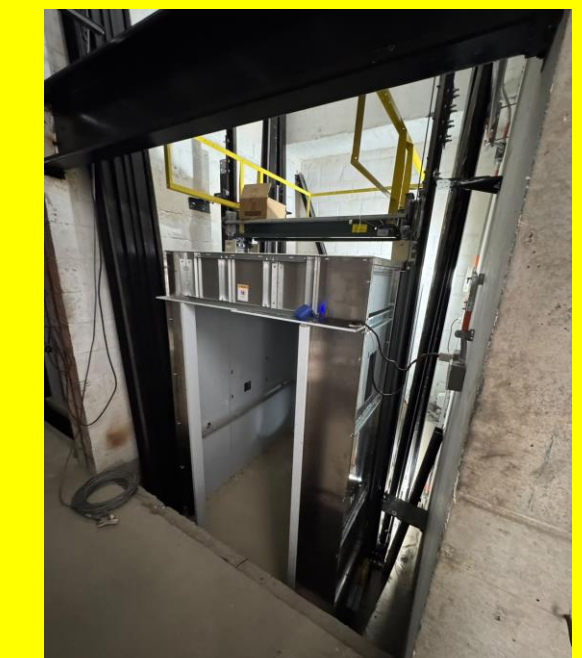
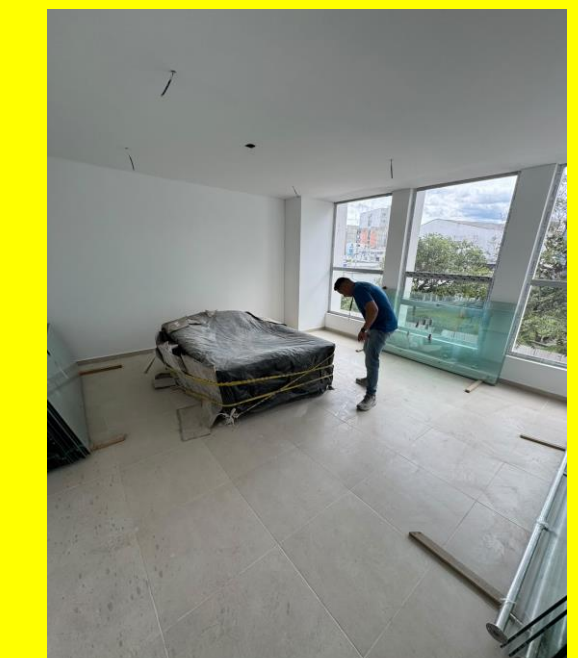
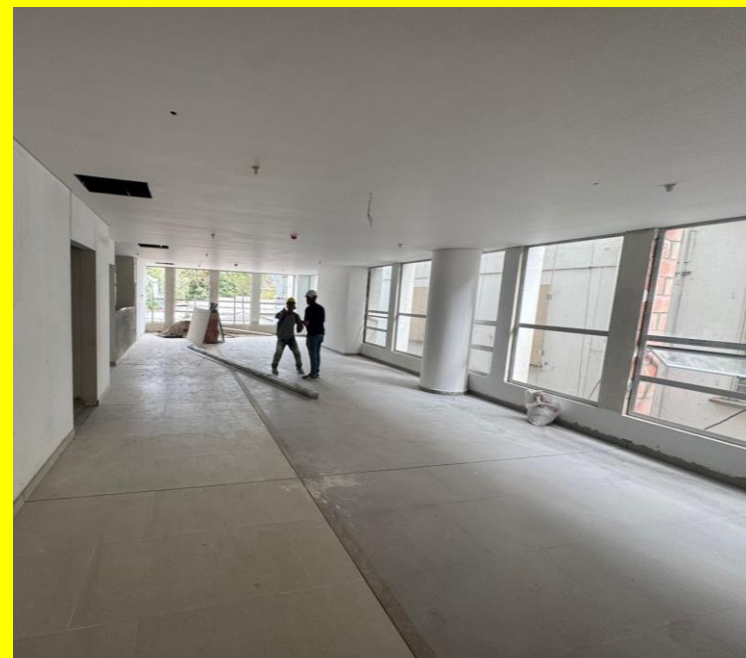
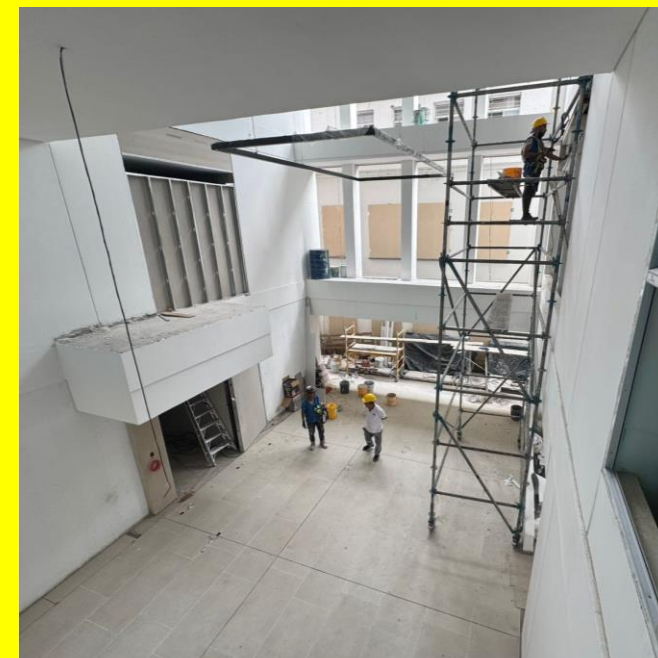
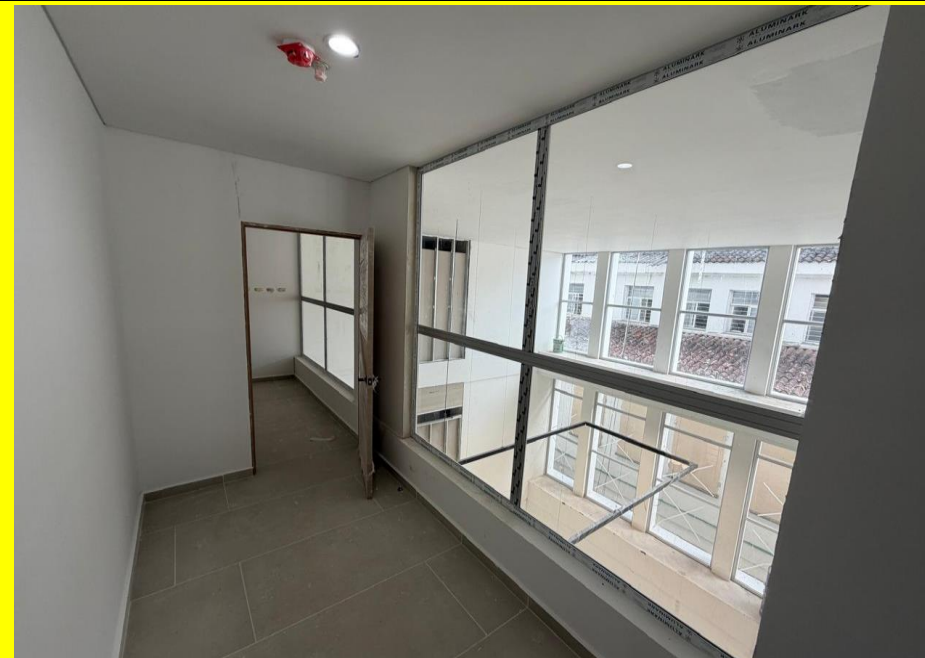
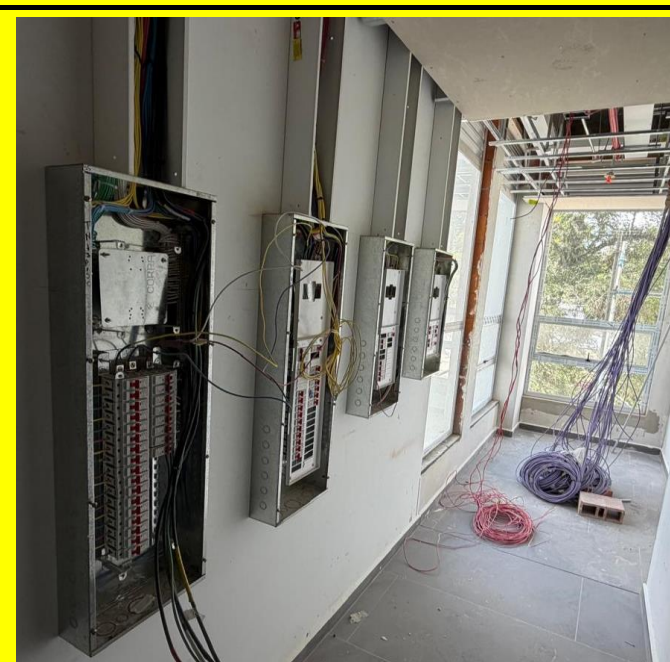
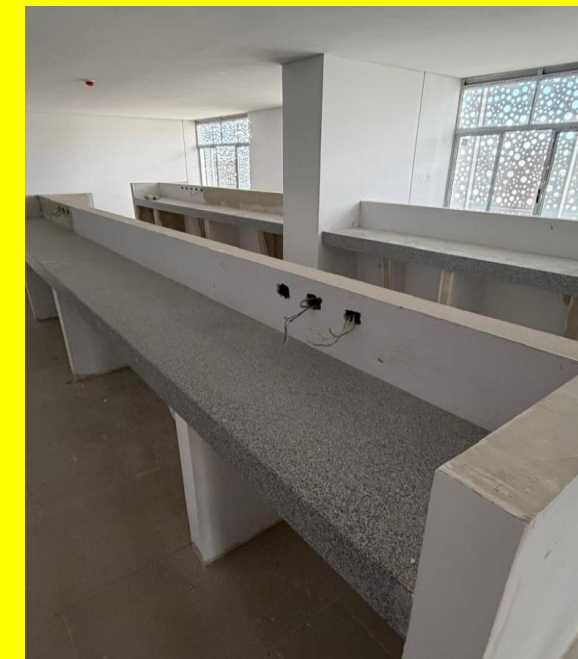
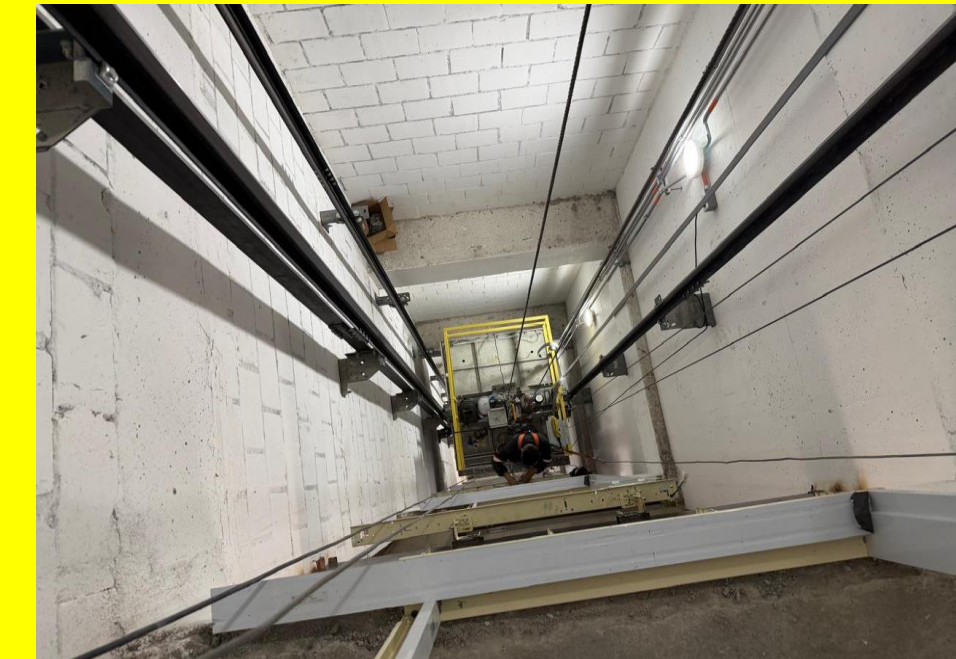


Fachada frontal y lateral norte. Avance del 98 % en la ejecución de ventanería, estucos, acabados arquitectónicos y sistema de sobrefachada.

Primer piso. Avance del 92 % en acabados, enchapes, estucos, redes técnicas e instalación de cielorrasos.

Página 2 de 4

13/07/2026

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023									
Informe No.	28								
Fecha	25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026								
Departamento	CAUCA								
Municipio	POPAYAN								
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.								
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA. PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO									
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte						
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023								
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023								
COFINANCIACION	MSPS								
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN				POPAYAN	CAUCA	\$ TOTAL
Acto Administrativo de asignación									
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial	VEINTE (20) MESES								
Plazo Inicial de Ejecución:	Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.								
Plazo de Ejecución Final:									
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias									
									
Segundo piso. Avance del 94 % en acabados arquitectónicos, con estucos, enchapes y cielorrasos en ejecución, ascensores en su etapa final instalación.			Tercer piso. Avance del 94 % en acabados arquitectónicos, con estucos, enchapes y carpintería instalados, además de la estructura del ascensor en proceso final de montaje.						
									
Cuarto piso. Avance del 95 % en acabados arquitectónicos, con estucos, enchapes, carpintería y puertas cortafuego instaladas. Se realizó seguimiento técnico a las actividades finales de ejecución.			Quinto piso. Avance del 93 % en acabados arquitectónicos, incluyendo estucos, enchapes, ventanería, puertas, luminarias, rociadores y adecuación de espacios para su puesta en funcionamiento..						
									
Sexto piso. Avance del 94 % en acabados arquitectónicos, redes hidrosanitarias, RCI y sistema de climatización, con instalación de ventanería, luminarias, difusores de aire acondicionado y ejecución de actividades finales en cielorrasos.			Séptimo piso. Avance del 95 % en acabados arquitectónicos, con redes RCI, hidrosanitarias, eléctricas y sistema de climatización instalados, además de ventanería, luminarias y tableros eléctricos en etapa final de ejecución.						
									
Octavo piso. Avance del 98 % en acabados arquitectónicos, con instalación de ventanería, carpintería, luminarias y componente mecánico, además del montaje de la estructura del ascensor y actividades finales de terminación.			Noveno piso. Avance del 98 % en acabados arquitectónicos, con instalación de ventanería, carpintería, luminarias, mobiliario fijo y ejecución de actividades finales de terminación.						
									
Décimo piso (cubierta). Avance del 98 % en la instalación de condensadoras del sistema de climatización, impermeabilización, redes eléctricas y preparación de la estructura metálica del helipuerto para su montaje.			Sala de máquinas y equipos especiales. Avance del 98 % en la construcción de la sala de la planta eléctrica, ingreso del equipo a obra y montaje del sistema de ascensores.						

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.

28

Fecha

25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026

Departamento

CAUCA

Municipio

POPAYAN

Entidad Beneficiaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Objeto del Proyecto:

«CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA. PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023»

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:

\$

33.764.596.959,00

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Fecha de Presentación Proyecto

18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto

19 de octubre de 2023

COFINANCIACION

MSPS

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

POPAYÁN

CAUCA

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación

\$

33.764.596.959,00

\$

-

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:

\$

33.764.596.959,00

\$

-

\$

-

\$

-

\$

33.764.596.959,00

Fecha de giro proyecto Inicial

VEINTE (20) MESES

Pleazo Inicial de Ejecución:

Pleazo de Ejecución Final:

Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Asossa 03-07-2026: Se realiza visita de seguimiento por parte del MSPS el día 1-06-2026, con participación de la E.S.E., SSD - Cauca, Interventoría y contratista de obra, en donde se realiza un recorrido en la ejecución del proyecto y los compromisos adquiridos. Se presento una prorroga el día 8 de mayo de 2026, por parte de la E.S.E.
La E.S.E. manifiesta que, se enviara ante el MSPS, un balance de mayores cantidades debido a: justificación técnica de mayores cantidades de obra e ítems adicionales requeridos para la terminación del proyecto, debido a ajustes de diseño, cambios de ubicación de equipos y ne-cesidades operativas que no fueron contempladas en la consultoría inicial.
Se le solicita al contratista de obra, implementar un plan de contingencia o plan de choque, que permita mayor avance en la ejecución del proyecto, para poder cumplir con la fecha de entrega programada.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto y compromisos adquiridos que garanticen de ejecución y terminacion a feliz termino

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	27-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA
13			14					

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia

Nombre: Adriana Lucia Belalcázar Murcia

Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero

Fecha de Elaboración:

25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026

Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024

Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024

Cargo: Contratista MSPS

Pag. 1

Página 4 de 4

13/07/2026
