ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 (PERIODO MARZO 26 - ABRIL 25 DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14

CONSORCIO INTERSALUD PZ

Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	**Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M.** Representante legal Consorcio Intersalud PZ

ABRIL 25 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 8
2.1. Localización 9
2.2. Justificación. 10
2.3. Características del Proyecto. 11
3.1. Contrato de Obra. 12
3.2. Póliza del Contrato de Obra. 13
3.3. Contrato de Interventoría. 15
3.4. Pólizas de Interventoría. 16
4.1. Gestión Administrativa 17
4.1.1 Personal de Interventoría 17
4.1.2 Personal del contratista de obra. 18
4.1.3. Comités de obra. 18
4.1.4 Correspondencia Cruzada 20
4.2. Gestión Técnica 28
4.2.1 Avance de obra 28
4.3. Gestión Financiera 86
4.4. Gestión Socioambiental 93
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 106
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA 125
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE MUESTRAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 126
8. CONCLUSIONES 132

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 9

Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1. 31

Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 32

Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3. 33

Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. 34

Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. 35

Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. 36

Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2 37

Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3. 38

Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. 39

Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. 40

Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. 41

Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. 42

Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. 43

Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. 44

Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. 45

Ilustración 17. Detalle losa de entrepiso 46

Ilustración 18. Detalle joist VT 01..... 46

Ilustración 19. Detalle joist VT 02..... 47

Ilustración 20. Detalle joist VT 03..... 47

Ilustración 21. Detalle joist VT 04..... 48

Ilustración 22. Detalle joist VT 05..... 48

Ilustración 23. Detalle joist VT 06..... 49

Ilustración 24. Detalle joist VT 07..... 49

Ilustración 25. Detalle joist VT 08..... 50

Ilustración 26. Detalle joist VT 09..... 50

Ilustración 27. Disposición de vigas joist entrepiso 3 N+11.50 51

Ilustración 28. Disposición de refuerzo viga A N +11.50..... 52

Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A' N +15.40 53

Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga B N +15.40..... 55

Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga C N +15.40..... 56

Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +15.40 58

Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +15.40..... 59

Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +15.40..... 60

Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*) N +15.40. 62

Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1* (B-E) N +15.40. 62

Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +15.40..... 63

Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +15.40..... 64

Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +15.40..... 65

Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +15.40 66

Ilustración 41.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +15.40 67

Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +15.40 68

Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +15.40 69

Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 5 ' (B-E) N +15.40 69

Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5' ' (B-E) N +15.40 70

Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +15.40 71

Ilustración 47. Acero corrugado de pantallas 79

Ilustración 48. Acero corrugado de columnas 80

Ilustración 49. Acero de refuerzo Vigas Joist 81

Ilustración 50. Acero corrugado vigas de entrepiso 82

Ilustración 51. Fundición losa de cimentación 83

Ilustración 52.Concreto para columnas 84

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra 13

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 13

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 14

Tabla 4. Contrato de Interventoría 15

Tabla 5. Pólizas de Interventoría 16

Tabla 6. Personal de Interventoría. 17

Tabla 7. Personal del contratista de obra. 18

Tabla 8. Actas de comité 19

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra. 14

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría. 16

Anexo 3. Planillas personal Interventoría 18

Anexo 4. Actas de comité abril de 2025 19

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. 28

Anexo 6. Autorización de desembolso UBANER PEREZ del 4 de ABRIL de 2025, pagado el 7 DE ABRIL DE 2025 88

Anexo 7. Comprobantes rendimientos financiero abril y marzo 2025 89

Anexo 8. Informe mensual del periodo del 26 marzo al 25 de abril de 2025 del contratista de obra 125

Anexo 9. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA 131

Anexo 10. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA 132

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE MARZO A 25 DE ABRIL DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	**CONSORCIO EVOLET**
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte ($32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Ampliación de plazo	Ciento setenta y dos (172) días
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025.
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 3	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		$ 3.247.392.856,90

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 3	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Vehiculos propios y no propios	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 4	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	13-sept-2026	$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	13-sept-2026	$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	13-may-2029	$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días.		$ 3.247.392.856,90

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 4	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Vehiculos propios y no propios	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45

Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	**CONSORCIO INTERSALUD PZ**
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva.
Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Ampliación de plazo Otro si No .01	Ciento setenta y dos (172) días.
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días.
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de $1.280.412.030

Tabla 5. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-may-2026	$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	$256.082.406,00

Tabla 6. Pólizas de Interventoría

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.

Póliza ampliación de plazo de interventoría OTROSI N°01.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 3	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	10-nov-2026	$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	10-may-2029	$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	13-may-2031	$256.082.406,00

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE MARZO al 25 DE ABRIL DE 2025.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Augusto Guzmán Enriquez
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniera eléctrica	Luis Felipe Valenzuela
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixsa Angulo Agudelo.
uelaJurídico.	José Alexander Romero
Contador publico	Edwin Micolta Mondragón

Tabla 7. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Suplente representante legal	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	José Geovaire Ausecha
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastian Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Malene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Lorena Falla Falla
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Arquitecta Apoyo técnico	Laura Valentina Callejas
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria

Tabla 8. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron cuatro (4) comités técnicos y cinco (5) Reuniones técnicas

COMITÉ	FECHA
43	01-04-2025

Reunión media tensión	01-04-2025
44	04-04-2025
Reunión Suelos	04-04-2025
Reunión recorrido SST	14-04-2025
45	15-04-2025
46	23-04-2025
Reunión eléctrica	25-04-2025

Tabla 9. Actas de comité

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Anexo 4. Actas de comité abril de 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025.

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO
1/04/2025	CIPZ-078-192-2024	CONVOCATORIA ESPECIALISTAS DE SUELOS – OFICIO ENTIDAD 31 DE MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
1/04/2025	CIPZ-078-193-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0328-25 Y COMPROMISOS MESA TECNICA RED DE MEDIA TENSION 1 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
2/04/2025	CIPZ-078-0194-2025	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0318-25 DEL 25 DE MARZO DE 2025 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN INICIO DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERÍA.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
2/04/2025	CIPZ-078-0195-2025	DOCUMENTACION FISICA CONTRATO N°358 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
3/04/2025	CIPZ-078-0196-2025	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0310-25 DEL 20 DE MARZO DE 2025 - LIBERACION REDES SANITARIAS.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
4/04/2025	CIPZ-078-0197-2025	OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
4/04/2025	CIPZ-078-0198-2025	CONVOCATORIA REUNION ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA 4 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO - Ingenierio DIDIER GOLONDRINO Profesional Universitario Infraestructura Hospitalaria
4/04/2025	CIPZ-078-0199-2025	RESPUESTA OFICIO DEL 3 DE ABRIL DE 2025 – "SOLICITUD REMISION DE INFORME SIN SANCIONES TASADAS EN RESPUESTA AL OFICIO DEL 17 DE MARZO DE 2025"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
5/04/2025	CIPZ-078-0200-2025	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-034-25 del 2 DE ABRIL DE 2025 - OBSERVACIONES BALANCE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
7/04/2025	CIPZ-078-0201-2025	EJECUCIÓN APANTALLAMIENTO DEL EDIFICIO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
7/04/2025	CIPZ-078-0202-2025	REMISIÓN RESPUESTAS EV-C358-23-0312-25 EV-C358-23-339-25 – CANCELACIÓN FUNDICIÓN 25 DE MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
7/04/2025	CIPZ-078-0203-2025	PROPUESTAS TRAZADO RED DE MEDIA TENSIÓN	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
9/04/2025	CIPZ-078-0204-2025	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
8/04/2025	CIPZ-078-0205-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-342-25 Y DOCUMENTACIÓN FISICA CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

9/04/2025	CIPZ-078-0206-2025	REMISION RESPUESTA 8 ABRIL – "RESPUESTA OFICIO INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA."	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
9/04/2025	CIPZ-078-0207-2025	REMISIÓN RESPUESTA ENTIDAD PROPUESTAS TRAZADO RED DE MEDIA TENSIÓN CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
9/04/2025	CIPZ-078-0208-2025	PROGRAMACIÓN RECORRIDO SG-SST LUNES 14 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL
11/04/2025	CIPZ-078-0209-2025	REMISION OFICIO EV-C358-23-0325-25, "REITERACIÓN DE SOLICITUDES REFERENTE A LOS DISEÑOS DEL PROYECTO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
11/04/2025	CIPZ-078-0211-2025	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
11/04/2025	CIPZ-078-0212-2025	REMISION OFICIO ENTIDAD 11 ABRIL 2025 "SOLICITUD DE GESTIÓN PARA REAJUSTE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – CONTRATO NO. 358	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/04/2025	CIPZ-078-0213-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/04/2025	CIPZ-078-0214-2025	RESPUESTA OFICIO "CRONOGRAMA" 12 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/04/2025	CIPZ-078-0215-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DEL ACTA PARCIAL No 1 – OBRA E INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
14/04/2025	CIPZ-078-0216-2025	REVISION DE PREACTA N°2, CON ANEXOS N°1 DEL 2 DE ABRIL DE 2025, N°2 DEL 5 DE ABRIL DE 2025, Y N°3 DEL 9 DE ABRIL DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/04/2025	CIPZ-078-0217-2025	CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO – CONTRATO DE OBRA N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
15/04/2025	CIPZ-078-0218-2025	REVISION AJUSTES BALANCE DE OBRA DEL 8 DE ABRIL DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
16/04/2025	CIPZ-078-0219-2025	OBSERVACIONES AL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PMA PARA EL MES DE MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
16/04/2025	CIPZ-078-0220-2025	REMISION OFICIO ENTIDAD 15 ABRIL 2025 – "RESPUESTA A SOLICITUD SOBRE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
16/04/2025	CIPZ-078-0221-2025	REMISION INFORMES MENSUALES MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

22/04/2025	CIPZ-078-0222-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
21/04/2025	CIPZ-078-0223-2025	REVISION DE PREACTA N°2, DEL 14 DE ABRIL DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
21/04/2025	CIPZ-078-0224-2025	CONVOCATORIA REUNION COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ - ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
21/04/2025	CIPZ-078-0225-2025	OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/04/2025	CIPZ-078-0226-2025	REVISION DE JOIST SUMINISTRADOS LOSA ENTREPISO N° 4	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
23/04/2025	CIPZ-078-0227-2025	CONTROL DE ASENTAMIENTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIO DE SUELOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
24/04/2025	CIPZ-078-0228-2025	REMISION OBSERVACIONES ENTIDAD ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
24/04/2025	CIPZ-078-0229-2025	REVISION AJUSTES BALANCE DE OBRA DEL 16 DE ABRIL DE 2025. OFICIO EV - C58-23-359-2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/04/2025	CIPZ-078-0230-2025	REMISIÓN OFICIOS ENTIDAD – "REVISORIA FISCAL Y RUTA DE COMUNICACIÓN"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/04/2025	CIPZ-078-231-2025	RESPUESTA OFICIO EV -C58-23-370-2025, "ENTREGA PREFACTURA Y CERTIFICADO PARAFISCALES"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/04/2025	CIPZ-078-232-2025	RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 24 ABRIL 2025 – "SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION DE RESPALDO DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
25/04/2025	CIPZ-078-0233-2025	REVISION DE PLANO DE FABRICACION JOIST LOSA ENTREPISO N°4 (N+15.40)	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/04/2025	CIPZ-078-0234-2025	SOLICITUD DE REVISIÓN DE INFORME MENSUAL – ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
28/04/2025	CIPZ-078-0235-2025	REENVIO RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 24 ABRIL 2025 – "SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION DE RESPALDO DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
29/04/2025	CIPZ-078-0236-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0374-25 Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
28/04/2025	CIPZ-078-0237-2025	REMISIÓN FACTURA COBRO ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

- ## CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
1/04/2025	EV-C358-23-0331-25	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.
1/04/2025	EV-C358-23-0332-25	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Reporte personal obra.
1/04/2025	EV-C358-23-0333-25	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cierre de vía Cali - Popayán.
1/04/2025	EV-C358-23-0334-25	1/04/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de pantallas y columnas del cuarto piso.
1/04/2025	n.a	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de pantallas y columnas del cuarto piso.
2/04/2025	EV-C358-23-0337-25	2/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Propuestas de trazado para la línea de media tensión presentadas por el Consorcio EVOLET en el Comité del 01 de abril de 2025
3/04/2025	n.a	3/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de remision de informe sin sanciones tasadas en respuesra al oficio 17 de marzo 2025
4/04/2025	EV-C358-23-338-24	4/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Asignación de proveedores.
5/04/2025	EV-C358-23-340-24	5/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Remisión planos estructurales actualizados
5/04/2025	EV-C358-23-342-25	5/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0195-2025- Solicitud de correspondencia en medio físico.
7/04/2025	EV-C358-23-339-24	7/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0185-2025- solicitud de ampliación de la información referente al impacto ocasionado en la reprogramación de la

7/04/2025	EV-C358-23-0343-25	7/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Ajuste Plan de manejo ambiental
7/04/2025	n.a	7/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud probatoria dentro del expediente Ético – Disciplinario PD-CAU-2024-000009 (E202414190062714) - 9106330.
2/04/2025	EV-C358-23-0344-25	2/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio de la Interventoría CIPZ-078-0200-2025 relacionado con el balance del contrato de obra No 358 de 2023.
8/04/2025	n.a	8/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO CIPZ-078-166-2025, RESPUESTA OFICIO INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA.
8/04/2025	N.A	8/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME DE FIDUCIA N°4
8/04/2025	N.A	8/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO CIPZ-078-203-2025, PROPUESTAS TRAZADO RED DE MEDIA TENSIÓN CONTRATO N°358 2023
9/04/2025	EV-C358-23-0346-25	9/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de informe No. 5 de fiducia.
9/04/2025	EV-C358-23-0348-25	9/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Envío de planilla de ss
9/04/2025	EV-C358-23-0325-25	9/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteracion solicitud diseños del proyecto
11/04/2025	EV-C358-23-0351-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de pantallas y columnas del cuarto piso.
11/04/2025	EV-C358-23-0352-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Labores semana santa.
11/04/2025	n.a	11/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de gestión para reajuste del cronograma de ejecución – Contrato No. 358 de 2023

12/04/2025	CIPZ-078-0353-2025	12/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cronograma.
14/04/2025	EV-C358-23-0355-2025	14/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cronograma y atención al oficio No. CIPZ-078-0214-2025.
12/04/2025	EV-C358-23-354-2025	12/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Estado del acta de obra No. 1.
11/04/2025	EV-C358-23-0345-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio de la Interventoría CIPZ-078-0201-2025 relacionado con la ejecución del apantallamiento del edificio.
14/04/2025	EV-C358-23-0356-25	14/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Respuesta oficio CIPZ-078-0197-2025
11/04/2025	EV-C358-23-0345-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio de la Interventoría CIPZ-078-0201-2025 relacionado con la ejecución del apantallamiento del edificio.
15/04/2025	EV-C358-23-359-2025	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Planos de fabricación de vigas joist.
15/04/2025	n.a	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD	Respuesta a solicitud sobre revision y aprobacion acta N°1 del contrato 358 2023
15/04/2025	EV-C358-23-0361-25	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta a Oficio CIPZ-078-0207-2025 – trazado de la línea de media tensión.
15/04/2025	EV-C358-23-0362-25	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta a Oficio CIPZ-078-0206-2025 – Instalación Sistema de Medición de Consumo Eléctrico Provisional
15/04/2025	EV-C358-23-359-2025	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0218-2025- Atención a las observaciones realizadas al balance de obra del 8 de abril del 2025.
16/04/2025	EV-C358-23-363-2025	16/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Planos de fabricación de vigas joist cuarto piso actualizado 16 abril del 2025.
16/04/2025	EV-C358-23-364-2025	16/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Planos de fabricación de vigas joist cuarto piso actualizado 16 abril del 2025.
21/04/2025	EV-C358-23-0365-25	21/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Fecha para instalación de malla contra caídas.
21/04/2025	EV-C358-23-0366-25	21/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.

22/04/2025	n.a	22/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Requerimiento para subsanar inconsistendias en prefactura y documentacion anexa- contrato 358 de 2023
23/04/2025	EV-C358-23-0368-25	23/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración oficio EV-C358-23-0325-25 del 9 de abril de 2025 solicitud referente a diseños del proyecto.
23/04/2025	EV-C358-23-0369-25	23/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REQUISITOS PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A OBRA
23/04/2025	EV-C358-23-0368-25	23/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	requerimientos electricos para la ejeuccon de obra
24/04/2025	n.a	25/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de verifixacion de informacion de respaldo del certificado de cumplimiento de olbigaciones laborales del contrato 358 2023
24/04/2025	n.a	25/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de correcion en la ruta de envio de informacion y documentos
24/04/2025	EV-C358-23-371-2025	24/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0229-2025- Atención a las observaciones realizadas al balance de obra del 24 de abril del 2025.
26/04/2025	EV-C358-23-0374-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reprogramación de fecha para instalación de malla
26/04/2025	EV-C358-23-0373-25	26/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de entrepiso No 4.
26/04/2025	EV-C358-23-0375-25	26/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Información visita técnica asesora arl
28/04/2025	EV-C358-23-0376-25	28/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega de la prefactura correspondiente al acta de obra N°1 corregida junto con el certificado de parafiscales
25/04/2025	n.a	28/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Aceptacion del cambio de profesional electrico contrato 078 2024
29/04/2025	EV-C358-23-381-25	29/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud cambio de proveedro-fiducia.
29/04/2025	EV-C358-23-0382-25	29/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega factura correspondiente al acta de obra No.1
30/03/2025	EV-C358-23-382-2025	30/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega de flujo de caja, curva S y reprogramación.

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025, el contratista de obra terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso N +11.50, el armado de aceros de las vigas de entrepiso N+11,50 y la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso n+11.50.

Se verificó que las vigas joist del entrepiso No 3 N+11.50 cumplieran en dimensión, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales, para lo cual se utilizó flexómetro y calibrador.

Se verificó que el acero de la malla electrosoldada cumplía con lo estipulado en los diseños aprobados por la curaduría, se verificó las dimensiones de las formaletas de las vigas de entrepiso 3 N +11.50, se verificó los niveles de la formaleta de la losa de entrepiso 3 N+11.50

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las vigas y losa de entrepiso No 3 N+11.50, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo

cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Se verificó que los aceros de las columnas y pantallas del entrepiso N+11.50 a N+15,40 cumplen con el diámetro, cuantía, disposición, espaciamiento, conforme a lo establecido en los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se verifico las formaletas para columnas y pantallas del entrepiso N+11.50 a N+15,40, cumplieran con las dimensiones, los plomos y alineamientos conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las columnas y pantallas de entrepiso N+11.50 a N+15,40, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia,

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 8" más o menos 1".

Se verificó la disposición de formaleta de la losa de entrepiso No 4 N+15.40, se verificó que los aceros de las vigas de entrepiso del nivel N+15.40 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas principales y gradas de emergencia del entrepiso N+0.0 a N+3.70 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las de las gradas principales y gradas de emergencia del entrepiso N+0.0 a N+3.70, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 3000 psi de resistencia.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas de emergencia del entrepiso N+3.7 a N+7.60 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N 11.50 A N +15.40

- COLUMNA C1

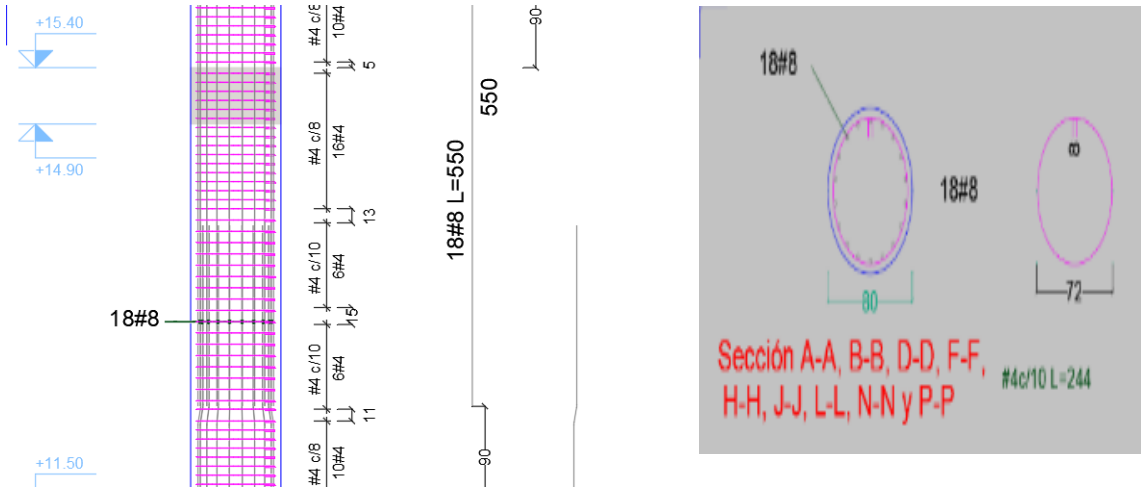


Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1.

- COLUMNA C2, C4 y C5

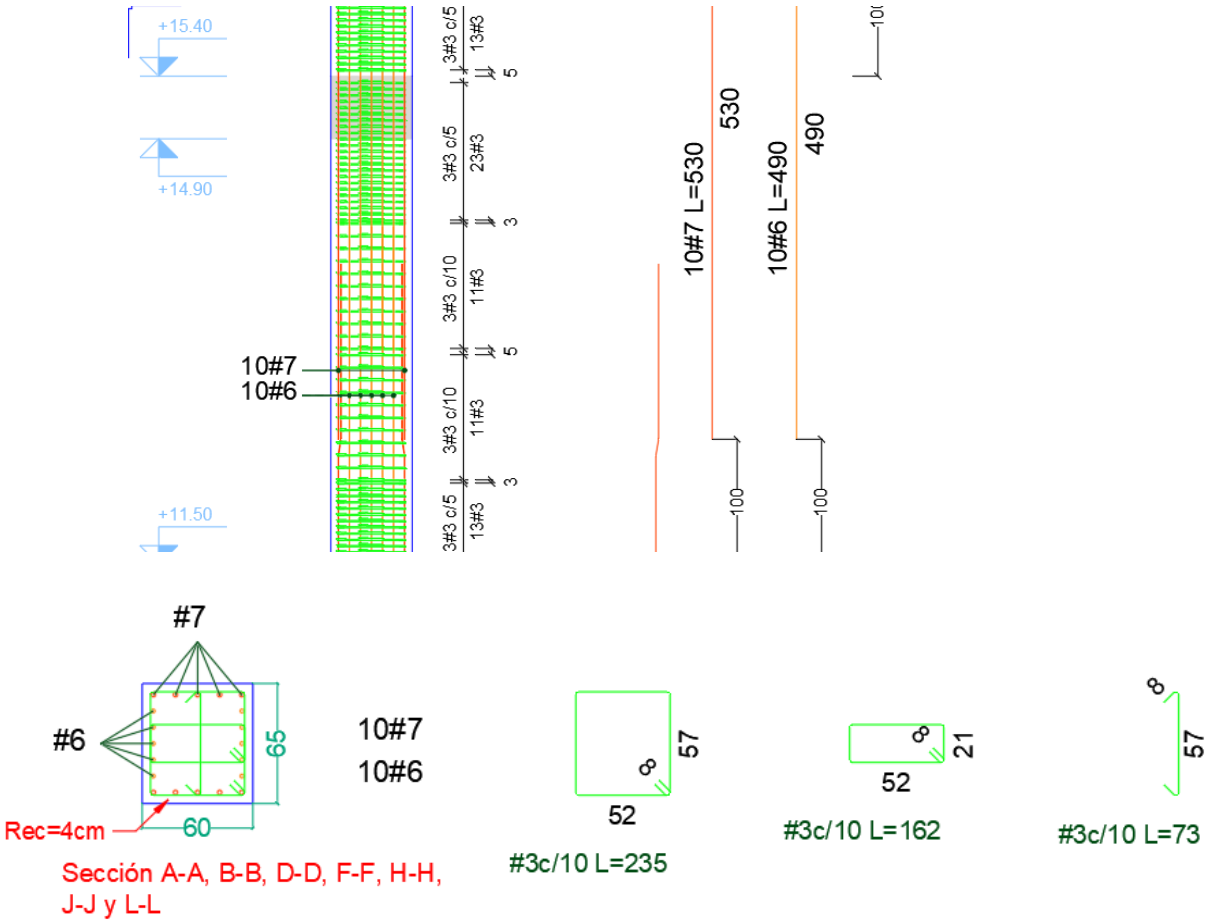


Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5

- COLUMNA C3

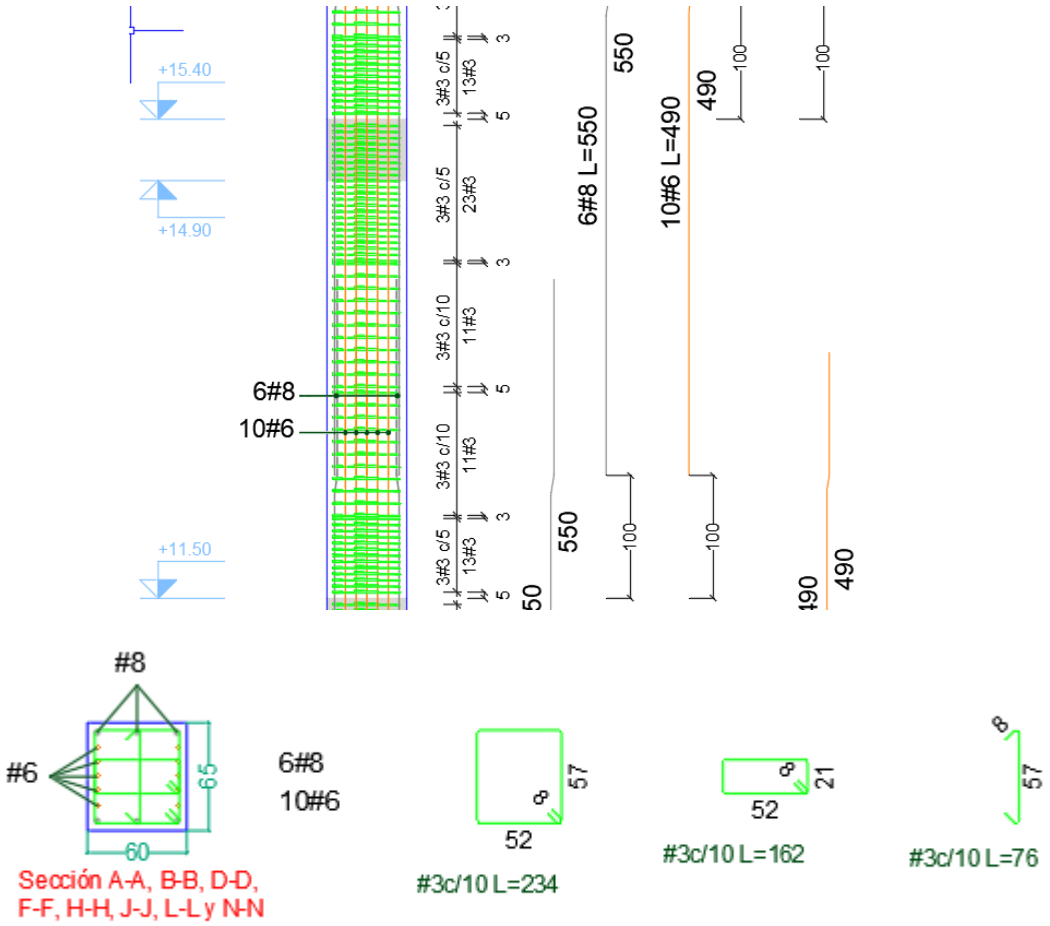


Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.

- COLUMNA C6, C7 y C8

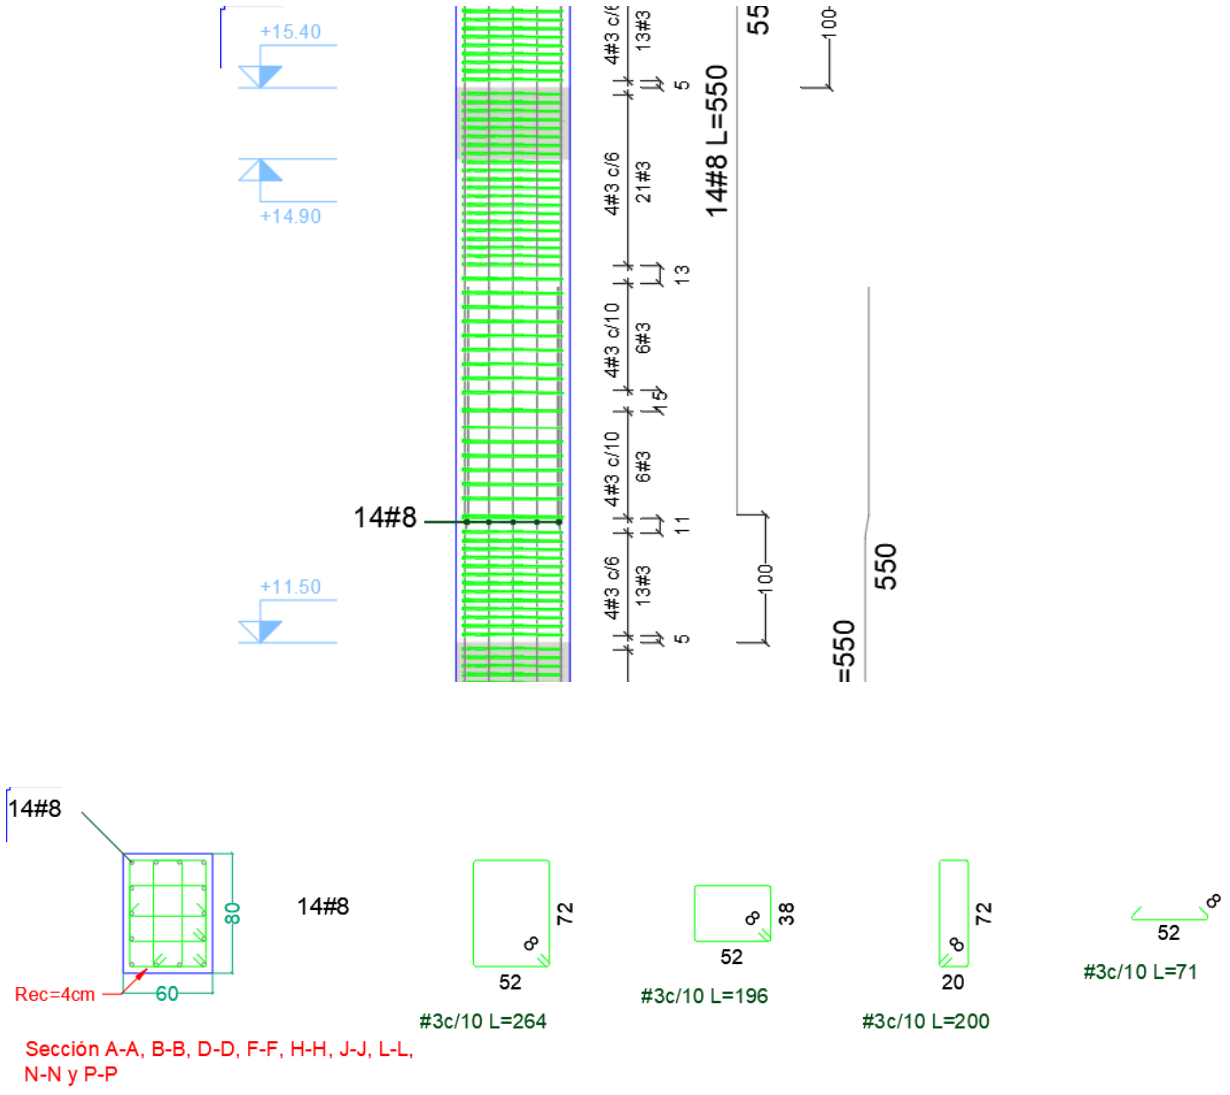


Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.

- COLUMNA C9 y C10

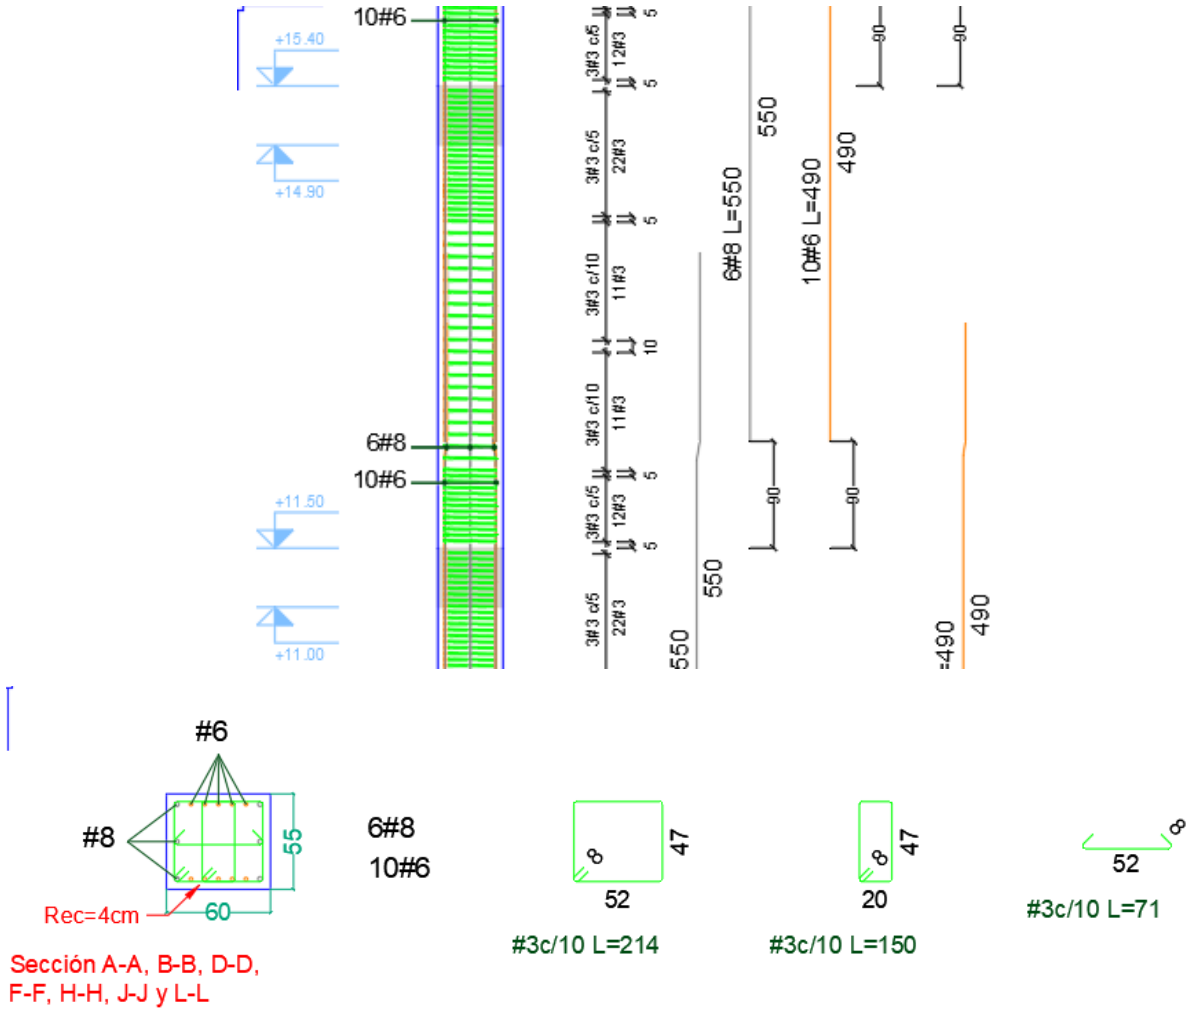


Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +11.50 A N +15.40

- PANTALLA PW1

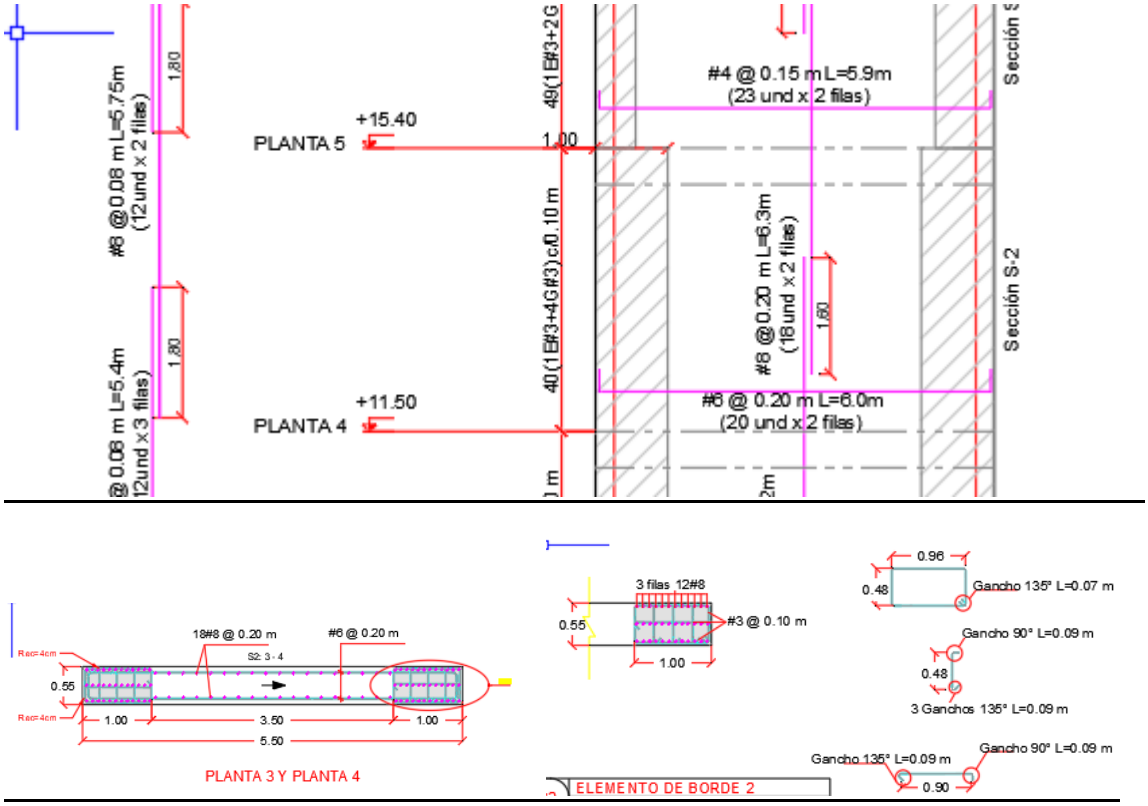


Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

- PANTALLA PW2

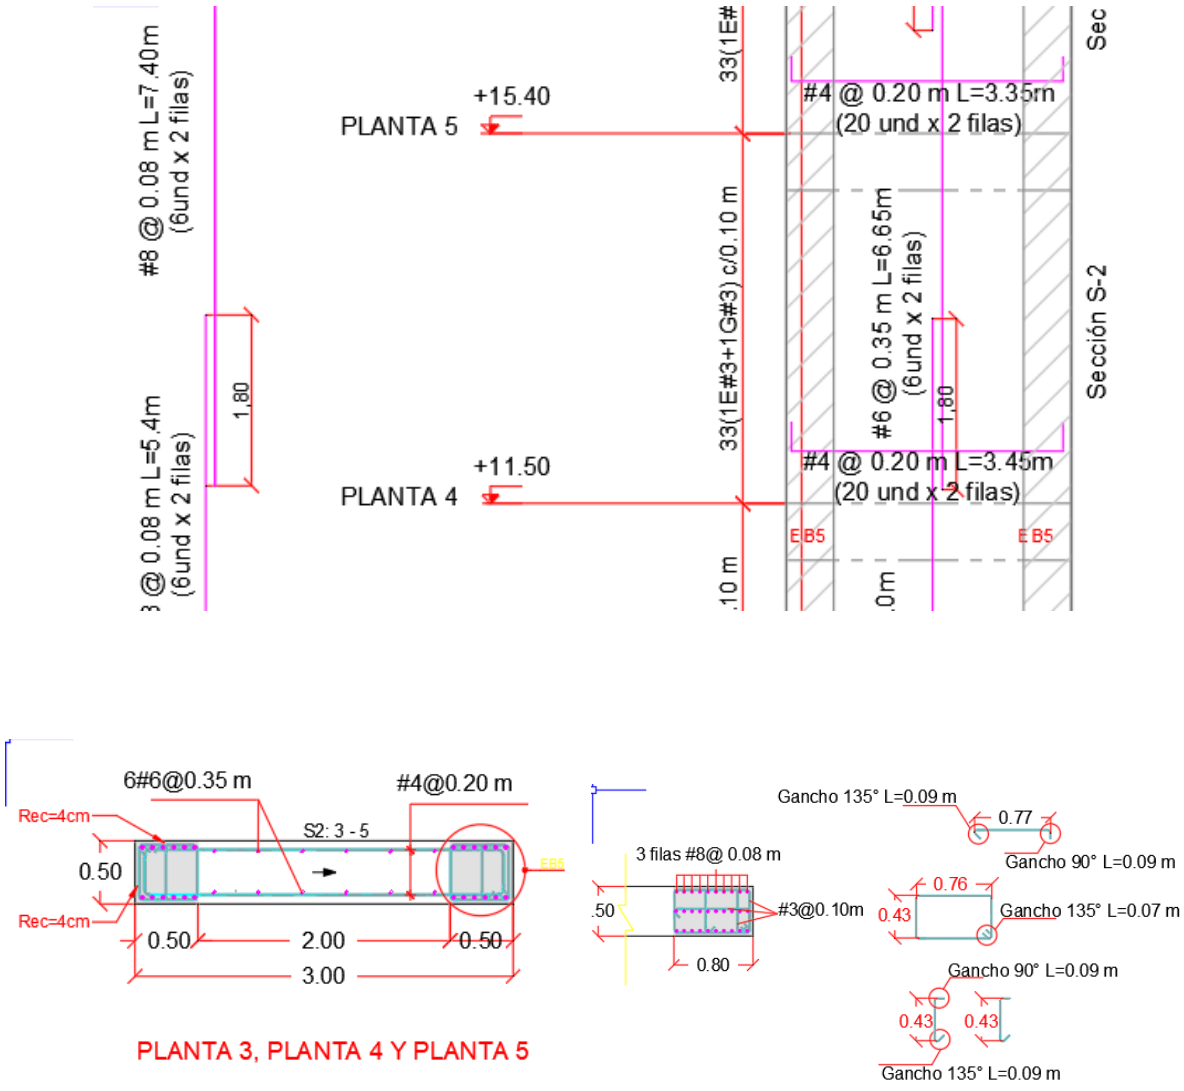


Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2

- PANTALLA PW3

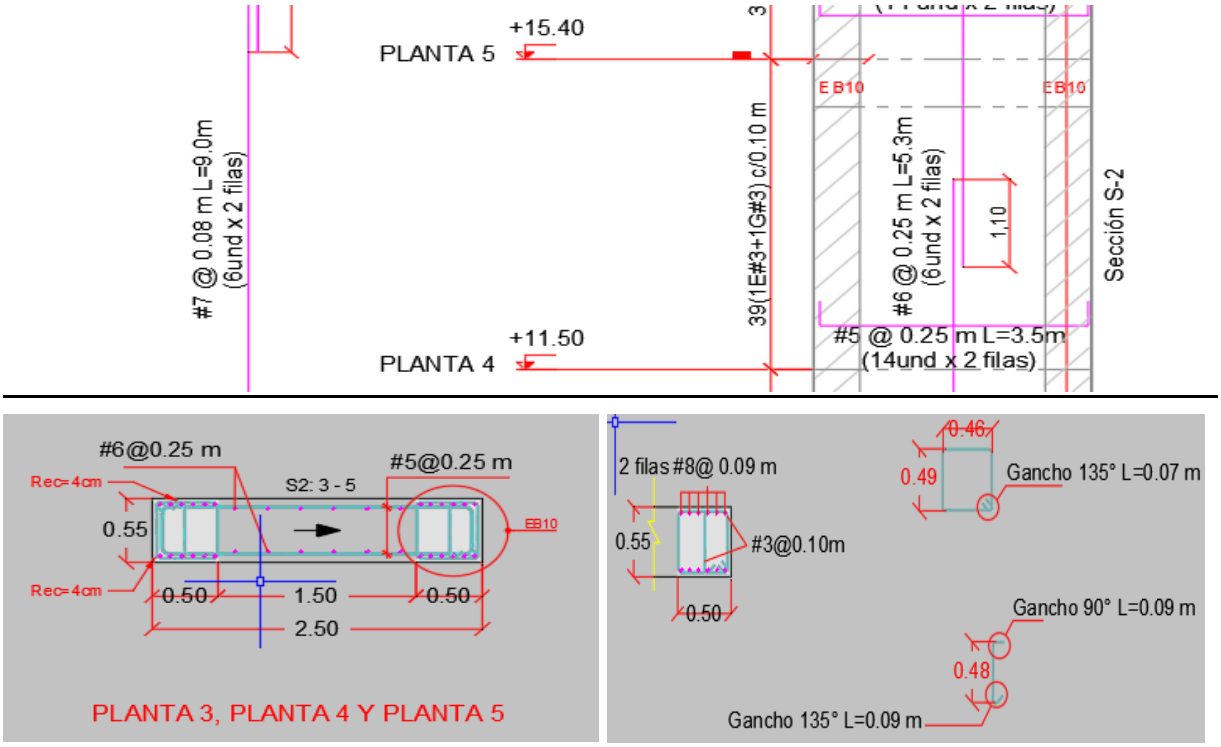


Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.

- PANTALLA PW4

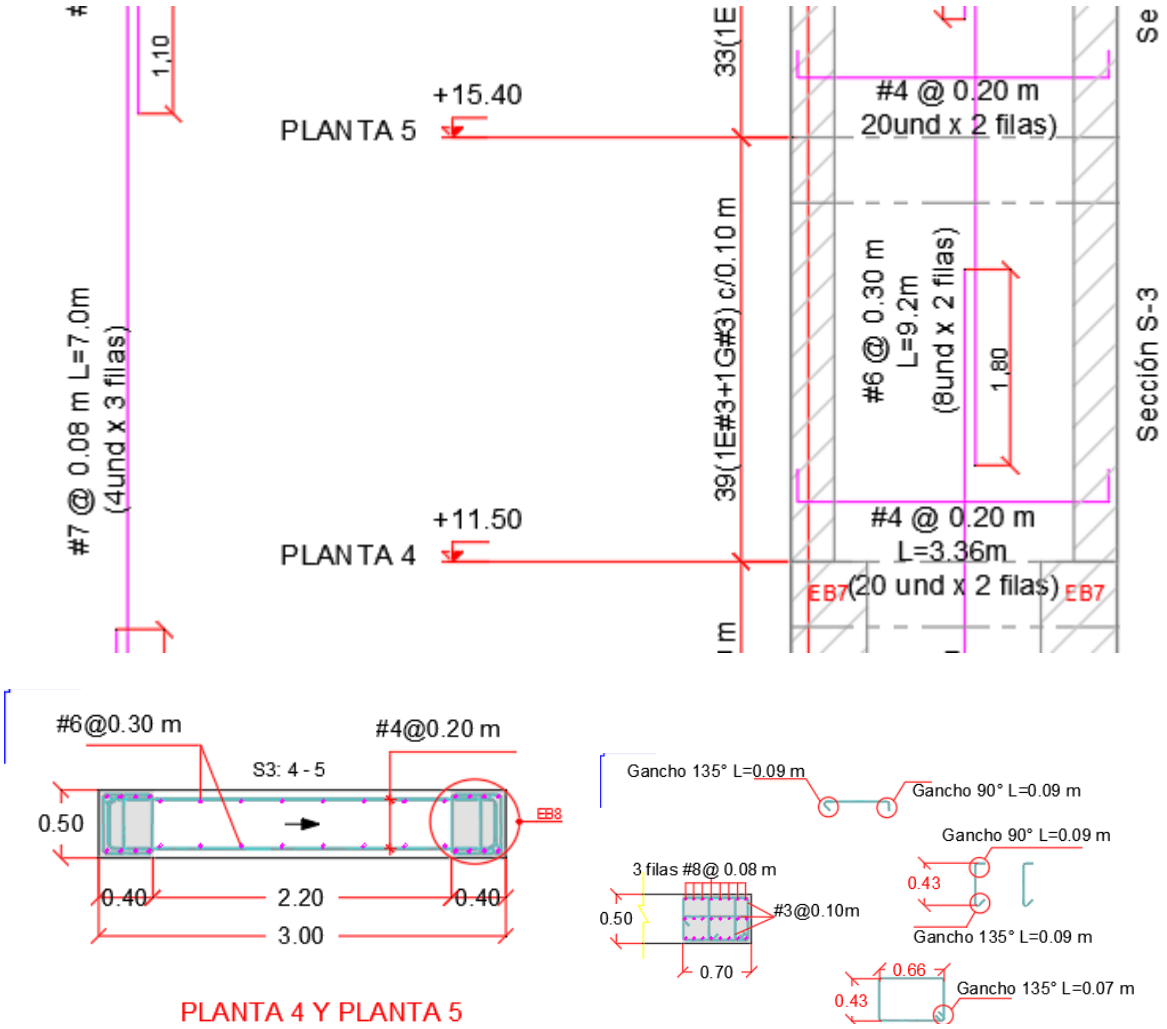


Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

- PANTALLA PW5

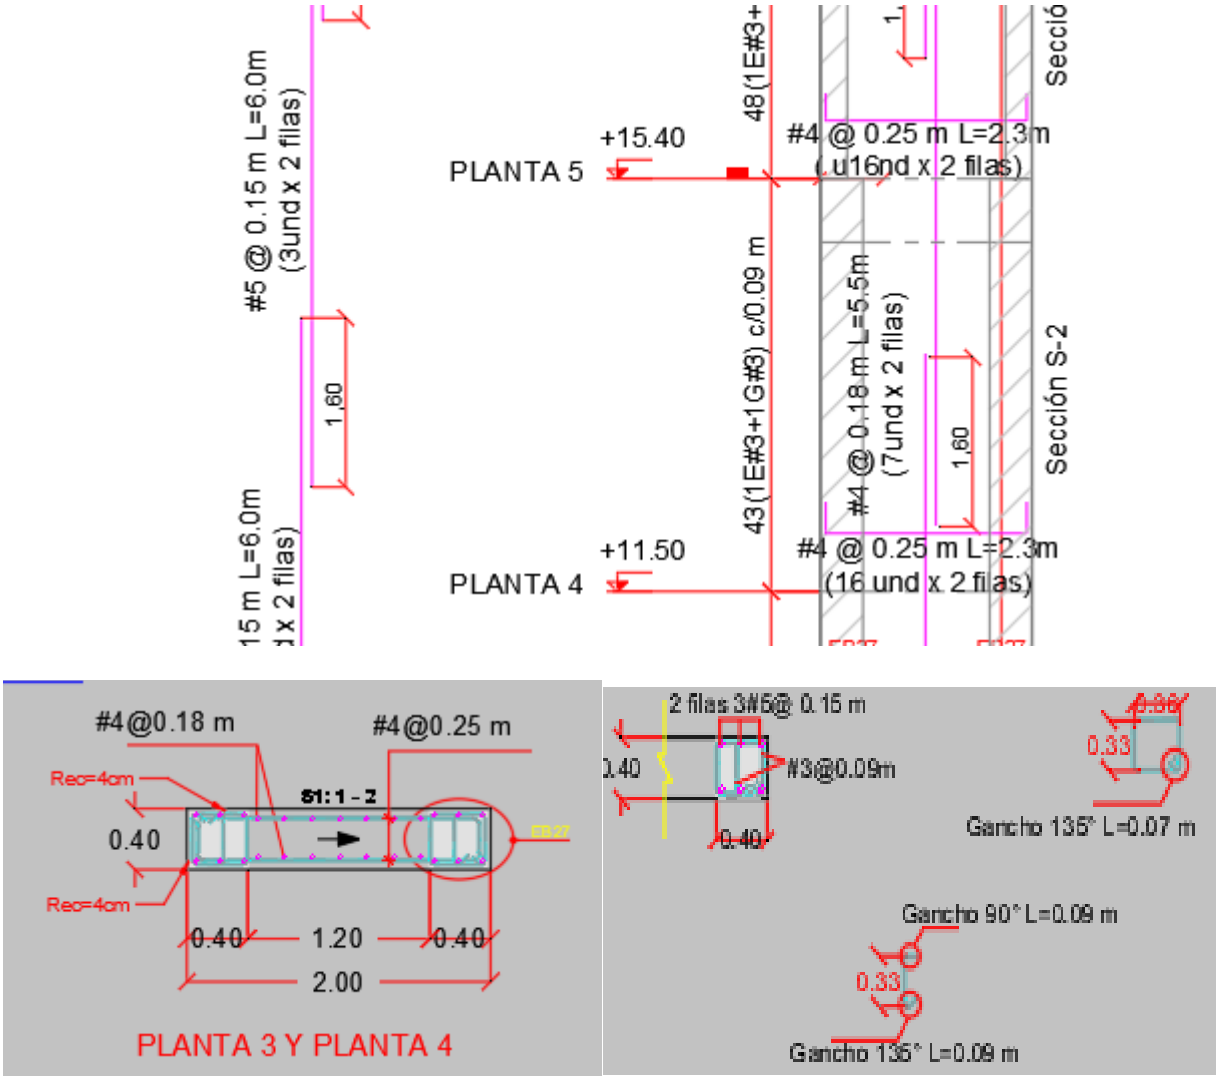
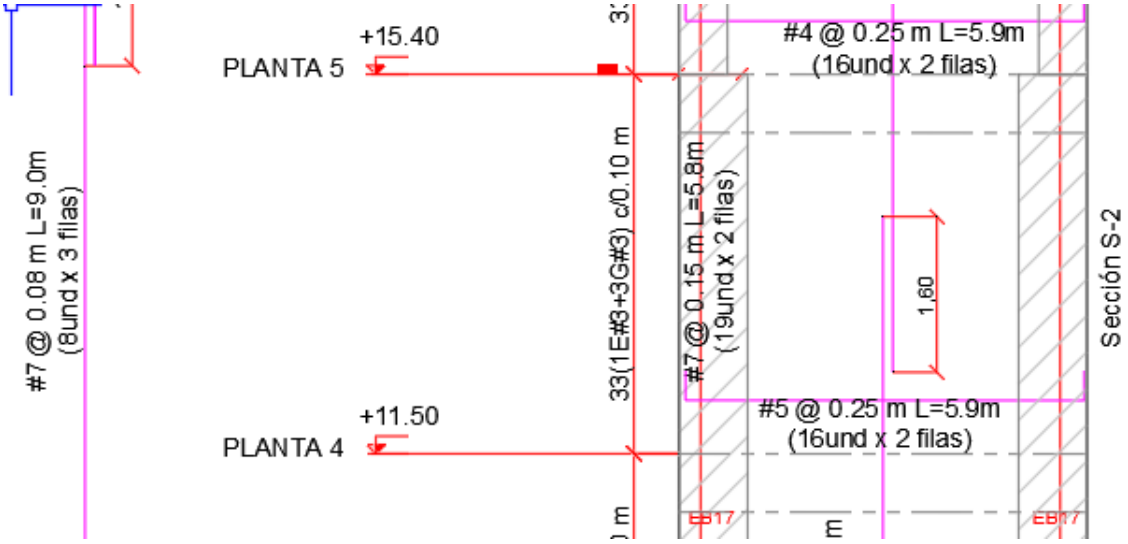
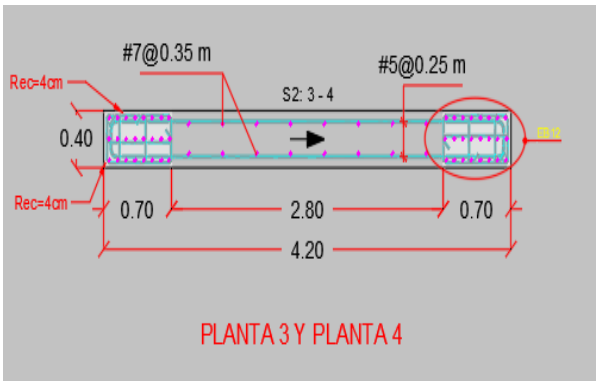


Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

- PANTALLA PW6





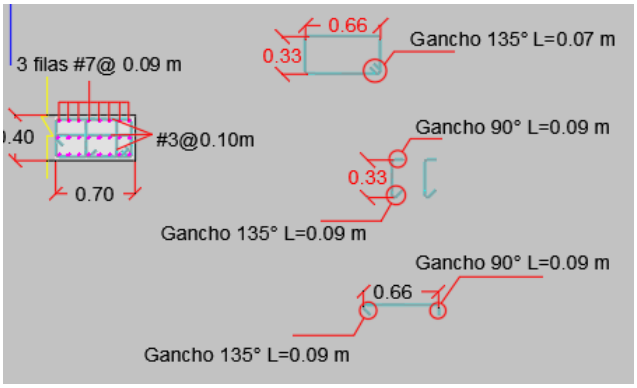
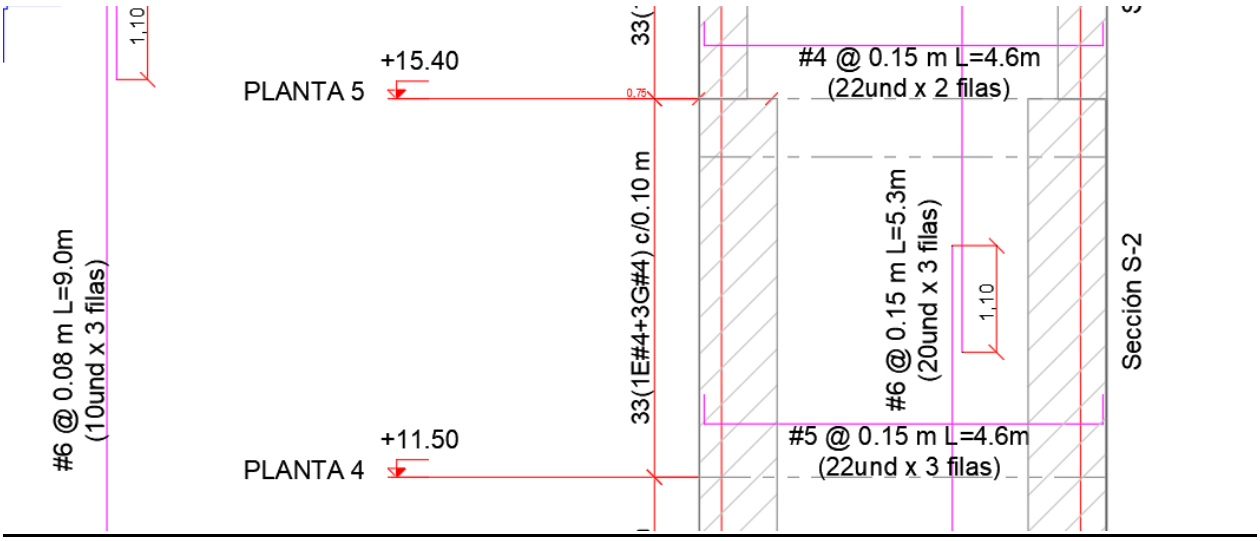


Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

- PANTALLA PW7



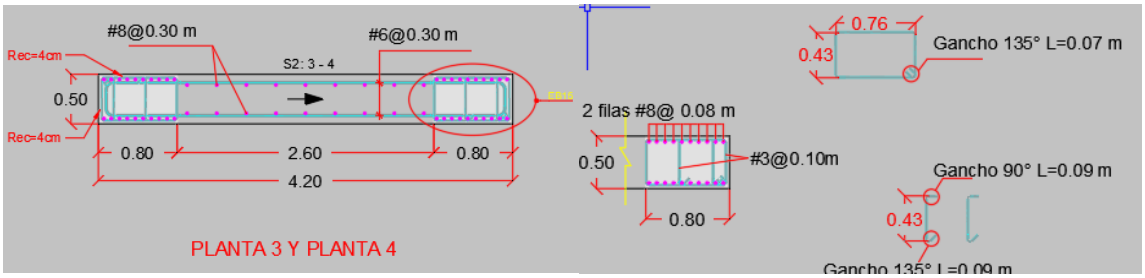


Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

- PANTALLA PW8

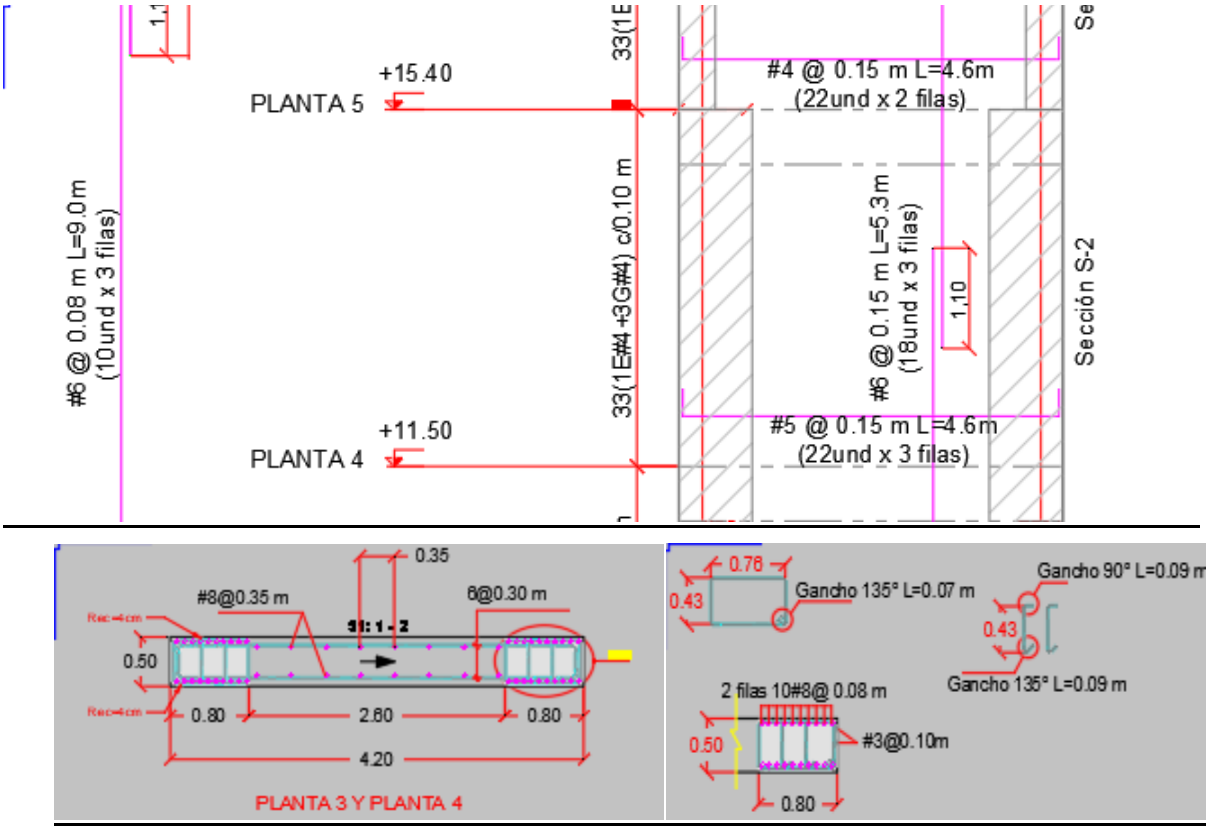


Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.

- PANTALLA PW9

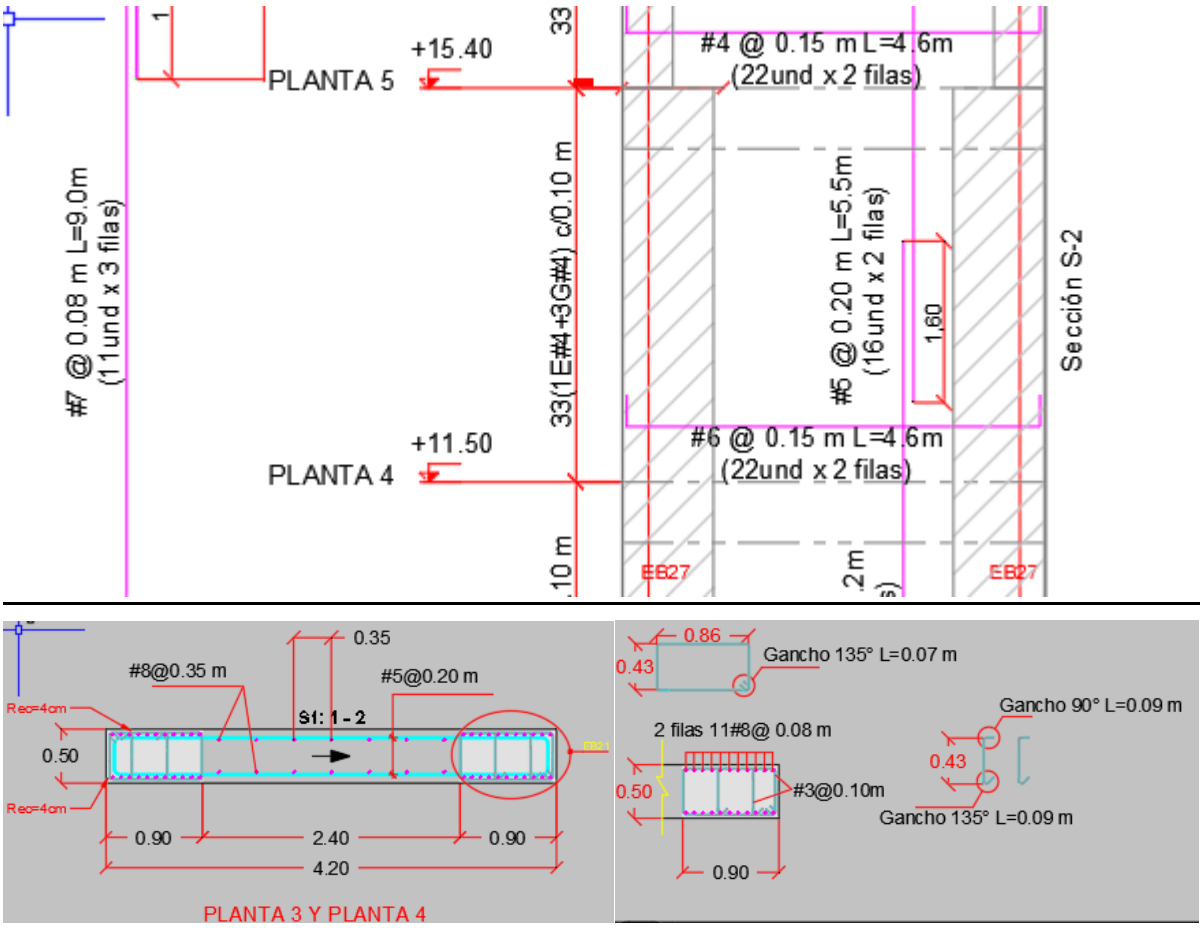
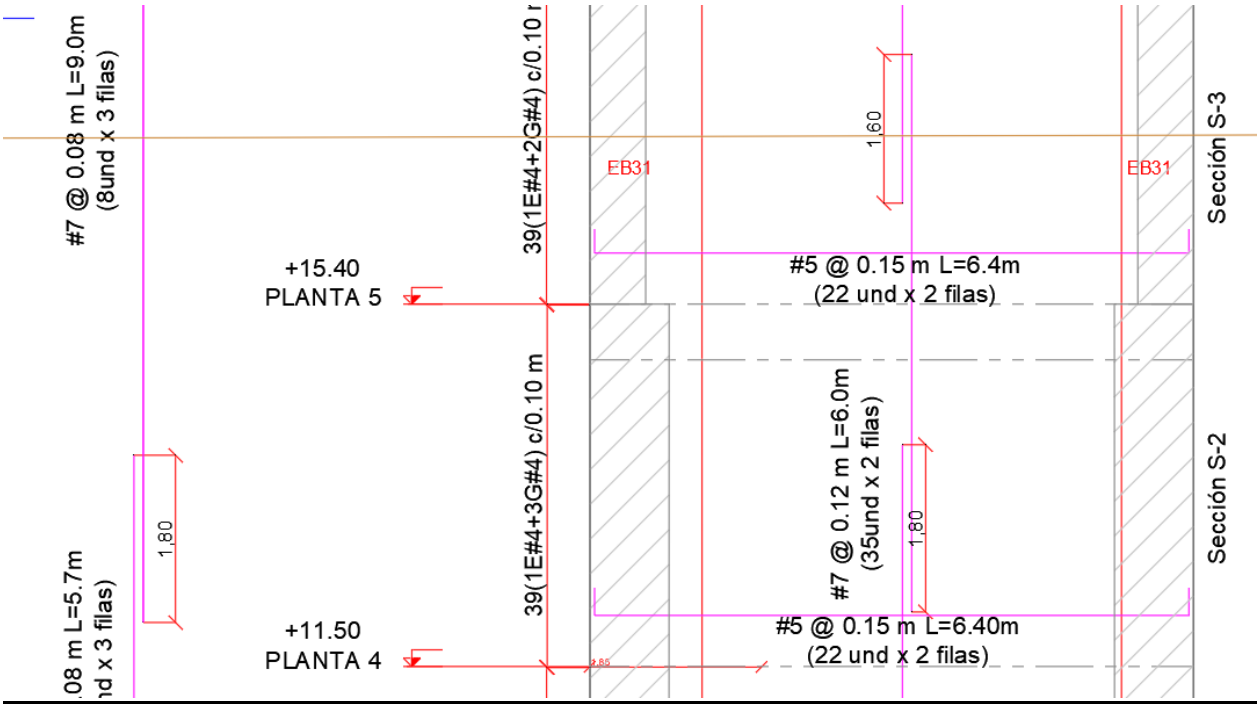


Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

- PANTALLA PW10




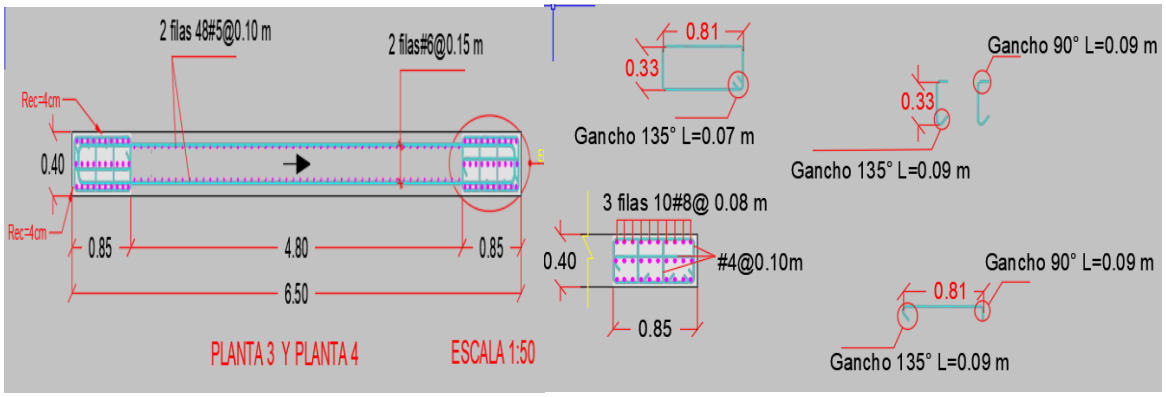


Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO 3 N +11.50

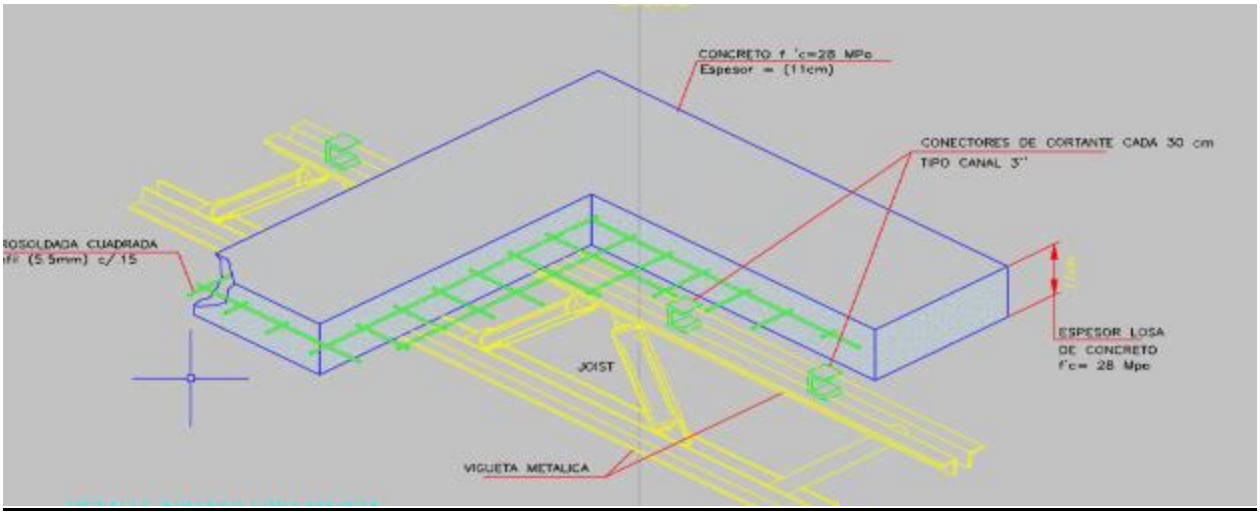

RESUMEN DE LA LOSA	
ITEM	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR DE LA LOSA (cm)	11.0
Malla de retracción para la placa:	Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 -Doble

Ilustración 17. Detalle losa de entrepiso

DETALLE VIGA TEC VT 01 ENTREPISO 3 N +11.50

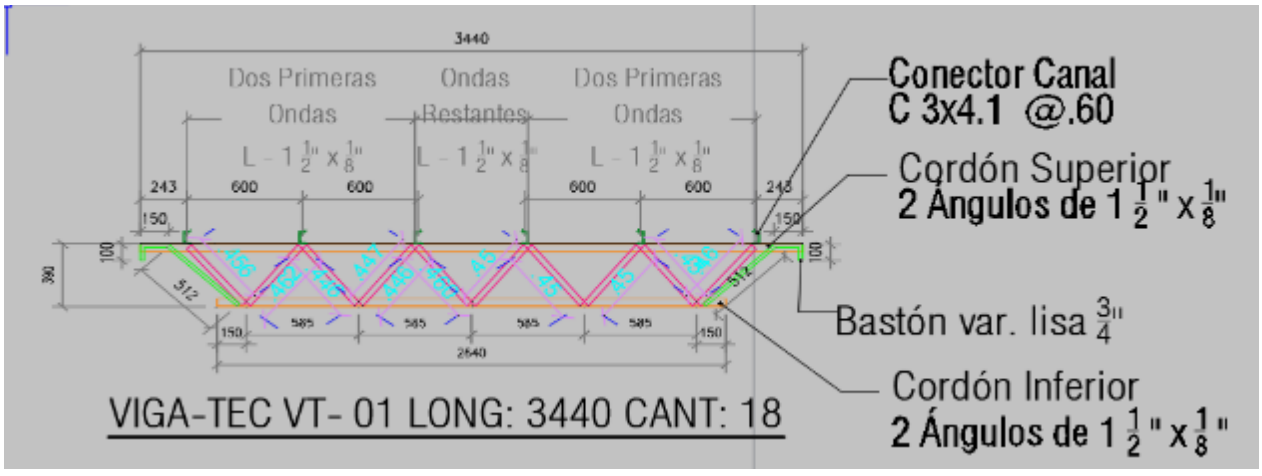


Ilustración 18. Detalle joist VT 01

DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO 3 N +11.50

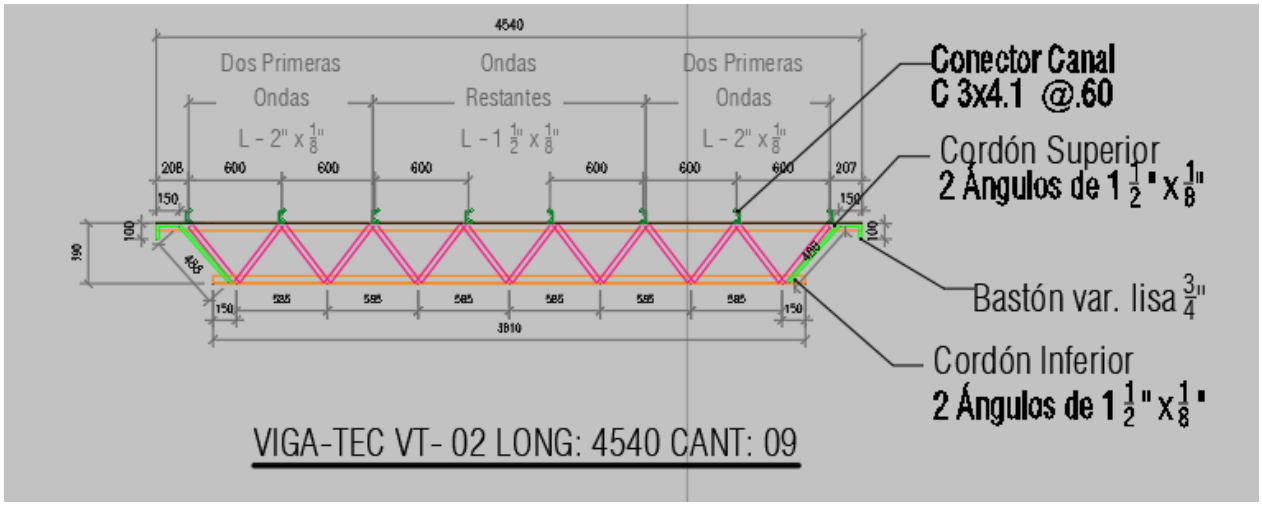


Ilustración 19. Detalle joist VT 02.

DETALLE VIGA TEC VT 03 ENTREPISO 3 N +11.50

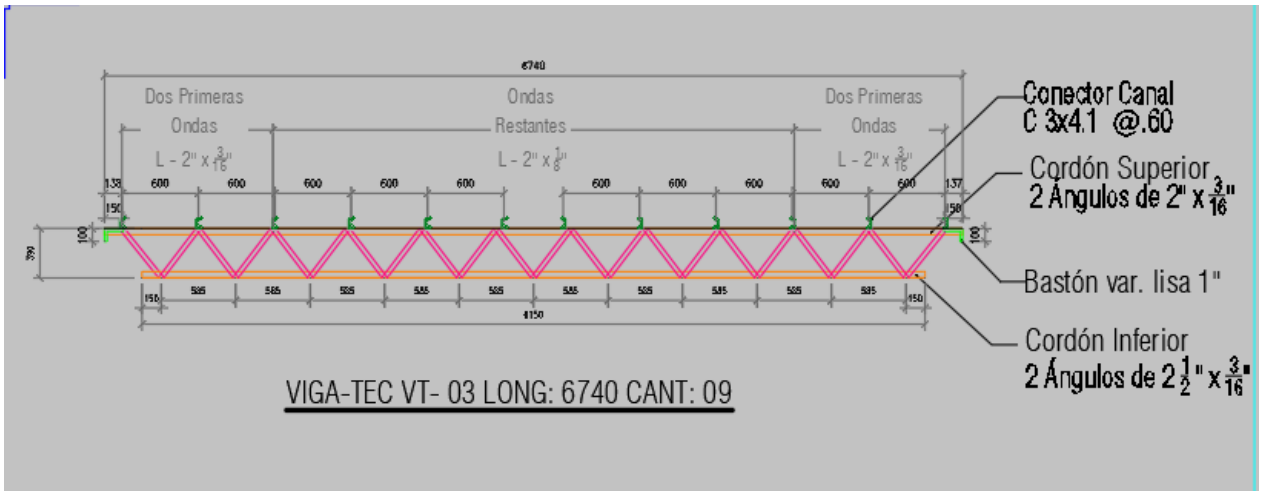


Ilustración 20. Detalle joist VT 03.

DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO 3 N +11.50

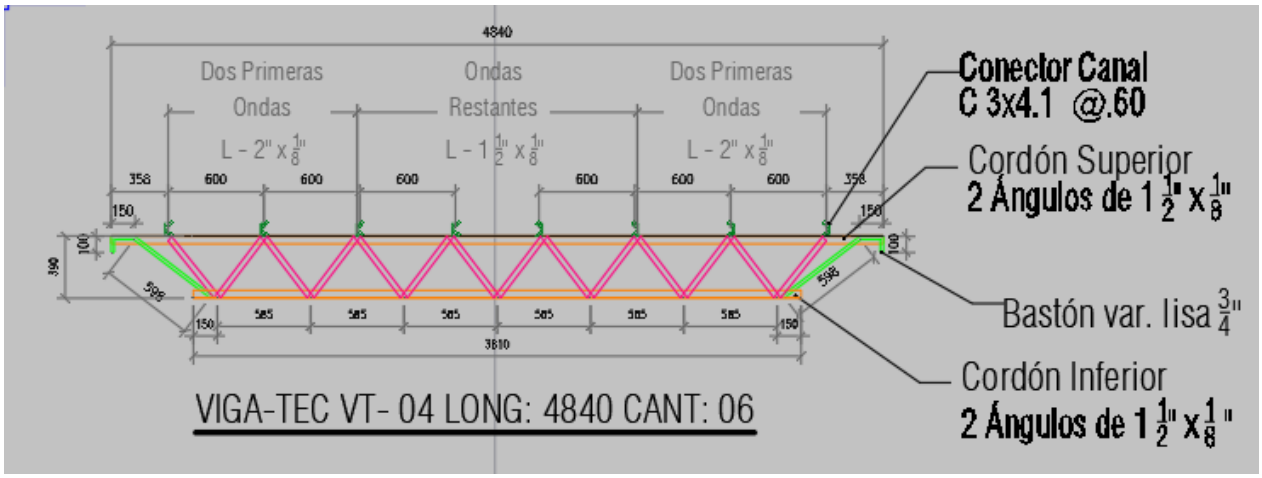


Ilustración 21. Detalle joist VT 04

DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO 3 N +11.50

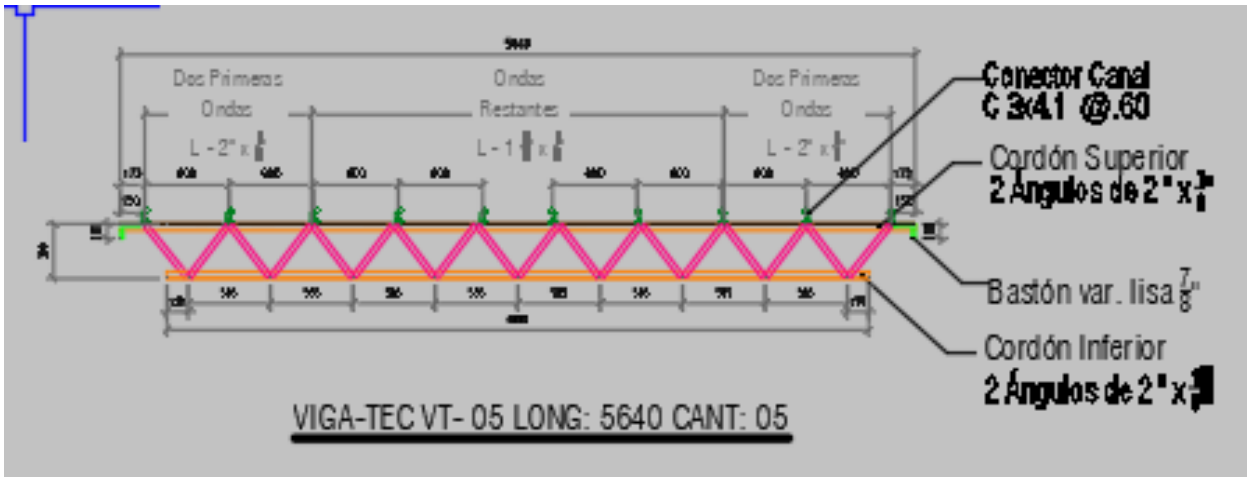


Ilustración 22. Detalle joist VT 05.

DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO 3 N +11.50

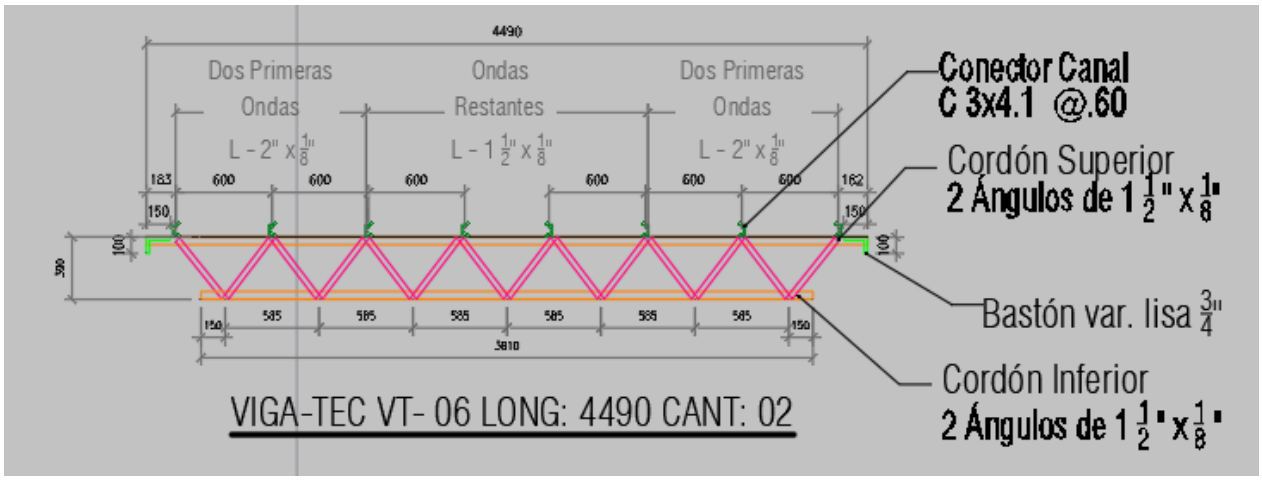


Ilustración 23. Detalle joist VT 06.

DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO 3 N +11.50

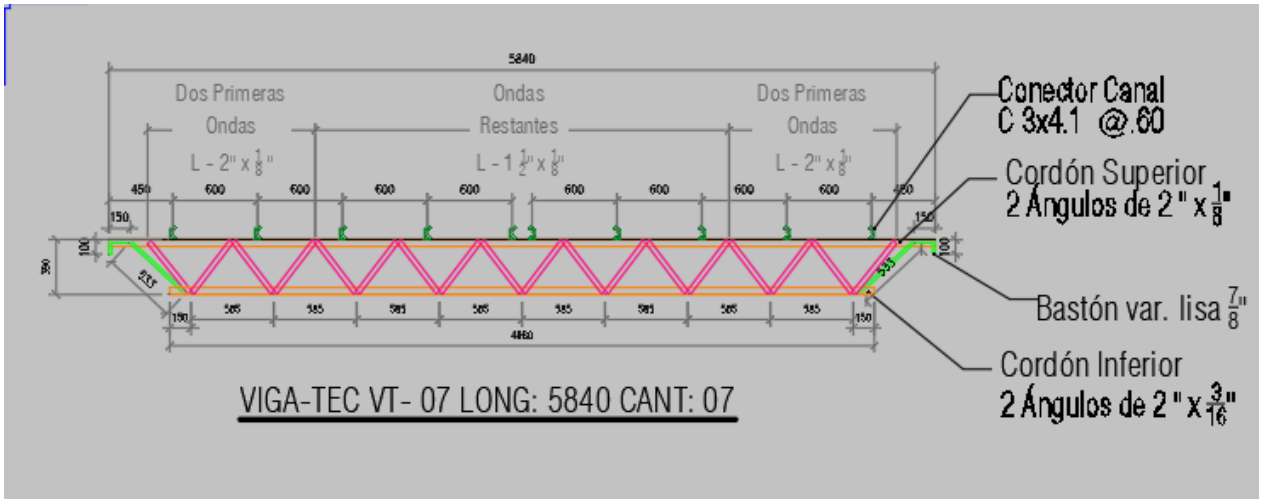


Ilustración 24. Detalle joist VT 07.

DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO 3 N +11.50

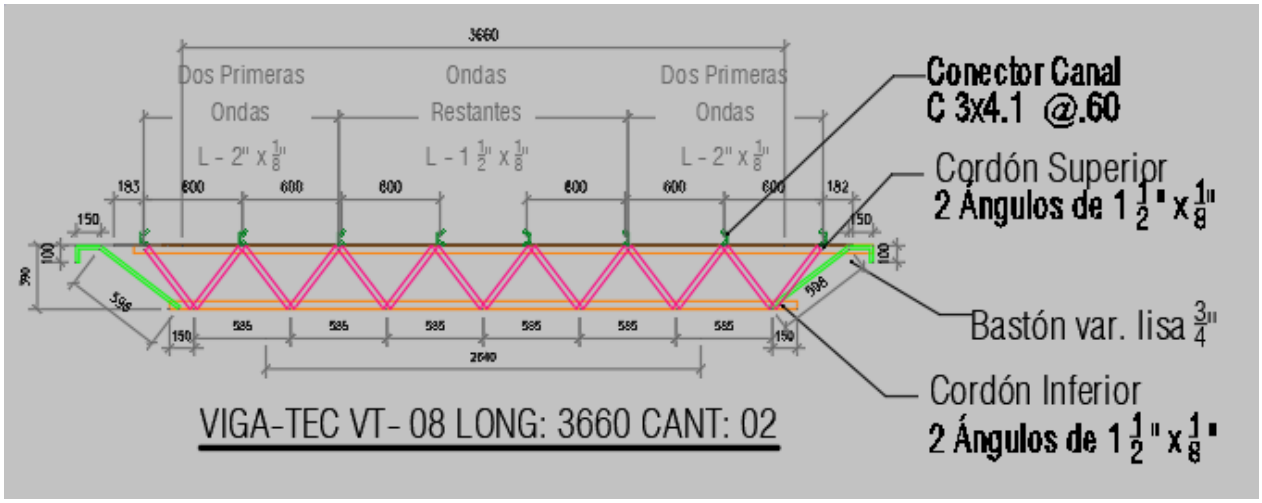


Ilustración 25. Detalle joist VT 08

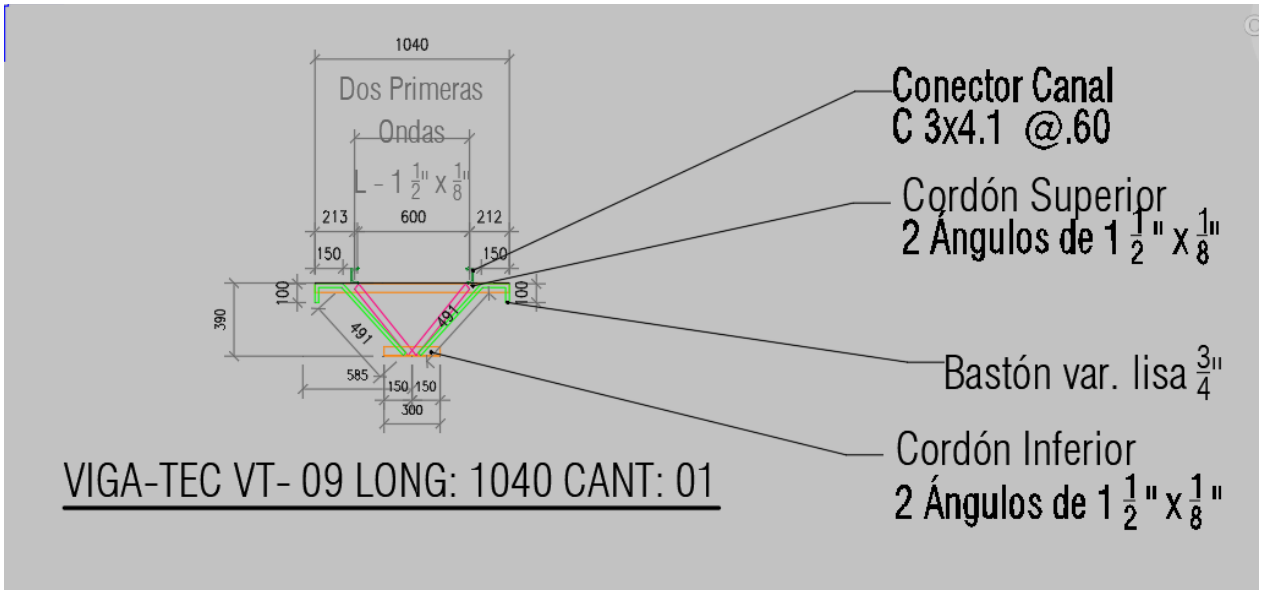


Ilustración 26. Detalle joist VT 09

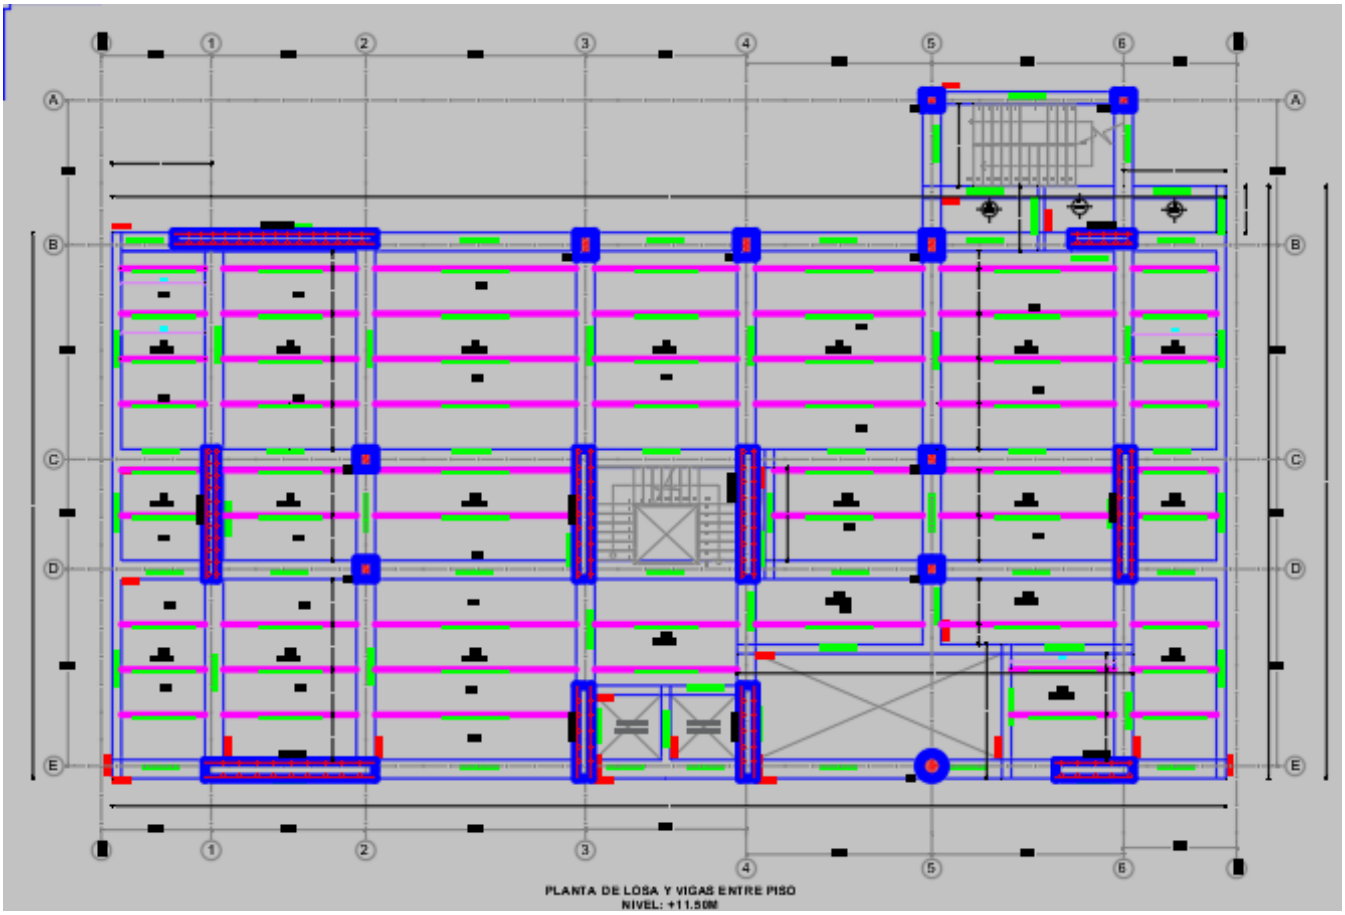
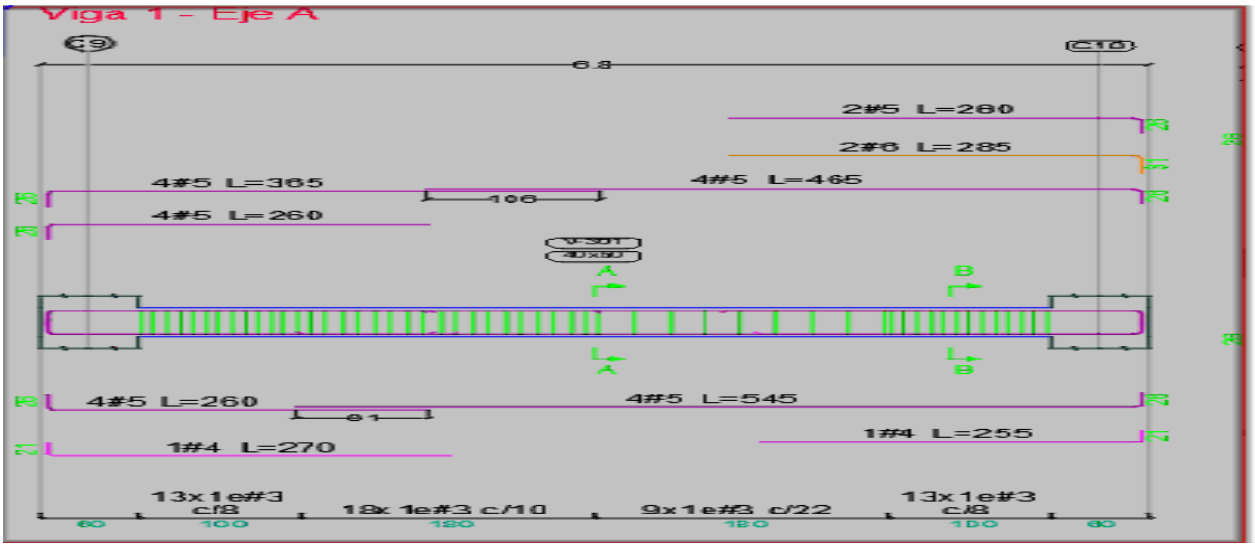


Ilustración 27. Disposición de vigas joist entrepiso 3 N+11.50

DETALLE VIGAS ENTREPISO N +15.60

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6) N +15.40



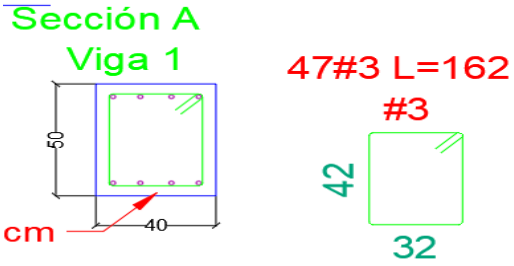
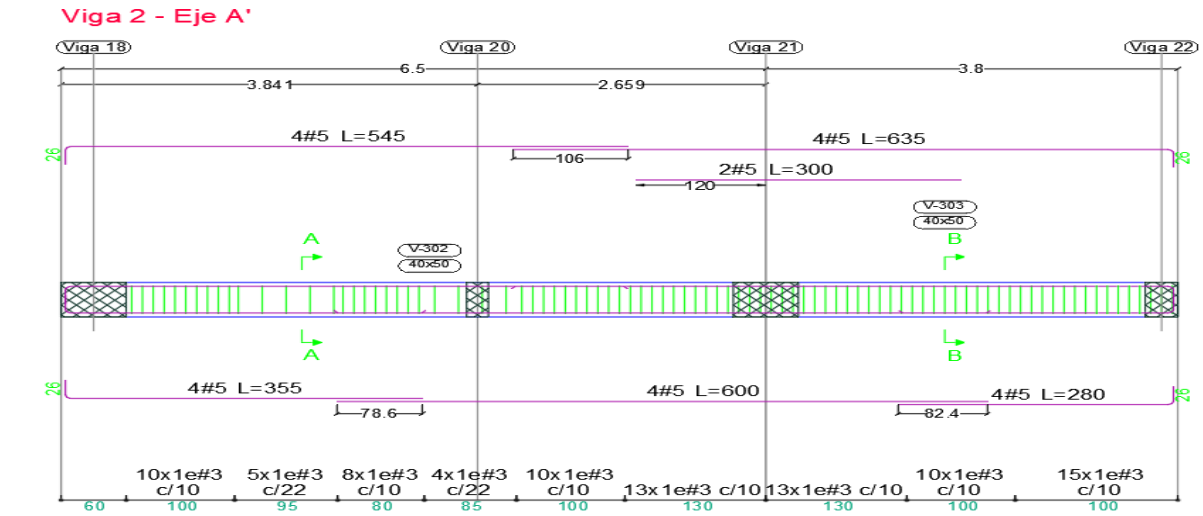


Ilustración 28. Disposición de refuerzo viga A N +11.50.

- DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6) N +15.40



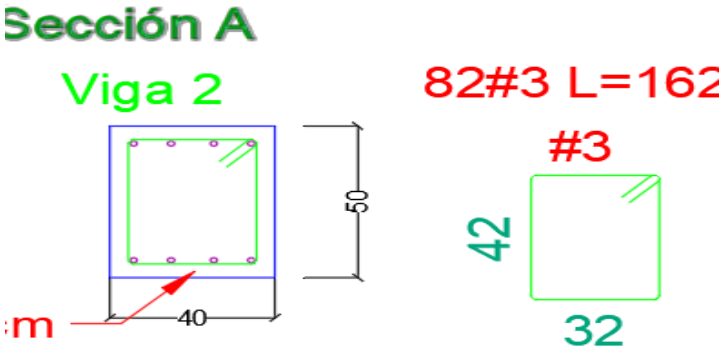
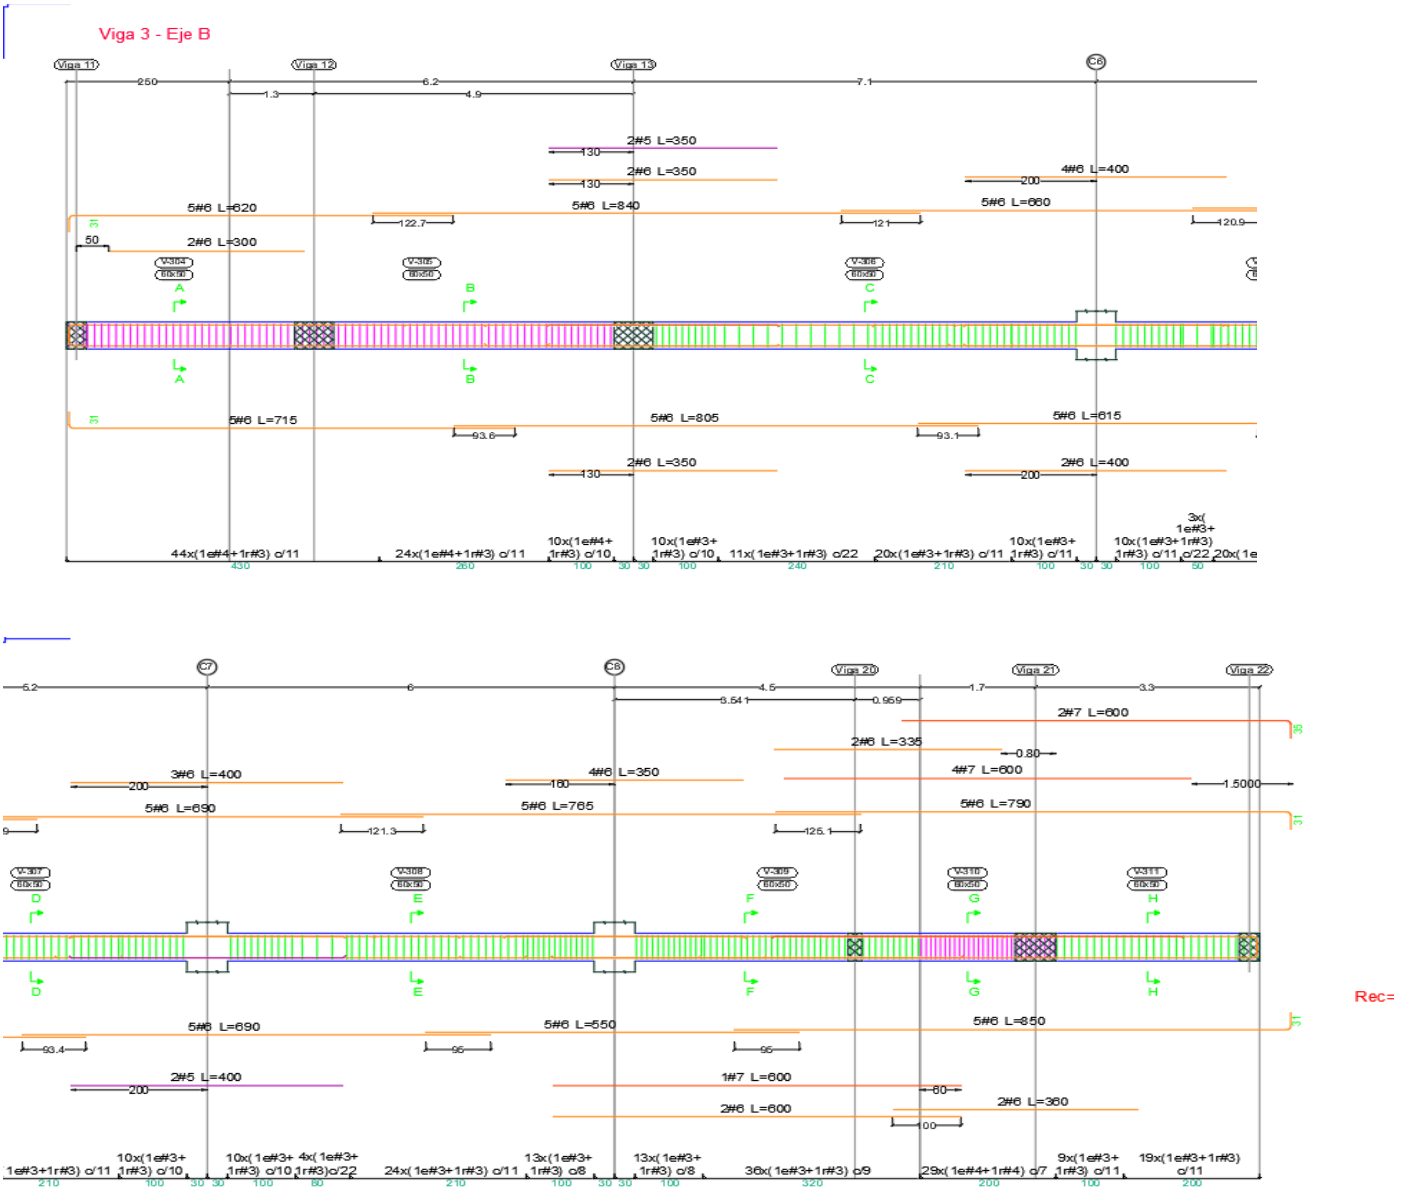


Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A' N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1′ – 6′) N +15.40



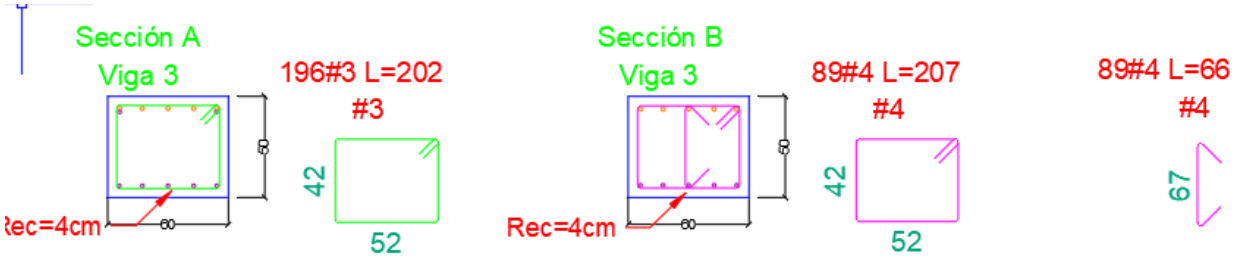
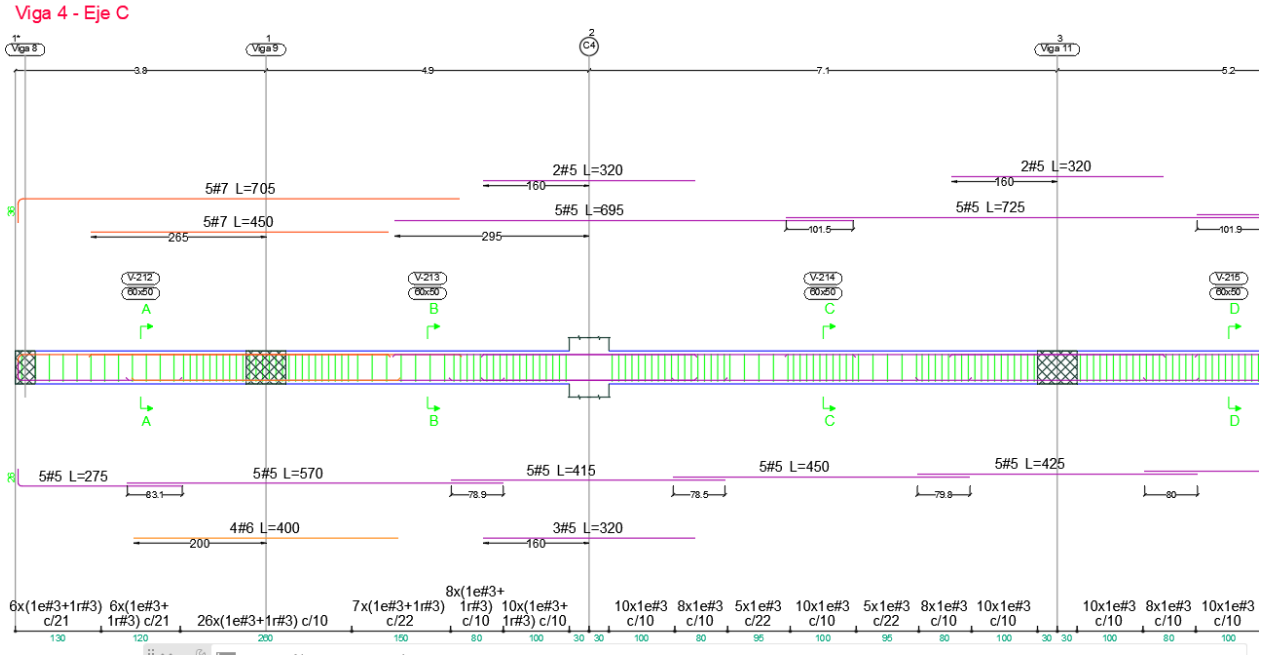


Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga B N +15.40.

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1′ -6′) N +15.40



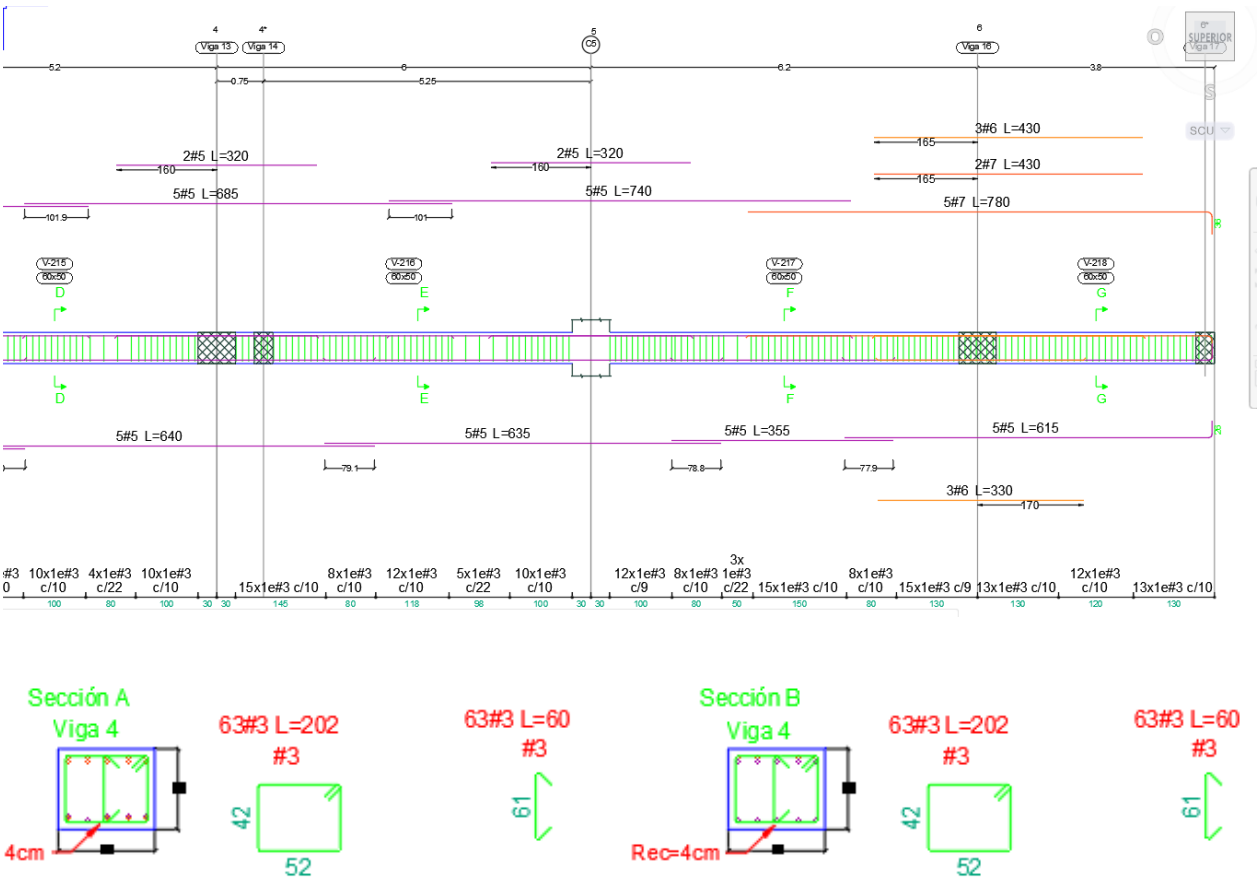
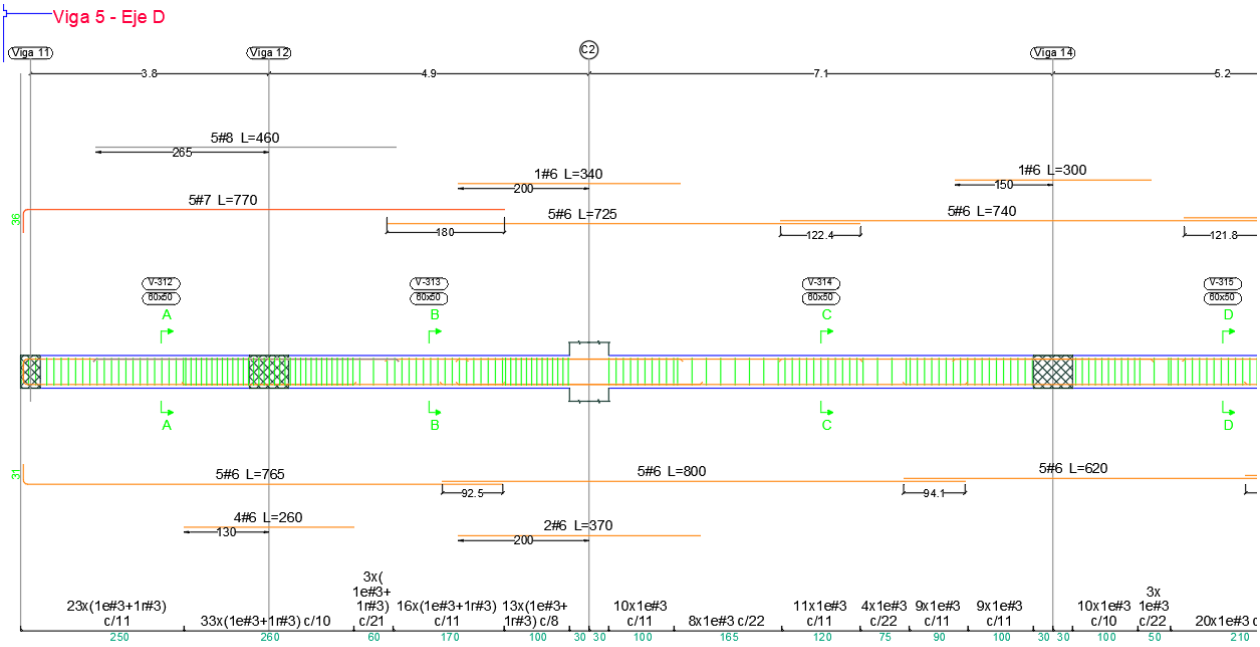
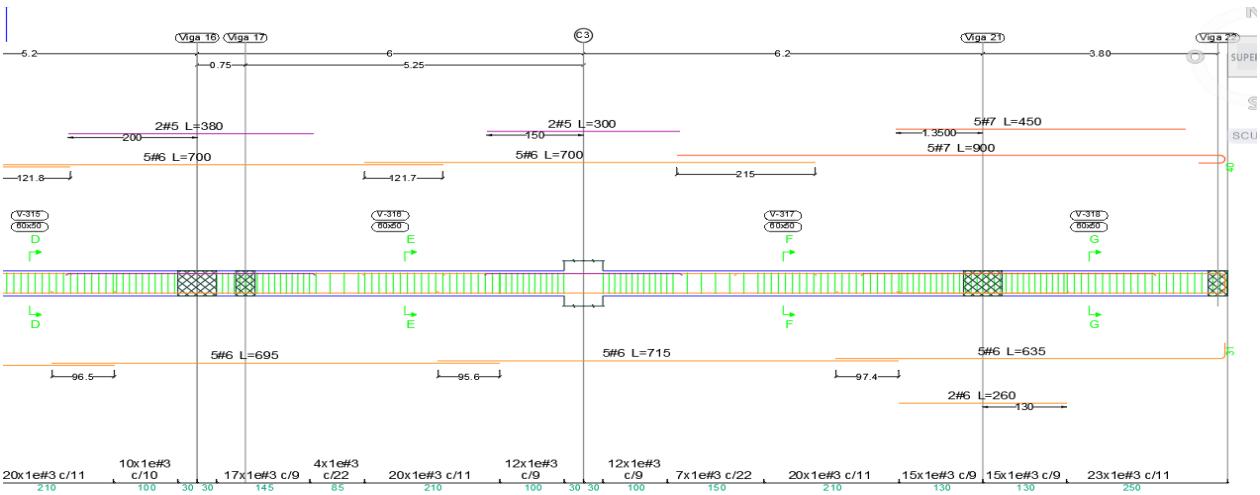


Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga C N +15.40.

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2) N +15.40





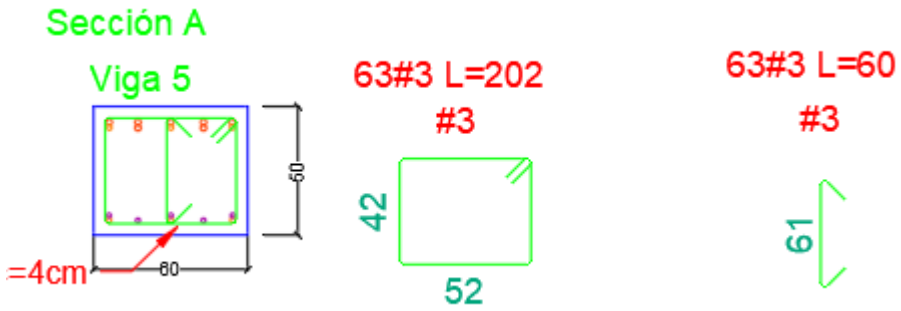
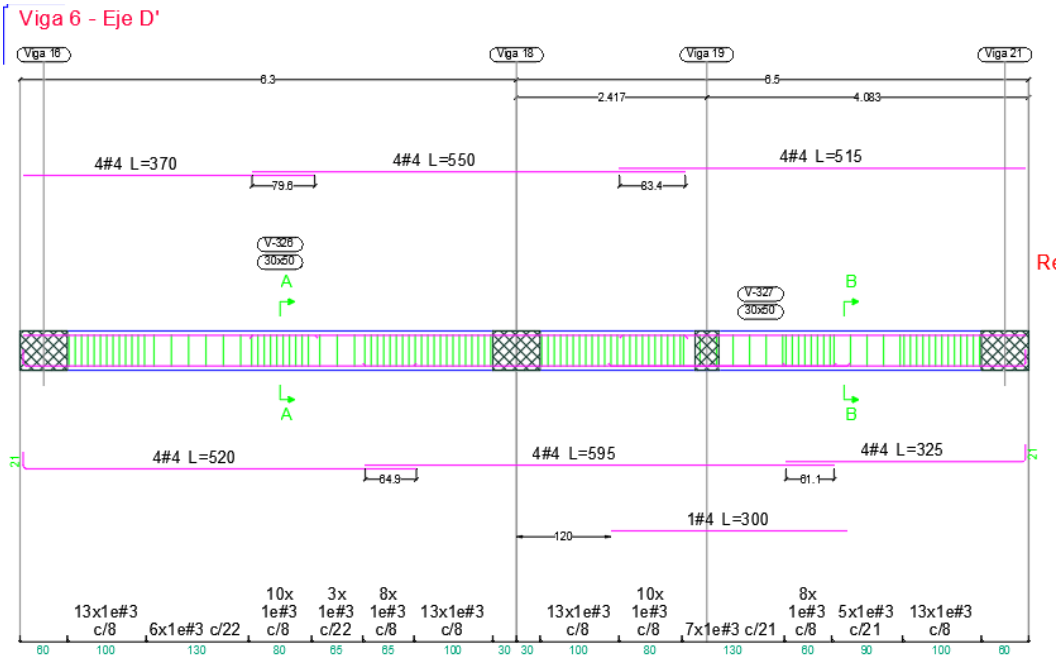


Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6') N +15.40



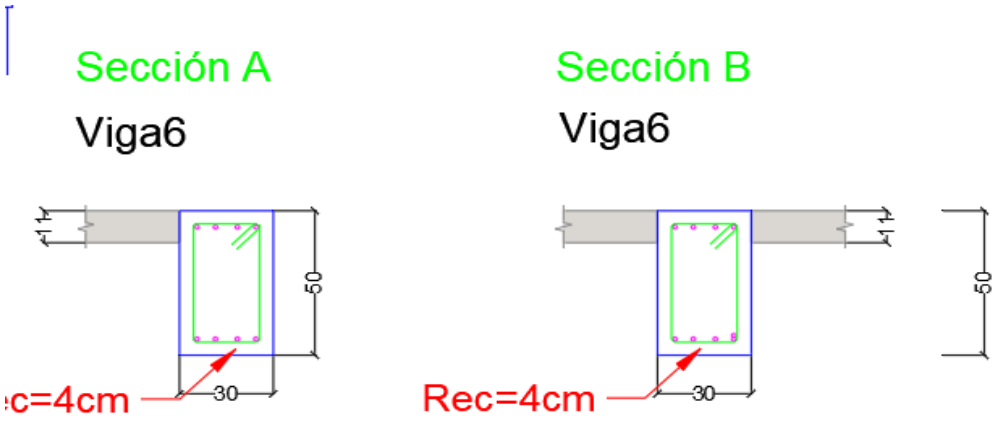
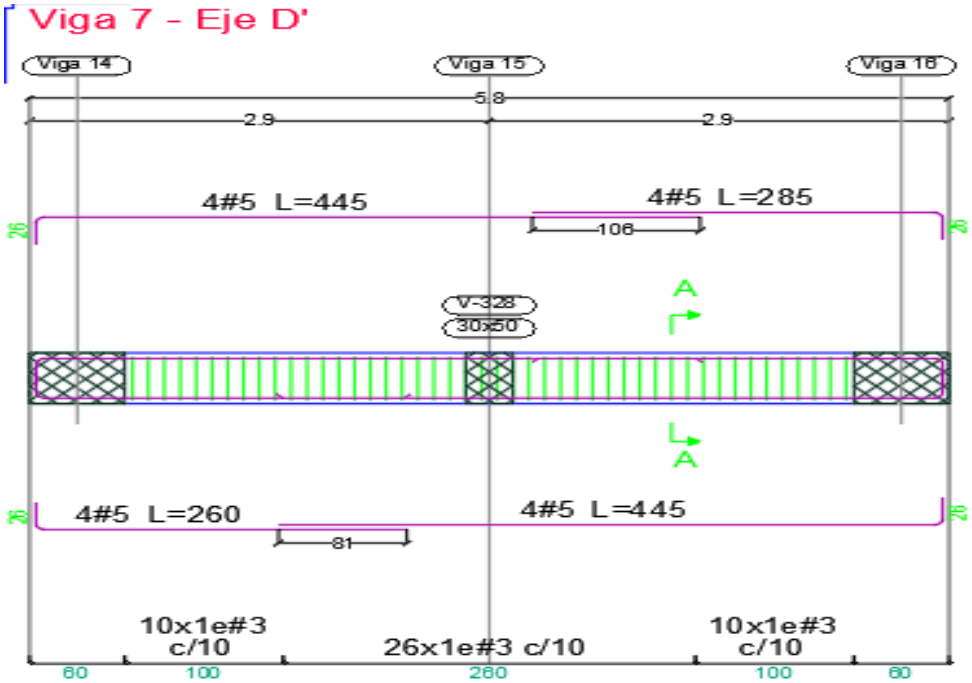


Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +15.40.

- DETALLE REFUERZO VIGA D* (4- 6) N +15.40



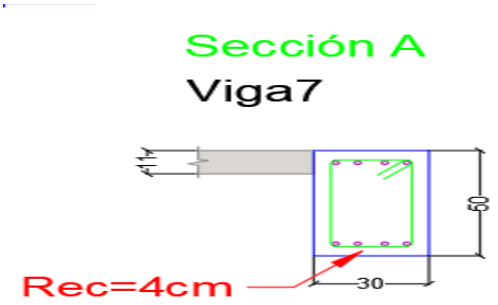
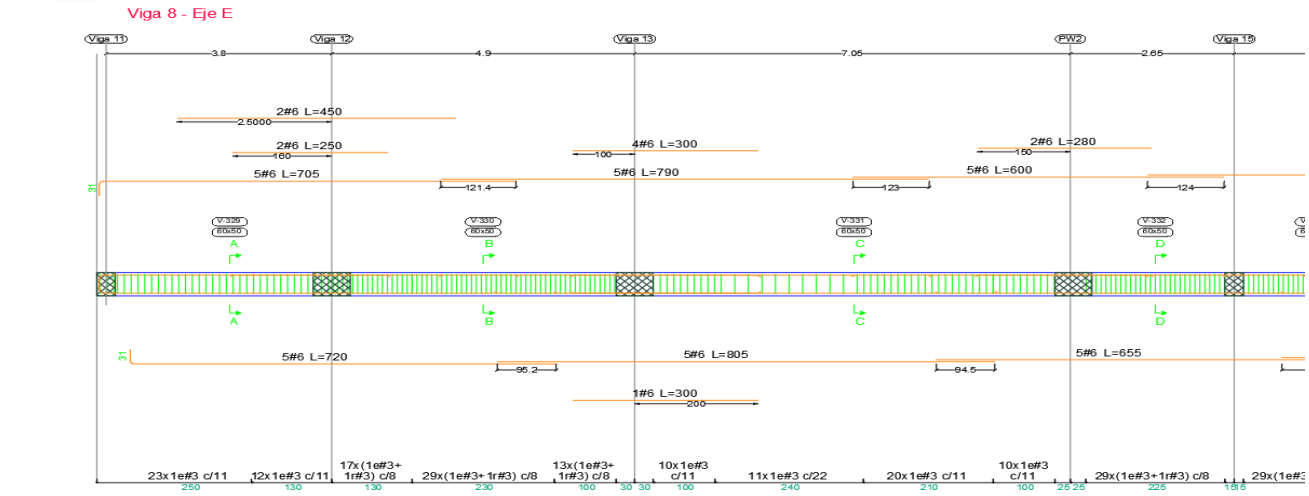


Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 1′ (B-E) N +15.40



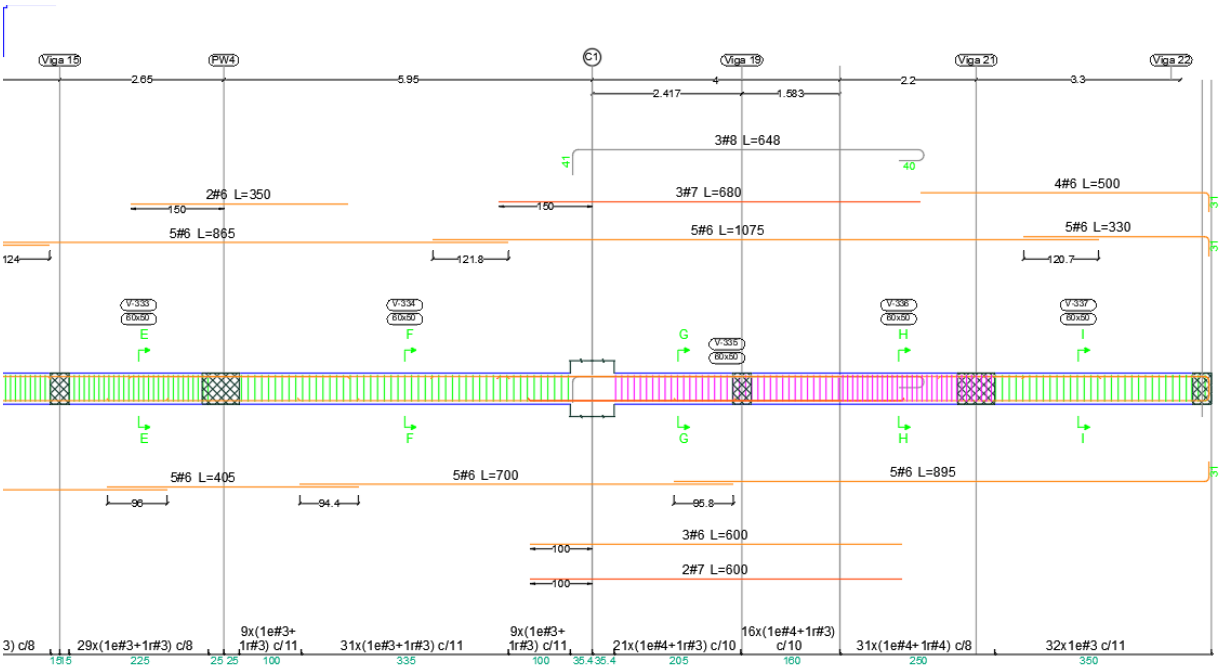




Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1-6*) N +15.40.*

- **DETALLE REFUERZO VIGA 1* (B-E) N +15.40**

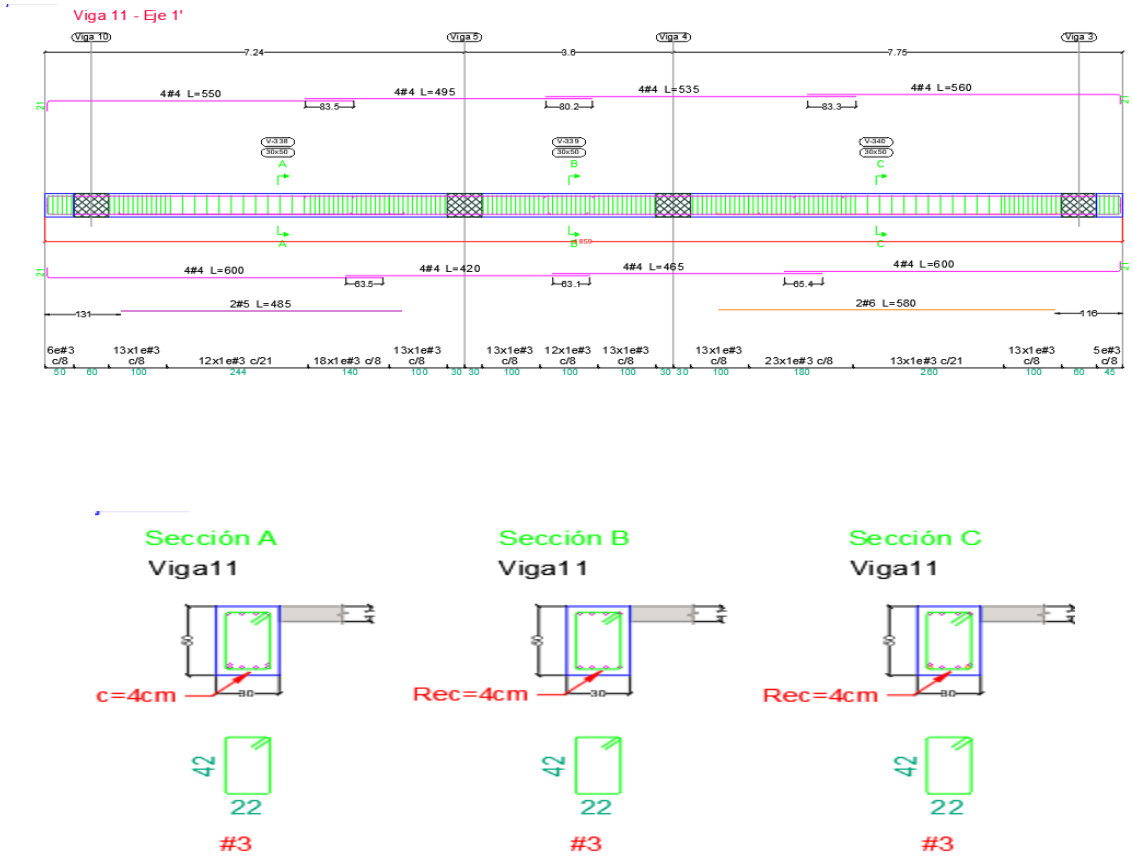


Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +15.40.*

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E) N +15.40

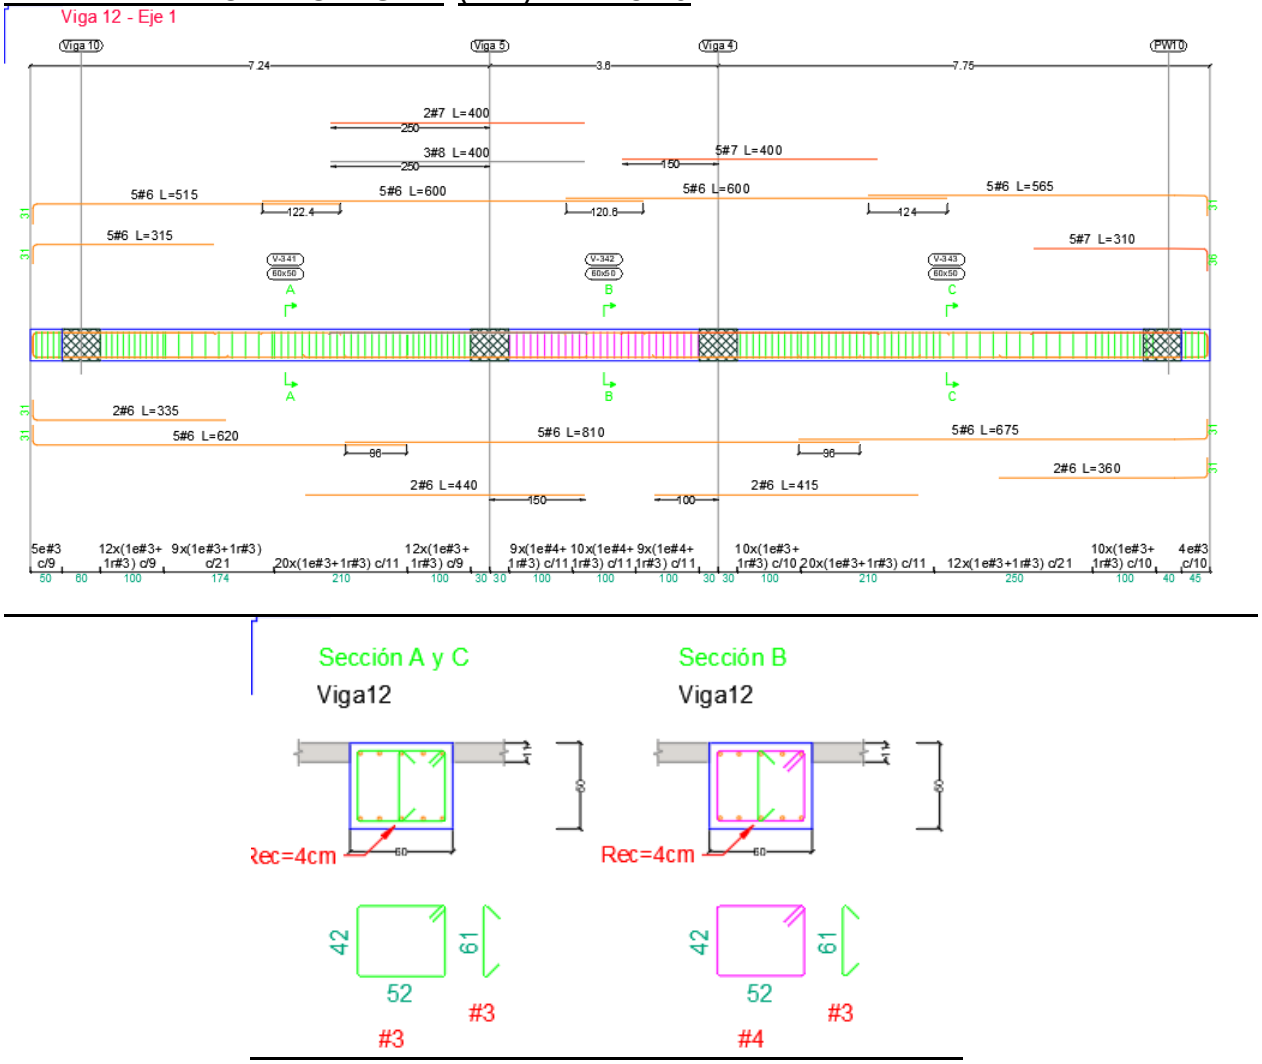


Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E) N +15.40

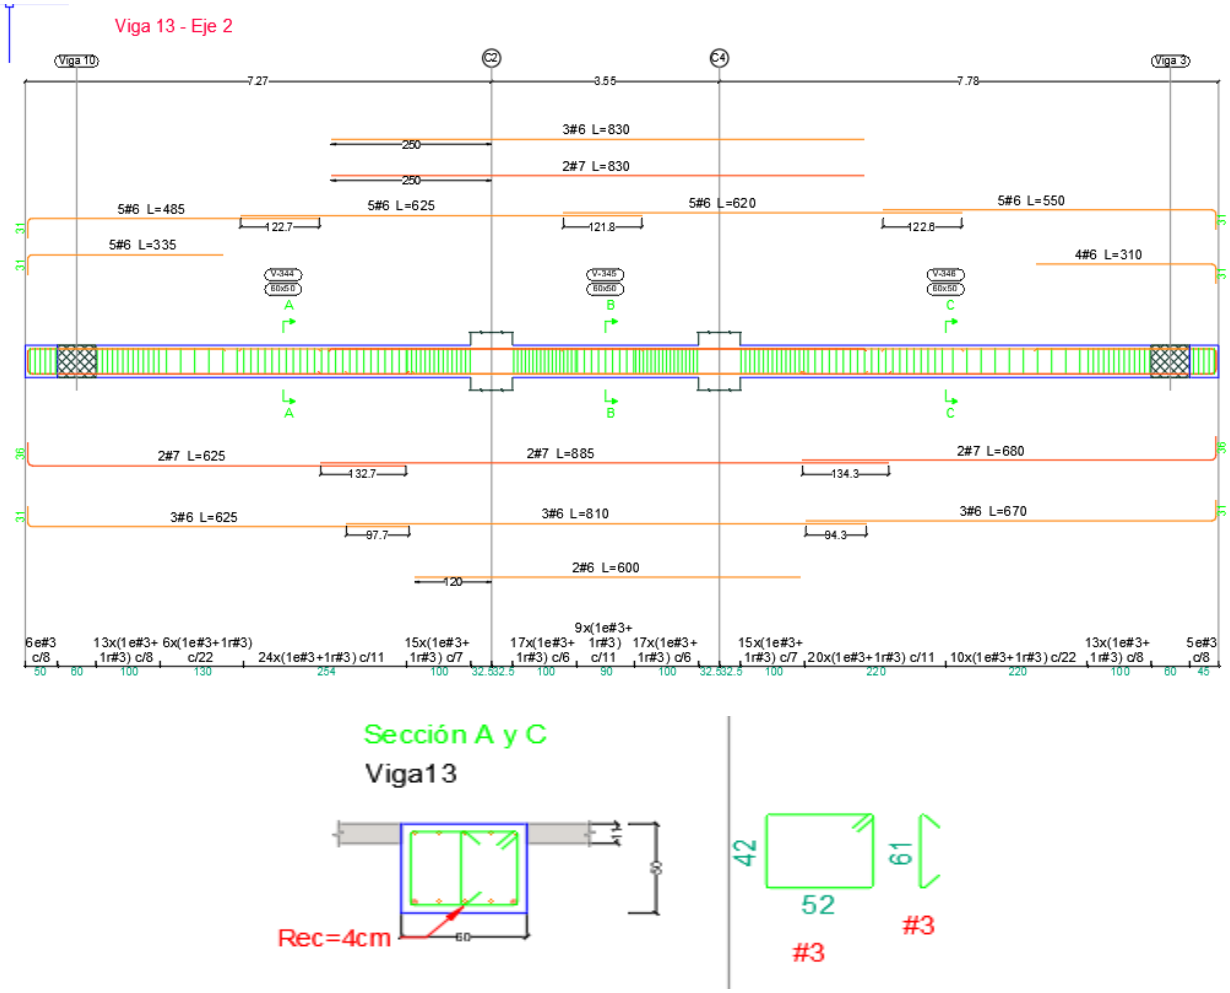


Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E) N +15.40

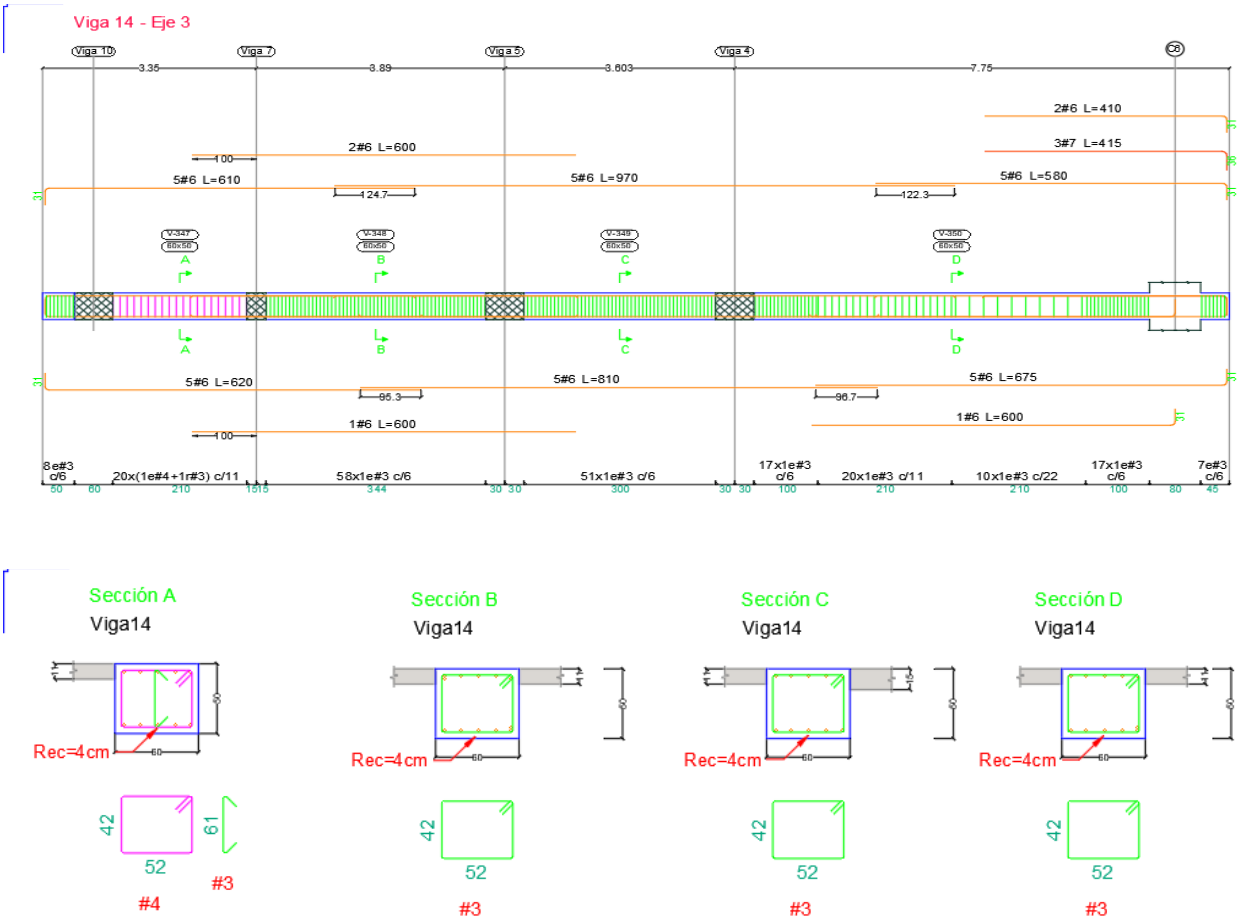


Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +15.40.

- DETALLE REFUERZO VIGA 3′ (B-E) N +15.40

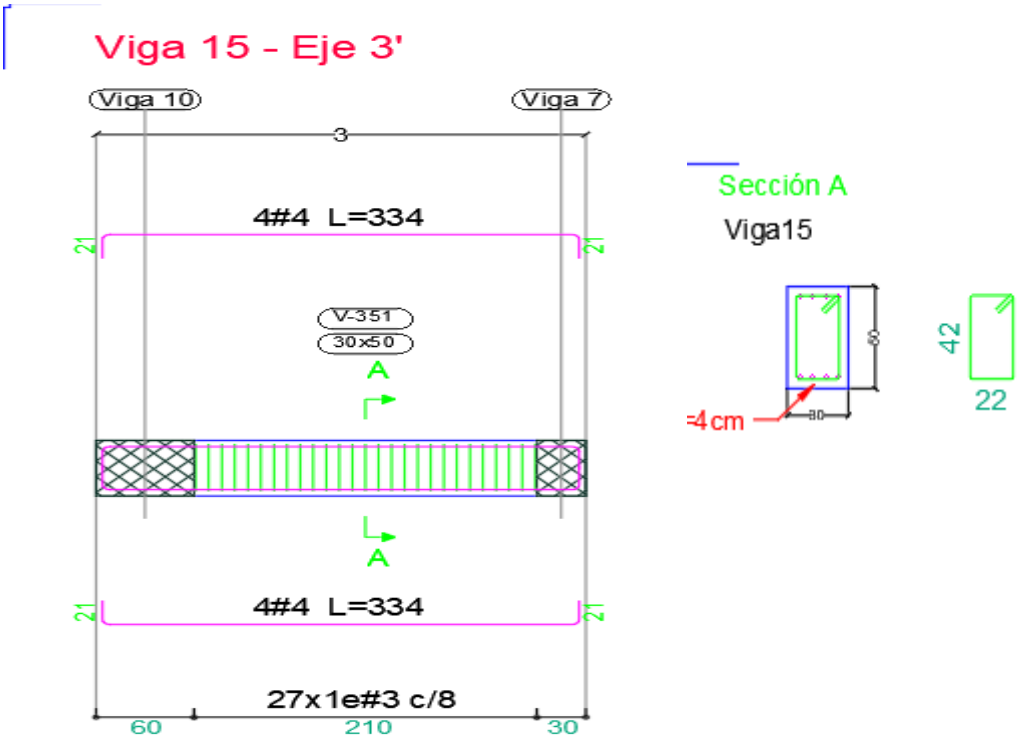


Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3′ (B-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E) N +15.40

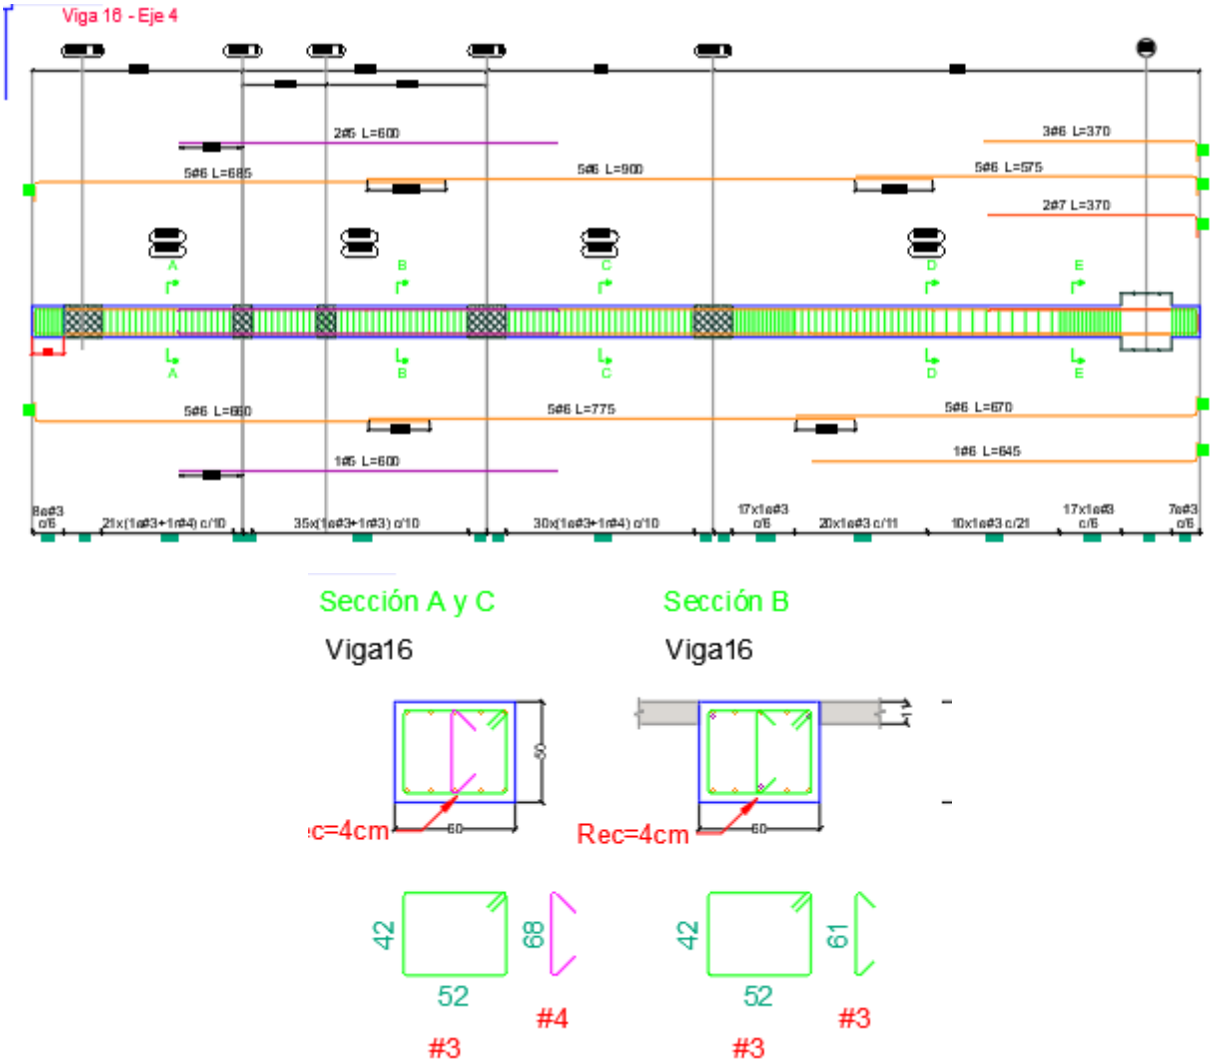


Ilustración 41.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +15.40

DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D)

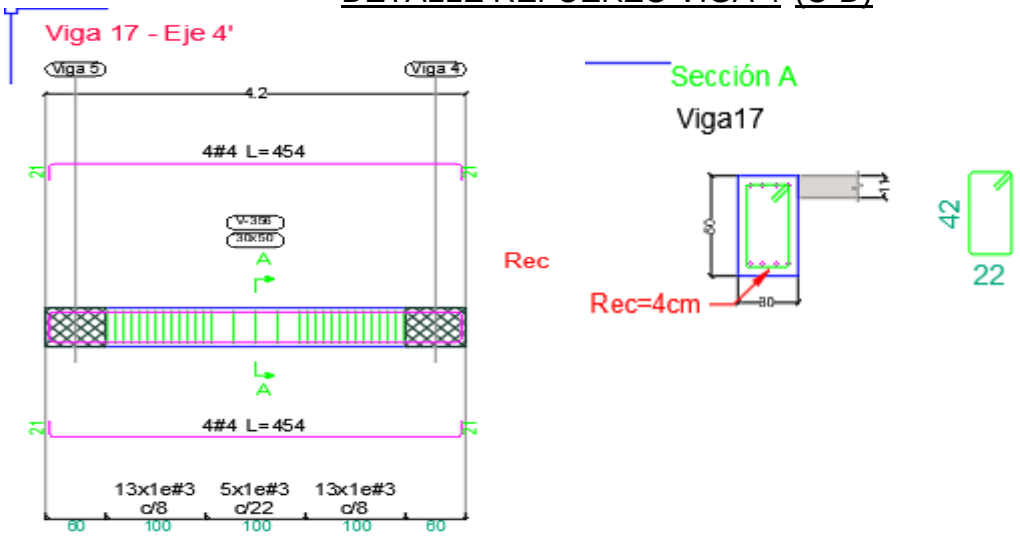
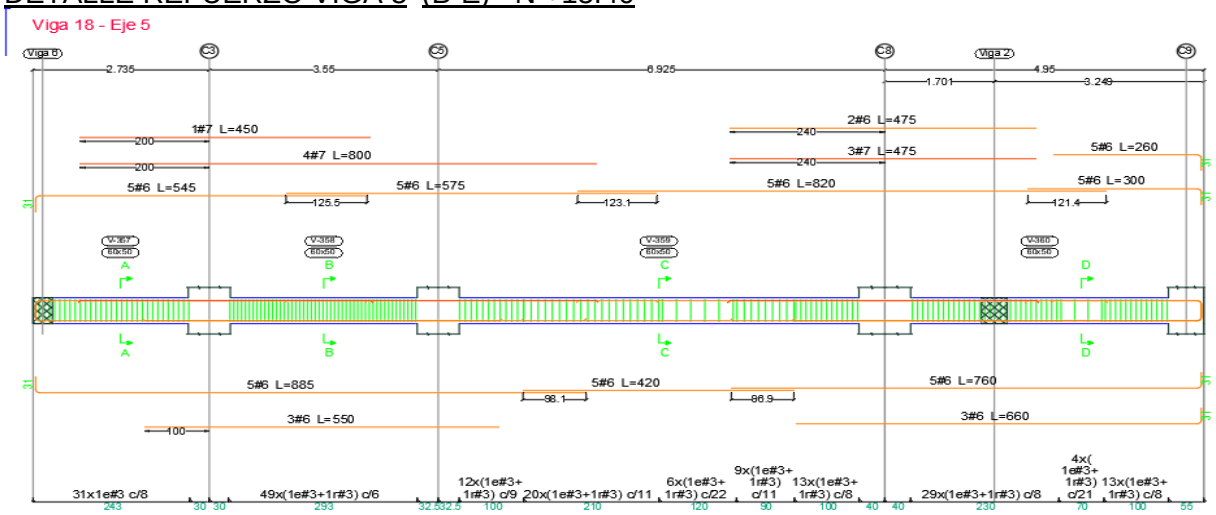


Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E) N +15.40



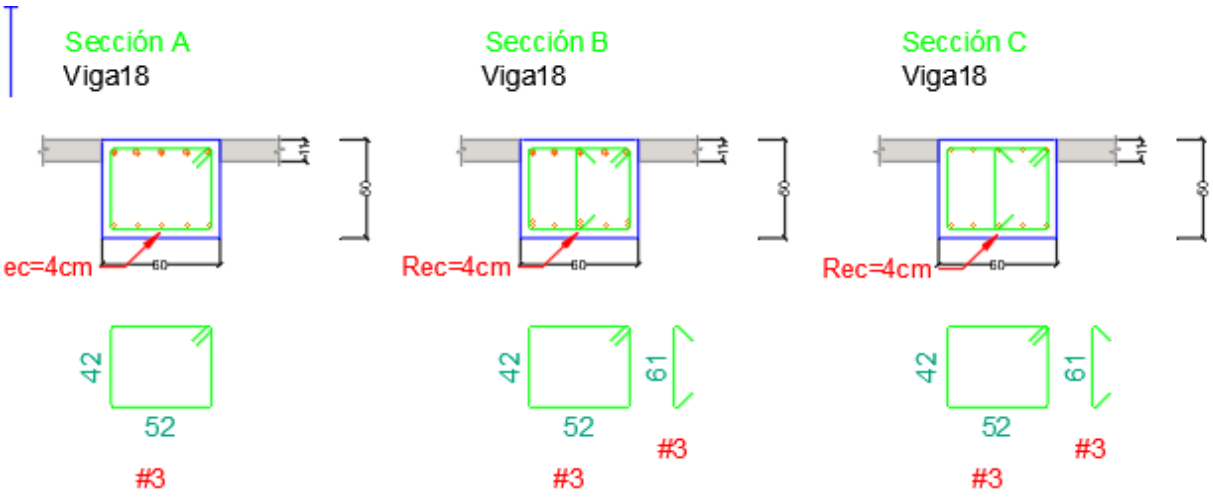


Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E) N +15.40

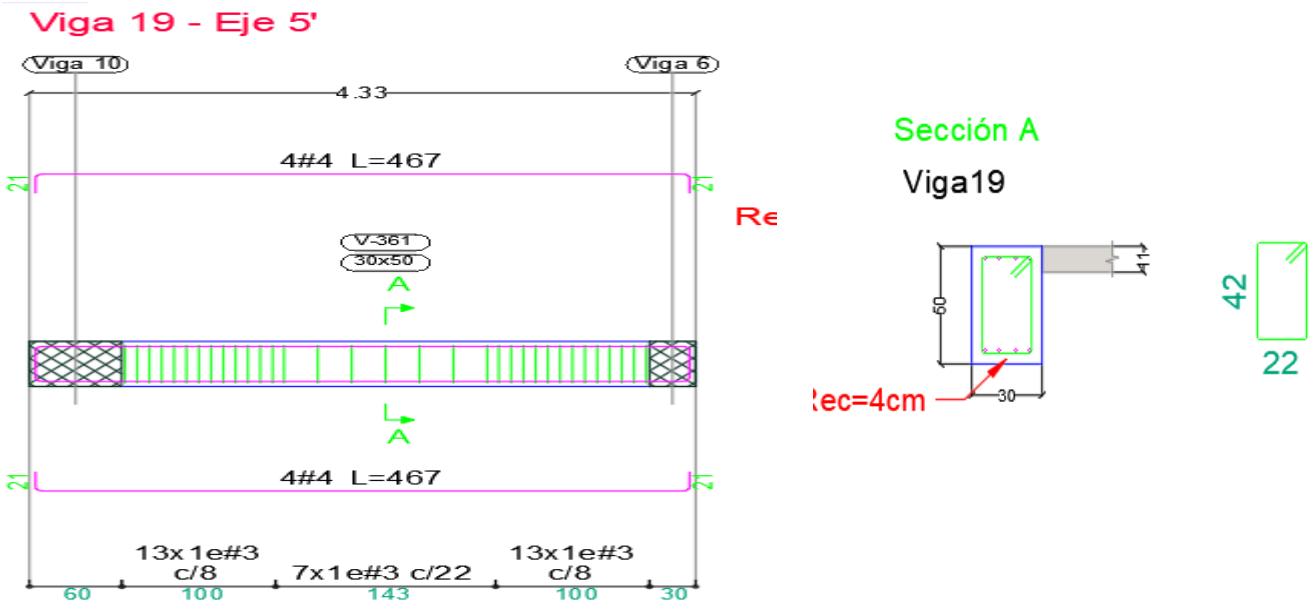


Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 5 ' (B-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 5" (B-E) N +15.40

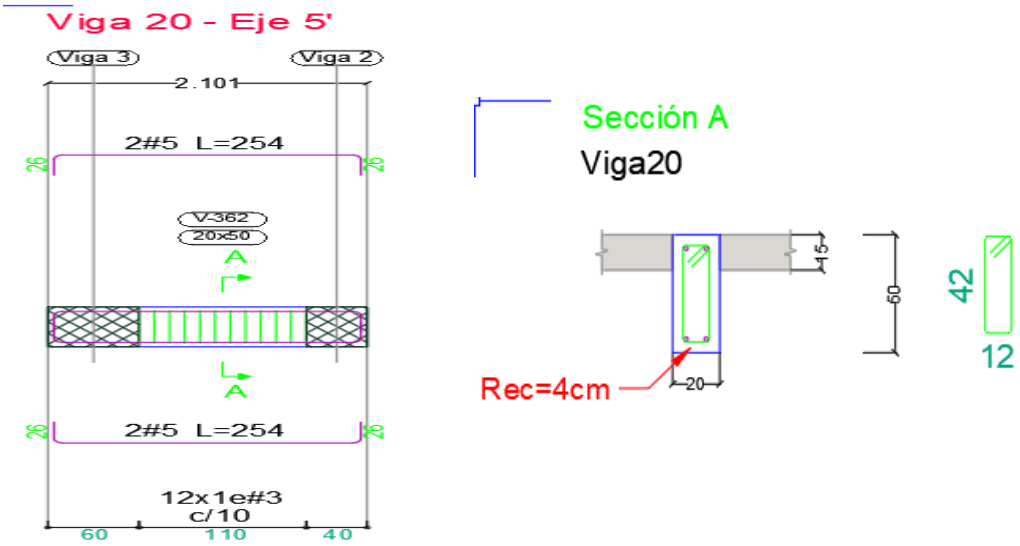
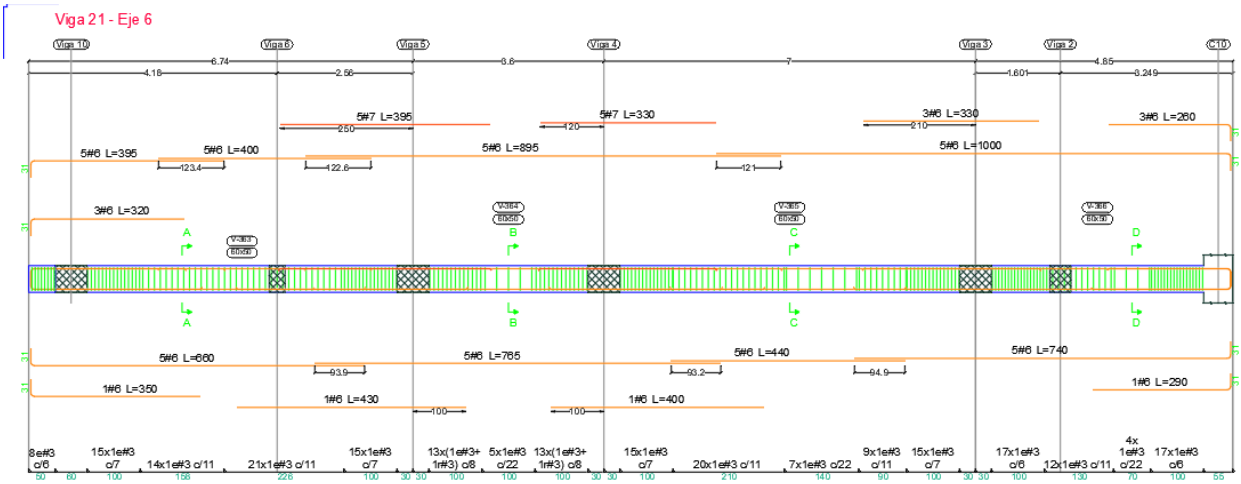


Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5' ' (B-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E) N +15.40



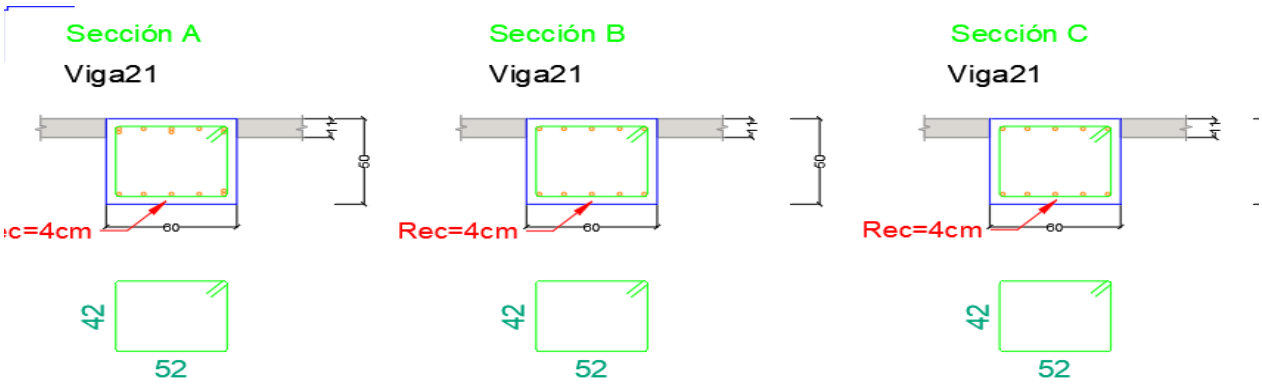
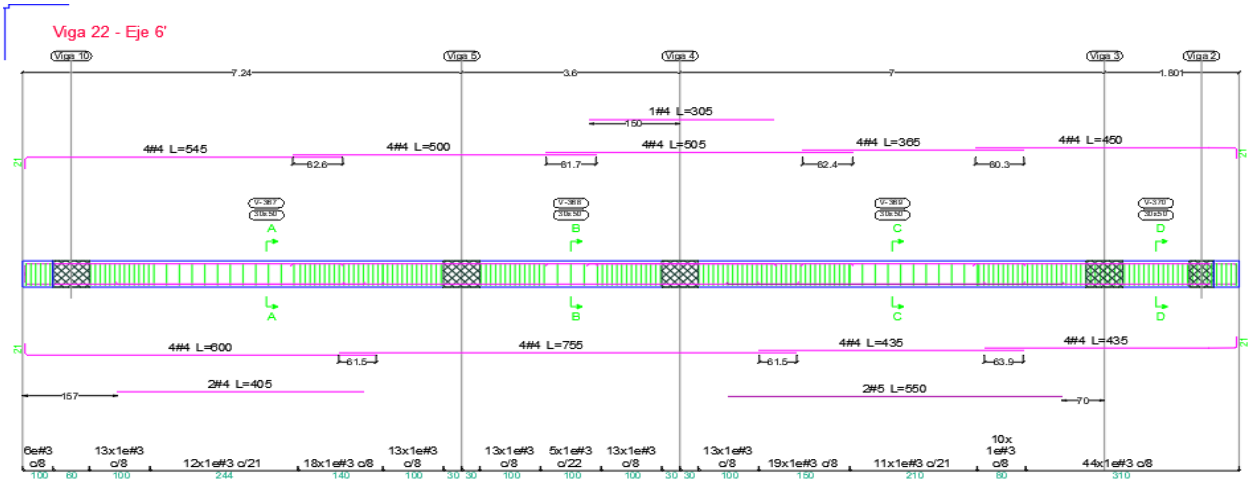


Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +15.40

- DETALLE REFUERZO VIGA 6′ (A-E) N +15.40



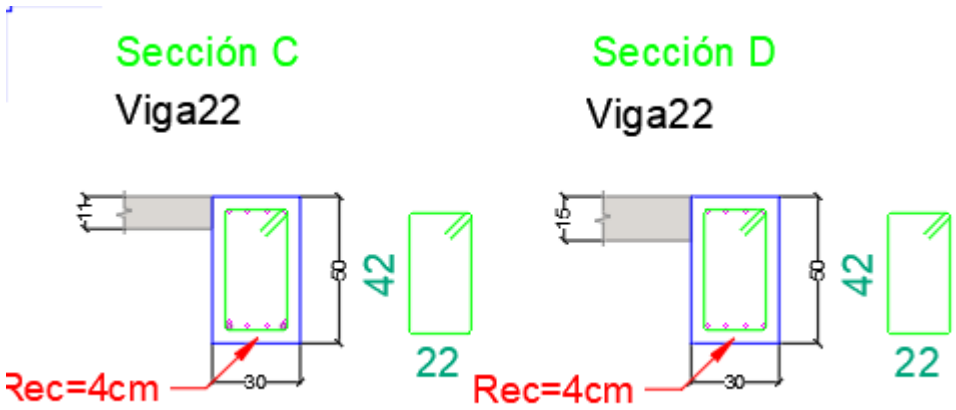


Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga 6' (A-E) N +15.40

ACERO ESTRUCTURAS

REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 2 filas, acero transversal de varilla No 6 espaciado .20 mts dispuesto en dos filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y acero transversal de varilla N°4 dispuesto en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.
- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°5 dispuestas en 2 filas,

refuerzo transversal en varilla No 5 espaciados 0.25 mts en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.25 mts, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 7 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas con espaciamiento 0.15 mts, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo transversal varilla No 6 en 2 filas espaciados 0.15 mts, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varillas No 6 en 3 filas espaciadas 0.12 mt, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1¨ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +15.40

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5 y 6, en la parte inferior varilla No 5 y 6, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.<

REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+7.60 A N +15.40

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

- **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D, D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

- **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso N +15.40, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 4

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 4.

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 4.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 4.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 4.

La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 4.

La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 4.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 4.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO









ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa PANTALLAS

Ilustración 47. Acero corrugado de pantallas









ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa COLUMNAS

Ilustración 48. Acero corrugado de columnas









ACERO REFUERZO Fy=420 Mpa VIGAS JOIST

Ilustración 49. Acero de refuerzo Vigas Joist










ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa VIGAS ENTREPISO

Ilustración 50. Acero corrugado vigas de entrepiso







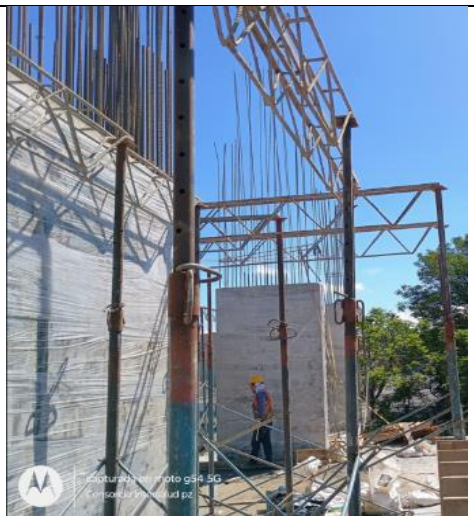

CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS

Ilustración 51. Fundición losa de cimentación










CONCRETO DE 28 Mpa PARA COLUMNAS

Ilustración 52.Concreto para columnas

- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de abril de 2025 del 23.34 frente un avance programado acumulado del 23.24, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025 es de 3.56% frente a un avance programado del 4.18%.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	$109,503,404	0.33%	$363.707.100	1.12%
30-09-2024	$858,324,856	2.16%	$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	$1.948.435.571	6.00%	$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	$2.636.884.000	8.12%	$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	$3.299.608.964	10.13%	$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	$4.715.214.428	14.52%	$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	$5.260.776.428	16.2%	$5.260.776.428	16.2%
25-3-2025	$6.189.530.785	19.06%	$6.423.343.071	19.78%
25-4-2025	$7.546.940.999	23.24%	$7.579.414.928	23.34%
AVANCE	$1.357.410.214	4.18%	$1.156.071.857	3.56%

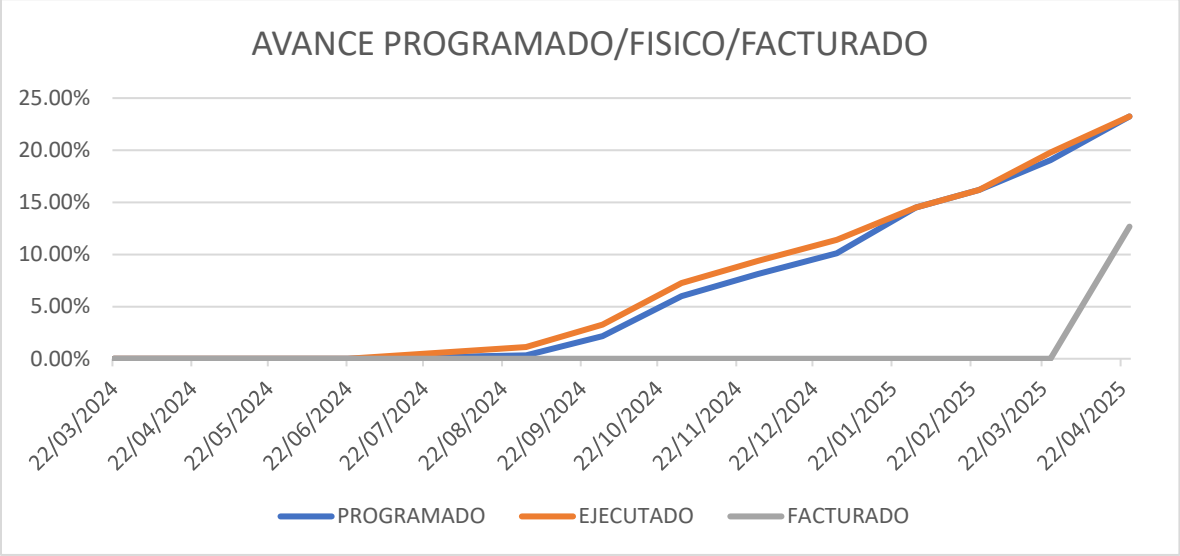

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de abril de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

AUTORIZACIONES DE PAGO

PROVEEDOR	VALOR/CONCEPTO	ITEM PLAN DE INVERSION
1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
2. FERRETERÍA GYJ	$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
3. URIEL PALTA AMA	$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo	Transporte
4. UBANER PEREZ	$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
5. PEDRO ROMO	$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo	Alquiler de equipos
6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN	$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo.	Materiales

9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
11. DIANA CAROLINA VIVAS	$133.865.096 m/cte	Mano de obra
12. SILOGISTICA	$103.240.000 m/cte	Transporte
13. LA ALIANZA GROUP SAS	$309.835.612 m/cte.	Mano de obra
14. UBANER PEREZ	$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo	Mano de obra
15. UBANER PEREZ	$30.000.000 m/cte	Mano de obra

Anexo 6. Autorización de desembolso UBANER PEREZ del 4 de ABRIL de 2025, pagado el 7 DE ABRIL DE 2025

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85,500,000.00	$ 2,073,600.00	0.02%	$ 83,426,400.00
2	TRANSPORTE	$ 105,400,000.00	$ 105,378,400.00	1.08%	$ 21,600.00

3	MATERIALES	$ 7,205,599,277.00	$ 7,134,454,460.00	73.23%	$ 71,144,817.00
4	MANO DE OBRA	$ 2,345,679,294.00	$ 2,315,679,293.00	23.77%	$ 30,000,001.00
	TOTAL	$ 9,742,178,571.00	$ 9,557,585,753.00	98.11%	$ 184,592,818.00

El contratista de obra hizo entrega del informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de marzo de 2025 mediante oficio EV-C358-23-0346-25 del 9 de abril del presente.

De lo cual se realizó el envío a la entidad del comprobante de los rendimientos financieros correspondientes al mes de marzo y abril por un valor de $23.690 y $19.952 m/cte respectivamente mediante oficio CIPZ-078-0414-2025.


Anexo 7. Comprobantes rendimientos financiero abril y marzo 2025

Cabe destacar que, al término del periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°1, con fecha de corte al 14 de marzo de 2025 por un valor de $4.113.300.273 correspondiente al 12.67% del valor contractual quedando un saldo por facturar de $28.360.628.296, se realiza una amortización del anticipo por un valor de $1.233.990.82, quedando pendiente por amortizar $8.508.188.489

CONTRATO DE OBRA 358-2023					
BALANCE CORTE 14-03-2025			**BALANCE DEL ANTICIPO:**		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 32,473,928,569	**VALOR ANTICIPO**		$9,742,178,571


VALOR CONTRATO ADICIONAL		-	**AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES**	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 32,473,928,569	**AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA**	$1,233,990,082	
VALOR FACTURADO ACUMULADO	$ 4,113,300,273		**SALDO POR AMORTIZAR**	$8,508,188,489	
SALDO POR FACTURAR	$ 28,360,628,296				
SUMAS IGUALES	**$ 32,473,928,569**	**$ 32,473,928,569**	**SUMAS IGUALES**	**$9,742,178,571**	**$9,742,178,571**

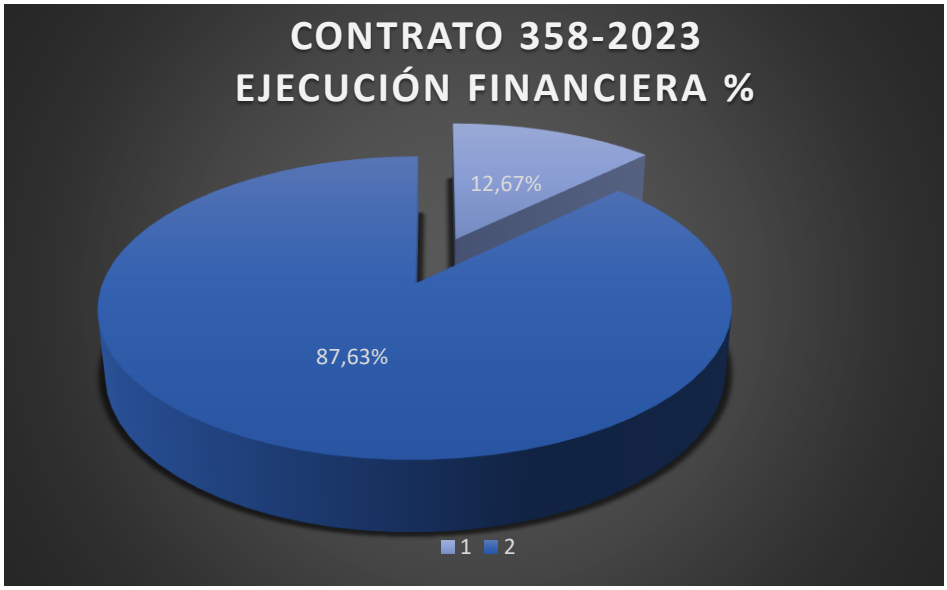





• **Desembolsado:**	**$ 9,742,178,571.00 m/cte**

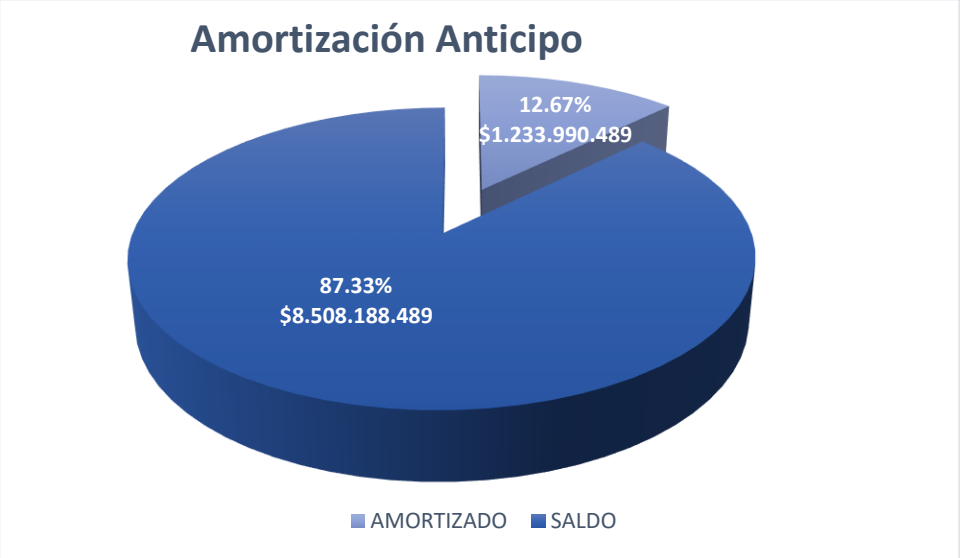

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024					
BALANCE CORTE 14-03-2025			**BALANCE DEL ANTICIPO:**		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 1.280.412.030	VALOR ANTICIPO		$0.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 1.280.412.030	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	$0.00	
VALOR FACTURADO ACUMULADO	$ 162.183.000		SALDO POR AMORTIZAR	$0.00	
SALDO POR FACTURAR	$1.118.229.030				
SUMAS IGUALES	**$ 1.280.412.030**	**$ 1.280.412.030**	**SUMAS IGUALES**	**$0.00**	**$0.00**



4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

PROGRAMA 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Aunque la siembra de árboles fue realizada al 100%, se encuentra pendiente el mantenimiento a las plántulas sembradas. Tienen como fecha programada de ejecución el mes de abril, de acuerdo con el informe anterior. No se ha evidenciado su realización hasta la fecha. Se esperan las evidencias mediante informe pendiente.

PROGRAMA 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Se observa la instalación y adecuación de puntos de acopio de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos

Registro fotográfico de punto de acopio residuos no aprovechables.





Como se puede observar en las imágenes anteriores, no hay orden, delimitación, cobertura superior ni inferior para los residuos no aprovechables.

Registro fotográfico de punto ecológico al interior de la obra







Como puede observarse en la fotografía, el punto ecológico presenta desorden, el depósito de residuos en los recipientes se ve obstaculizado por la superposición de cajas y elementos varios sobre y alrededor de ellos. No se observa limpio ni organizado el lugar. Adicionalmente, no se observa una separación adecuada al interior de los mismos. De lo cual fue debidamente observado por esta interventoria y remitido mediante oficio CIPZ-078-0219-2025

Registro fotográfico del interior de los recipientes en punto ecológico.





Registro fotográfico punto ecológico instalado al inicio de la obra.



Registro fotográfico punto acopio residuos aprovechables.





El sitio de acopio e material aprovechable se encuentra delimitado, cubierto, señalizado y desordenado.

PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Teniendo en cuenta que la ejecución del programa se ha realizado bajo las condiciones planteadas en el PMA, se observa que tanto en la ficha de cumplimiento como en el cronograma de actividades la actividad de lavado de llantas y control de dispersión de material particulado mediante cubrimiento con polietileno no se ejecutará más.

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

La ejecución de estas actividades ha sido ejecutada en periodos anteriores y su revisión obedece estrictamente a los profesionales de ingeniería civil toda vez que constituyen obras civiles sanitarias y de drenaje cuyo presupuesto quedó adjudicado en el PMA pero

corresponde a un experto en el tema la revisión de su ejecución. A la fecha, dichas actividades fueron ejecutadas al 100% entre septiembre y noviembre del 2024.

Para efectos ambientales las actividades de: manutención de cobertura vegetal, jornadas de almacenamiento seguro de material excavado, las cuales quedaron programadas para el mes de abril teniendo en cuenta los ajustes que se le realizaron al PMA para este periodo, no se lograron revisar ya que no se contó con acompañamiento en la visita de inspección.

PROGRAMA 5: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.


Se observa la utilización de indumentaria para el personal de obra y visitantes de acuerdo con sus funciones. También la presencia de botiquín tipo B, el cual fue adaptado con elementos de base, camilla, extintor vigente y elementos de protección personal, así como equipos de trabajo para seguridad y salud en el trabajo como arnés y líneas de vida.

Todos los elementos se encuentran en lugares asequibles para atender las necesidades a las cuales haya lugar.

Registro fotográfico de algunos elementos de botiquín tipo B.


VENDAS
Leukoplas
BAJALENGUA
PROTEX

Extintores

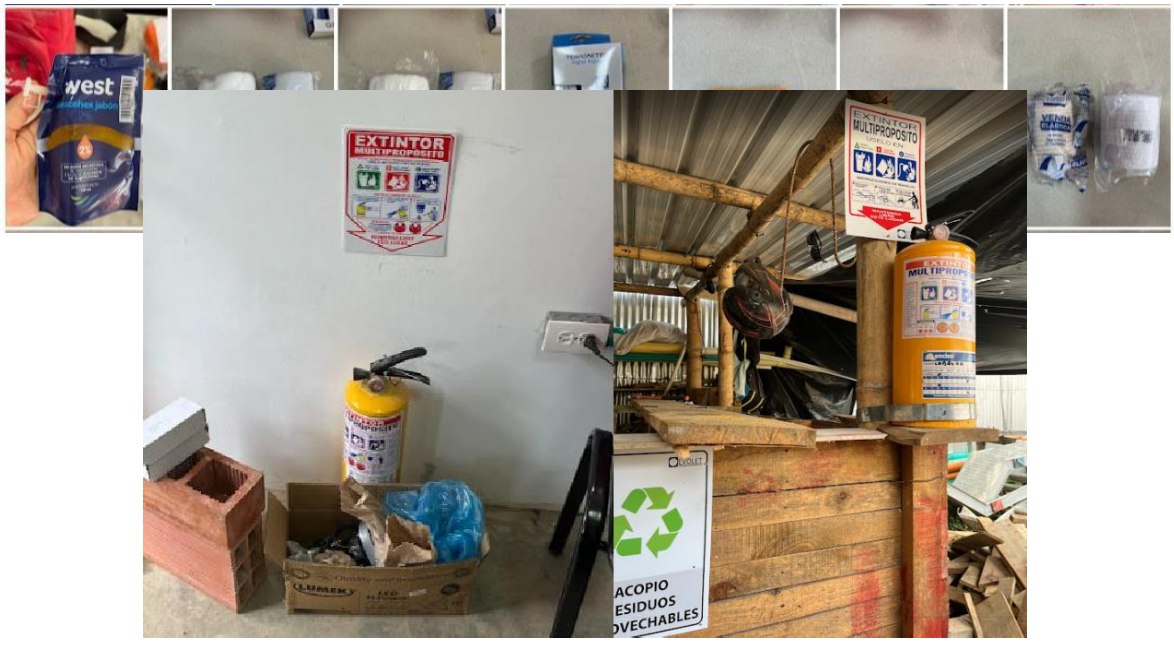
EXTINTOR
MULTIPROPOSITO
ACOPIO
ESIDUOS
OVECHABLES

Personal en obra con indumentaria y EE.PP.



REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.



Camilla No.1



Camilla No.2

Se observa que se mantiene abierto el canal para la comunicación activa de las PQRs.



Señalética atencion a PQRS

SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL.

No es clara la señalización de los senderos y/o el cerramiento. Es necesario el acompañamiento en la visita para que en la guianza se explique y ejemplifique cómo funciona la adecuación y delimitación de senderos de la obra así como su cerramiento.

Registro fotográfico de instalación de cinta amarilla para aislamiento o delimitación de frentes de trabajo.









Señalización restrictiva, preventiva e informativa

5. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Para el mes de abril se tenían pendientes las siguientes actividades:

- Protección de sumideros.
- Disposición y empleo de elementos para recolección y uso de agua lluvias.
- Mantenimiento de sumideros.
- Limpieza de vías afectadas.

Sin embargo, no se observó ni se logró corroborar su ejecución hasta el día de visita.

Registro fotográfico de sumideros sin protección ni mantenimiento.







SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 28 DE ABRIL DE 2025

Para este seguimiento se tiene pendiente el ajuste de indicadores de acuerdo con lo emitido por el oficio con observaciones al PMA. También se necesita el acompañamiento en las visitas para tener claras la señalización y adecuación de senderos. Del mismo modo, la entrega del informe del periodo para las actividades que durante los días de visita no pudieron ser corroboradas como las capacitaciones, posible mantenimiento a sumideros y a la siembra de plántulas.

Cada una de las actividades requiere su continuo seguimiento de modo que no se descuide la atención a ninguna alteración que pueda ocurrir en el transcurso de la obra.

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 20 enero al 20 de febrero 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL		
No.	**NORMATIVA**	**ASPECTO LEGAL**
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario

2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales corresponden al pago del mes de marzo 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9483898459	MARZO	2025/04/01	1	SE PRESENTA AFILIACION
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL					
2	9483898459	MARZO	2025/04/01	11	APORTES EN LINEA

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL					
3	948245588	MARZO	20/03/2025	1	APORTES EN LINEA
4	9482319080	MARZO	2025/03/26	1	APORTES EN LINEA
5	9483656038	MARZO	2025/03/31	1	APORTES EN LINEA
6	32656433	MARZO	2025/04/01	1	ASOPAGOS
7	9483758336	MARZO	2025/03/31	1	APORTES EN LINEA
8	9483537754	MARZO	2025/03/31	1	APORTES EN LINEA
9	4594570921	MARZO	2025/02/28	1	SOI- NO SE PRESENTA PLANILLA VIGENTE
10	9483592051	MARZO	2025/03/31	1	APORTES EN LINEA
11	9483620528	MARZO	2025/03/28	1	APORTES EN LINEA
12	9483603996	MARZO	2025/03/31	1	APORTES EN LINEA
13	4593053419	MARZO	2025/03/25	1	SOI
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION					
14		MARZO		1	NO SE PRESENTA PLANILLA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ					
15		MARZO		29	NO SE PRESENTA PLANILLA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE
16	INGRESOS	MARZO		**0**	**SIN NOVEDAD**
17	RETIRO	MARZO		1	**SIN NOVEDAD**
CONTRATIST- TOPOGRAFIA					
19	9482661891	MARZO	2025/03/04	2	NO SE PRESENTA PLANILLA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONTRATIST- TOPOGRAFIA- INDEPENDIENTE					
20	9482661965	MARZO	4/03/2025	1	APRENDIZ
21	INGRESOS	MARZO		0	**SIN NOVEDAD**
22	RETIRO	MARZO		0	**SIN NOVEDAD**
CONTRATISTA- MAMPOSTERIA					
		MARZO		7	SE PRESENTA DOCUMENTOS AFILIACION E INGRESO
CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS					
		MARZO		6	SE PRESENTA DOCUMENTOS AFILIACION E INGRESO
TOTAL				**58**	

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
1	ELVIO MARINO SANTIAGO CAMPO	10.305.105	SANITAS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
2	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10.302.884	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
3	CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES	34.328.843	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
4	JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ	1.061.725.247	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	N/A
5	JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ	76.310.636	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	N/A

6	LAURA VALENTINA CALLEJAS GAVIRIA	1.061.818.139	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
7	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
8	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	LORENA FALLA FALLA	1.019.092.020	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
10	JULIO CESAR MAYA BASTIDAS	98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
11	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
12	ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ	34.533.693	SANITAS	PENS VEJ ACT	SURA	N/A
13	LUIS FRANCISCO ORTEGA HERNANDEZ	91.243.438	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO						
14	LUIS FANCISCO ORTEGA HERNANDEZ	91.243.438	FOSYGA	COLPENSIONES	SURA	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP						
15	PEREZ GOMEZ UBANER	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
16	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
17	LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
18	MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
19	ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES	1081595473	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
20	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
21	WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
22	WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

23	WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
24	RAUL LOZADA BERMEO	1117839679	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
25	CRISTIAN CAMILO MACA AVIRAMA	1002966961	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
26	DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
27	JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
28	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
29	CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
30	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
31	CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
32	JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
33	CARLOS ANDRES ROJAS GUTIERREZ	1007462733	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
34	ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
35	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
36	OBER FERNEY SANCHEZ SOL	1061761500	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
37	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
38	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
39	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
40	WILMAR ZAMRANO YANDI	1002849154	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
41	JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ	1061017769	SANITAS	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
42	LUIS ERNESTO NARVAEZ ESPINOSA	10568074	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
43	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76334379	SANITAS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
44	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS						

45	EMBER JAVID SIMALES BONILLA	1061744746	NUEVA EPS	PORVENIR		
CONTRATISTA TOPOGRAFIA						
46	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
47	NESDRY YELISSA NARVAEZ GALVIS	1.061.708.231	EMSSANAR	N/A	SURA	N/A
48	FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
49	JAIME JUNIAN MUÑOZ GUASAMALLI	4.617.575	SURA	COLPENSIONES	SURA	INICIO DE COBERTURA 21/03/2025
50	JOSE CLAUDIO IETER RENGIFO	76.190.347	ASMED SALUD	COLPENSIONES	SURA	INICIO DE COBERTURA 31/03/2025
51	LUISA FERNANDA MORENO ORTEGA	1.088.651.098	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	INICIO DE COBERTURA 30/03/2025
52	ROLANDO BURBANO CALIBIO	15.571.993	SANITAS	PORVENIR	SURA	INICIO DE COBERTURA 21/03/2025
53	DAVID ALEJANDRO PONCE HURTADO	1.007.785.202	EMMSANAR		SURA	INICIO DE COBERTURA 21/03/2025
54	RICARDO ANDRES HURTADO HOYOS	1.064.435.591	SURA		SURA	INICIO DE COBERTURA 21/03/2025
55	FERNANDO ANDRES CHACON CABARICO	1.130.607.657	SANITAS		SURA	INICIO DE COBERTURA 21/03/2025
CONTRATISTA - MAMPOSTERIA						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
56	ALVARO ALDAIR SANCHEZ	1.002.970.903	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	INICIO DE COBERTURA 26/03/2025
57	CARLOS JAVIER VALENCIA	1.059.044.132			POSITIVA	INICIO DE COBERTURA 01/04/2025
58	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SERNA	1.144.044.900	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	INICIO DE COBERTURA 26/03/2025

59	JOHN OMAR ROMAN CAICEDO	1.061.114.657	ASMED SALUD	PORVENIR	POSITIVA	INICIO DE COBERTURA 26/03/2025
60	MIGUEL GARCIA SIERRA	1.098.657.855	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	INICIO DE COBERTURA 26/03/2025
61	ROLANDO BURBANO CALIBIO	15.571.993	SANITAS		SURA	INICIO DE COBERTURA 26/03/2025
62	ELVIO MARINO SANTIAGO CAMPO	10.305.105	SANITAS		SURA	INICIO DE COBERTURA 31/03/2025
TOTAL 62						

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	11
Antiguo	49
Retiro	1
Personal flotante	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	**62**

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ \ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ \ de\ trabajadores\ contratados}\frac{11}{11}X100 \quad = \mathbf{100}\%$

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los siguientes ingresos:

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	PEREZ GOMEZ UBANER	Ingreso	0
2	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	Ingreso	0
3	Consorcio EVOLET	Ingreso	2
4	HSA INGENIERIA SAS	Ingreso	4
5	MAMPOSTERIA	Ingreso	4

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal para los trabajadores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Entrega de dotación y EPP al personal**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ trabajadores\ dotados\ con\ EPP\ 62}{Numero\ de\ trabajadaores\ contratados\quad 62} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 11 ingresos y se registró en el formato de entrenamiento las inducciones correspondientes al periodo de los colaboradores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ, INGENIO TOPOGRAFICO, Consorcio EVOLET, EMPRESA HIDROSANITARIA, MAMPOSTERIA

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Cobertura Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 11}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes } 11} X\ 100 = \mathbf{100}\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ ejecutadas\ \ 11}{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ programadas\ 11} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 2 actividades relacionadas con el área SST, con el tema asociado a la atencion de emergencias, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacitación del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ trabajadores \text{ asisten capacitación al mes } 27}{No.\,de\ trabajadaores \text{ en el mes } 27} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**

FORMULA	$\frac{No.\,de\ capacitaciones\ ejecutadas \quad 2}{No.\,de\ de\ capacitaciones\ programas \quad 2} X\ 100 = 10\mathbf{0}\%$

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADORES ASISTENTES	No. TRABAJADORES PROGRAMADOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	04/04/2025	SOCIALIZACION DE SIMULACRO	27	32	32/32*100 = 100%
1	11/04/2025	SIMULACRO DE EVACUACION	25	44	44/44*100 = 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO





Imagen No. 1 Socialización de Simulacro

Imagen No. 2. Simulacro de Evacuación

FUENTE: CONSORCIO EVOLET

COMITÉ PARITARIO DE SST.

En el informe presentado para el periodo correspondiente no se evidencia el acta de la reunión del COPASST.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

En el informe presentado para el periodo correspondiente no se evidencia el informe de la reunión del COCOLA

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO			
No.	**ORIGEN**	**EMPRESA**	**TIEMPO REPORTADO**
1	ACCIDENTE LABORAL	SIN NOVEDAD	0
2	INCAPACIDAD X A. T	CONSORCIO EVOLET	24
3	ENFERMEDAD LABORAL	SIN NOVEDAD	0
4	INCAPACIDAD X A. L	SIN NOVEDAD	0
5	ENFERMEDAD COMUN	SIN NOVEDAD	0
6	PERMISOS	UBANER PEREZ GOMEZ	9 DIAS
7	INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS	SIN NOVEDAD	0
TOTAL, DE AUSENTISMO			**33 DIAS**

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Periodo 2025	
DESCRIPCIÓN	**RESULTADO**
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	62
Número de accidentes laborales durante el periodo	1
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	24
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante del periodo	0

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Periodo 2025	
DESCRIPCIÓN	**RESULTADO**
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	2
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	84+24=108
Frecuencia de Accidentalidad = = No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 No de trabajadores en el mes	0/62*100 =0%
Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes *100 # de trabajadores en el mes	24+0/62*100=38.7%
Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000	0*38.7/1000 = 0
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	24/26*100 =92%

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores. Se evidencia recomendaciones generales.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Relación de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos

En el desarrollo de estas actividades se cuentan con 36 personas certificadas para labor en alturas.

Por parte de la interventoría y el área SST se organiza seguimiento en obra relaciona al control del riesgo en alturas, mediante oficio con el acompañamiento del profesional S.O, bombero e instructor de trabajo en altura especialista en el tema de altura, para el día 14 de abril del 2025 se realiza reunión con el acompañamiento de las partes interesadas, donde se revisó los sistemas de acenso, descenso, líneas de vida, equipos TA, implementadas, se impartieron las observaciones a intervenir y corregir en obra sobre la instalación y puntos de sujeción de la línea de vida, armado y uso seguro de los andamios, áreas de restricción, medidas de prevención colectiva, importancia del uso de la malla contra caída, seguridad con los huecos, orden y aseo. Del recorrido se generó el acta correspondiente.

ACTA DE REUNION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
14	04	2025	8:30 a.m.	11:20 a.m.

ASISTENTES			
NOMBRE	**CARGO/ENTIDAD**	**NOMBRE**	**CARGO/ENTIDAD**
Lorena Falla Falla	Inspectora SST Consorcio Evolet	Jesus Edinson Perafan	Residente de Interventoria Intersalud PZ
Jose Geovaire Ausecha	Contratista Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Intersalud PZ
Angiee Gabriela Teran	Inspectora SST Contratista Estructura Consorcio Evolet	Augusto Guzman	Interventoría Intersalud PZ
Henry Mauricio Sandoval	Asesor SG-SST Interventoría	Aixsa Angulo	Profesional SG-SST Interventoria
Marco Antonio Velasco	Apoyo Supervision HUSJ		



Imagen No. 9, 10 y 11 Seguimiento Interventoría de tareas en alturas

FUENTE: CONSORCIO INTERSALUD

Reporte de Incidente:

Se reporta un incidente ocurrido por caída de objetos:

Descripción de los hechos

El día miércoles 9 de abril de 2025 un grupo de trabajadores pertenecientes al área estructural del proyecto se encontraba realizando actividades de retiro de formaleta en la

losa del cuarto piso. Durante el desarrollo de esta labor, al momento de desmontar uno de los tableros de formaleta, este se soltó de manera no controlada y cayó accidentalmente sobre la cubierta de teja de zinc de la oficina asignada a la inspectora SST del contratista Ubaner Pérez. Al momento del incidente no se encontraba ninguna persona dentro de dicha oficina, por lo que no se registraron lesiones personales. Sin embargo, se presentaron daños materiales en la estructura de la cubierta, cuya evaluación preliminar sugiere la necesidad de reparación o reemplazo parcial.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No. 12 y 13. Orden y Aseo en Obra

FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025- INVESTIRGACION DE INCIDENTES

ORDEN Y ASEO

La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden y aseo, se evidencia la intervención y corrección de las observaciones realizadas como prevención del el riesgo locativo y de esta manera prevenir caídas de los colaboradores a nivel y de diferente nivel, Desde a la interventoría se continua con las solicitud del orden y aseo durante la jornada laboral y en especial donde se desempeñan actividades de

altura, mantener limpio y sin obstáculos los senderos peatonales, además de identificados.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Imagen No. 14 y 15. Orden y Aseo en Obra

FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- ABRIL 2025

SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

REGISTRO FOTOGRAFICO







Imagen No. 16, 17 y 18. Disposición de recipientes para recolección de residuos según su clasificación, Servicios de baños para el personal de obra

FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- MARZO 2025

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Para el periodo correspondiente al informe se evidencia la realización de simulacro de evacuación con el personal de obra y el consorcio EVOLET, realizado el día 11 /04/2025.

Los equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.
Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

BRIGADA DE EMERGENCIA

El CONSORCIO EVOLET cuenta con la brigada de emergencia conformación por los siguientes integrantes:

BRIGADA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
JEFE DE BRIGADA	Jesús Iruba	76.334.379	JESUS IRUBA
JEFE DE EVACUACIÓN	Guillermo León Escobar.	79.339.308	
BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	Ubaner Perez.	1061600546.	
BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Ricardo Bolaños.	4754052.	
PERSONAL DE APOYO	Jose Revelo	1061725247.	

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacidad de respuesta**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ \ emergencias\ atendidas\ oportunamente}{Numero\ de\ emergencias\ presentadas} \frac{0}{0} X\ 100 = N.A.$
INDICADOR	**% de simulacros realizados**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ simulacros\ efectuados}{Numero\ de\ simulacros\ programados} X\ 100 = N.A$

INSPECCIONES.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, la programación del plan de trabajo SG-SST para este año, las inspecciones realizadas fueron: inspección equipos de emergencia mediante registro CV-SGSST-63.3- V1, ubicados en el área de comedor en obra, las cuales se relacionan en el archivo anexo al informe.

REGISTRO FOTOGRAFICO







Imagen No. 19, 20 y 21. Equipos y materiales de emergencia

FUENTE: PROPIA- INFORME CONSORCIO EVOLET- ABRIL 2025

7. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025.

Anexo 8. Informe mensual del periodo del 26 marzo al 25 de abril de 2025 del contratista de obra

8. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

En el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de columnas, pantallas y losas de entrepiso N°3(0.00+11.50)

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión losa de entrepiso N°3 (N+11.50), del contratista de obra

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
274	**1571**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	224,4	3	8171	280	**3983**	27,5	281	**4000**	27,6	99,6	20,3	Entrepiso 3 fibra
274	**1572**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	274,9	1	8413	333	**4739**	32,7	281	**4000**	27,6	118,5	20,3	Entrepiso 3 fibra
274	**1573**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	285,1	3	8332	349	**4962**	34,2	281	**4000**	27,6	124,0	20,3	Entrepiso 3 fibra
274	**1574**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	289,6	4	8171	361	**5139**	35,4	281	**4000**	27,6	128,5	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas
274	**1575**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	286,5	5	8171	358	**5085**	35,1	281	**4000**	27,6	127,1	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas
274	**1576**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	307,0	3	8171	383	**5450**	37,6	281	**4000**	27,6	136,2	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas
274	**1577**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	294,7	4	8091	371	**5282**	36,4	281	**4000**	27,6	132,1	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas
274	**1578**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	293,6	3	8171	366	**5211**	35,9	281	**4000**	27,6	130,3	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas
274	**1579**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	272,0	4	8332	333	**4734**	32,6	281	**4000**	27,6	118,4	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas

Se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para su aceptación.

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas entrepiso N°3 y N°4 (N+11.50, N+15.40), del contratista de obra.

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
298	1673	T37	4	03-abr-25	11-abr-25	8	339,5	4	8252	420	5968	41,1	281	4000	27,6	149,2	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4
298	1674	T37	4	03-abr-25	11-abr-25	8	306,3	3	8332	375	5332	36,8	281	4000	27,6	133,3	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4
298	1675	T37	4	03-abr-25	11-abr-25	8	345,3	3	8252	427	6069	41,8	281	4000	27,6	151,7	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
309	1784	T38	4	12-abr-25	21-abr-25	9	336,9	1	7933	433	6160	42,5	281	4000	27,6	154,0	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4
309	1785	T38	4	12-abr-25	21-abr-25	9	349,7	1	8091	441	6269	43,2	281	4000	27,6	156,7	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4
309	1786	T38	4	12-abr-25	21-abr-25	9	374,4	3	8091	472	6711	46,3	281	4000	27,6	167,8	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
256	1474	T33	4	21-mar-25	29-mar-25	8	302,7	5	8171	378	5372	37,0	281	4000	27,6	134,3	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3
256	1475	T33	4	21-mar-25	29-mar-25	8	315,6	3	8332	386	5493	37,9	281	4000	27,6	137,3	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3
256	1476	T33	4	21-mar-25	29-mar-25	8	290,1	4	8171	362	5149	35,5	281	4000	27,6	128,7	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
223	1154	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	275,6	3	8171	344	4891	33,7	281	4000	27,6	122,3	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R
223	1155	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	282,4	3	8252	349	4963	34,2	281	4000	27,6	124,1	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R
223	1156	T32	4	08-mar-25	15-mar-25	7	301,0	4	8495	361	5138	35,4	281	4000	27,6	128,5	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R
223	1157	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	323,2	5	8332	396	5626	38,8	281	4000	27,6	140,7	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3
223	1158	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	304,5	4	8171	380	5404	37,3	281	4000	27,6	135,1	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3
223	1159	T31	4	08-mar-25	15-mar-25	7	309,6	3	8171	386	5496	37,9	281	4000	27,6	137,4	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3

Al realizar un análisis los resultados del contratista de obra, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para aceptación.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c.

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c, sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las apartes .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Anexo 9. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA

- <u>Resultados resistencia concreto interventoria</u>

ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
						Mpa	PSI		
VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +7,60 - PISO 3)	27/02/2025	14/05/2025	76	386,9	8251,6	46,9	6698	167,5	SI
	27/02/2025	14/05/2025	76	385,0	8251,6	46,7	6665	166,6	SI
PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +7,60 - PISO 3)	21/03/2025	14/05/2025	54	444,1	8091,4	54,9	7840	196,0	SI
	21/03/2025	14/05/2025	54	442,4	8011,8	55,2	7888	197,2	SI

ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
						Mpa	PSI		
VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +11,50 - PISO 4)	27/03/2025	14/05/2025	48	417,7	8171,3	51,1	7302	182,6	SI
	27/03/2025	14/05/2025	48	414,8	8091,4	51,3	7323	183,1	SI
	27/03/2025	14/05/2025	48	412,6	8011,8	51,5	7356	183,9	SI
PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +11,50 - PISO 4)	3/04/2025	14/05/2025	41	414,8	8171,3	50,8	7251	181,3	SI
	3/04/2025	14/04/2025	41	415,8	8171,3	50,9	7269	181,7	SI

Anexo 10. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA

9. CONCLUSIONES

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de abril de 2025 del 23.34% por valor de $7.579.414.928 frente un avance programado del 23.24%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025 es de 3.56% frente a un avance programado del 4.18%.

El contratista de obra presentó acta de cobro parcial No 1, por valor de $4.113.300.273, correspondiente al 12.67% del valor contractual, con corte al 14 de marzo de 2025.

Se toma el 30% del valor del acta $1.233.990.082 para amortizar el anticipo del contratista de obra mediante el acta parcial de obra No 1.

El contrato de interventoría, factura en igual porcentaje por lo facturado del contrato de obra, por lo cual el acta parcial No 1 de interventoría es de $162.183.000, con corte al 14 de marzo de 2025, no se realiza amortización ya que no cuenta con anticipo.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025, se realizó el suministro e instalación de aceros para el entrepiso N+15.40 al N+19.30 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10.

Se realizó la instalación de aceros para las vigas y losa del entrepiso N+19.30, así mismo se instaló los joist correspondientes.

Se realizó el suministro e instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, la losa y vigas de entrepiso N+15.40 al N+19.30 Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo en cuenta el procedimiento indicado en el aparte C.5.6. EVALUACION Y ACEPTACION DE CONCRETOS DE LA NSR 10

Teniendo en cuenta que se presentó una actualización del PMA a la fecha, se tienen algunas actividades pendientes de seguimiento toda vez que es necesario el periodo de transición para implementarlas, entre esas se encuentran las actividades del programa "PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS".

En general, se presencia la necesidad de capacitaciones y organización de lugares de acopio de residuos puesto que se evidencia desorden en algunos puntos ecológicos, acopio e inadecuada separación en los recipientes.

No se evidencian actividades de mantenimiento a sumideros ni recolección de aguas lluvias.

Se requiere acompañamiento en las visitas para esclarecer los temas de señalización y delimitación de senderos.

Se observó adecuada separación de residuos peligrosos, implementación de señalética, provisión y acceso de elementos de protección personal.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. Asimismo, ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.

Para el periodo correspondiente al informe se evidencia la realización de simulacro de evacuación con el personal de obra y el consorcio EVOLET, realizado el día 11 /04/2025.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.

Se han acatado todas las observaciones realizadas en informes anteriores respecto del componente ambiental y del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo posible, entre otras cosas, un seguimiento más claro y una medición de cumplimiento mucho más eficiente.

Las actividades pendientes para realizar en el mes de mayo quedaron consolidadas en cada uno de los programas, así como algunas observaciones para mejora en la medición de cumplimiento para informes posteriores.

ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTA DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-40-101051477**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**13**	**05**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO:	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO	8234508
BENEFICIARIO:	891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,912,847.00	$ *******3,000.00	$ *****364,011.00	$ *********2,279,858.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2025	22	03	2024	00:00	13	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-40-101051477**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**13**	**05**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO:	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO	8234508

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,912,847.00	$ *******3,000.00	$ *****364,011.00	$ *********2,279,858.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009610188095(3900)000002279858(96)20250322

REFERENCIA PAGO:

1100961018809-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2025	22	03	2024	00:00	13	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EVOLET — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.784.507-4**

DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA — **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA — **TELÉFONO:** 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 891.580.002-5**

DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142 — **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA — **TELÉFONO:** 8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101279178**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**22**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	**NIT: 901.784.507-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT: 891.580.002-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/03/2024**	**13/09/2026**	**$6,494,785,713.80**	**$6,494,785,713.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/03/2024**	**13/05/2029**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**22/03/2024**	**13/09/2026**	**$9,742,178,570.70**	**$9,742,178,570.70**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$3,247,392,856.90**	**$3,247,392,856.90**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/05/2026	13/05/2031	$3,247,392,856.90

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **25,503,155.00	$ *******8,000.00	$ ***4,847,119.00	$ ********30,358,274.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101279178**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**22**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO:	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO	8234508

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **25,503,155.00	$ *******8,000.00	$ ***4,847,119.00	$ ********30,358,274.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009610188088(3900)000030358274(96)20250322

REFERENCIA PAGO:

1100961018808-8

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2025	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO EVOLET	**NIT: 901.784.507-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA		POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT: 891.580.002-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	KR 6 NRO. 10 N - 142		POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2024

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	28	04	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	15	05	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	10/11/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	10/05/2029	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	13/05/2031	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 172 DÍAS, DE ACUERDO A OTRO SI 001 DE FECHA 15/04/2025 AL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS EN ESTE ANEXO CONTINUAN VIEGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***576,185,413.50	$ **********488,732	$*****5,000.00	$ *******93,809	$ **********587,541

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ROCIO SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	5932	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB257A0E08FC7D57

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1415205012	9484699724	Y	2025/04/03	2025/04/16	BANCOLOMBIA	13	$399,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66785383	ANGULO AGUDELO AIXSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1061817104	ORDOÑEZ CORTES ANGELICA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	76313467	PERAFAN LEDEZMA JESUS EDINSON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	1061791956	PROAÑO MUÑOZ MICHELLE VANNESSA		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(4)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,694,000	$396,400		$0	$0		$396,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1415205012	9484699724	Y	2025/04/03	2025/04/16	BANCOLOMBIA	13	$399,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$396,400	$3,400	$0	$399,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$396,400	$3,400	$0	$399,800
TOTAL				**4**	**$396,400**	**$3,400**	**$0**	**$399,800**

ANEXO 4. ACTAS DE COMITE TECNICO ABRIL 2025

ACTA DE COMITÉ N°43

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023

DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN
01	04	2025	8:40 A.M.	9:20 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Carlos Alberto Córdoba	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Luis Francisco Ortega	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ		

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.			X		
2. La interventoría comunica un avance ejecutado acumulado de 21.03% y un programado acumulado de 20.08%. Durante esta semana se realizo la fundición de vigas de entrepiso y losa del nivel 11.50, el armado de acero de pantallas y columnas.			X		
3. Con respecto al suministro provisional de energía, se informa que, a la fecha, el contratista de obra se encuentra a la espera de la autorización por parte de la entidad para continuar conectado a la red eléctrica del hospital, implementando un contador independiente, mientras se tramita la conexión definitiva con la Compañía Energética de Occidente. En respuesta, la entidad solicita a la interventoría el reenvió del requerimiento y se compromete a dar respuesta a la mayor brevedad.	Entidad HUSJ Interventoría	X		04/04/2025	
4. Por otra parte, en relación con la respuesta emitida por la Interventoría a la entidad, referente a un presunto incumplimiento, se solicita formalmente a la entidad que informe si el Ministerio ha emitido alguna respuesta al respecto. En respuesta, la entidad indica que, a la fecha, no se ha recibido ninguna respuesta.	Entidad HUSJ	X		04/04/2025	

5. En relación a los ítems no previstos, la interventoria menciona que, se realizó el envio al ministerio de un informe el cual realizaba la debida justificación de dichos ítems. Sin embargo, luego de la mesa técnica relativa al balance realizada el 31 de marzo del presente, donde secretaria de salud realizó unas observaciones. La interventoría realiza la consulta a la entidad, acerca de si se realizo el envio de toda la documentación de los ítems no previstos al ministerio o si se requeriría solicitar una mesa técnica con el ministerio. En respuesta, la entidad manifiesta la necesidad de realizar otra mesa técnica, para abordar puntualmente el tema de los ítems no previstos. En virtud de ello, precisa que, siguiendo los lineamientos de la mesa técnica relativa al balance, propone realizar una mesa técnica con los especialistas que participaron en el ajuste de la cimentación. Donde se realizó el requerimiento tanto al consultor como a la interventoría y contratista de requerir a dichos especialistas para convocar una mesa técnica.	Entidad HUSJ Interventoría Contratista	X		04/04/2025	
6. La interventoría informa que, el día de ayer se radico a la entidad mediante oficio CIPZ-078-0190-2025 el concepto de aprobación por parte de la interventoría a la solicitud de prorroga presentaba por el contratista de obra con su debida justificación técnica, jurídica y financiera. Por otro lado, mediante oficios CIPZ-078-0184-2025 y CIPZ-078-0191-2025 las actas parciales de cobro N°1 del contratista y la interventoría respectivamente.	Entidad	X		04/04/2025	

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: REUNION MT - COMITÉ 43. **FECHA:** 1 ABRIL 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Marco Antonio Velasco M	HUSJ	Apoyo Supervisión	mantenimiento@hospitalsanjose.gov.co	
2	Luis Francisco Ortega	Consorcio Evolet	Soporte Director Obra	Consorcioevolet@Gmail.com	
3	Carlos A. Cordoba.	Consorcio Evolet.	RL Suplente.	consorcioevolet@Gmail.com	
4	Michelle Vanessa Prado M	Consorcio Intersalud Pz	Rep legal	intersaludpz@gmail.com	
5	Jesús E. Perafan L	Consorcio Inzor	Residente Interventoria	residenciainterventoria@gmail.com	
6	David Leandro Lenis	HUSJ	Ingeniero Electricista	Electricohospital@hospitalsanjose.gov.co	
7	Juan Francisco Mora Obando	H.U.S.J.	Supervisor Subgerencia	—	
8	Felipe Restrepo	Consultoría	Especialista eléctrica	frestrepo@oferestrepo.com	
9	Isabel Giraldo	evolet	RL legal		
10	Valentina Callejas G.	Evolet	Apoyo	Consorcioevolet@gmail.com	Valentina Callejas G.
11	Angelica Ordoñez Cortés	Consorcio Intersalud PZ	Interventoria	residenciainterventoria hsj@gmail.com	AngelicaOrdoñez.
12					
13					

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ N°44

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023

DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN
04	04	2025	10:30A.M.	11:20 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Carlos Alberto Córdoba	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Luis Francisco Ortega	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ	Edgar Galvis	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
David leandro Lemus	Apoyo eléctrico a la supervisión HUSJ	Cindy Rodriguez	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Juan sebastian Orozco	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Alberto Peña	Contratista de Obra Consorcio Evolet.

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.			X		
2. La interventoría comunica un avance ejecutado acumulado de 21.83% y un programado acumulado de 20.88%.			X		
3. Con respecto al suministro provisional de energía, se informa que, a la fecha, el contratista de obra se encuentra a la espera de la autorización por parte de la entidad para continuar conectado a la red eléctrica del hospital. La interventoría manifiesta que hará el reenvió de la solicitud por parte del contratista a la entidad para proceder con la respectiva respuesta.	Entidad	X		04/04/2025	
4. Por otra parte, en relación con la respuesta emitida por la Interventoría a la entidad, referente a un presunto incumplimiento, la entidad ha comunicado que solicitó formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social manifestar su postura en caso de considerar si existe algún incumplimiento. Esto se debe a que el informe remitido por la entidad tuvo concordancia con el informe de respuesta enviado por la Interventoría, donde se señala que, en su concepto, no existe incumplimiento. A la fecha, la entidad	Entidad HUSJ	X		11/04/2025	

no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.					
5. En relación a los ítems no previstos, la interventoría menciona que, luego de la mesa técnica relativa al balance realizada el 31 de marzo del presente, secretaria de salud realizó unas observaciones, con el fin de que, la información este de manera más clara y precisa para su posterior envió al ministerio. En virtud de lo anterior, el contratista se compromete a realizar las respectivas subsanaciones tanto al balance como a la justificación de los NP. Por otro lado, siguiendo los lineamientos de la mesa técnica relativa al balance en mención, donde se propuso realizar una mesa técnica con los especialistas que participaron en el ajuste de la cimentación. Se informa que, el día de hoy se realizará dicha mesa en instalación de subgerencia a las 4 p.m.	Contratista Entidad Interventoría Contratista	X X		11/04/2025 04/04/2025	
6. Con respecto a la prórroga, la supervisión menciona recibió la comunicación por parte de la interventoría canalizada desde el contratista mediante oficio CIPZ-078-0190-2025. Actualmente, se encuentran en proceso de acompañamiento con la oficina jurídica de la entidad para la emisión de su concepto sobre la viabilidad de la prórroga del contrato, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta formal por parte de dicha oficina. No obstante, la supervisión precisa que, tras evaluar la solicitud conjuntamente con la gerencia, no se han identificado objeciones al respecto. Por otro lado, en cuanto a las actas parciales tanto del contratista como de la interventoría, la supervisión informa que, se encuentra en proceso de revisión.	Entidad	X		11/04/2025	
7. En lo concerniente al tema de seguridad y salud en el trabajo, la Interventoría informa que, mediante el oficio CIPZ-078-0181-2025, de fecha 27 de marzo del presente año, se remitieron varios puntos pendientes por subsanar, otorgándose un plazo de una semana para tal fin. No obstante, la respuesta del contratista, emitida a través del oficio EV-C358-23-0330-25 del 31 de marzo, no se consideró contundente ni resolutiva ante dicho requerimiento. En consecuencia, la Interventoría, mediante el oficio CIPZ-078-0197-2025 de fecha de hoy, reiteró la solicitud y requirió un informe detallado de las acciones ejecutadas y la justificación de aquellas que aún permanecen pendientes otorgando nuevamente una semana de plazo para su entrega. En consideración a lo anterior, la Interventoría gestionará una visita por parte de un profesional del cuerpo de bomberos con el fin de verificar las condiciones de	Contratista Interventoría	X X		10/04/2025 09/04/2025	

seguridad y salud en el trabajo en la obra. Dicha visita será informada mediante oficio, indicando la fecha y hora precisas, para que así se pueda contar con el acompañamiento del contratista de obra y las partes que deseen asistir.					
8. En cuanto a la red de media tensión, el contratista manifiesta que realizó el envío de las tres propuestas de trazado para dicha red y se encuentra a la espera que la entidad se pronuncie sobre ello y decida cual propuesta será adoptada. Adicionalmente, el contratista manifiesta que, además de la definición del trazado, también requerirá la entrega de las especificaciones técnicas, los estudios pertinentes y los planos de detalle, argumentando que dicha documentación debe ser suministrada por la entidad. Por otra parte, la interventoria remitirá las propuestas enviadas por el contratista a la entidad, para su respectivo pronunciamiento.	Entidad Interventoría	X X		11/04/2025 04/04/2025	

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comite 44 **FECHA:** 04 Abril 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Marco Antonio Velasco Mejia	HUSJ	Apoyo a la Supervisión	mantenimiento@hospitalsanjose.gov.co	
2	Isabel Caraballo	R. evolet	R Legal		
3	ALBERTO PEÑA RIVERA	CONSORCIO EVOLET.	APOYO JURIDICO	alberto.peñarivera@gmail.com	
4	Juan Francisco Ortega H.	CONSORCIO EVOLET	APOYO. DIR. OBRA		
5	Jose G. Acosta O	Consorcio Evolet	Residente Obra	consorcioevolet@gmail.com	
6	Juan Sebastian Orozco M.	Consorcio Evolet	Apoyo Tecnico	consorcioevolet@gmail.com	
7	Edgar Golu.	Evolet.	Apoyotecnico	edgarc2074@gmail.com	
8	Carlos A. Córdoba.	Consorcio Evolet.	R. Suplente.	consorcioevolet@gmail.com.	
9	Juan Francisco Hoyo O.	H.U.S.J.	Supervisor HUSJ Supervisor.		
10	Jessica. Perafan L.	Consorcio Intersalud P2	Residente Interventoria	residenciainterventoriahs@gmail.com	
11	David Leandro Urrea	HUSJ	Ingeniero Civil	Mantenimiento Electromedicina.husj@hospital.	
12	Valentina Callaqui G.	Evolet	Apoyo	Consorcioevolet@gmail.com	Valentina Callaqui
13	Angélica Ordóñez Cortés	Intersalud P2	Interventoria	residenciainterventoriahs@gmail.com	

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ N°45				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
15	04	2025	10:30A.M.	11:20 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Carlos Alberto Córdoba	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ	Edgar Galvis	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
David Leandro Lemus	Apoyo eléctrico a la supervisión HUSJ	Didier Golondrino	Secretaria de Salud Departamental
Elkin Gomez	Secretaria de Salud Departamental	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.			X		
2. La interventoría comunica un avance ejecutado acumulado de 22.91% y un programado acumulado de 22.63%.			X		
3. En relación con el suministro provisional de energía, se informa que la interventoría recibió por parte de contratista la documentación en la fecha de hoy mediante oficio EV-C358-23-0362-25. No obstante, el contratista de obra indicó que la información proporcionada será complementada para atender integralmente los requerimientos establecidos tanto por la entidad como por la interventoría mediante oficio CIPZ-078-0206-2025.	Contratista		X	21/04/2025	
4. Con respecto a los ítems no previstos, se había establecido el compromiso por parte del contratista de remitir la ampliación de la justificación del ajuste de diseño de los pilotes el lunes 14 de abril del presente año. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido la información correspondiente. En respuesta a esta situación, el contratista de obra informa que ya dispone de la información proporcionada por el Ingeniero Hugo Cosme y actualmente se encuentra complementando los datos relativos al balance de obra, procediendo al envío de la documentación completa mediante oficio.	Contratista	X		21/04/2025	


Por otra parte, se sugiere que, una vez recibida la información por parte del contratista, esta sea remitida a la Secretaría de Salud para su debida revisión y verificación. En caso de identificarse observaciones, se propone la realización de una mesa técnica para su análisis y resolución.					
5. En lo referente a la seguridad y salud en el trabajo de la obra, la interventoría informa que, a través del oficio de presunto incumplimiento CIPZ-078-0213-2025, se reiteró al contratista una serie de observaciones y requerimientos específicos mencionado en los oficios CIPZ-078-0181-2025 y CIPZ-078-0197-2025 que a la fecha no han sido subsanados por el contratista. En respuesta, el contratista remitió en el día de hoy un documento que contiene las subsanaciones correspondientes, el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoría. En este aspecto, dentro de las observaciones previamente comunicadas, se encuentran: **a. Líneas de advertencia, estas deben cumplir con:** • Debe ser colocada a lo largo de los lados desprotegidos. • Debe estar colocada a 1.80 metros de distancia del borde desprotegido o más. • Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg. • Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos, inferior a 1.80 metros. • Se debe garantizar la debida supervisión del área con un ayudante de seguridad, que impida que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin protección de caídas. El ayudante de seguridad debe estar en la misma superficie de trabajo y en una posición que le permita vigilar a los trabajadores y con la capacidad de advertirles del riesgo, utilizando los medios que sean necesarios. **b. Medidas de seguridad en la obra:** • Delimitación según la norma el área perimetral del edifico en construcción y los pasos peatonales. • Restricción del paso a personal en áreas con riesgo de caída de objetos. • Exigir el uso de los E.P.P a trabajadores, contratistas y visitantes.	Contratista	X		21/04/2025	

• **COLOCACIÓN DE MALLA ESCOMBRERA** como medida correctiva y preventiva al espacio reducido en obra, e incidentes presentados por caída de objetos de los trabajos realizados en pisos superiores a zonas de paso peatonal, y los riesgos de daños a terceros por actividades de la obra colindantes al techo del Hospital San José. • Ubicación de las Líneas de advertencias en los espacios de trabajo en altura que dan al vacío, que sean identificadas y socializadas con el personal expuesto en trabajos en alturas, como medida preventiva y correctiva de comportamientos inseguros de estar cerca a los bordes que dan al vacío sin las medidas de seguridad establecidas. • El montaje, uso y desmontaje de los andamios multidireccionales deberá realizarse siguiendo en todo momento las instrucciones del fabricante. (manual del fabricante) • El montaje y desmontaje de estas estructuras se encomendará a personal formado que conozca los riesgos inherentes a dichas actuaciones. (Certificado de formación) • El andamio debe arriostrarse (estabilizarse) siguiendo las instrucciones del fabricante. • **RED DE SEGURIDAD PARA LA DETENCIÓN DE CAÍDAS.** • Instalación de las líneas de vida portátiles horizontales que garanticen su efectividad en caso de posible caída de trabajadores. • Instructivo o protocolo de instalación de líneas de vida, socializado al personal expuesto y encargado de la instalación y de los cambios de ubicación de esta, como medida preventiva por la dinámica de cambios de ubicación de la línea de vida portátil horizontal por las características que presenta la obra. • La socialización procedimientos de trabajos en alturas, plan de emergencia a la totalidad de personal que labora en alturas del consorcio EVOLET. • Realizar un simulacro • La documentación relacionada a la gestión de contratistas en SG-SST. • Manual para contratistas y proveedores, su socialización a la totalidad de los contratistas en obra. • Procedimiento para la selección de contratistas y proveedores.					

b. Se solicita la intervención al personal que labora en alturas en los siguientes temas: • Sistemas de anclajes (Riesgos y controles). • Socialización del Procedimiento de operación de la pluma al personal encargado. • Socialización del Procedimiento de izaje de cargas con pluma al personal encargado. c. Intervenir los siguientes comportamientos inseguros identificados en obra: • laborar cerca a los bordes con riesgo de caída al vacío, sin dar uso de las medidas de restricción establecidas. • Desplazamientos en los bordes con riesgo de caída al vacío, sin dar uso de las medidas de restricción establecidas. • Uso de los ganchos de las eslingas en los puntos de anclaje de forma insegura (posición de palanca). • Izaje de materiales, sin dar uso de las medidas de restricción establecidas, ubicación del personal cerca a los bordes sin protección. • Programa de orden y aseo. **d. Intervenir las siguientes condiciones inseguras identificados en obra:** • Cuando la actividad se desarrolla en diferente nivel, desnivel o a una altura inferior a los 2 m, donde se requiera de elementos de apoyo para alcanzar la altura para laborar. (estos deben garantizar la estabilidad del trabajador, ejemplos bancos). • Mayor acompañamiento de los trabajadores expuestos a alturas durante la jornada del encargado SST, para la identificación de comportamientos inseguros y su intervención y corrección oportuna. **e. Documentos solicitados:** • Ficha y hoja de vida de la pluma. • Procedimiento de operación de la pluma. • Procedimiento de izaje de cargas con pluma.					

• Gestión de la implementación del programa de trabajo en alturas. • Procedimiento de armado de andamio multidireccional. • Certificación del andamio utilizado en obra **f. Se solicita además la siguiente gestión:** • Acondicionamiento de tableros eléctricos portátiles que eviten la exposición al sol y al agua de las conexiones eléctricas utilizadas en la obra. • Capacitar e intervenir en el ruido generado por las motos de los trabajadores al momento de salir de la obra. (Aceleración y uso del pito). • Dadas las condiciones de la obra y su avance se presenta riesgos asociados a desastres naturales, los cuales deben ser identificados, analizados, intervenidos y controlados, la instalación de pararrayos se debe instalarse siempre que haya un mayor riesgo de daños debido a la caída de rayos u otros sucesos peligrosos. • La instalación de pararrayos que cumplan con las normas vigente.					
6. Con respecto al apantallamiento provisional del edificio, implementado como medida de seguridad y protección contra descargas atmosféricas, el contratista informa que ya cuenta con el diseño correspondiente y actualmente se encuentra en la fase de elaboración de las memorias de cálculo y cantidades necesarias para su posterior adquisición. En este sentido, se compromete a entregar, el próximo lunes, la lista detallada de los materiales requeridos para el sistema de aterrizaje. En este sentido, la interventoría solicita formalmente al contratista de obra que, para llevar a cabo la revisión integral del diseño, se remitan las justificaciones técnicas, los planos y toda la documentación pertinente para su respectivo análisis. En respuesta a esta solicitud, el contratista se compromete a enviar la información requerida el miércoles 23 de abril del presente año.	Contratista	X		23/04/2025	


15/04/2025, 11:34:24 a. m.
CONSORCIO INTERSALUD PZ


C
R
CONSORCIO INTERSALUD PZ
11:24 a.m. rrb-fwca-zws

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comite 45

FECHA: 15 Abril 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Isabel Giraldo	evolet	R. legal		
2	Carlos A. Cordoba.	Consorc. Evolet.	R. legal Suplente.	consorcioevolet@gmail.com	
3	Elkin Gomez	SJSC.	Contratista Estructural	elkingomecplanos@gmail.com	
4	Juan Francisco Mora O	H.U.S.	Supervisor. Seguridad.		
5	Didier Ivan Golondrino Leon	Secretaria de Salud Cauca	Profesional Universitario	didiergolondrino.salud@cauca.gov.co 3104268783	
6	Jesus A. Perafan L.	Consorcio Intersalud P→	Residente Interventoria	Residenteinterventoria@gmail.com	
7	Edgar Galvis.	evolet.	Contratista	edgarc2074@gmail.com	
8	David Leandro Lemu	HUSJ ESE	Ingeniero Electronico	Electrohospitalario hospitalsanjose.gov.co	
9	Marco Antonio Velasco Mejia	HUSJ	Apoyo a la Supervisión	mantenimiento@hospitalranjore.gov.co	
10	Angelica Ordoñez Cortes	Intersalud PZ	Interventoria	residenciainterventoriahsjc@gmail.com	Angelica Ordoñez C.
11					
12					
13					

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ N°46				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
23	04	2025	08:49 A.M.	10:02 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Carlos Alberto Córdoba	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Edgar Galvis	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
David Leandro Lemus	Apoyo eléctrico a la supervisión HUSJ	Andres Fabian Talaga	Consultor
Alberto peña	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Felipe restrepo	Ingeniero Electrico Consultoria

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.			X		
2. La interventoría comunica un avance ejecutado acumulado de 23.3% y un programado acumulado de 23.24.			X		
3. En relación con el suministro provisional de energía, se informa que en la fecha de hoy se recibió por parte del contratista la documentación física mediante oficio EV-C358-23-368-2025 que adjunta la memoria de cálculo del contador para la provisional y la hoja de vida del diseñador, la cual, por consiguiente, se encuentra actualmente sujeta a revisión por parte de la interventoría.	Interventoría Contratista		X	30/04/2025	
4. Con respecto a los ítems no previstos, se informa que el contratista de obra realizó el envió del balance de obra junto con el concepto de ampliación de información del estudio de suelos mediante oficio EV-C358-23-359-2025, sin embargo, se informa que está sujeto a subsanación de una serie de observaciones identificadas por la interventoría. Una vez será remitida la información ajustada y de manera completa por el contratista a la interventoría, se procederá a enviar a la entidad y posteriormente la entidad enviará a la Secretaría de Salud para su debida revisión y verificación. Sin embargo, se reitera que, en caso de	Contratista	X		30/04/2025	

identificarse observaciones, se propone la realización de una mesa técnica para su análisis y resolución.					
5. En lo referente a la seguridad y salud en el trabajo de la obra, la interventoría informa que, a través del oficio de presunto incumplimiento CIPZ-078-0213-2025, una de las observaciones que realizaron al contratista de obra fueron las líneas de vida, puesto que, luego de varias visitas en obra por parte del profesional en seguridad y salud en el trabajo y el recorrido realizado el 14 de abril del presente por esta última y un asesor profesional en salud ocupacional por parte de la interventoría, se constató que no cumplían. Por otro lado, la interventoría manifiesta que, el contratista de obra recibió una visitar por parte de la ARL, por lo que se solicita el envío de un informe con la información la cual dictamino la ARL. Debido a que, según la profesional SST de interventoría dichas observaciones tuvieron concordancia con lo que previamente se le ha objetado y solicitado al contratista en cuanto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, la interventoría precisa que, si persisten las observaciones y falencias en este aspecto, se deberán suspender actividades en altura hasta que cumplan y se hará el respectivo informe de incumplimiento. Dado que, en el momento que suceda un accidente o siniestro la ARL posiblemente no se haría cargo. La interventoría precisa que, en relación con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en obra, se han remitido diversos oficios al contratista, entre los cuales se encuentran los radicados CIPZ-078-0161-2025, CIPZ-078-0181-2025, CIPZ-078-0197-2025 y CIPZ-078-0222-2025, estableciéndose como plazo máximo el 21 de abril del presente año para la subsanación de los requerimientos formulados. En respuesta, el 21 de abril, mediante el oficio EV-C358-23-0365-25, el contratista comunicó haber tenido un inconveniente con el proveedor de la malla, uno de los elementos requeridos, sin embargo, omitió dar respuesta a las demás observaciones realizadas. En consecuencia, la interventoría otorga al contratista de obra un plazo hasta el viernes 25 de abril del presente año para subsanar la totalidad de los requerimientos pendientes o, en su defecto, presentar un informe detallado que justifique la imposibilidad de hacerlo. En respuesta a lo previamente comunicado por la interventoría, el contratista manifiesta que la malla de protección será entregada en obra en la fecha de hoy. Adicionalmente, informa que el personal designado para su instalación se movilizará y estará disponible en el sitio de trabajo el sábado 26 de abril del presente año para llevar a cabo dicha labor.	Contratista Contratista	X X		25/04/2025 26/04/2025	

6. Con respecto al Plan de manejo ambiental (PMA), la interventoría informa que, mediante oficio EV-C358-23-0343-25 el contratista de obra realizo el envió del PMA para actualización, de lo cual se remitió una serie de observaciones mediante oficio CIPZ-078-0225-2025 del 21 de abril del presente, y de lo cual a la fecha se esta a la espera de la respuesta. En respuesta, el contratista manifiesta que, su profesional ambiental se encuentra en la elaboración de las subsanaciones correspondientes.	Contratista	X		25/04/2025	
7. En cuanto al tema del apantallamiento provisional del edifcio como medida de seguridad para el trabajo en alturas, estaba pendiente que, el contratista enviara el calculo del pararrayo y del procedimiento a realizar. El contratista realiza hoy la entrega fisica mediante oficio EV-C358-23-368-2025 del calculo del apantallamiento. Lo cual se encuentra sujeto a revisión por parte de la interventoría.	Interventoría Contratista	X		30/04/2025	
8. En relación con el pago del Acta Parcial de Obra N° 1, la supervisión manifiesta su disposición para avanzar en el proceso. No obstante, precisa que, previamente, existen dos observaciones puntuales referentes a la prefactura y al certificado de pago de aportes parafiscales. En virtud de lo anterior, la supervisión procederá a emitir el oficio de requerimiento correspondiente para la subsanación de estas observaciones y la posterior continuación del trámite de pago. Por otra parte, la supervisión informa que el acta parcial de cobro presentada por la interventoría también fue objeto de revisión. Actualmente, se encuentra a la espera de tramitar el acta correspondiente al contratista para, posteriormente, dar curso al trámite del acta de la interventoría.	Entidad	X		30/04/2025	
9. Por otro lado, con respecto a los diseño electricos, el profesional electrico del consultor presentó un resumen de los cálculos de carga eléctrica de la torre, comparando los datos del año 2023 con las proyecciones para el año 2025. Los puntos principales discutidos fueron: ➢ **Carga del Transformador:** - En 2023, la carga calculada fue de 296 kV, dejando una reserva de 4 kV para el transformador de 300 kV. - Para 2025, la carga proyectada disminuyó a 291 kV. - Se aclaró que estos cálculos no incluyen reservas adicionales. ➢ **Normativa y Reserva**: - El consultor señaló que no existe una norma colombiana					

(RETI o NTC) que exija un porcentaje específico de reserva para los transformadores. - Compartió experiencias, como el caso del Hospital de un municipio del cauca con un transformador de 300 kV y un consumo máximo de 60 kV, para ilustrar que los consumos reales suelen ser significativamente menores a la capacidad instalada. - Mencionó que la normativa colombiana se basa en la norma estadounidense NEC, la cual tiene cálculos complejos para las tomas de corriente. ➢ **Cálculo de Tomas:** - Se detalló el método normativo para calcular la demanda de los tomas, el cual asume una simultaneidad de uso exagerada. - Se ejemplificó con una situación donde, de 8 tomas existentes, solo uno estaba en uso, contrastando con la metodología de cálculo que sobreestima la demanda real. ➢ **Análisis Comparativo de Cargas (2023 vs. 2025):** - Se realizó una comparación de las cargas entre 2023 y 2025, mostrando un aumento en la carga de los tomas normales debido a la configuración de los espacios. - La carga del aire acondicionado se mantuvo en 160 KVA, aunque en una propuesta anterior (enero 2025) se había considerado un equipo de 100 KVA, lo que habría resultado en un ahorro de 60 KVA de reserva en el transformador. - Otras cargas como el regulador (+2 KVA) y la bomba contra incendios (90 KVA asumidos verbalmente) también fueron consideradas. ➢ **Bomba Contra Incendios:** - El contratista de obra enfatizó la necesidad de aclarar las especificaciones definitivas de la bomba contra incendios (ubicación, tipo, potencia: 90, 45 o 30 KVA), ya que esta información es crucial para el diseño eléctrico. - El consultor expresó su opinión, basada en su conocimiento de la parte sanitaria, de que la potencia de 90 KVA propuesta inicialmente por el contratista era un poco sobredimensionada. - Se reiteró que los 90 KVA asumidos inicialmente para la bomba contra incendios se consideran suficientes para su operación. - El punto de ubicación del tanque asociado a la bomba se					

está trabajando con la entidad y se espera consolidar la información próximamente. - Se mencionó que la demanda de agua ya está definida, faltando únicamente las medidas exactas del tanque existente (volumen conocido de 380 m³). - Se proyecta un consumo de agua para 1.200 personas, lo que requeriría una capacidad de almacenamiento de 1.440 m³ para una normalidad de 48 horas, estimando un consumo de 600 litros por persona al día. ➢ **Factor de Demanda del Aire Acondicionado:** - Se recordó que el cálculo actual considera un factor de demanda del 60% para los equipos de aire acondicionado. - Se expresó la opinión de que con un factor de demanda del 30%, la potencia instalada podría ser menor (300 KVA serían suficientes en lugar de 500 KVA), considerando que el uso simultáneo al 60% se percibe como exagerado. ➢ **Planos Eléctricos**: Se informó que los planos eléctricos detallados ya están listos y organizados. ➢ **Laboratorios y Aire Acondicionado:** Se consultó sobre la funcionalidad de los laboratorios a ser instalados (investigación académica) para determinar si su demanda de aire acondicionado puede ser considerada dentro de los factores de diversidad, a diferencia de laboratorios clínicos con funcionamiento continuo. Se confirmó que, al ser laboratorios de investigación académica, se pueden demandar según lo planteado en la consultoría. ➢ **Diagrama Unifilar Definitivo y Modificación Propuesta:** - Se presentó el diagrama unifilar definitivo. - Se explicó una modificación propuesta por el contratista (a través del ingeniero Edgar Galvis apoyo electrico del contratista al diseño original, la cual consistio en: ✓ Separar el tablero de transferencia del tablero de distribución. ✓ Ubicar la transferencia en la subestación (exterior) y el tablero de distribución dentro del edificio. ✓ Esta modificación busca acortar las distancias de los alimentadores de cable, generando un posible ahorro en cableado.					

✓ Se indicó que el diseño actual responde a esta solicitud y que se requiere sustentar, justificar y presentar formalmente esta modificación. Se manifestó por parte de la entidad, una inquietud por la realización de ajustes al diseño original presentado al Ministerio, dada la sensibilidad de cualquier cambio. En respuesta, el consultor aclaró que, desde la perspectiva eléctrica, la modificación propuesta es un cambio en la organización de los tableros, no un cambio en el criterio general del diseño ni en la afectación de equipos. Los mismos equipos de transferencia se reubican, lo que genera un beneficio en la longitud del cableado. ➢ **Nuevas Cargas de Equipos:** - Se señaló que, posterior a la entrega inicial del diseño, hubo un incremento en las cargas eléctricas debido a cambios en los equipos propuestos por la entidad en enero. - Se planteó la necesidad de hablar con el Ministerio para justificar este incremento de cargas, ya que los equipos de 2020 (considerados en el diseño inicial) son diferentes a los actuales. Es por ello, que la interventoria precisa que el aumento de las cargas deben quedar muy bien justificados por parte del contratista de la mano de la entidad, dado que en aquel momento la entidad presentó otros equipos, teniendo en cuenta que la matriz de equipos es un documento reciente. - Se planteó la necesidad de establecer comunicación con el Ministerio para justificar el incremento de las cargas, motivado por la diferencia entre las especificaciones de los equipos considerados en el diseño inicial (correspondientes al año 2020) y las características de los equipos actuales. En este sentido, la interventoría enfatiza que el aumento de dichas cargas debe ser debidamente soportado y justificado por el contratista, en colaboración con la entidad contratante, considerando que en su momento la entidad presentó información sobre equipos distintos. Es importante tener en cuenta que la matriz de equipos es un documento de reciente elaboración, por lo cual la justificación debe ser clara y precisa con la información previamente suministrada por la entidad. ➢ **Matriz de Equipos Biomédicos:** - Se aclaró que la matriz de equipos biomédicos es un documento de implementación reciente (mediados del año pasado) y no era un requisito en consultorías anteriores. - Se enfatizó que la responsabilidad de la carga de los equipos recae en la entidad, y la consultoría busca brindar					

el soporte técnico para justificar cualquier cambio ante las autoridades. ➢ **No Previstos (NPs) Eléctricos:** - Se identificaron elementos no previstos en el contrato para los alimentadores de cable, surgidos a partir de las modificaciones y la nueva configuración del edificio. - Se aclaró que la identificación y presentación formal de estos no previstos es responsabilidad del contratista, quien debe analizarlos y presentarlos a la interventoría para su aval y posterior aprobación por la entidad. - Se destacó por parte de la entidad y la interventoria la necesidad de una gestión ágil de los no previstos para evitar retrasos en la ejecución del proyecto. - El contratista de obra manifestó su postura de requerir la aprobación y la definición de la forma de pago de los no previstos antes de proceder con su ejecución, para evitar riesgos financieros. ➢ **Comunicación con el Ministerio:** Se resaltó la importancia de mantener informado al Ministerio sobre los cambios y las justificaciones, idealmente de manera progresiva y organizada, para evitar inconvenientes y asegurar la licencia del proyecto. La interventoria sugiere que, una vez se disponga de la información que el Ingeniero Felipe profesional electrico de la consultoria ha presentado, se inicie la elaboración de la justificación correspondiente. Es importante destacar que la presentación tardía de información relevante en etapas avanzadas del proceso podría generar inconvenientes, como se presume ocurrió anteriormente. En este sentido, la interventoria propone mantener una comunicación con el ministerio e informar seguidamente sobre los avances. Por ejemplo, respecto a la matriz de equipos (un requerimiento no solicitado inicialmente, pero ahora incorporado según las indicaciones del consultor y proporcionado por el hospital en concordancia con el proyecto futuro), se solicita la entrega formal de la justificacion biomedica o tecnica de la matriz de equipos por parte de la entidad, ya que, de esta manera, se podrá informar de manera oportuna sobre posibles ajustes o desarrollos significativos, asegurando que, al momento de la consolidación final de la documentación, se cuente con la certeza de su correcta fundamentación. En virtud de lo anterior, la supervision propone que la ruta de trabajo sea realizar una mesa tecnica, donde se realice una evaluacion de todo con acompañamiento de la consultoria y el el personal que realizó la matriz de caracterizacion con el fin					

de abordar todos los puntos antes de tomar una decision. Por lo cual se propone realizar dicha reunion el viernes 25 de abril a las 3:00 p.m.  					

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comite 46.

FECHA: 23 Abril 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Edgar Galvis.	Evolet.	Asesor	edgarc2074@gmail.com	
2	Carlos A. Cordoba	Consorcio Evolet.	RL Suplente	consorcioevolet.@Gmail.com	
3	Isabel Giraldo	evolet	R Legal		
4	Marco Antonio Velasco Mejia	HUSJ	Apoyo de Supervisión	mantenimiento@hospital.gov.co	
5	David Isidro Lemus	HUSJ	Apoyo Electrico	Electricohospital@hospitalsanjose.gov.co	
6	Felipe Restrepo	Consult evolet	esp electrico	frestrepo@eferestrepo.com	
7	Michelle Vanessa Prado M	Consorcio Intersalud PZ	Rep Legal	intersaludpz@gmail.com	
8	Juan Francisco Hoyos	H.U.S.J.	Supervisor ctto 358 2023	———	
9	ALBERTO PEÑA RIVERA	CONSORCIO EVOLET	APOYO JURIDICO	alberto.penvera@gmail.com	
10	Jose J. Perafan L.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
11	Andrés Fabián Tálaga Sandoval	HUSJ	Consultor	aftosa@Gmail.com	
12	Angelica Ordoñez Cortes	Intersalud PZ	Interventoria		
13					

ANEXO 5. TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA CRUZADA ABRIL 2025

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
1/04/2025	CIPZ-078-192-2024	CONVOCATORIA ESPECIALISTAS DE SUELOS – OFICIO ENTIDAD 31 DE MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
1/04/2025	CIPZ-078-193-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0328-25 Y COMPROMISOS MESA TECNICA RED DE MEDIA TENSION 1 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0328-25
2/04/2025	CIPZ-078-0194-2025	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0318-25 DEL 25 DE MARZO DE 2025 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN INICIO DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERÍA.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0318-25
2/04/2025	CIPZ-078-0195-2025	DOCUMENTACION FISICA CONTRATO N°358 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0342-25
3/04/2025	CIPZ-078-0196-2025	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-0310-25 DEL 20 DE MARZO DE 2025 - LIBERACION REDES SANITARIAS.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0310-25
4/04/2025	CIPZ-078-0197-2025	OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
4/04/2025	CIPZ-078-0198-2025	CONVOCATORIA REUNION ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA 4 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO - Ingenierio DIDIER GOLONDRINO Profesional Universitario Infraestructura Hospitalaria			X	

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
4/04/2025	CIPZ-078-0199-2025	RESPUESTA OFICIO DEL 3 DE ABRIL DE 2025 – "SOLICITUD REMISION DE INFORME SIN SANCIONES TASADAS EN RESPUESTA AL OFICIO DEL 17 DE MARZO DE 2025"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ		X		17-mar-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
5/04/2025	CIPZ-078-0200-2025	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-034-25 del 2 DE ABRIL DE 2025 - OBSERVACIONES BALANCE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-034-25
7/04/2025	CIPZ-078-0201-2025	EJECUCIÓN APANTALLAMIENTO DEL EDIFICIO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
7/04/2025	CIPZ-078-0202-2025	REMISIÓN RESPUESTAS EV-C358-23-0312-25 EV-C358-23-339-25 – CANCELACIÓN FUNDICIÓN 25 DE MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
7/04/2025	CIPZ-078-0203-2025	PROPUESTAS TRAZADO RED DE MEDIA TENSIÓN	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
9/04/2025	CIPZ-078-0204-2025	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ		X		
8/04/2025	CIPZ-078-0205-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-342-25 Y DOCUMENTACIÓN FISICA CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				EV-C358-23-342-25
9/04/2025	CIPZ-078-0206-2025	REMISION RESPUESTA 8 ABRIL – "RESPUESTA OFICIO INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA."	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		8-abr-25
9/04/2025	CIPZ-078-0207-2025	REMISIÓN RESPUESTA ENTIDAD PROPUESTAS TRAZADO RED DE MEDIA TENSIÓN CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		8-abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
9/04/2025	CIPZ-078-0208-2025	PROGRAMACIÓN RECORRIDO SG-SST LUNES 14 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL			X	
11/04/2025	CIPZ-078-0209-2025	REMISION OFICIO EV-C358-23-0325-25, “REITERACIÓN DE SOLICITUDES REFERENTE A LOS DISEÑOS DEL PROYECTO”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ	X			
11/04/2025	CIPZ-078-0211-2025	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
11/04/2025	CIPZ-078-0212-2025	REMISION OFICIO ENTIDAD 11 ABRIL 2025 “SOLICITUD DE GESTIÓN PARA REAJUSTE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – CONTRATO NO. 358	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
14/04/2025	CIPZ-078-0213-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		
14/04/2025	CIPZ-078-0214-2025	RESPUESTA OFICIO “CRONOGRAMA” 12 ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		12-abr-25
14/04/2025	CIPZ-078-0215-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DEL ACTA PARCIAL No 1 – OBRA E INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ		X		
14/04/2025	CIPZ-078-0216-2025	REVISION DE PREACTA N°2, CON ANEXOS N°1 DEL 2 DE ABRIL DE 2025, N°2 DEL 5 DE ABRIL DE 2025, Y N°3 DEL 9 DE ABRIL DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
14/04/2025	CIPZ-078-0217-2025	CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO – CONTRATO DE OBRA N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
15/04/2025	CIPZ-078-0218-2025	REVISION AJUSTES BALANCE DE OBRA DEL 8 DE ABRIL DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
16/04/2025	CIPZ-078-0219-2025	OBSERVACIONES AL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PMA PARA EL MES DE MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
16/04/2025	CIPZ-078-0220-2025	REMISION OFICIO ENTIDAD 15 ABRIL 2025 – "RESPUESTA A SOLICITUD SOBRE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
16/04/2025	CIPZ-078-0221-2025	REMISION INFORMES MENSUALES MARZO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
22/04/2025	CIPZ-078-0222-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
21/04/2025	CIPZ-078-0223-2025	REVISION DE PREACTA N°2, DEL 14 DE ABRIL DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
21/04/2025	CIPZ-078-0224-2025	CONVOCATORIA REUNION COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ - ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
21/04/2025	CIPZ-078-0225-2025	OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
22/04/2025	CIPZ-078-0226-2025	REVISION DE JOIST SUMINISTRADOS LOSA ENTREPISO N° 4	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
23/04/2025	CIPZ-078-0227-2025	CONTROL DE ASENTAMIENTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIO DE SUELOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
24/04/2025	CIPZ-078-0228-2025	REMISION OBSERVACIONES ENTIDAD ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
24/04/2025	CIPZ-078-0229-2025	REVISION AJUSTES BALANCE DE OBRA DEL 16 DE ABRIL DE 2025. OFICIO EV - C58-23-359-2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
25/04/2025	CIPZ-078-0230-2025	REMISIÓN OFICIOS ENTIDAD – "REVISORIA FISCAL Y RUTA DE COMUNICACIÓN"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: abr-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
25/04/2025	CIPZ-078-231-2025	RESPUESTA OFICIO EV -C58-23-370-2025, "ENTREGA PREFACTURA Y CERTIFICADO PARAFISCALES"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
25/04/2025	CIPZ-078-232-2025	RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 24 ABRIL 2025 – "SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION DE RESPALDO DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATO N°358 DE 2023"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
25/04/2025	CIPZ-078-0233-2025	REVISION DE PLANO DE FABRICACION JOIST LOSA ENTREPISO N°4 (N+15.40)	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
25/04/2025	CIPZ-078-0234-2025	SOLICITUD DE REVISIÓN DE INFORME MENSUAL – ABRIL 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
28/04/2025	CIPZ-078-0235-2025	REENVIO RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 24 ABRIL 2025 – "SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION DE RESPALDO DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
29/04/2025	CIPZ-078-0236-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0374-25 Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
28/04/2025	CIPZ-078-0237-2025	REMISIÓN FACTURA COBRO ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
1/04/2025	EV-C358-23-0331-25	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.				
1/04/2025	EV-C358-23-0332-25	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Reporte personal obra.				
1/04/2025	EV-C358-23-0333-25	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cierre de vía Cali - Popayán.				
1/04/2025	EV-C358-23-0334-25	1/04/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de pantallas y columnas del cuarto piso.				
1/04/2025	n.a	1/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de pantallas y columnas del cuarto piso.				
2/04/2025	EV-C358-23-0337-25	2/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Propuestas de trazado para la línea de media tensión presentadas por el Consorcio EVOLET en el Comité del 01 de abril de 2025				
3/04/2025	n.a	3/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de remision de informe sin sanciones tasadas en respuesra al oficio 17 de marzo 2025				
4/04/2025	EV-C358-23-338-24	4/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Asignación de proveedores.				
5/04/2025	EV-C358-23-340-24	5/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Remisión planos estructurales actualizados				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
5/04/2025	EV-C358-23-342-25	5/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0195-2025- Solicitud de correspondencia en medio físico.				
7/04/2025	EV-C358-23-339-24	7/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0185-2025- solicitud de ampliación de la información referente al impacto ocasionado en la reprogramación de la				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
7/04/2025	EV-C358-23-0343-25	7/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Ajuste Plan de manejo ambiental				
7/04/2025	n.a	7/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud probatoria dentro del expediente Ético – Disciplinario PD-CAU-2024-000009 (E202414190062714) - 9106330.				
2/04/2025	EV-C358-23-0344-25	2/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio de la Interventoría CIPZ-078-0200-2025 relacionado con el balance del contrato de obra No 358 de 2023.				
8/04/2025	n.a	8/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO CIPZ-078-166-2025, RESPUESTA OFICIO INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA.				
8/04/2025	N.A	8/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME DE FIDUCIA N°4				
8/04/2025	N.A	8/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO CIPZ-078-203-2025, PROPUESTAS TRAZADO RED DE MEDIA TENSIÓN CONTRATO N°358 2023				
9/04/2025	EV-C358-23-0346-25	9/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de informe No. 5 de fiducia.				
9/04/2025	EV-C358-23-0348-25	9/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Envío de planilla de ss				
9/04/2025	EV-C358-23-0325-25	9/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteracion solicitud diseños del proyecto				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
11/04/2025	EV-C358-23-0351-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de pantallas y columnas del cuarto piso.				
11/04/2025	EV-C358-23-0352-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Labores semana santa.				
11/04/2025	n.a	11/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de gestión para reajuste del cronograma de ejecución – Contrato No. 358 de 2023				
12/04/2025	CIPZ-078-0353-2025	12/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cronograma.				
14/04/2025	EV-C358-23-0355-2025	14/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Cronograma y atención al oficio No. CIPZ-078-0214-2025.				
12/04/2025	EV-C358-23-354-2025	12/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Estado del acta de obra No. 1.				
11/04/2025	EV-C358-23-0345-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio de la Interventoría CIPZ-078-0201-2025 relacionado con la ejecución del apantallamiento del edificio.				
14/04/2025	EV-C358-23-0356-25	14/04/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Respuesta oficio CIPZ-078-0197-2025				
11/04/2025	EV-C358-23-0345-25	11/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio de la Interventoría CIPZ-078-0201-2025 relacionado con la ejecución del apantallamiento del edificio.				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
15/04/2025	EV-C358-23-359-2025	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Planos de fabricación de vigas joist.				
15/04/2025	n.a	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD	Respuesta a solicitud sobre revision y aprobacion acta N°1 del contrato 358 2023				
15/04/2025	EV-C358-23-0361-25	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta a Oficio CIPZ-078-0207-2025 – trazado de la línea de media tensión.				
15/04/2025	EV-C358-23-0362-25	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta a Oficio CIPZ-078-0206-2025 – Instalación Sistema de Medición de Consumo Eléctrico Provisional				
15/04/2025	EV-C358-23-359-2025	15/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0218-2025- Atención a las observaciones realizadas al balance de obra del 8 de abril del 2025.				
16/04/2025	EV-C358-23-363-2025	16/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Planos de fabricación de vigas joist cuarto piso actualizado 16 abril del 2025.				
16/04/2025	EV-C358-23-364-2025	16/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Planos de fabricación de vigas joist cuarto piso actualizado 16 abril del 2025.				
21/04/2025	EV-C358-23-0365-25	21/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Fecha para instalación de malla contra caídas.				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
21/04/2025	EV-C358-23-0366-25	21/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.				
22/04/2025	n.a	22/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Requerimiento para subsanar inconsistendias en prefactura y documentacion anexa- contrato 358 de 2023				
23/04/2025	EV-C358-23-0368-25	23/04/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteración oficio EV-C358-23-0325-25 del 9 de abril de 2025 solicitud referente a diseños del proyecto.				
23/04/2025	EV-C358-23-0369-25	23/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REQUISITOS PARA INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A OBRA				
23/04/2025	EV-C358-23-0368-25	23/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	requerimientos electricos para la ejeuccon de obra				
24/04/2025	n.a	25/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de verifixacion de informacion de respaldo del certificado de cumplimiento de olbigaciones laborales del contrato 358 2023				
24/04/2025	n.a	25/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de correcion en la ruta de envio de informacion y documentos				
24/04/2025	EV-C358-23-371-2025	24/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0229-2025- Atención a las observaciones realizadas al balance de obra del 24 de abril del 2025.				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	abr-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
26/04/2025	EV-C358-23-0374-25	31/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reprogramación de fecha para instalación de malla				
26/04/2025	EV-C358-23-0373-25	26/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de entrepiso No 4.				
26/04/2025	EV-C358-23-0375-25	26/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Información visita técnica asesora arl				
28/04/2025	EV-C358-23-0376-25	28/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega de la prefactura correspondiente al acta de obra N°1 corregida junto con el certificado de parafiscales				
25/04/2025	n.a	28/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Aceptacion del cambio de profesional electrico contrato 078 2024				
29/04/2025	EV-C358-23-381-25	29/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud cambio de proveedro-fiducia.				
29/04/2025	EV-C358-23-0382-25	29/04/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega factura correspondiente al acta de obra No.1				
30/03/2025	EV-C358-23-382-2025	30/03/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega de flujo de caja, curva S y reprogramación.				

ANEXO 6. AUTORIZACION DESEMBOLGO UBANER PEREZ

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 04/04/2025 Fecha de Registro de la Orden: 04/04/2025 Fecha de Pago: 07/04/2025

Proveedor: 1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-19073260

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,000,000.00	0.00	0	30,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		30,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		30,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 30,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ		30,000,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	30,000,000.00	
						30,000,000.00	30,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		30,000,000.00	-30,000,000.00
			TOTALES	30,000,000.00	-30,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #739902 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_613649 del 04/04/2025 21:50:55, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	8
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444
Nro. Doc. Tercero:	1061600546
Nombre Tercero:	UBANER PEREZ GOMEZ
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$30,000,000.00
Observaciones:	OP_613649-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 16/05/2025 08:59:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 7. COMPROBANTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO Y ABRIL 2025

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 9

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 14/04/2025 Fecha de Registro de la Orden: 14/04/2025 Fecha de Pago: 14/04/2025

Proveedor: 891580002 - 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 PI_18617-1 pago rendimientos marzo

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PI	186171	14/04/2025	23,690.93

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
23,690.93	0.00	0	23,690.93

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		23,690.93	0.00	0.00
		Totales	23,690.93	0.00	0.00

Valor a Girar: 23,690.93

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 9 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		23,690.93
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	23,690.93	
						23,690.93	23,690.93

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 9

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	1 | 0 | 101 | | | | | | 21	DEVOLUCION EXCEDENTES		23,690.93	-23,690.93
			TOTALES	23,690.93	-23,690.93

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 17

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 16/05/2025 Fecha de Registro de la Orden: 16/05/2025 Fecha de Pago: 16/05/2025

Proveedor: 891580002 - 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: PI_21109 DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS ABRIL

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PI	21109	16/05/2025	19,952.56

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
19,952.56	0.00	0	19,952.56

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		19,952.56	0.00	0.00
		Totales	19,952.56	0.00	0.00

Valor a Girar: 19,952.56

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 17 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	19,952.56	
25110501001	PROVEEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		19,952.56
						19,952.56	19,952.56

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 17

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	1 | 0 | 101 | | | | | | 21	DEVOLUCION EXCEDENTES		19,952.56	-19,952.56
			TOTALES	19,952.56	-19,952.56

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 9. RESISTENCIA CONCRETO CONTRATISTA

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
309	**1784**	**T38**	**4**	12-abr-25	**21-abr-25**	**9**	336,9	1	7933	433	**6160**	42,5	281	**4000**	27,6	154,0	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"
309	**1785**	**T38**	**4**	12-abr-25	**21-abr-25**	**9**	349,7	1	8091	441	**6269**	43,2	281	**4000**	27,6	156,7	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"
309	**1786**	**T38**	**4**	12-abr-25	**21-abr-25**	**9**	374,4	3	8091	472	**6711**	46,3	281	**4000**	27,6	167,8	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2". La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1784 y 1785

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
298	**1673**	**T37**	**4**	03-abr-25	**11-abr-25**	**8**	339,5	4	8252	420	**5968**	41,1	281	**4000**	27,6	149,2	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
298	**1674**	**T37**	**4**	03-abr-25	**11-abr-25**	**8**	306,3	3	8332	375	**5332**	36,8	281	**4000**	27,6	133,3	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1673 y 1675
298	**1675**	**T37**	**4**	03-abr-25	**11-abr-25**	**8**	345,3	3	8252	427	**6069**	41,8	281	**4000**	27,6	151,7	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CALI

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
274	**1571**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	224,4	3	8171	280	**3983**	27,5	281	**4000**	27,6	99,6	20,3	Entrepiso 3 fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra, La muestra 1571, presenta dispersión con respecto a las muestras 1572 y 1573
274	**1572**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	274,9	1	8413	333	**4739**	32,7	281	**4000**	27,6	118,5	20,3	Entrepiso 3 fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra
274	**1573**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	285,1	3	8332	349	**4962**	34,2	281	**4000**	27,6	124,0	20,3	Entrepiso 3 fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra
274	**1574**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	289,6	4	8171	361	**5139**	35,4	281	**4000**	27,6	128,5	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1575**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	286,5	5	8171	358	**5085**	35,1	281	**4000**	27,6	127,1	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1576**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	307,0	3	8171	383	**5450**	37,6	281	**4000**	27,6	136,2	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra, La muestra 1576, presenta dispersión con respecto a las muestras 1574 y 1575
274	**1577**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	294,7	4	8091	371	**5282**	36,4	281	**4000**	27,6	132,1	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1578**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	293,6	3	8171	366	**5211**	35,9	281	**4000**	27,6	130,3	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1579**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	272,0	4	8332	333	**4734**	32,6	281	**4000**	27,6	118,4	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra, La muestra 1579, presenta dispersión con respecto a las muestras 1577 y 1578

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
256	**1474**	**T33**	**4**	21-mar-25	**29-mar-25**	**8**	302,7	5	8171	378	**5372**	37,0	281	**4000**	27,6	134,3	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
256	**1475**	**T33**	**4**	21-mar-25	**29-mar-25**	**8**	315,6	3	8332	386	**5493**	37,9	281	**4000**	27,6	137,3	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
256	**1476**	**T33**	**4**	21-mar-25	**29-mar-25**	**8**	290,1	4	8171	362	**5149**	35,5	281	**4000**	27,6	128,7	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Presenta dispersión con respecto a las muestras 1474 y 1475

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
223	**1154**	**T32**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	275,6	3	8171	344	**4891**	33,7	281	**4000**	27,6	122,3	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1155**	**T32**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	282,4	3	8252	349	**4963**	34,2	281	**4000**	27,6	124,1	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1156**	**T32**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	301,0	4	8495	361	**5138**	35,4	281	**4000**	27,6	128,5	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1157**	**T31**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	323,2	5	8332	396	**5626**	38,8	281	**4000**	27,6	140,7	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1158**	**T31**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	304,5	4	8171	380	**5404**	37,3	281	**4000**	27,6	135,1	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1159**	**T31**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	309,6	3	8171	386	**5496**	37,9	281	**4000**	27,6	137,4	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
204	**1067**	**T25**	**4**	10-feb-25	**11-mar-25**	**29**	311,9	3	8171	389	**5537**	38,2	281	**4000**	27,6	138,4	63,0	C10 - PW1 9 10 PISO 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
309	**1784**	**T38**	**4**	12-abr-25	**21-abr-25**	**9**	336,9	1	7933	433	**6160**	42,5	281	**4000**	27,6	154,0	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"
309	**1785**	**T38**	**4**	12-abr-25	**21-abr-25**	**9**	349,7	1	8091	441	**6269**	43,2	281	**4000**	27,6	156,7	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2"
309	**1786**	**T38**	**4**	12-abr-25	**21-abr-25**	**9**	374,4	3	8091	472	**6711**	46,3	281	**4000**	27,6	167,8	55,0	PW1 7 8 10 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante 1/2". La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1784 y 1785

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
298	**1673**	**T37**	**4**	03-abr-25	**11-abr-25**	**8**	339,5	4	8252	420	**5968**	41,1	281	**4000**	27,6	149,2	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
298	**1674**	**T37**	**4**	03-abr-25	**11-abr-25**	**8**	306,3	3	8332	375	**5332**	36,8	281	**4000**	27,6	133,3	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. La muestra presenta dispersión con respecto a las muestras 1673 y 1675
298	**1675**	**T37**	**4**	03-abr-25	**11-abr-25**	**8**	345,3	3	8252	427	**6069**	41,8	281	**4000**	27,6	151,7	65,0	C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PW2 3, 4, 6,9 PISO 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CALI

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
274	**1571**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	224,4	3	8171	280	**3983**	27,5	281	**4000**	27,6	99,6	20,3	Entrepiso 3 fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra, La muestra 1571, presenta dispersión con respecto a las muestras 1572 y 1573
274	**1572**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	274,9	1	8413	333	**4739**	32,7	281	**4000**	27,6	118,5	20,3	Entrepiso 3 fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra
274	**1573**	**T34**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	285,1	3	8332	349	**4962**	34,2	281	**4000**	27,6	124,0	20,3	Entrepiso 3 fibra	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra
274	**1574**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	289,6	4	8171	361	**5139**	35,4	281	**4000**	27,6	128,5	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1575**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	286,5	5	8171	358	**5085**	35,1	281	**4000**	27,6	127,1	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1576**	**T35**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	307,0	3	8171	383	**5450**	37,6	281	**4000**	27,6	136,2	19,1	Entrepiso 3 ejes 1" A3 Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra, La muestra 1576, presenta dispersión con respecto a las muestras 1574 y 1575
274	**1577**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	294,7	4	8091	371	**5282**	36,4	281	**4000**	27,6	132,1	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1578**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	293,6	3	8171	366	**5211**	35,9	281	**4000**	27,6	130,3	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
274	**1579**	**T36**	**4**	27-mar-25	**03-abr-25**	**7**	272,0	4	8332	333	**4734**	32,6	281	**4000**	27,6	118,4	20,3	Entrepiso 3 Eje 3 a 6" Vigas	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se refuerza con microfibra, La muestra 1579, presenta dispersión con respecto a las muestras 1577 y 1578

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
256	**1474**	**T33**	**4**	21-mar-25	**29-mar-25**	**8**	302,7	5	8171	378	**5372**	37,0	281	**4000**	27,6	134,3	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
256	**1475**	**T33**	**4**	21-mar-25	**29-mar-25**	**8**	315,6	3	8332	386	**5493**	37,9	281	**4000**	27,6	137,3	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
256	**1476**	**T33**	**4**	21-mar-25	**29-mar-25**	**8**	290,1	4	8171	362	**5149**	35,5	281	**4000**	27,6	128,7	N.S	C3.6.78.9.10 PW8 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Presenta dispersión con respecto a las muestras 1474 y 1475

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
223	**1154**	**T32**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	275,6	3	8171	344	**4891**	33,7	281	**4000**	27,6	122,3	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1155**	**T32**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	282,4	3	8252	349	**4963**	34,2	281	**4000**	27,6	124,1	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1156**	**T32**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	301,0	4	8495	361	**5138**	35,4	281	**4000**	27,6	128,5	N.S	PW3 4 5 9 - C1 C5 PISO 3 R	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1157**	**T31**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	323,2	5	8332	396	**5626**	38,8	281	**4000**	27,6	140,7	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1158**	**T31**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	304,5	4	8171	380	**5404**	37,3	281	**4000**	27,6	135,1	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
223	**1159**	**T31**	**4**	08-mar-25	**15-mar-25**	**7**	309,6	3	8171	386	**5496**	37,9	281	**4000**	27,6	137,4	N.S	PW1 2 6 7 10 - C2 C4 PISO 3	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
204	**1067**	**T25**	**4**	10-feb-25	**11-mar-25**	**29**	311,9	3	8171	389	**5537**	38,2	281	**4000**	27,6	138,4	63,0	C10 - PW1 9 10 PISO 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

ANEXO 10. RESISTENCIA CONCRETO INTERVENTORIA

INGEOTED S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 637

SOLICITADO POR CONSORCIO INTERSALUD PZ **REFERENCIA**

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCES DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

LOCALIZACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE POPAYÁN, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA CONSORCIO INTERSALUD PZ

RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa): 28 ASENTAMIENTO (cm): TOMA REALIZADA POR: CLIENTE

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE	TIPO DE FALLA
								Mpa	PSI			
1	1	VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +7,60 - PISO 3)	27/02/2025	14/05/2025	76	386,9	8251,6	46,9	6698	167,5	SI	3
	2		27/02/2025	14/05/2025	76	385,0	8251,6	46,7	6665	166,6	SI	3
2	3	PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +7,60 - PISO 3)	21/03/2025	14/05/2025	54	444,1	8091,4	54,9	7840	196,0	SI	3
	4		21/03/2025	14/05/2025	54	442,4	8011,8	55,2	7888	197,2	SI	3

INGEOTED
INGENIERIA, GEOTECNIA, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS

REALIZÓ

BAIRON FELIPE MACA GIRÓN
GEOTECNOLOGO M.P. 063016-0693216CAU

REVISÓ

JUAN SEBASTIAN URBANO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGEOTED S.A.S.

INGEOTED S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 637

SOLICITADO POR CONSORCIO INTERSALUD PZ **REFERENCIA**

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCES DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

LOCALIZACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE POPAYÁN, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA CONSORCIO INTERSALUD PZ

RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa): 28 ASENTAMIENTO (cm): TOMA REALIZADA POR: CLIENTE

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE	TIPO DE FALLA
								Mpa	PSI			
3	5	VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +11,50 - PISO 4)	27/03/2025	14/05/2025	48	417,7	8171,3	51,1	7302	182,6	SI	3
	6		27/03/2025	14/05/2025	48	414,8	8091,4	51,3	7323	183,1	SI	3
	7		27/03/2025	14/05/2025	48	412,6	8011,8	51,5	7356	183,9	SI	3
4	8	PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +11,50 - PISO 4)	3/04/2025	14/05/2025	41	414,8	8171,3	50,8	7251	181,3	SI	1
	9		3/04/2025	14/04/2025	41	415,8	8171,3	50,9	7269	181,7	SI	3

INGENIERIA, GEOTECNIA, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS

REALIZÓ

BAIRON FELIPE MACA GIRÓN
GEOTECNOLOGO M.P. 063016-0693216CAU

REVISÓ

JUAN SEBASTIAN URBANO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGEOTED S.A.S.
