| | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. |
| OBJETO DEL PROYECTO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023". |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERSALUD PZ |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO EVOLET |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO: | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 16 (PERIODO MAYO 26 - JUNIO 25 DE 2025) |

## CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°16

CONSORCIO INTERSALUD PZ

| | |
|---|---|
| **Elaboró: Jesús Edinson Perafan**<br>Residente de Interventoría | **Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M.**<br>Representante legal<br>Consorcio Intersalud PZ |

JUNIO 25 DE 2025

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... 9
2.1. Localización ..... 10
2.2. Justificación ..... 11
2.3. Características del Proyecto. ..... 12
3.1. Contrato de Obra. ..... 13
3.2. Póliza del Contrato de Obra. ..... 14
3.3. Contrato de Interventoría. ..... 16
3.4. Pólizas de Interventoría. ..... 17
4.1. Gestión Administrativa ..... 18
4.1.1 Personal de Interventoría ..... 18
4.1.2 Personal del contratista de obra. ..... 19
4.1.3. Comités de obra. ..... 19
4.1.4 Correspondencia Cruzada ..... 20
4.2. Gestión Técnica ..... 26
4.2.1 Avance de obra ..... 26
4.3. Gestión Financiera ..... 102
4.4. Gestión Socioambiental ..... 112
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 130
Trabajo de alturas: ..... 147
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA ..... 153
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION. ..... 153
8. CONCLUSIONES ..... 158

## Tabla de ilustraciones

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. ..... 10
Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1. ..... 31
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 ..... 32
Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3. ..... 33
Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. ..... 34
Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. ..... 35
Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. ..... 36
Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2 ..... 37
Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3. ..... 38
Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. ..... 39
Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. ..... 40
Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. ..... 41
Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. ..... 41
Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. ..... 42
Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. ..... 43
Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. ..... 44
Ilustración 17. Detalle losa de entrepiso ..... 45
Ilustración 18. Detalle joist VT 02..... 45
Ilustración 19. Detalle joist VT 03..... 46
Ilustración 20. Detalle joist VT 04..... 46
Ilustración 21. Detalle joist VT 05..... 47
Ilustración 22. Detalle joist VT 06..... 47

Ilustración 23. Detalle joist VT 07..... 48
Ilustración 24. Detalle joist VT 08..... 48
Ilustración 25. Detalle joist VT 09..... 49
Ilustración 26. Detalle joist VT 10..... 49
Ilustración 27. Detalle joist VT 11..... 50
Ilustración 28. Detalle joist VT 12..... 50
Ilustración 29. Detalle joist VT 13..... 51
Ilustración 30. Disposición de vigas joist entrepiso 5 N+19.30. ..... 52
Ilustración 31. Detalle joist VT 02..... 53
Ilustración 32. Detalle joist VT 03..... 53
Ilustración 33. Detalle joist VT 04..... 54
Ilustración 34. Detalle joist VT 05..... 54
Ilustración 35. Detalle joist VT 06..... 55
Ilustración 36. Detalle joist VT 07..... 55
Ilustración 37. Detalle joist VT 10..... 56
Ilustración 38. Detalle joist VT 11..... 56
Ilustración 39. Detalle joist VT 12..... 57
Ilustración 40. Detalle joist VT 13..... 57
Ilustración 41. Disposición de vigas joist entrepiso 6 N+23.20 ..... 58
Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga A N +19.30..... 59
Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga A' N+19.30 ..... 60
Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga B N +19.30..... 61
Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga C N +15.40..... 62
Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +15.40 ..... 63

Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +15.40..... 64
Ilustración 48. Disposición de refuerzo viga E (1-6) N +19.30 ..... 65
Ilustración 49. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*) ..... 66
Ilustración 50. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*) N +19.30 ..... 66
Ilustración 51. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +19.30..... 67
Ilustración 52. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) N +19.30..... 67
Ilustración 53. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E) N +15.40 ..... 68
Ilustración 54. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +19.30..... 68
Ilustración 55. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C) N +19.30 ..... 69
Ilustración 56.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +15.40..... 69
Ilustración 57. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E) N +19.30..... 70
Ilustración 58. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +19.30..... 70
Ilustración 59. Disposición de refuerzo viga 5 ' (B-E) N +15.40 ..... 71
Ilustración 60. Disposición de refuerzo viga A. ..... 71
Ilustración 61. Disposición de refuerzo viga A'..... 72
Ilustración 62. Disposición de refuerzo viga B ..... 73
Ilustración 63. Disposición de refuerzo viga B*(5-6*)..... 73
Ilustración 64. Disposición de refuerzo viga C ..... 74
Ilustración 65. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)..... 75
Ilustración 66. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') ..... 76
Ilustración 67. Disposición de refuerzo viga E (1-6)..... 77
Ilustración 68. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)..... 77
Ilustración 69. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)..... 78
Ilustración 70. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) ..... 78

Ilustración 71. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) ..... 79
Ilustración 72. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E) ..... 79
Ilustración 73. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) ..... 80
Ilustración 74. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C) ..... 80
Ilustración 75.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) ..... 81
Ilustración 76. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)..... 81
Ilustración 77. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) ..... 82

## Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra ..... 14
Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra..... 14
Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra..... 15
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra..... 15
Tabla 5. Contrato de Interventoría ..... 16
Tabla 6. Pólizas de Interventoría ..... 17
Tabla 7. Personal de Interventoría. ..... 18
Tabla 8. Personal del contratista de obra. ..... 19
Tabla 9. Actas de comité ..... 19

## Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra. ..... 15

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría. ..... 17

Anexo 3. Planillas personal Interventoría ..... 18

Anexo 4. Actas de comité mayo- junio de 2025 ..... 20

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. ..... 26

Anexo 6. Informe mensual del periodo del 26 mayo al 25 de junio de 2025 del contratista de obra ..... 153

Anexo 7. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA ..... 157

Anexo 8. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA ..... 158

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE MAYO A 25 DE JUNIO DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

## 2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.




*Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.*

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

### 2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

### 2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

## 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

### 3.1. Contrato de Obra.

| **CONTRATO N° 358 DE 2023** | |
|---|---|
| Firma contratista | **CONSORCIO EVOLET** |
| NIT | 901.784.507-4 |
| Objeto del contrato | Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. |
| Valor del contrato incluido el AIU | Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte ($32.473.928.569) |
| Contrato N° | 358 de 2023 |
| Acta de Inicio | 22 de marzo de 2024. |
| Plazo inicial estimado | Veinte (20) meses. |
| Ampliación de plazo | Ciento setenta y dos (172) días |
| Plazo final estimado | Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días |
| Fecha de terminación inicial | 22 de noviembre de 2025. |
| Fecha de terminación final | 13 de mayo de 2026. |
| Registro presupuestal | 1348 del 27 de diciembre de 2023. |
| Imputación Presupuestal | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023. |

*Tabla 1. Contrato de obra*

### 3.2. Póliza del Contrato de Obra.

| **Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 3** | **Vigencia** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento del Contrato | 22-marzo-2024 | 23-marzo-2026 | $ 6.494.785.713,80 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 22-marzo-2024 | 23-marzo-2026 | $ 9.742.178.570,70 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 22-marzo-2024 | 23-nov-2028 | $ 1.623.696.428,45 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Cinco (5) años. | | $ 3.247.392.856,90 |

*Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra*

| **Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 3** | **Vigencia** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Predios, labores y operaciones | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45 |
| Daño emergente y lucro cesante | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45 |
| Contratistas y subcontratistas | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45 |
| Responsabilidad civil patronal | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45 |
| Vehículos propios y no propios | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45 |

*Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.*

| **Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 4** | **Vigencia** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento del Contrato | 22-marzo-2024 | 13-sept-2026 | $ 6.494.785.713,80 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 22-marzo-2024 | 13-sept-2026 | $ 9.742.178.570,70 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 22-marzo-2024 | 13-may-2029 | $ 1.623.696.428,45 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días. | | $ 3.247.392.856,90 |

*Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra*

| **Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 4** | **Vigencia** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Predios, labores y operaciones | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45 |
| Daño emergente y lucro cesante | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45 |
| Contratistas y subcontratistas | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45 |
| Responsabilidad civil patronal | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45 |
| Vehículos propios y no propios | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45 |

*Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra*

*Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.*

### 3.3. Contrato de Interventoría.

| **CONTRATO N° 078 DE 2024** | |
|---|---|
| Firma contratista | **CONSORCIO INTERSALUD PZ** |
| NIT | 901.794.710-6 |
| Objeto del contrato | Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023". |
| Valor del contrato | Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva. |
| Contrato N° | 078 de 2024. |
| Acta de Inicio | 22 de marzo de 2024. |
| Plazo inicial estimado | Veinte (20) meses. |
| Ampliación de plazo Otro si No .01 | Ciento setenta y dos (172) días. |
| Plazo final estimado | Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días. |
| Fecha de terminación inicial | 22 de noviembre de 2025 |
| Fecha de terminación final | 13 de mayo de 2026. |
| Imputación Presupuestal | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024. |
| Registro | Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de $1.280.412.030 |

*Tabla 5. Contrato de Interventoría*

### 3.4. Pólizas de Interventoría.

| **Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2** | **Vigencia** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento del Contrato | 22-marzo-2024 | 22-may-2026 | $256.082.406,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables | 22-marzo-2024 | 22-nov-2028 | $64.020.601,50 |
| Calidad del Servicio | 22-nov-2025 | 22-nov-2030 | $256.082.406,00 |

*Tabla 6. Pólizas de Interventoría*

*Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.*

*Póliza ampliación de plazo de interventoría OTROSI N°01.*

| **Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 3** | **Vigencia** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento del Contrato | 22-marzo-2024 | 10-nov-2026 | $256.082.406,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables | 22-marzo-2024 | 10-may-2029 | $64.020.601,50 |
| Calidad del Servicio | 22-nov-2025 | 13-may-2031 | $256.082.406,00 |

## 4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE MAYO al 25 DE JUNIO DE 2025.

### 4.1. Gestión Administrativa

#### 4.1.1 Personal de Interventoría

| CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|
| Representante Legal | Michelle Vannessa Proaño |
| Director de Interventoría | Martin Adolfo Morillo |
| Residente de Interventoría | Jesús Edinson Perafán L. |
| Inspector de Obra | Augusto Guzmán Enríquez |
| Ingeniera Auxiliar Técnica | Angélica Ordóñez Cortés |
| Ingeniero eléctrico | Juan José Mosquera |
| | |
| **Dedicación 30%** | |
| Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo | Aixsa Angulo Agudelo. |
| Abogado Jurídico | José Alexander Romero |

*Tabla 7. Personal de Interventoría.*

*Anexo 3. Planillas personal Interventoría*

### 4.1.2 Personal del contratista de obra.

| CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|
| Representante Legal | Isabel Cristina Giraldo |
| Director de obra | Álvaro Eduardo Gaitán |
| Suplente representante legal | Carlos Alberto Córdoba |
| Ingeniero residente de obra | Fabio Humberto Carvajal |
| Asesor Infraestructura Hospitalaria | Juan Sebastían Orozco |
| Profesional en Seguridad Ocupacional | Elsa Marlene Osorio Muñoz |
| Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo | Lorena Falla Falla |
| Inspector de obra | Guillermo León Escobar |
| Ingeniero civil apoyo técnico. | Claudia Gaviria |

*Tabla 8. Personal del contratista de obra.*

### 4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron cuatro (2) comités técnicos

| COMITÉ | FECHA |
|---|---|
| 51 | 3-06-2025 |
| 52 | 18-06-2025 |

*Tabla 9. Actas de comité*

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Adicionalmente, se realizaron reuniones eléctricas y con el personal jurídico de la entidad, con el fin de abordar las observaciones eléctricas y el ajuste al diseño eléctrico.

*Anexo 4. Actas de comité mayo- junio de 2025*

### 4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025.

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | ASUNTO | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 3/06/2025 | CIPZ-078-0290-2025 | REITERACION INSTRUCCIONES PARA LIBERACION DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 4/06/2025 | CIPZ-078-0291-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0434-25 – PROVISIONAL ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 3/06/2025 | CIPZ-078-0292-2025 | SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS ACTUALIZADOS – CONTRATO N°358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5/06/2025 | CIPZ-078-0293-2025 | REMISION OFICIO EV-C358-23-0434-25 PROVISIONAL ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO |
| 5/06/2025 | CIPZ-078-0294-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 3 DE JUNIO 2025 – ESTUDIO DE ILUMINACION | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0295-2025 | SOLICITUD DE COMPROBANTES DE PAGO ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 Y N°2 – CONTRATO 358 2023 CONTRATO 078 DE 2024 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0296-2025 | REVISION MEMORIAS DE CANTIDADES PAQUETE N°1 – ACTA PARCIAL N°3 DEL 31 DE MAYO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0297-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0431-25 – VIGAS JOIST Y VIGAS VOLADIZO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0298-2025 | RESPUESTA OFICIO 28 DE MAYO – SOLICITUD DE SOPORTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA CAMBIO EN EL APANTALLAMIENTO Y MANEJO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO |
| 7/06/2025 | CIPZ-078-0299-2025 | SOLICITUD OBSERVACIONES ELECTRICAS – CONTRATO 358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 7/06/2025 | CIPZ-078-0300-2025 | REMISION COMPROBANTES DE PAGO ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 Y N°2 – CONTRATO 358 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 9/06/2025 | CIPZ-078-0301-2025 | SOLICITUD ENTREGA ACTAS DE COMITÉ FIRMADAS | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO |
| 9/06/2025 | CIPZ-078-0302-2025 | REMISION INFORME TECNICO RESISTIVIDAD DEL TERRENO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 9/06/2025 | CIPZ-078-0303-2025 | REVISION REPROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 10/06/2025 | CIPZ-078-0304-2025 | REVISION ACTA DE RECIBO DE OBRA N°3 DEL 5 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 10/06/2025 | CIPZ-078-0305-2025 | REMISION INFORMES MENSUALES MAYO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 10/06/2025 | CIPZ-078-0306-2025 | SOLICITUD ENTREGA OPORTUNA INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 11/06/2025 | CIPZ-078-0307-2025 | SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL – INGENIERO ELECTRICISTA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | CIPZ-078-0308-2025 | REITERACION OFICIO CIPZ-078-0284-2025 JUSTIFICACION AL CONCEPTO EMITIDO POR SECRETARIA DE SALUD Y COMPLEMENTACION BALANCE N°3 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 11/06/2025 | CIPZ-078-0309-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0445-25 "DISEÑO CIMENTACIÓN AMPLIACIÓN ZONA DE CAFETERÍA Y ANDENES PERIMETRALES" | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 12/06/2025 | CIPZ-078-0310-2025 | SOLICITUD SOBRE INGENIERO ELECTRICO EQUIPO MINIMO CONTRATO 358 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 12/06/2025 | CIPZ-078-0311-2025 | REITERACION REQUERIMIENTOS APANTALLAMIENTO EDIFICIO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 13/06/2025 | CIPZ-078-0312-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 12 DE JUNIO DE 2025 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MAYO 2025) | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 13/06/2025 | CIPZ-078-0313-2025 | REMISION BALANCE N°3 CONTRATO 358 2023 OFICIO EV-C358-23-0453-25 DEL 12 DE JUNIO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 14/06/2025 | CIPZ-078-0314-2025 | REVISION REPROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA OFICIO EV-C358-23-0452-25 DEL 12 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 18/06/2025 | CIPZ-078-0315-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°3 DE OBRA - CONTRATO N°358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 16/06/2025 | CIPZ-078-0316-2025 | OBSERVACIONES ELECTRICAS CONTRATO 358 2023 - INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 19/06/2025 | CIPZ-078-0317-2025 | REVISION PREACTA N°4 OFICIO EV-C358-23-0454-25 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 20/06/2025 | CIPZ-078-0318-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°3 DE INTERVENTORIA CONTRATO 078 2024 - CONTRATO N°358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 20/06/2025 | CIPZ-078-0319-2025 | SOLICITUD DE COMPROBANTE DE PAGO ACTA PARCIAL DE COBRO N°2 – CONTRATO 078 DE 2024 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0320-2025 | RESPUESTA OBSERVACIONES ELECTRICAS CONTRATISTA OFICIO EV-C358-23-0447-25 DEL 23 DE MAYO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0321-2025 | CONVOCATORIA REUNION ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0322-2025 | APROBACIÓN CRONOGRAMA DE OBRA – PLAN DE CONTINGENCIA DEL 18 DE JUNIO DE 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0323-2025 | REVISION ACTA N°4 OFICIO EV-C358-23-0459-25 DEL 20 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0324-2025 | REVISION INFORME MENSUAL N°16 MES JUNIO 2025– OFICIO EV-C358-23-0460- 25 DEL 21 DE JUNIO. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 25/06/2025 | CIPZ-078-0325-2025 | REMISION OFICIO EV-C358-23-0461-25 – "RESPUESTA AL OFICIO NO. CIPZ-078-0312- 2025, ACLARACIÓN SOBRE EL VALOR CONSIGNADO A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0326-2025 | REITERACIÓN OBSERVACIONES REVISION ACTA N°4 OFICIO EV-C358-23-0459-25 DEL 20 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0327-2025 | INSPECCIÓN AMBIENTAL A OBRA 21 DE JUNIO DE 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0328-2025 | SOLICITUD ENTREGA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET |

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | FECHA RECIBIDO | ORIGEN | DESTINO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/06/2025 | EV-C358-23-0441-25 | 2/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de columnas y pantallas piso No. 6. |
| 31/05/2025 | EV-C358-23-0440-25 | 3/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión memorias de cantidades paquete N°1 - Acta parcial de obra N°3. |
| 3/06/2025 | N.A | 3/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Estudio de iluminacion |
| 3/06/2025 | EV-C358-23-0442-25 | 3/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | reporte personal en obra |
| 27/05/2025 | EV-C358-23-0432-25 | 4/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Ampliación zonas para la prolongación de la zona de cafetería y andenes. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/06/2025 | n.a | 4/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | COPIA ESCANEADA ACTAS #1 Y #2 EVOLET, ACTA#1 INTERSALUD PZ |
| 4/06/2025 | EV-C358-23-0443-25 | 4/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta al oficio CIPZ-078-0291-2025. Provisional de energia |
| 6/06/2025 | EV-C358-23-0445-25 | 6/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Diseño cimentación ampliación zona de cafetería y andenes perimetrales |
| 6/06/2025 | N.A | 6/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión de comprobantes de pago de actas parciales de cobro – Contrato 358 de 2023 y 078 de 2024 |
| 6/06/2025 | EV-C358-23-444-25 | 6/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Informe mensual abril - mayo 2025 contrato 358 2023 |
| 9/06/2025 | n.a | 9/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Informe tecnico de resistividad del terreno |
| 9/06/2025 | n.a | 9/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA | Entrega de actas de comité No. 48, 49, 50 y 51 – Respuesta al oficio CIPZ-078-0301-2025 |
| 23/05/2025 | EV-C358-23-0447-25 | 10/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio de Interventoría CIPZ-078-0299-2025 / Observaciones componente electrico del proyecto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | n.a | 10/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Acta parcial de cobro N°1 interventoria |
| 10/06/2025 | n.a | 10/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | PLAZO PARA ENTREGA DE INFORME Y PETICION DE CONCEPTO SOBRE NUEVAS OBSERVACIONES. |
| 11/06/2025 | EV-C358-23-0448-25 | 11/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión acta de obra No. 3 y atención al comunicado No. CIPZ-078-0304-2025. |
| 11/06/2025 | n.a | 11/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Scaner del acta de obra No. 3 |
| 11/06/2025 | EV-C358-23-0450-25 | 11/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reporte personal en obra |
| 12/06/2025 | EV-C358-23-0452-25 | 12/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | REPROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN AL OFICIO No. CIPZ-078-0303-2025 |
| 9/06/2025 | EV-C358-23-0451-25 | 12/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Cambio de residente de obra |
| 12/06/2025 | n.a | 12/06/2025 | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Envío de oficio – Solicitud de aclaración sobre rendimientos financieros (mayo 2025) |
| 12/06/2025 | EV-C358-23-0453-25 | 12/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reiteración a la solicitud de aprobación del balance de obra No. 3 e ítems no previstos. |
| 12/06/2025 | n.a | 12/06/2025 | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | ACEPTACION PROFESIONAL ELECTRICISTA JUAN JOSE MOSQUERA |
| 17/06/2025 | EV-C358-23-0457-25 | 17/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de losa de entrepiso No. 6. |
| 16/06/2025 | EV-C358-23-0455-25 | 16/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-0309-2025 / Propuesta para losas de piso áreas perimetrales |
| 18/06/2025 | EV-C358-23-0458-25 | 18/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Ajuste a la reprogramación y atención al oficio No. CIPZ-078-0274-2025 |
| 18/06/2025 | EV-C358-23-0446-25 | 18/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta CIPZ-078-269-2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EV-C358-23-0456-25 | 18/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-0311-2025 / Requerimientos sistema de apantallamiento |
| 20/06/2025 | N.A | 20/06/2025 | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Mesa tecnica anden perimetral |
| 21/06/2025 | EV-C358-23-0460-25 | 21/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión informe mensual No. 16, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de mayo y 25 de junio del |
| 24/06/2025 | EV-C358-23-0461-25 | 24/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0312-2025, aclaración sobre el valor consignado a la entidad por concepto de rendimientos financieros. |
| 24/06/2025 | EV-C358-23-462-25 | 24/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE PRESIÓN |
| 25/06/2025 | EV-C358-23-0465-25 | 25/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Informe fiducia No. 7 |
| 24/06/2025 | EV-C358-23-0463-25 | 25/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD | ELEMENTOS DE FACHADA PISOS 2 Y 3 |
| 25/06/2025 | EV-C358-23-0464-25 | 25/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | reporte personal en obra |

*Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.*

## 4.2. Gestión Técnica

### 4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025, el contratista de obra terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso 5 N +19.30, el entrepiso 6 N+ 23.20, el armado de aceros de las vigas de entrepiso 5 N+19.30 y el entrepiso 6 N+ 23.20, la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso 5 N+19.30 y el entrepiso 6 N+ 23.20, se instalaron las vigas joist de entrepiso 5 N+19.30 y el entrepiso 6 N+ 23.20.

Se realizó la fundición de las vigas y losa de entrepiso 5 N+19.30 y el entrepiso 6 N+ 23.20.

Se realizó la instalación de aceros de columnas y pantallas para el piso 6 N+19.30 a N+23.20.

Se realizó la instalación de formaleta para columnas y columnas y pantallas del piso 6 N+19.30 a N+23.20.

Se realizó la instalación de concretos de columnas y columnas y pantallas para el piso 6 N+19.30 a N+23.20.

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas de emergencia del nivel 4 a 5 N+15.40 a N+19.30.

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas centrales del nivel 4 a 5 N+15.40 a N+19.30.

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas de emergencia del nivel 4 a 5 N+15.40 Se han construido muros en mampostería estructural en las fachadas y muros confinados en las zonas húmedas y muros perimetrales de las gradas centrales y de emergencia en los pisos 1 y 2.

Se ha realizado la instalación de redes sanitarias bajo el piso 2 y piso 3.

Los aceros de vigas y losas fueron verificados que cumplieran en diámetro, cuantía, longitud, espaciamientos, posición conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría.

Se verificó que las vigas joist de los entrepisos cumplieran en dimensión, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales, para lo cual se utilizó flexómetro y calibrador.

Se verificó que el acero de la malla electrosoldada, cumplieran con lo estipulado en los diseños aprobados por la curaduría, se verificó las dimensiones de las formaletas de las

vigas de entrepiso cumplieran con los diseños estructurales se verificó los niveles de la formaleta de la losa de entrepiso 5 N+19.30.y entrepiso 6 N+23.20

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las vigas y losa de entrepiso No 5 N+19.30 y entrepiso No 6 N+23.20, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, para lo cual los asentamientos de los concretos de cada vehículo de suministro se encontraron dentro del margen de las 7" más o menos 1", se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima exigida conforme a los diseños estructurales.





Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Se verificó que los aceros de las columnas y pantallas del entrepiso 6 N+19.30 a N+23.20 cumplieran con el diámetro, longitud, cuantía, disposición, espaciamiento, conforme a lo establecido en los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se verifico las formaletas para columnas y pantallas del entrepiso 6 N+19.30 a N+23.20, cumplieran con las dimensiones, los plomos, escuadra y alineamientos conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las columnas y pantallas de entrepiso 6 N+19.30 a N+23.20, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 8" más o menos 1".

Se verificó la disposición de formaleta de la losa de entrepiso No 5 N+19.30 y entrepiso 6 N+23.20, se verificó que los aceros de las vigas de entrepiso No 5 N+19.30 y entrepiso 6 N+23.20 , cumplían en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas de emergencia del entrepiso 4 N+11.50 a N+15.40 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento y espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las de las gradas de emergencia del entrepiso 4 N+11.50 a N+15.40, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los

diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 3000 psi de resistencia.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Para los muros de mampostería, se realizó control de localización y dimensiones, se verificó la instalación de los anclajes de los arranques de los refuerzos a la losa inferior, se controló el correcto vaciado de las dovelas y de las columnetas de confinamientos, se verificó la correcta instalación de los aceros de refuerzo tanto en dovelas como en columnetas.

Para la tubería sanitaria, se ha llevado control del sentido de flujo de la tubería, pendientes y dimensiones, conforme a los diseños, se realizó recomendaciones de ajustes a trazados en la zona del cuarto eléctrico, para minimizar los riesgos por filtraciones al sector, se ha verificado que no existan filtraciones con ensayos de estanquidad de la tubería.

## DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N 19.30 A N +23.20

- COLUMNA C1

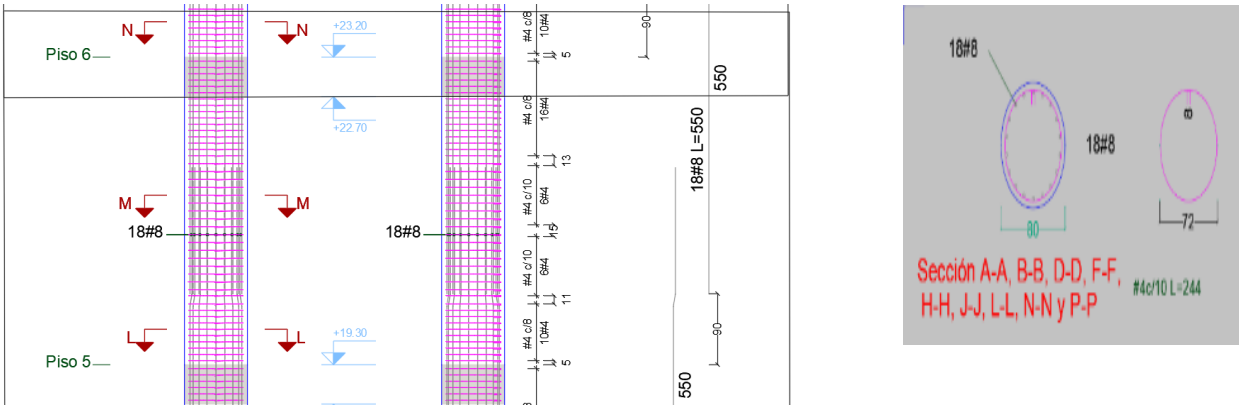
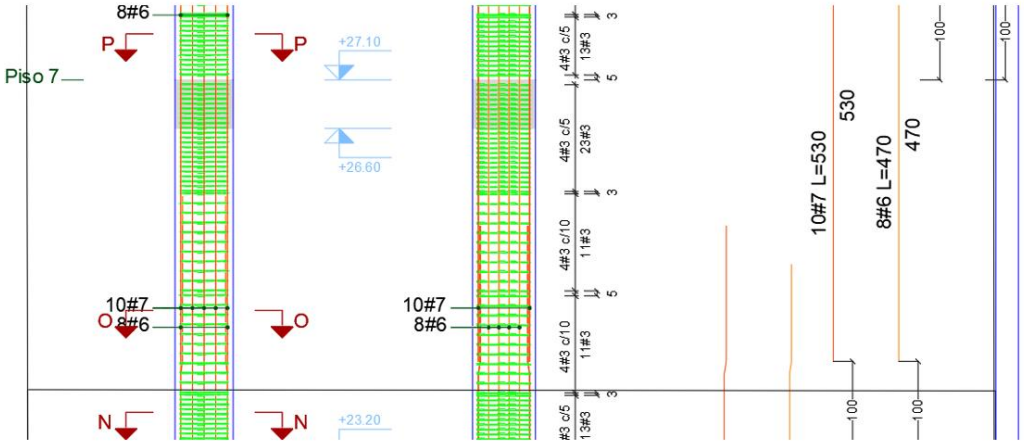



*Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1.*

- COLUMNA C2, C4 y C5



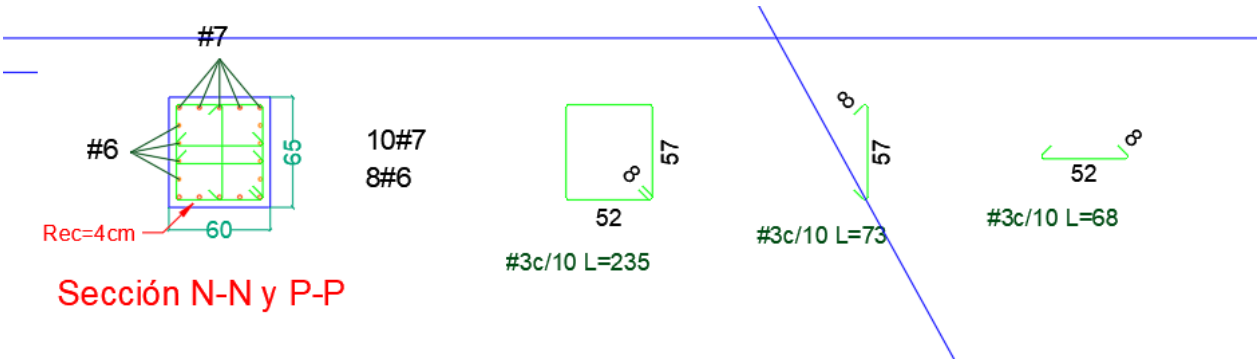
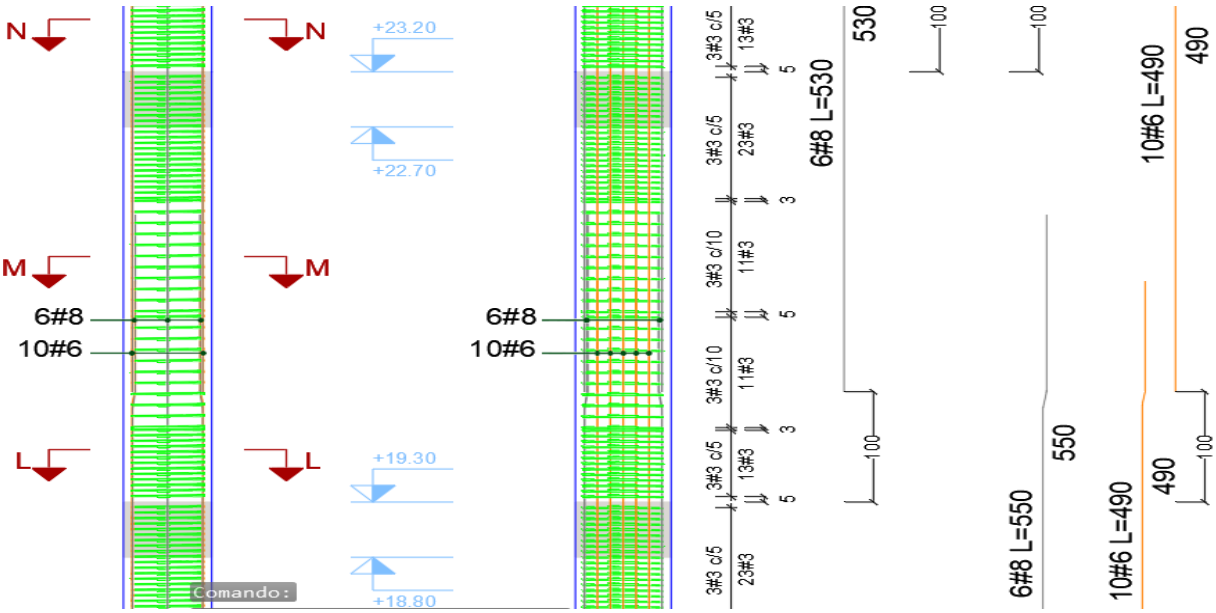



*Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5*

- COLUMNA C3



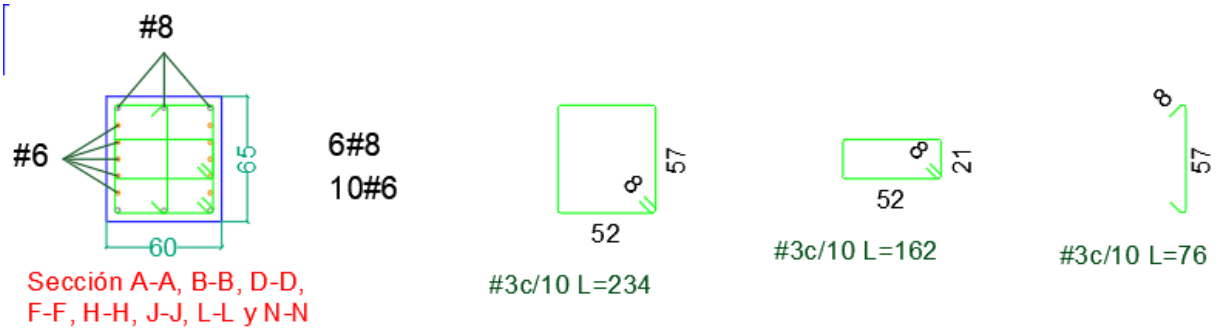
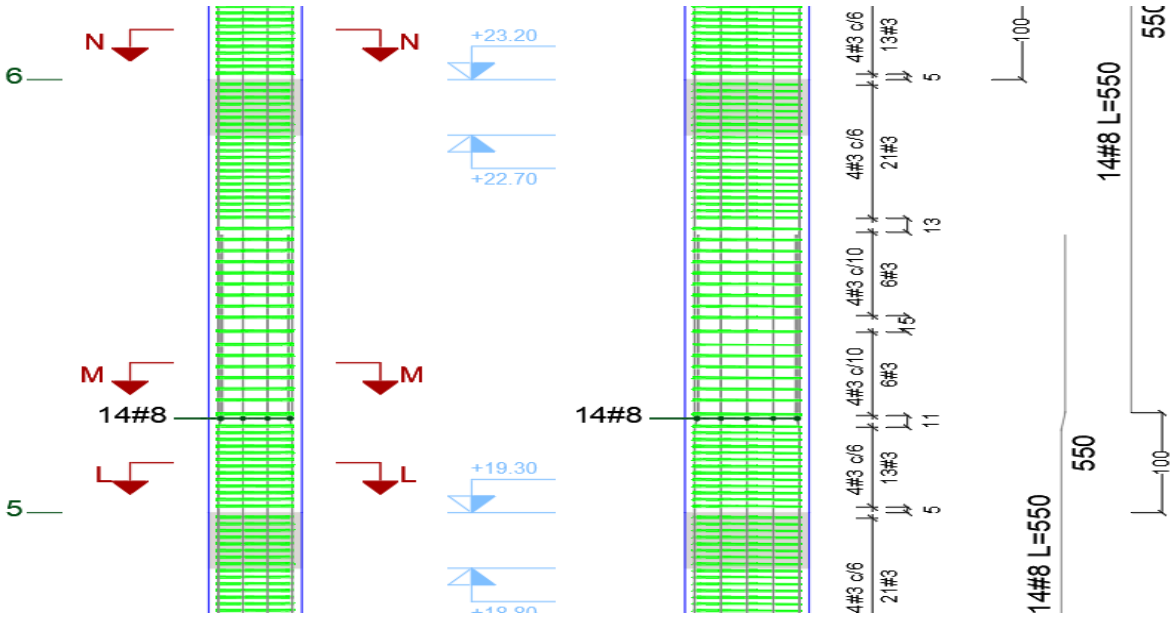



*Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.*

- COLUMNA C6, C7 y C8



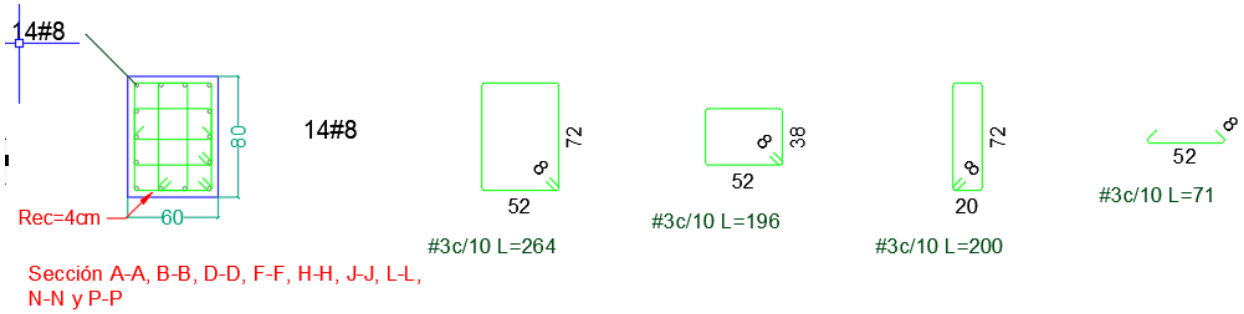
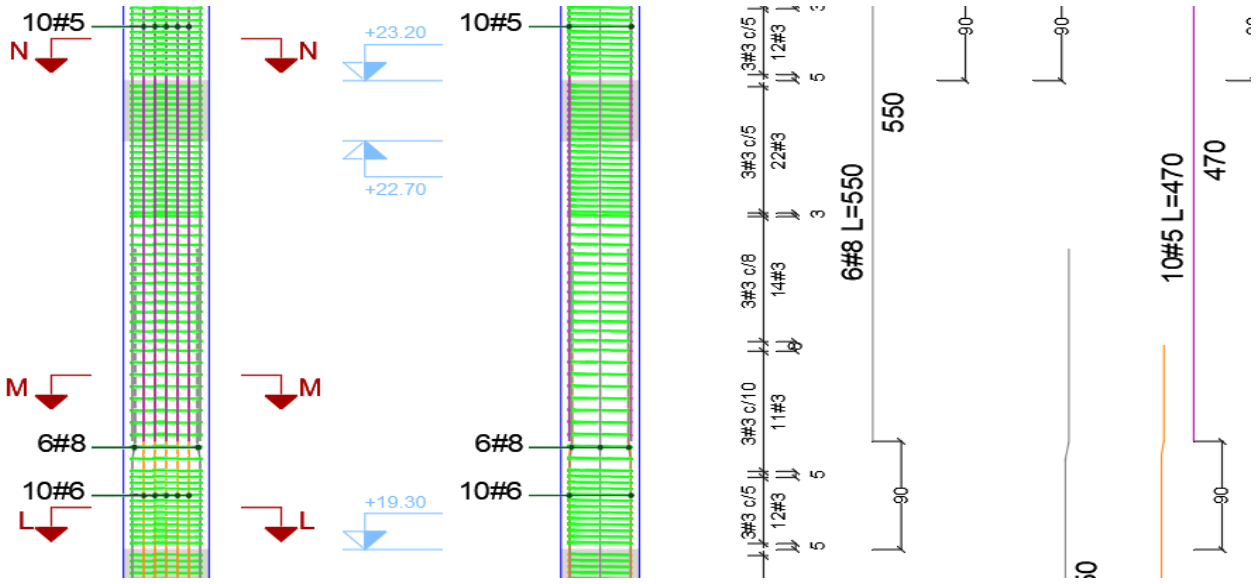



*Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.*

- COLUMNA C9 y C10



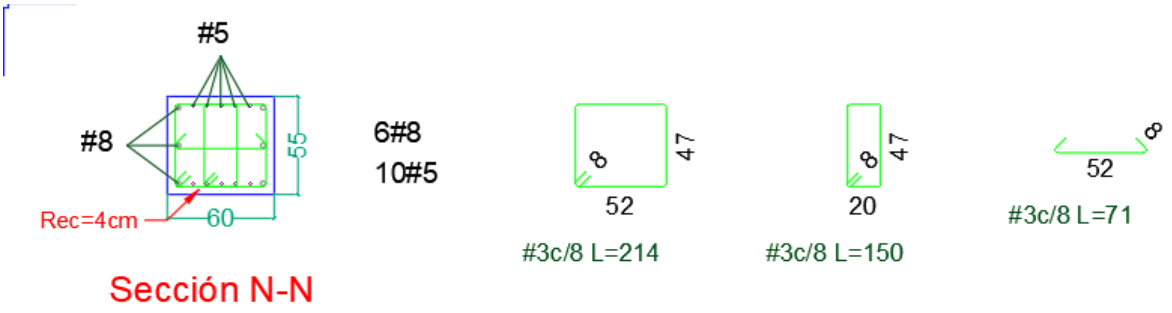
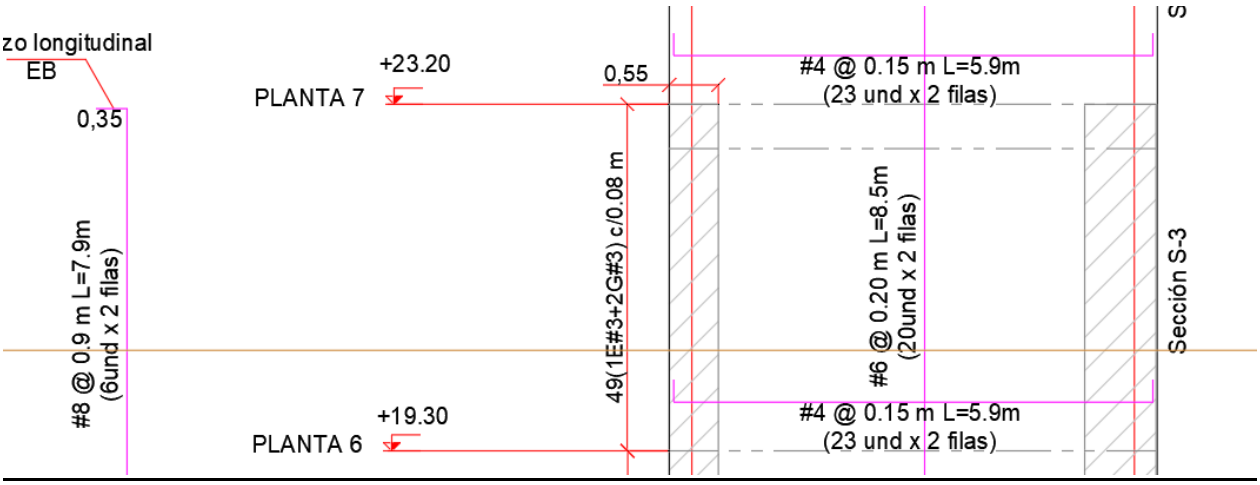



*Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.*

## DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +19.30 A N +23.20

- PANTALLA PW1





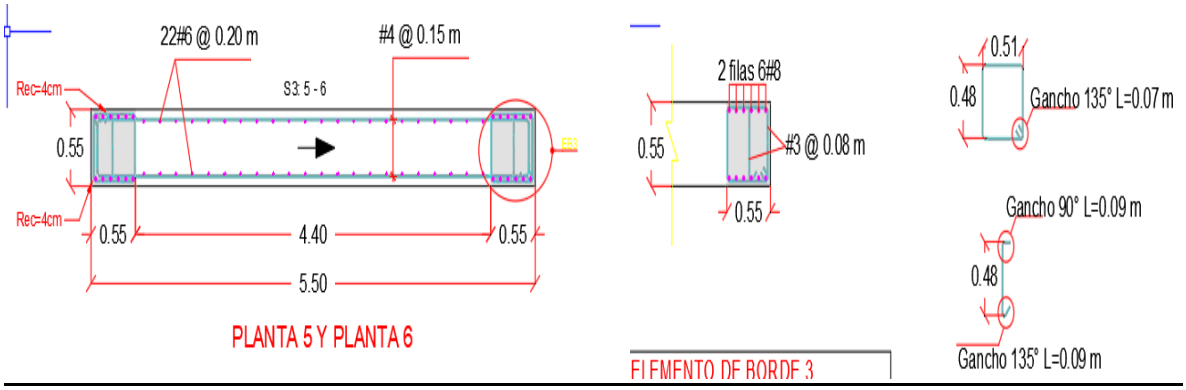



*Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.*

- PANTALLA PW2

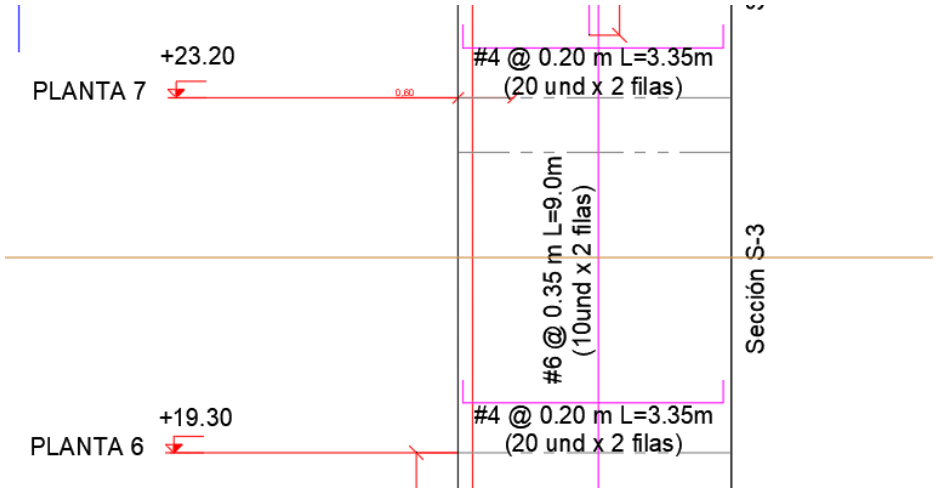


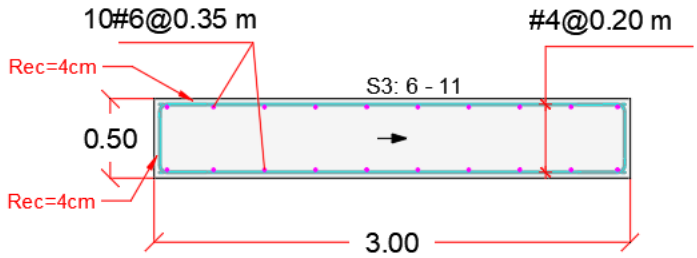



PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

*Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2*

- PANTALLA PW3

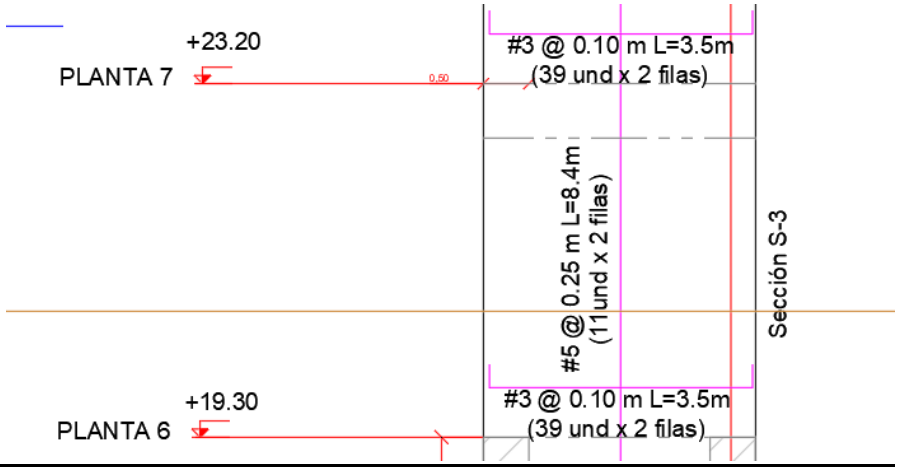


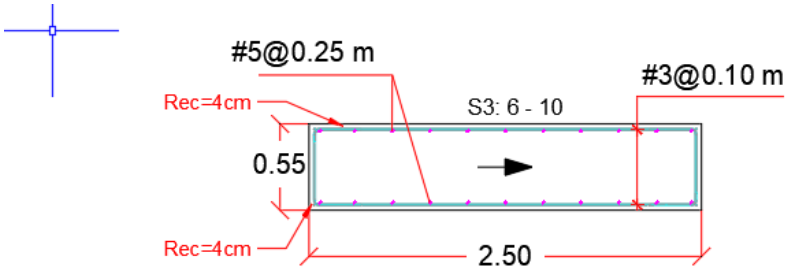



PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

*Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.*

- PANTALLA PW4

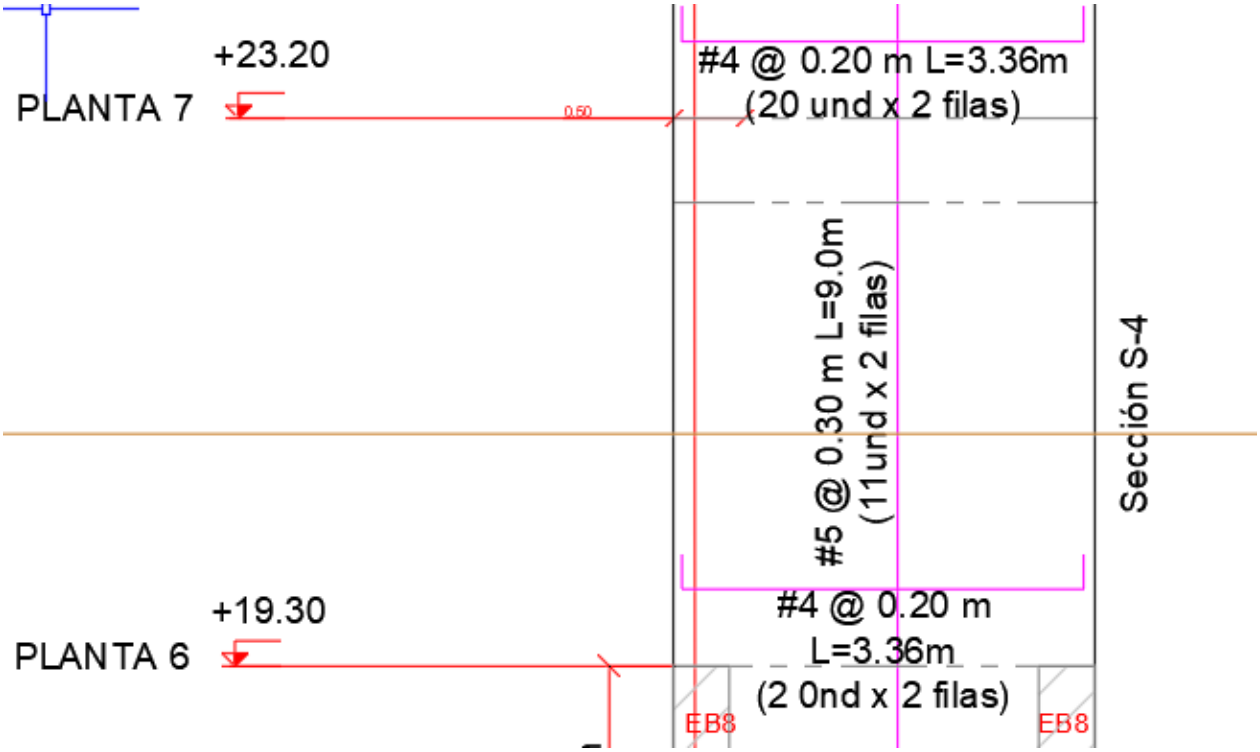





PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9, PLANTA 10 Y PLANTA 11

*Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.*

- PANTALLA PW5

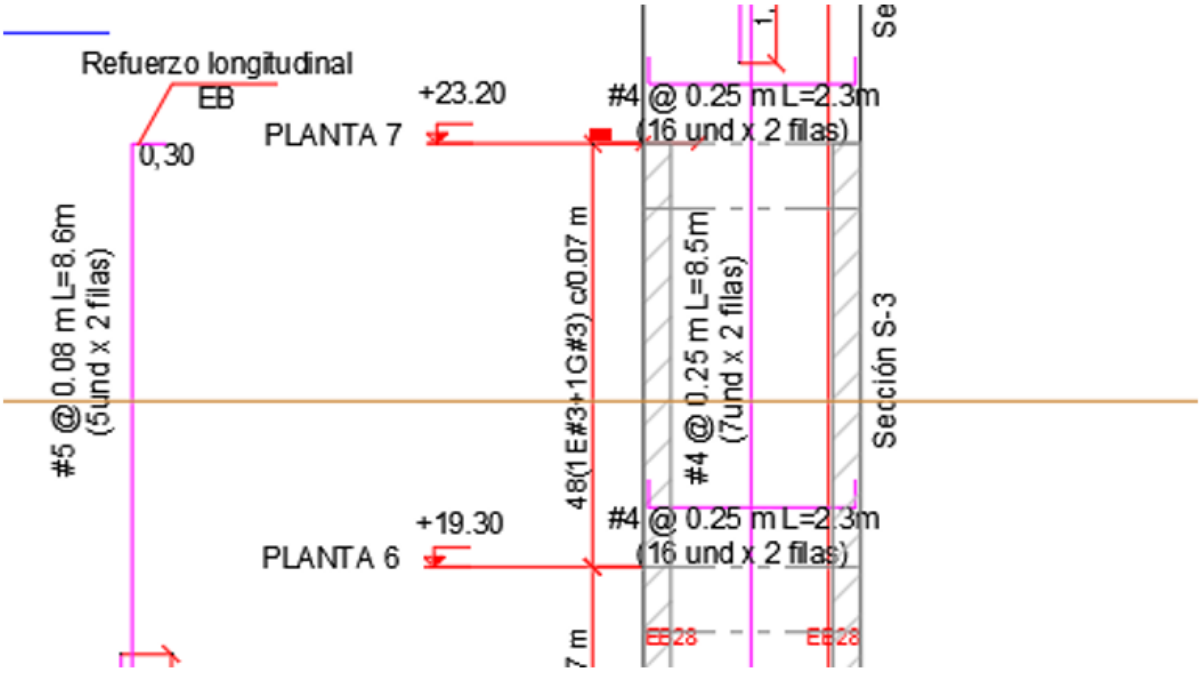

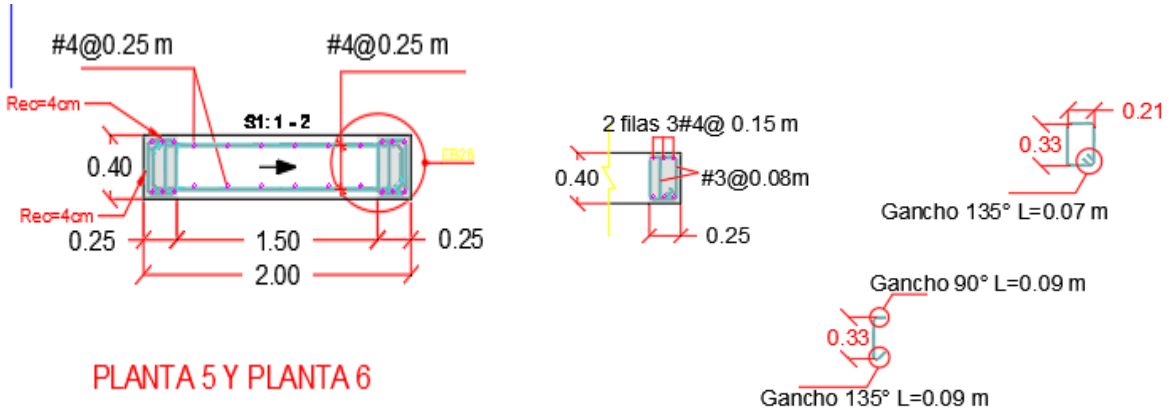
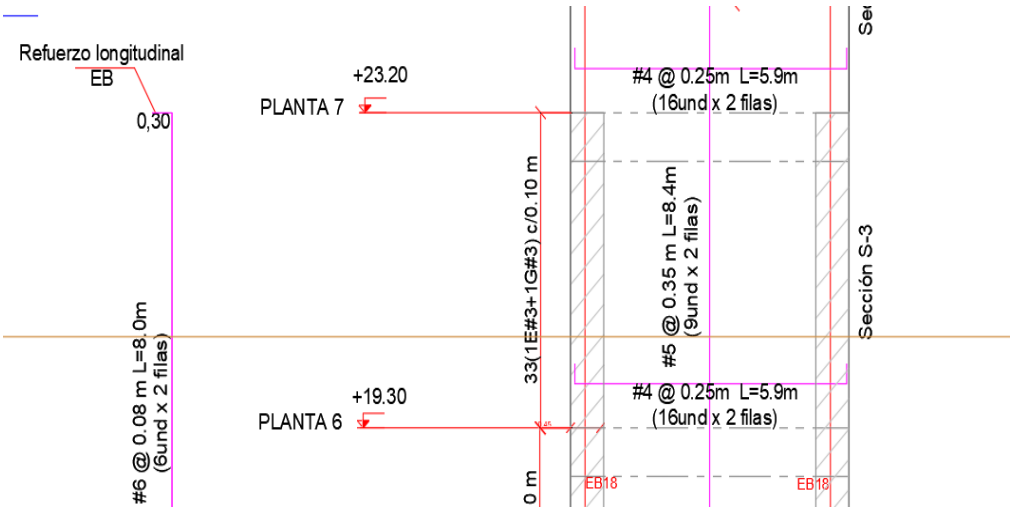



*Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.*

- PANTALLA PW6



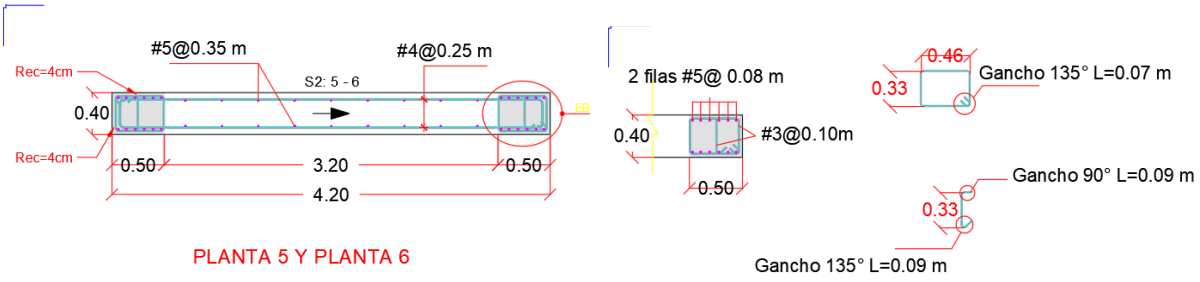



*Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.*

- PANTALLA PW7

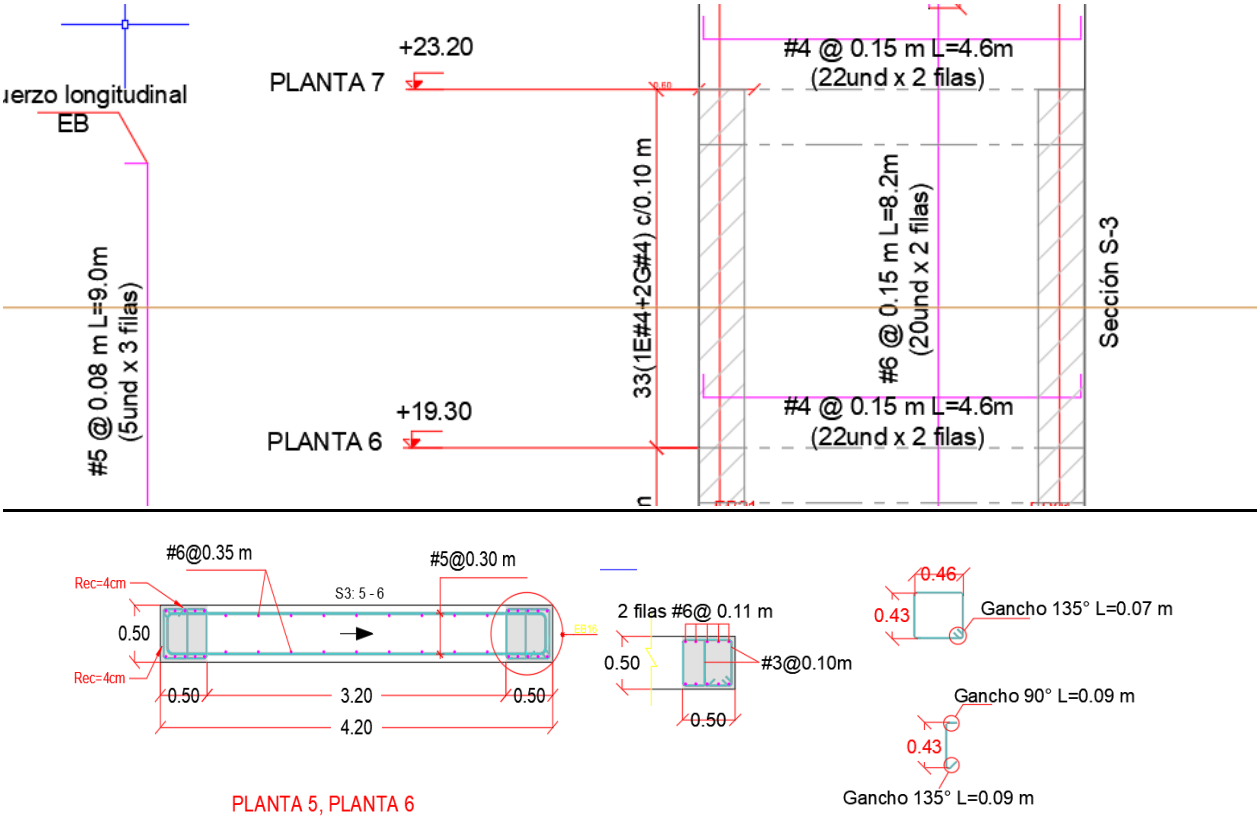
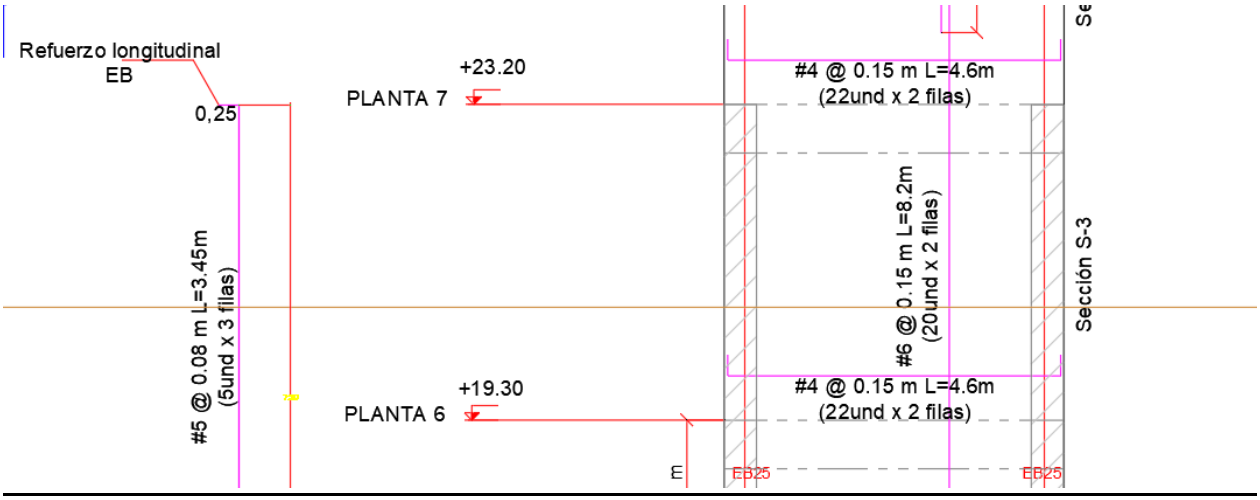



*Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.*

- PANTALLA PW8



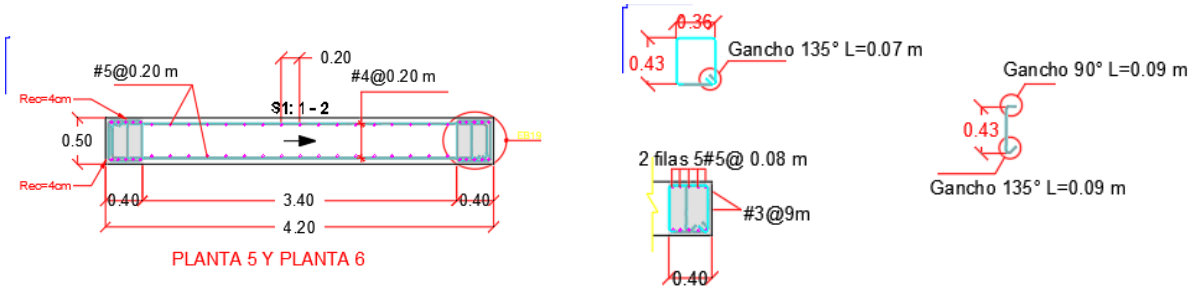
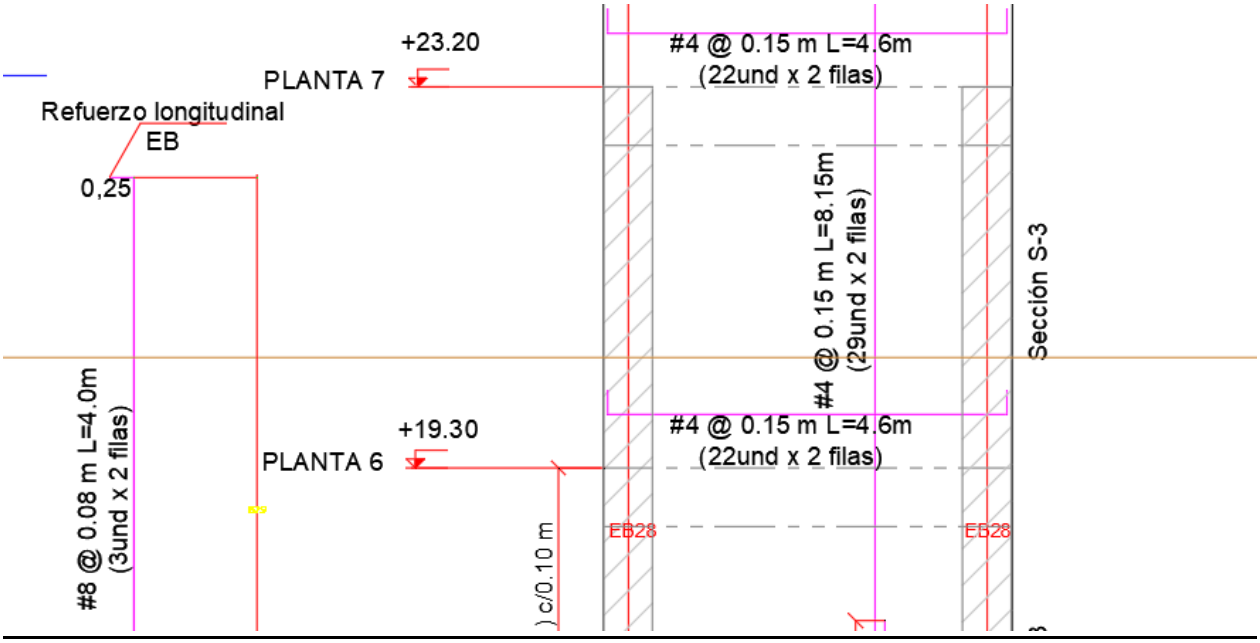




*Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.*

- PANTALLA PW9



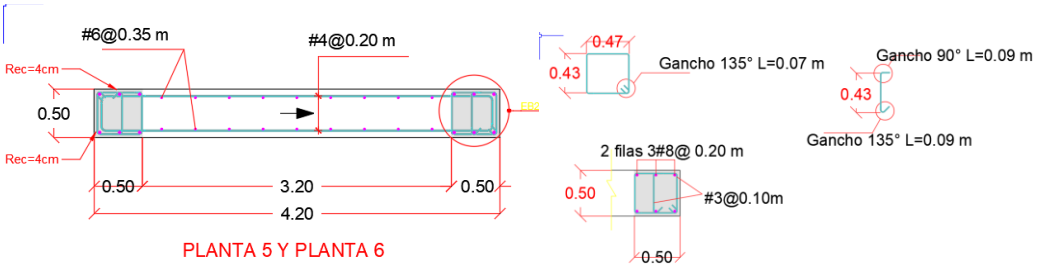
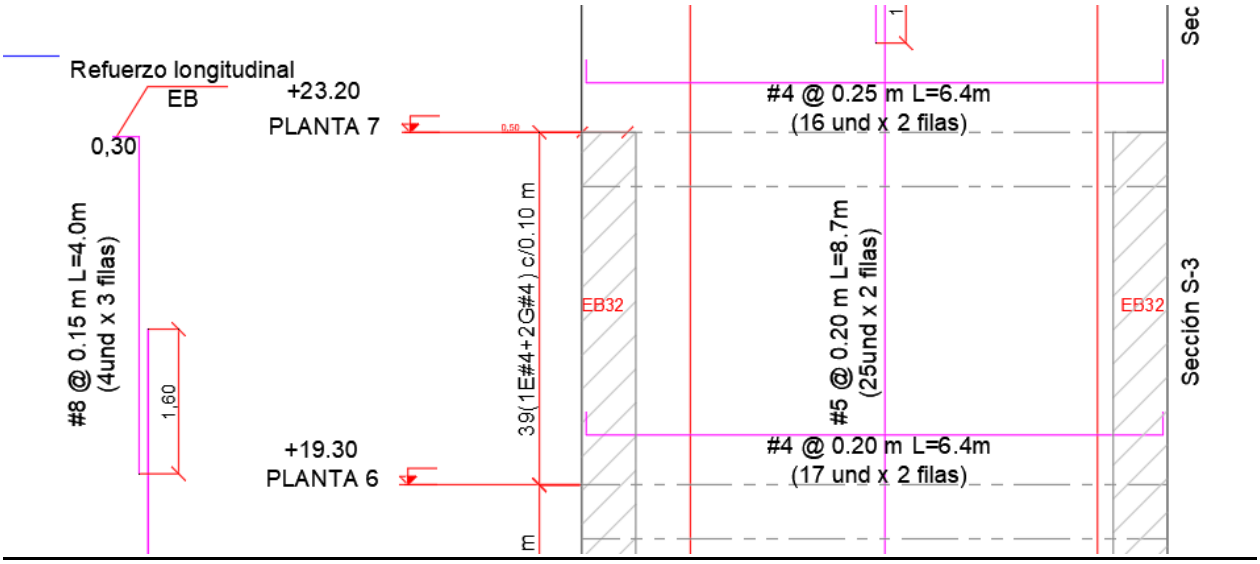




*Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.*

- PANTALLA PW10




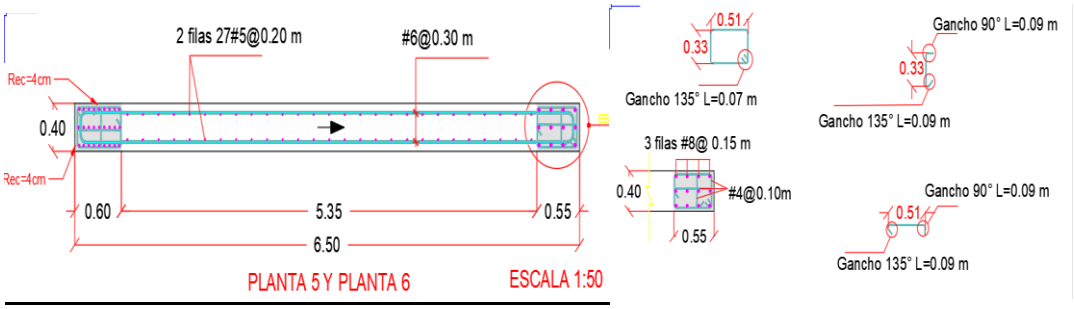




*Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.*

## DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO 4 N +19.30 y ENTREPISO 5 N+23.20

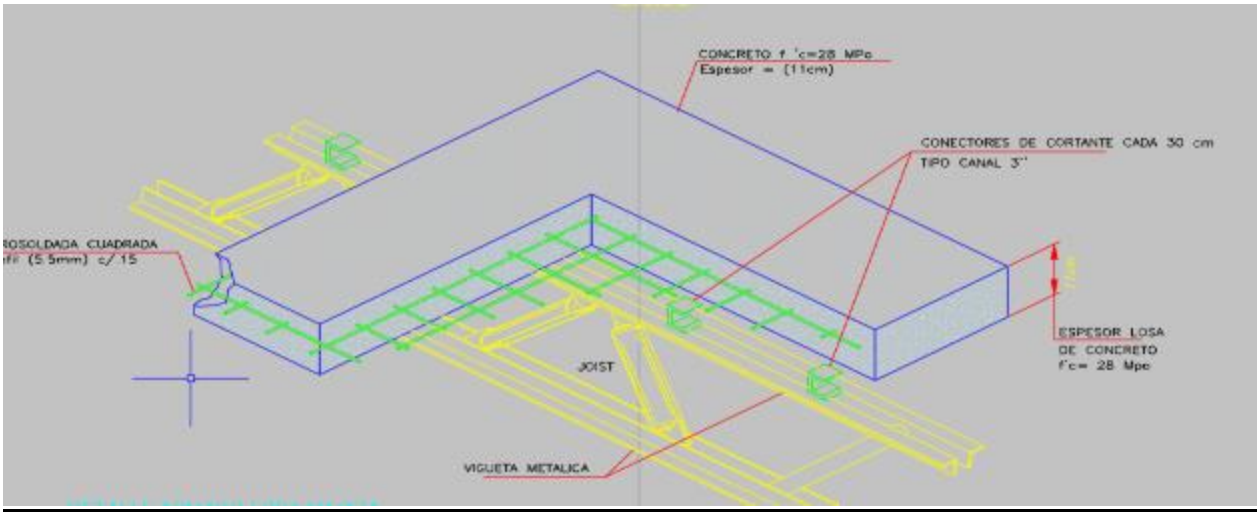


| RESUMEN DE LA LOSA | |
|---|---|
| ITEM | ESPECIFICACIÓN |
| ESPESOR DE LA LOSA (cm) | 11.0 |
| Malla de retracción para la placa: | Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 - Doble |

*Ilustración 17. Detalle losa de entrepiso*

## DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO 5 N +19,30

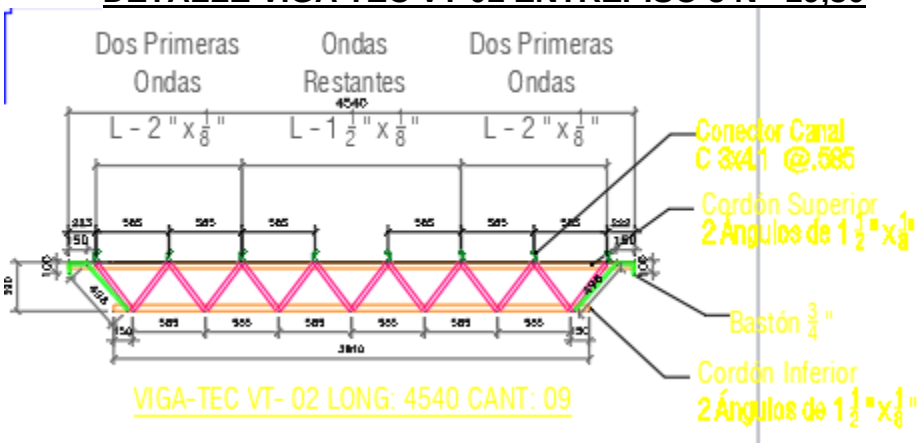



*Ilustración 18. Detalle joist VT 02*

## DETALLE VIGA TEC VT 03

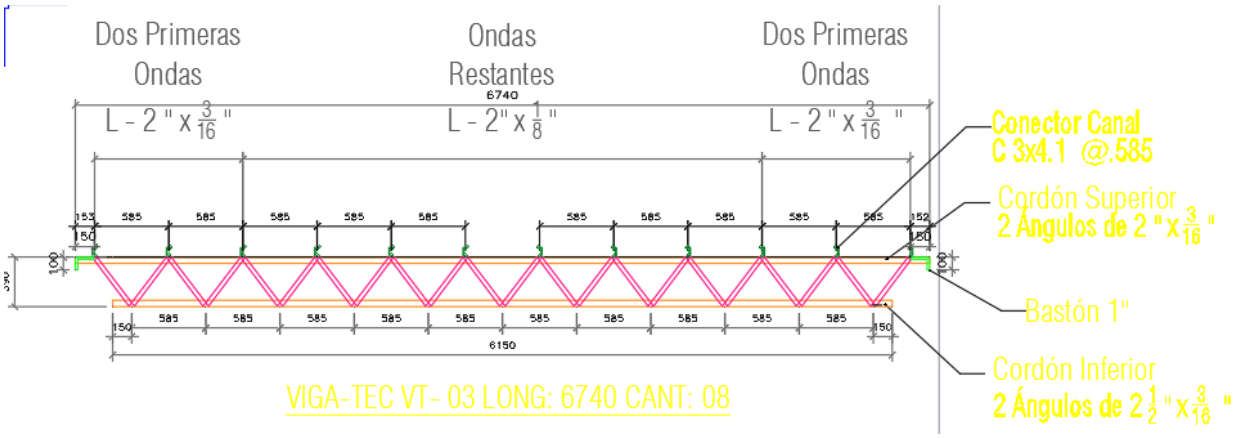



*Ilustración 19. Detalle joist VT 03.*

## DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO 5 N +19,30

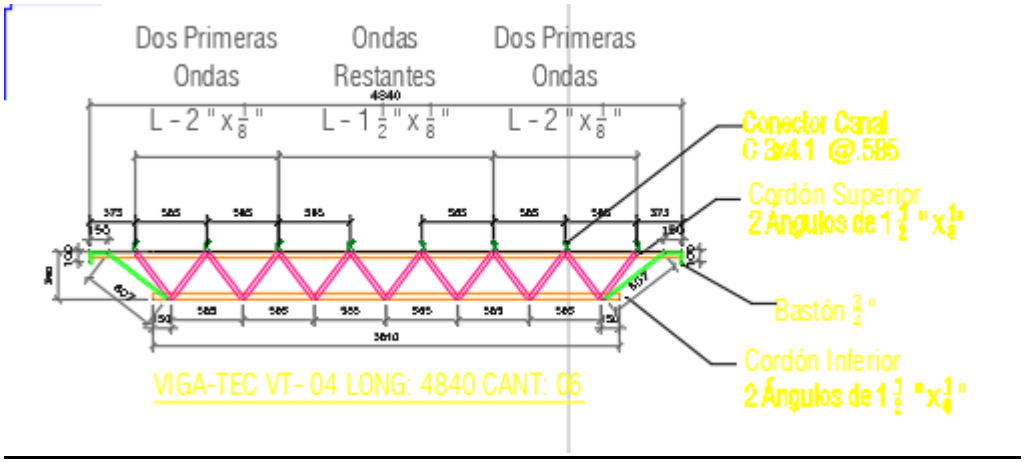



*Ilustración 20. Detalle joist VT 04*

## DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO 5 N +19,30

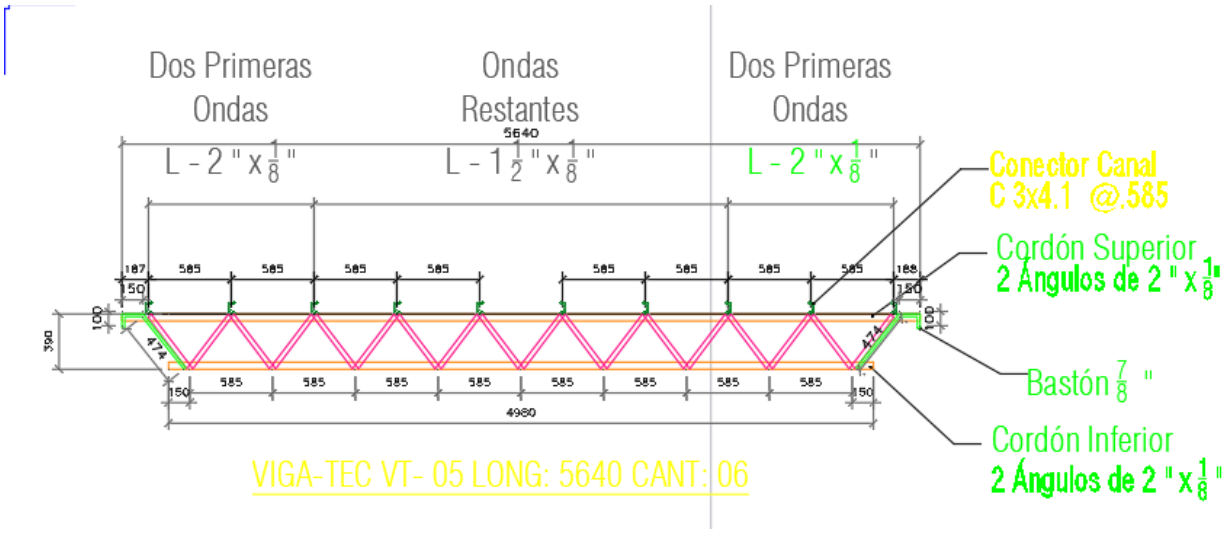



*Ilustración 21. Detalle joist VT 05.*

## DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO 5 N +19,30

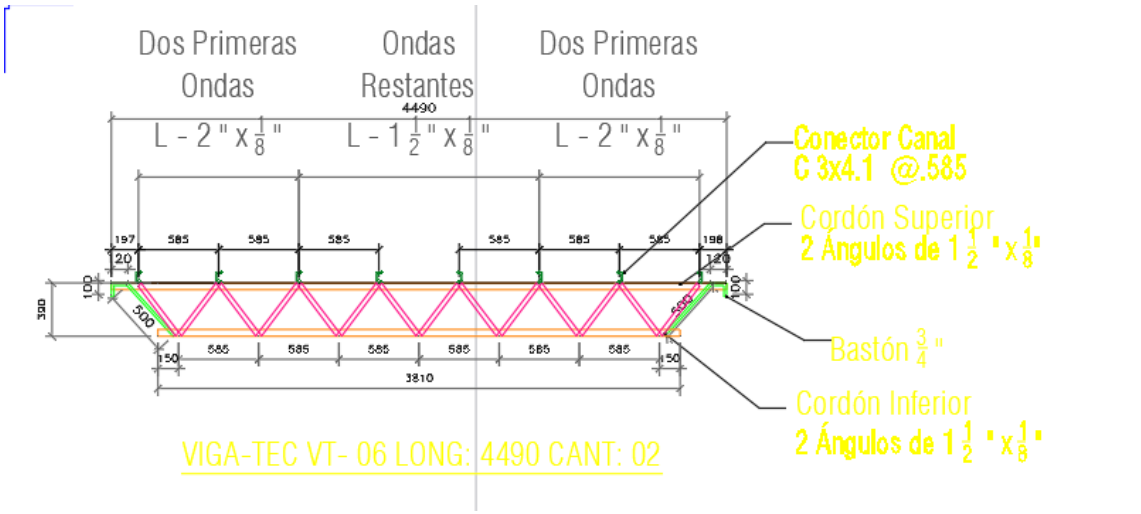



*Ilustración 22. Detalle joist VT 06.*

## DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO 5 N +19,30

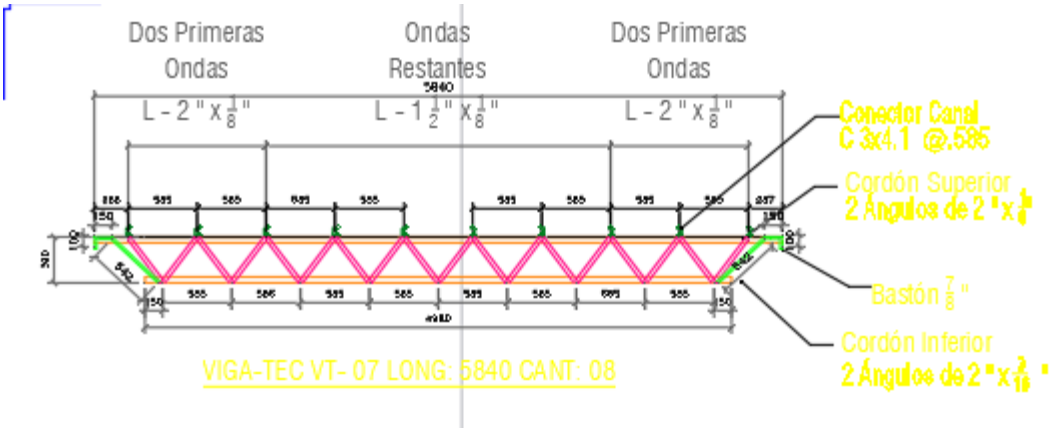



*Ilustración 23. Detalle joist VT 07.*

## DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO 5 N +19,30

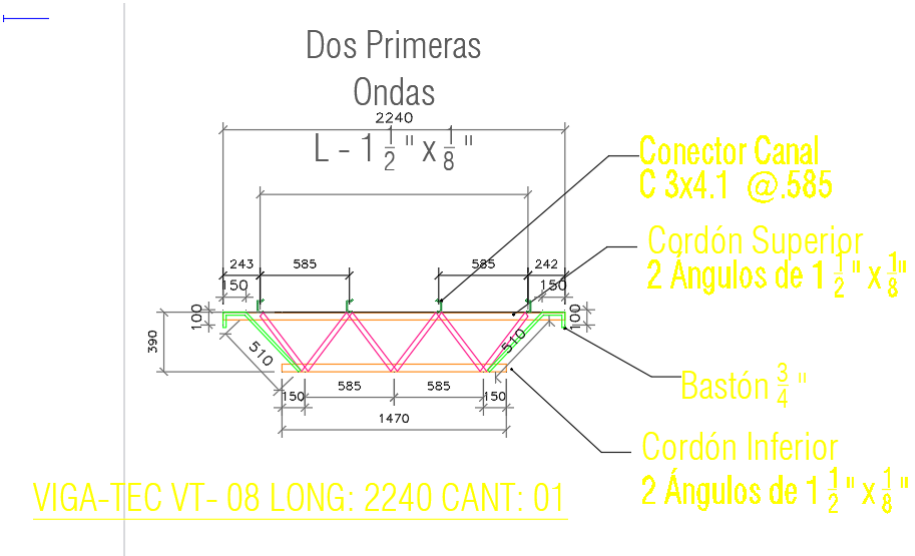



*Ilustración 24. Detalle joist VT 08*

## DETALLE VIGA TEC VT 09 ENTREPISO 5 N +19,30

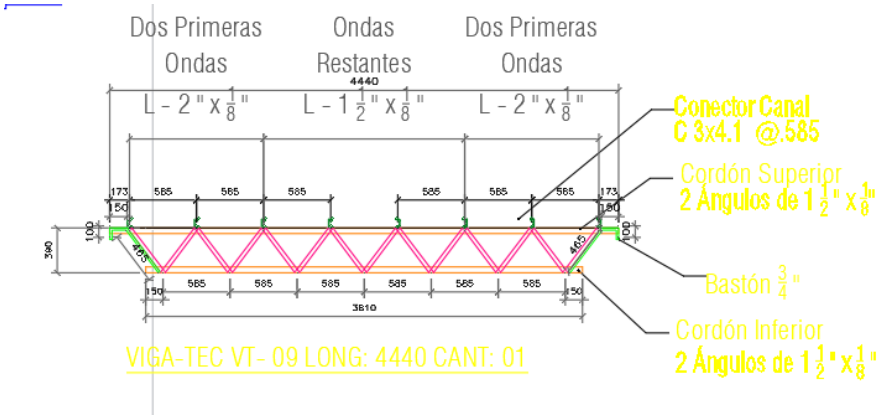



*Ilustración 25. Detalle joist VT 09*

## DETALLE VIGA TEC VT 10 ENTREPISO 5 N +19,30

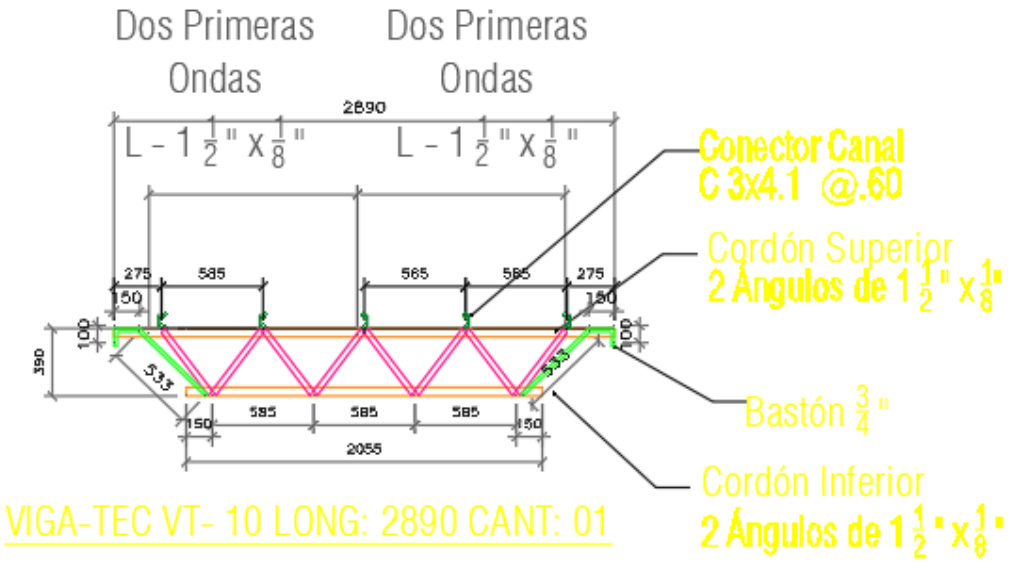



*Ilustración 26. Detalle joist VT 10*

## DETALLE VIGA TEC VT 11 ENTREPISO 5 N +19,30

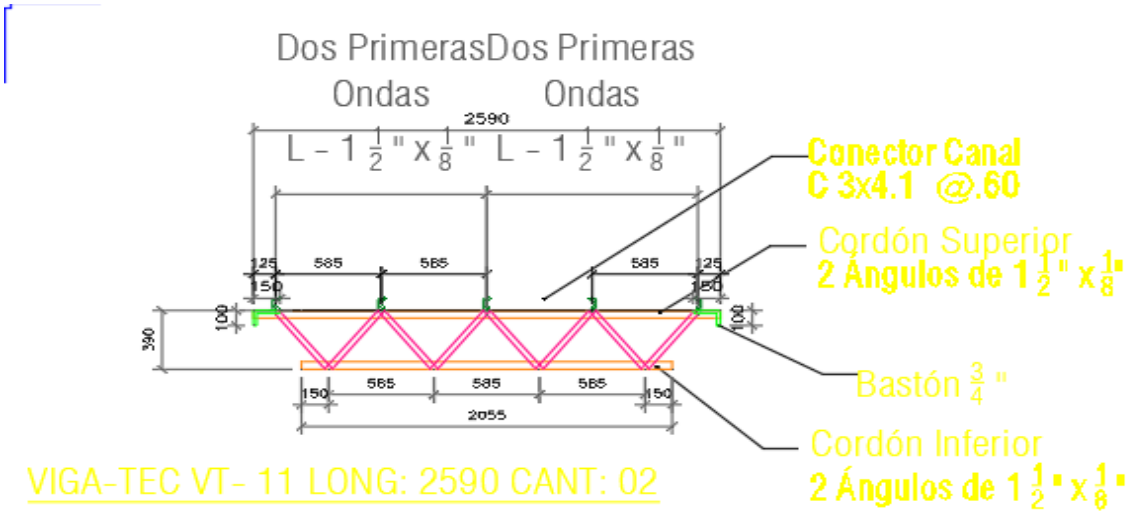



*Ilustración 27. Detalle joist VT 11*

## DETALLE VIGA TEC VT 12 ENTREPISO 5 N +19,30

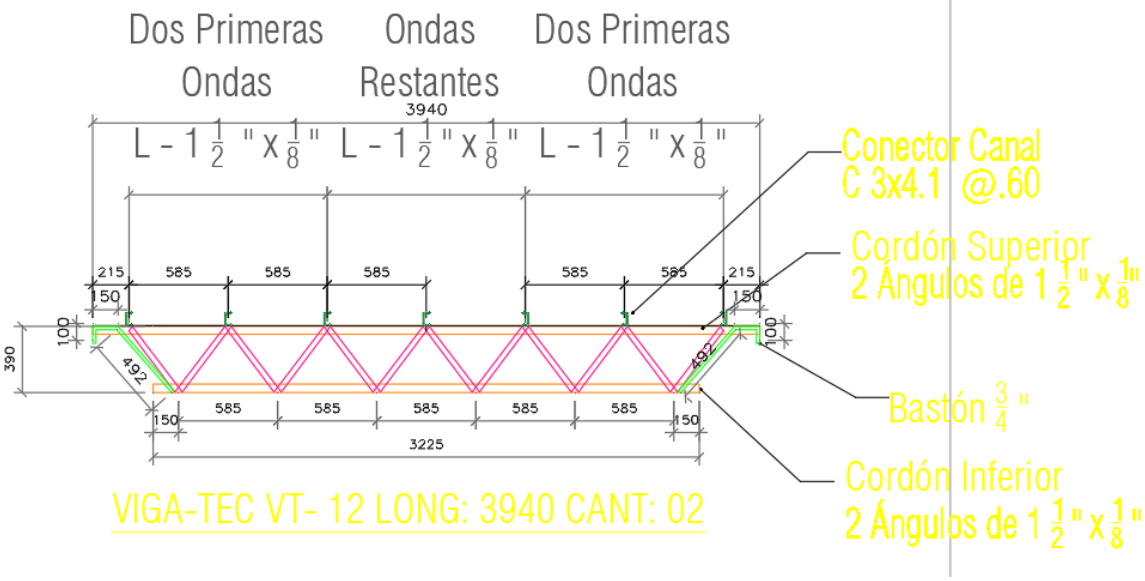



*Ilustración 28. Detalle joist VT 12*

## DETALLE VIGA TEC VT 13 ENTREPISO 5 N +19,30

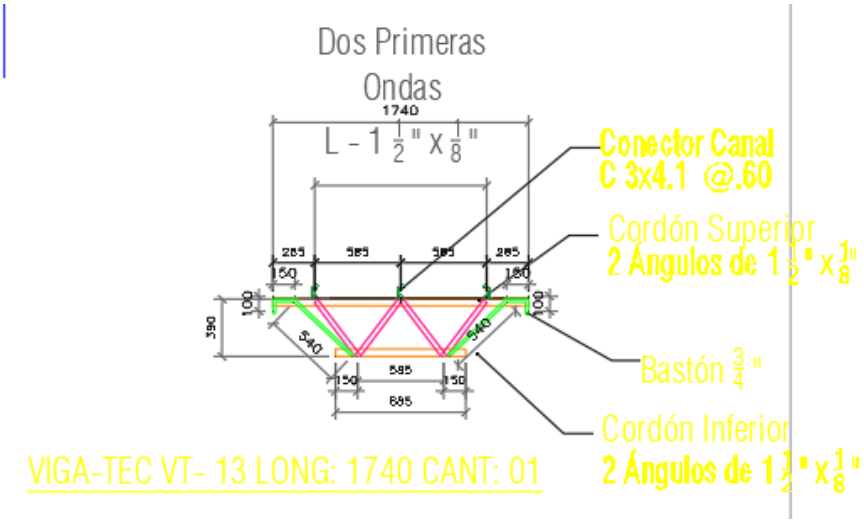



*Ilustración 29. Detalle joist VT 13*

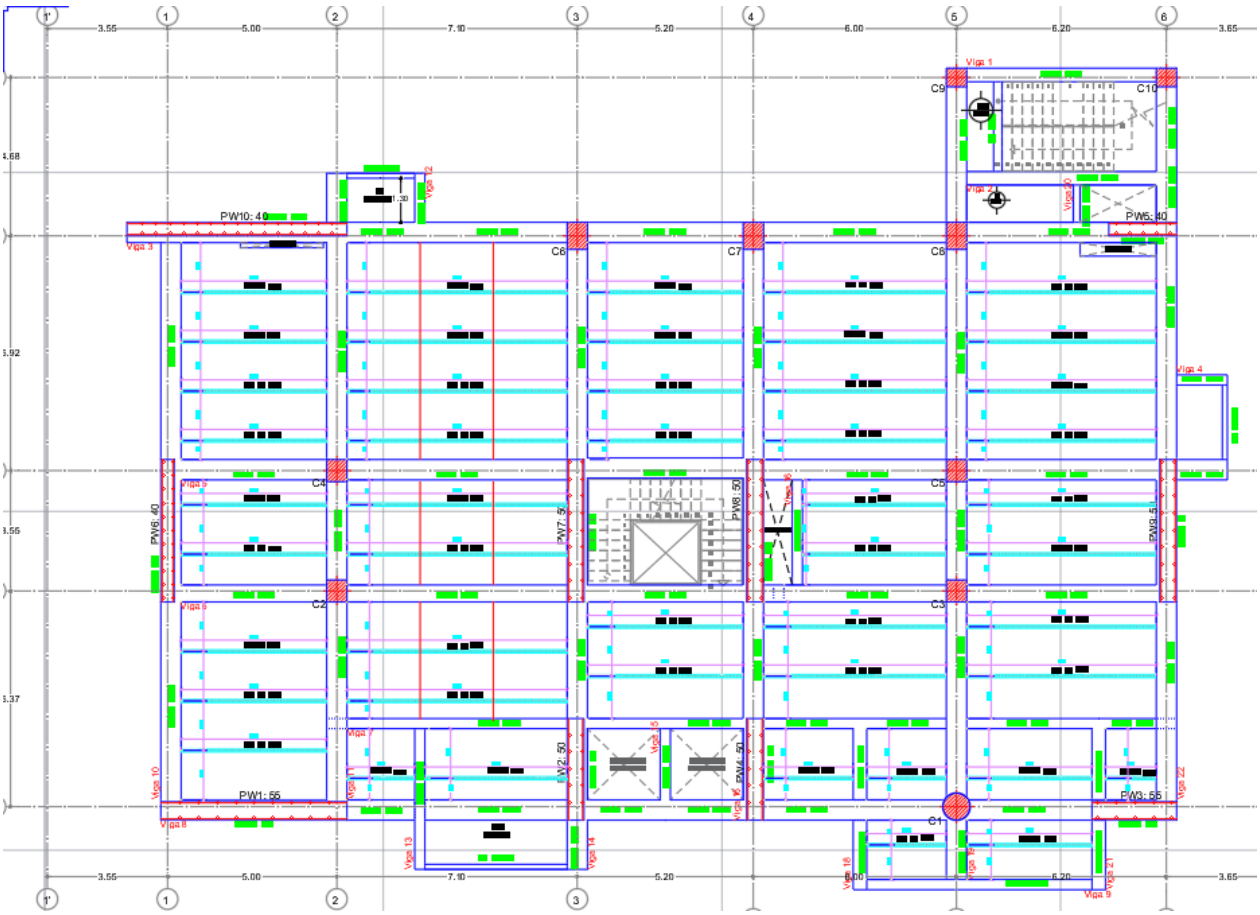



*Ilustración 30. Disposición de vigas joist entrepiso 5 N+19.30.*

## DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO 6 N +23.20

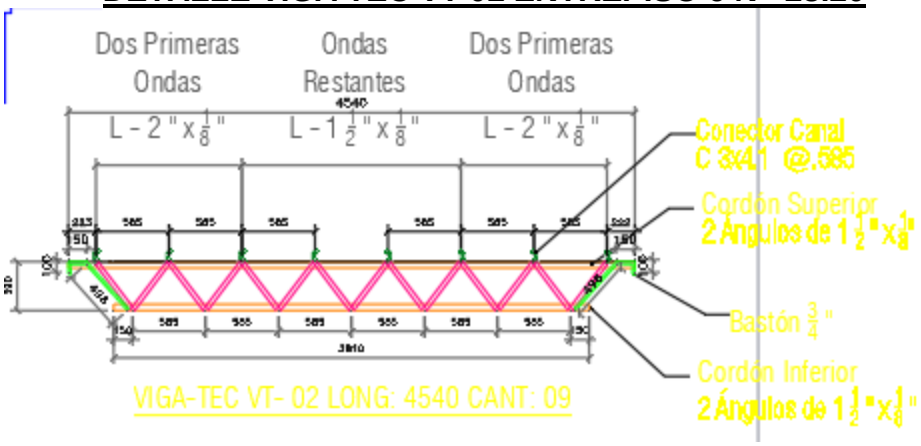



*Ilustración 31. Detalle joist VT 02*

## DETALLE VIGA TEC VT 03

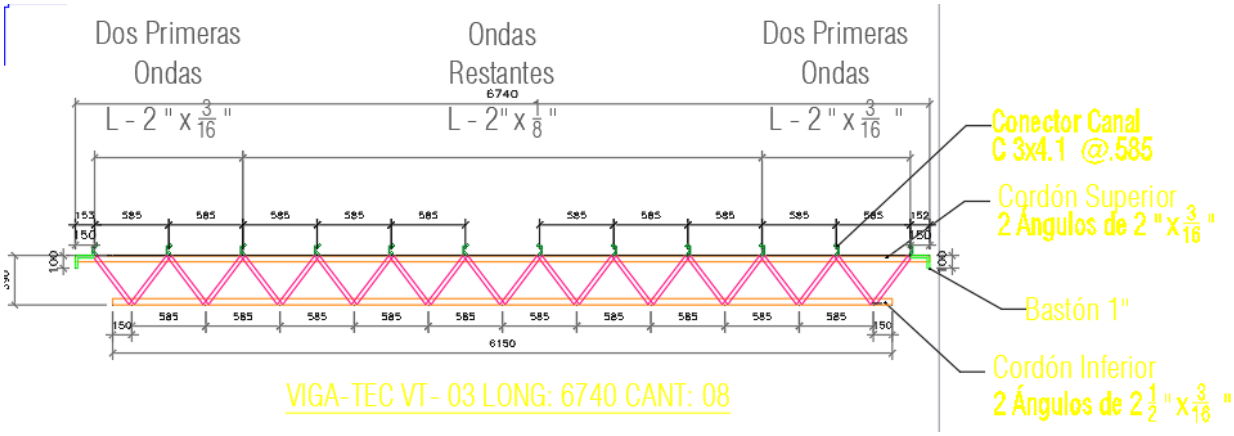



*Ilustración 32. Detalle joist VT 03.*

## DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO 6 N +23.20

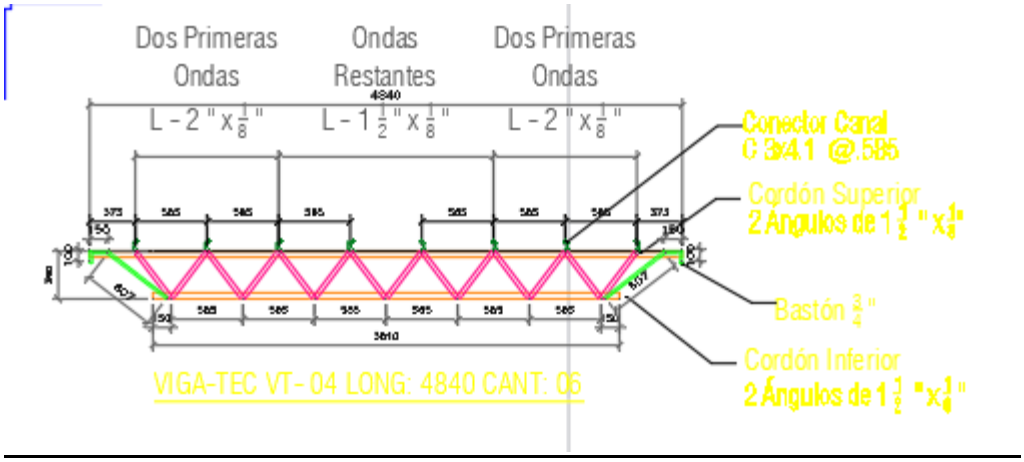



*Ilustración 33. Detalle joist VT 04*

## DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO 6 N +23.20

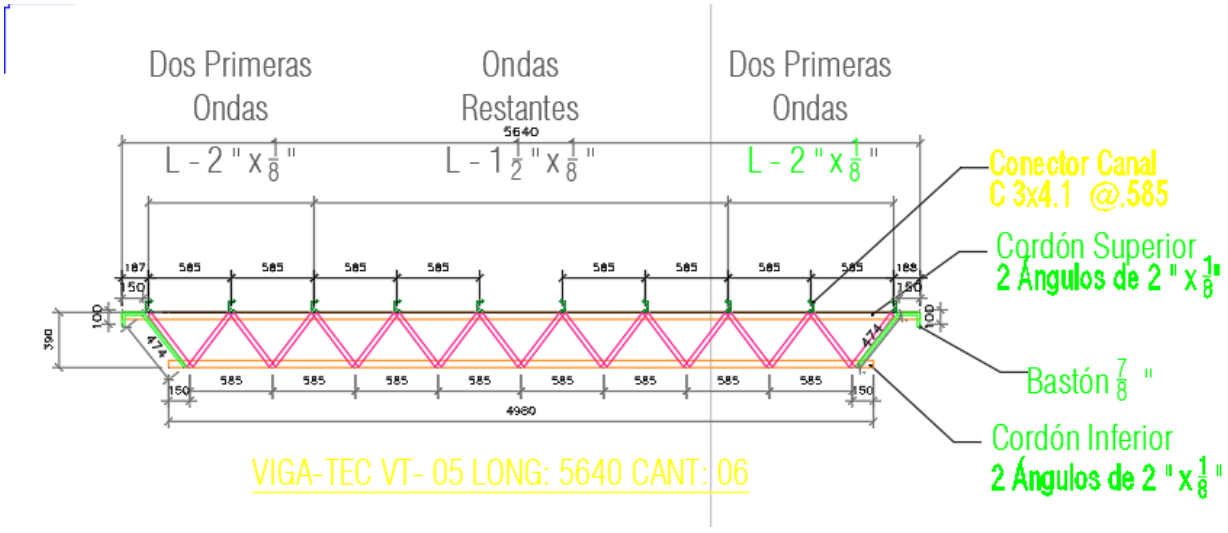



*Ilustración 34. Detalle joist VT 05.*

## DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO 6 N +23.20

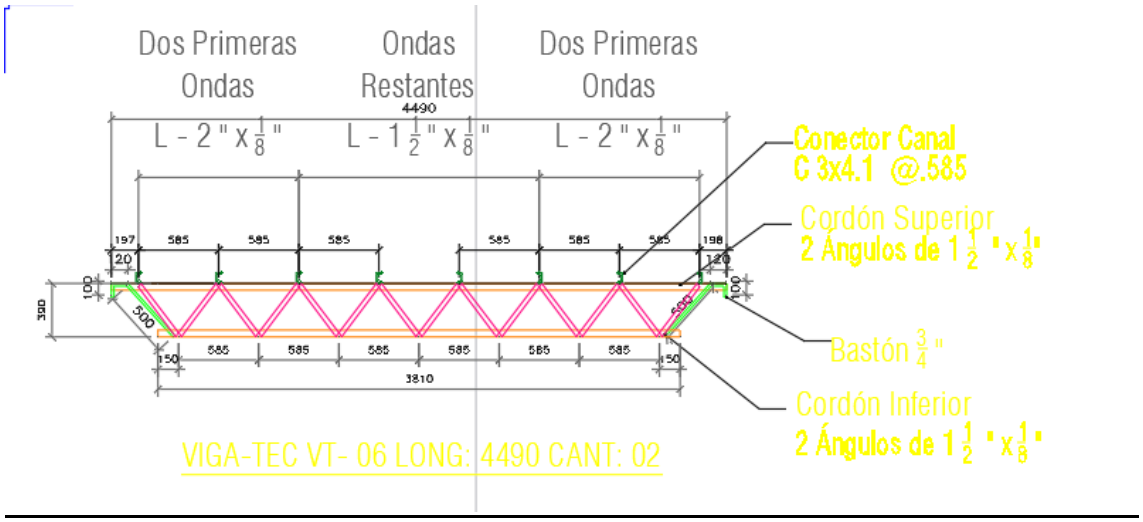



*Ilustración 35. Detalle joist VT 06.*

## DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO 6 N +23.20

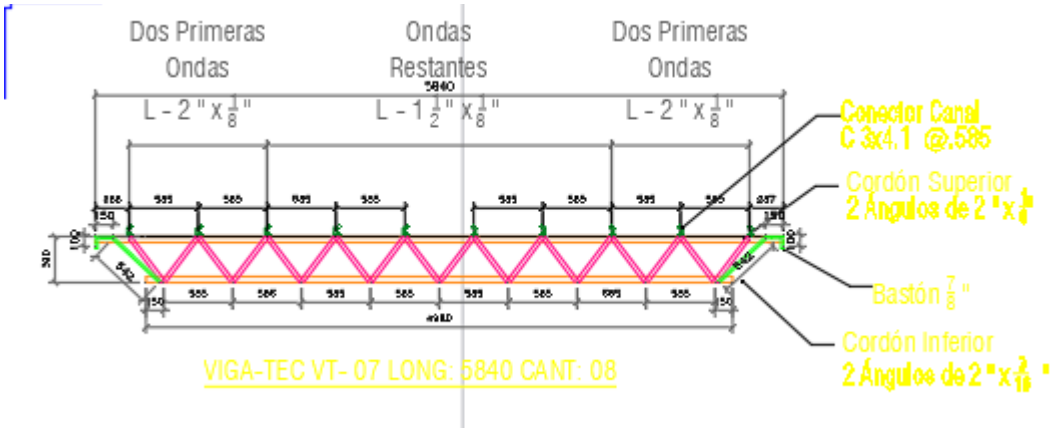



*Ilustración 36. Detalle joist VT 07.*

## DETALLE VIGA TEC VT 10 ENTREPISO 6 N +23.20

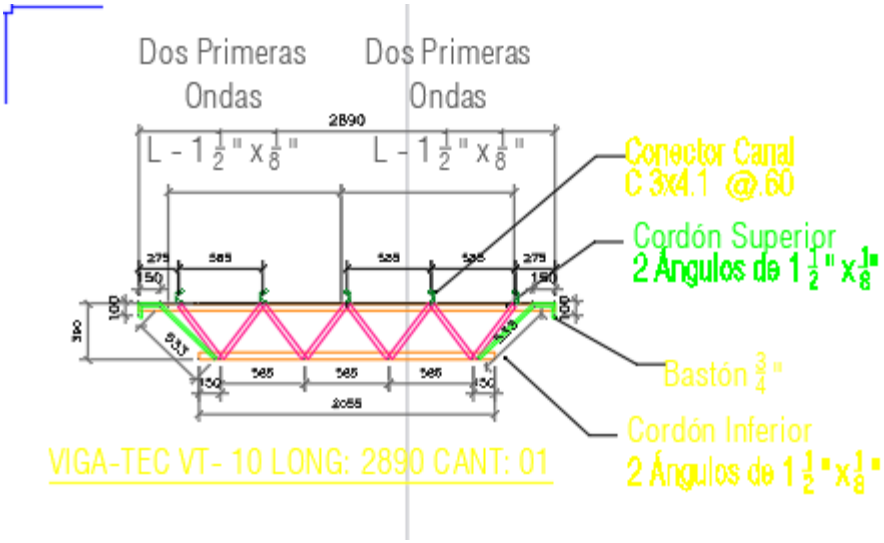



*Ilustración 37. Detalle joist VT 10*

## DETALLE VIGA TEC VT 11 ENTREPISO 6 N +23.20

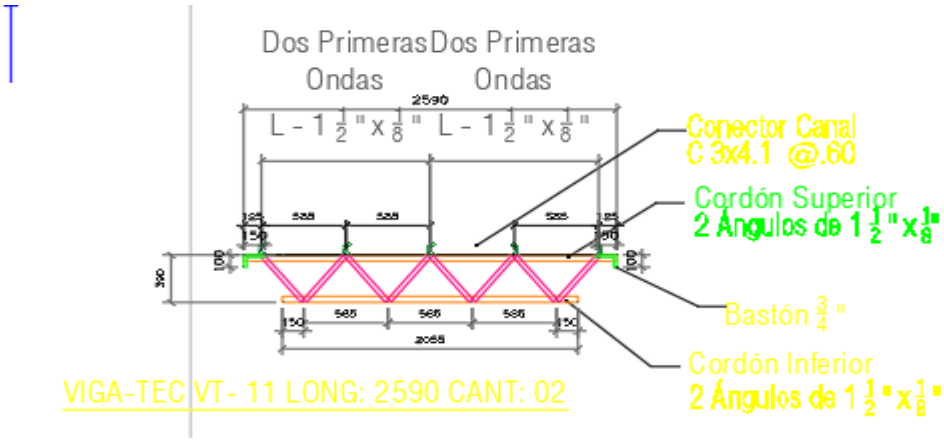



*Ilustración 38. Detalle joist VT 11*

## DETALLE VIGA TEC VT 12 ENTREPISO 6 N +23.20

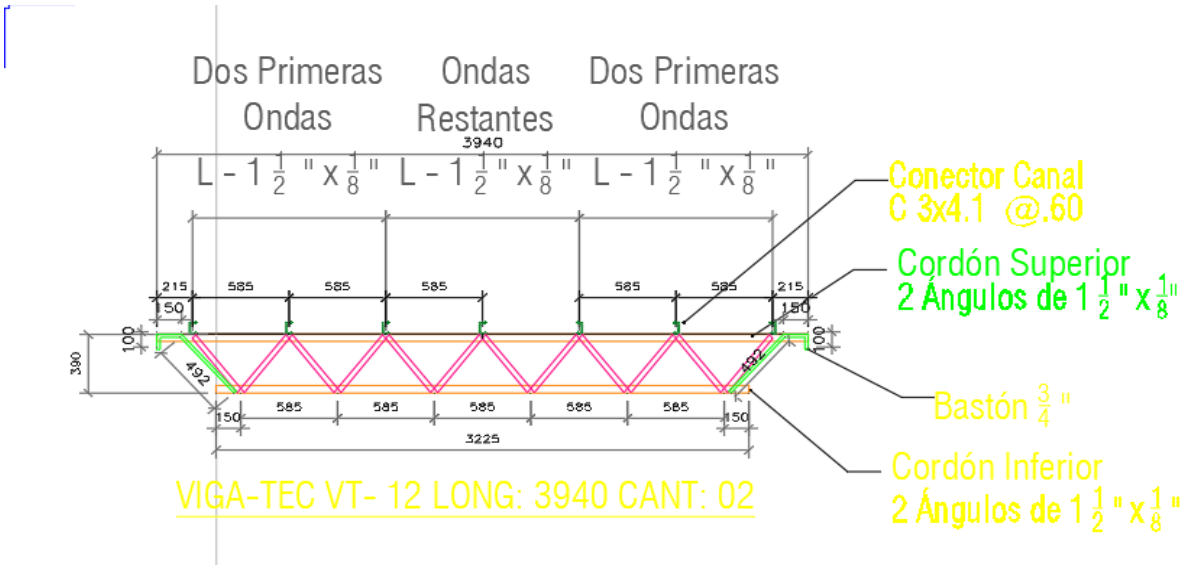



*Ilustración 39. Detalle joist VT 12*

## DETALLE VIGA TEC VT 13 ENTREPISO 6 N +23.20

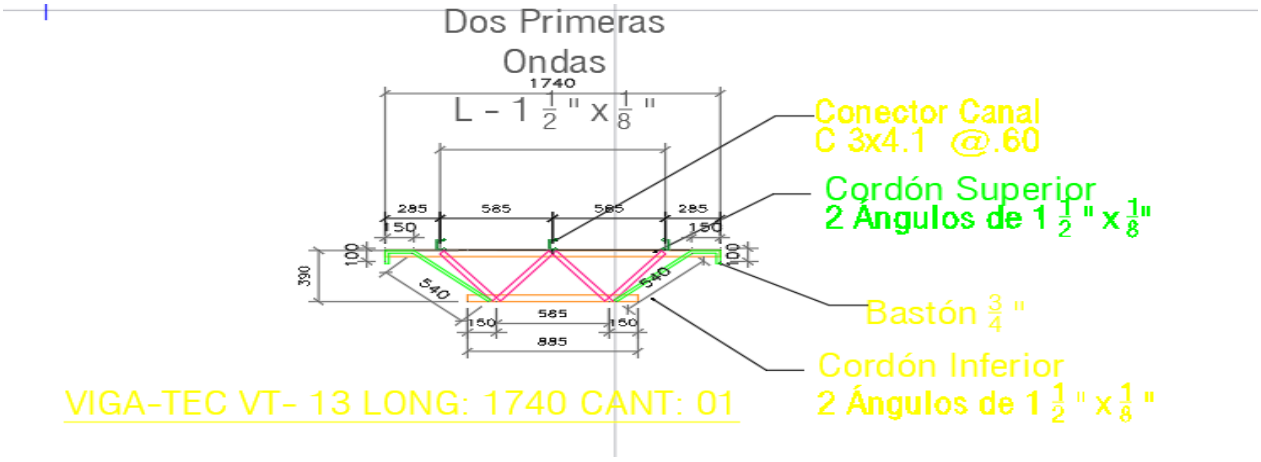



*Ilustración 40. Detalle joist VT 13*

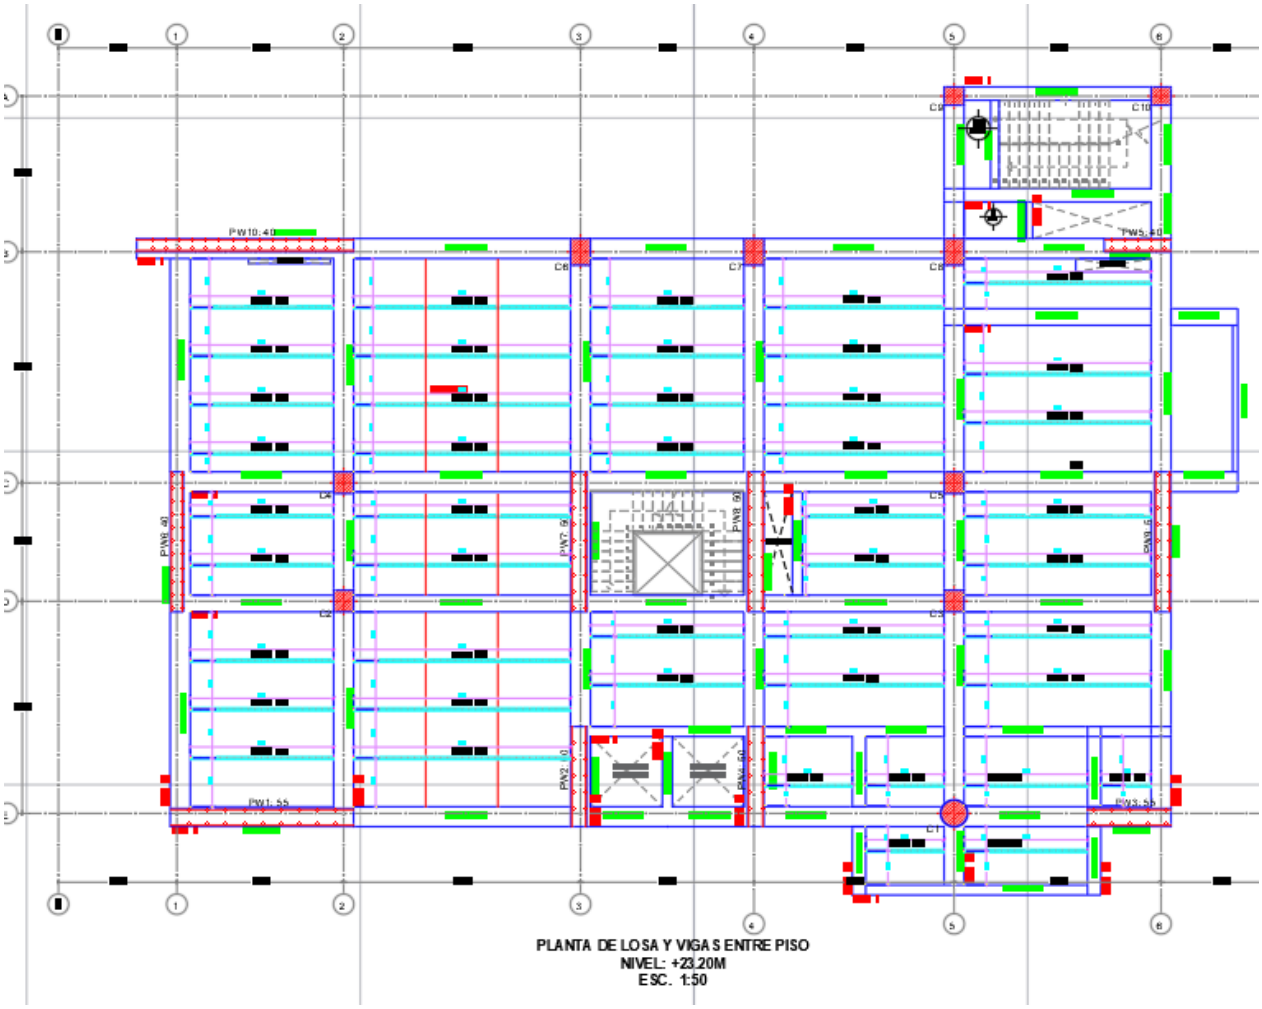



*Ilustración 41. Disposición de vigas joist entrepiso 6 N+23.20*

## DETALLE VIGAS ENTREPISO N +19.30

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6)

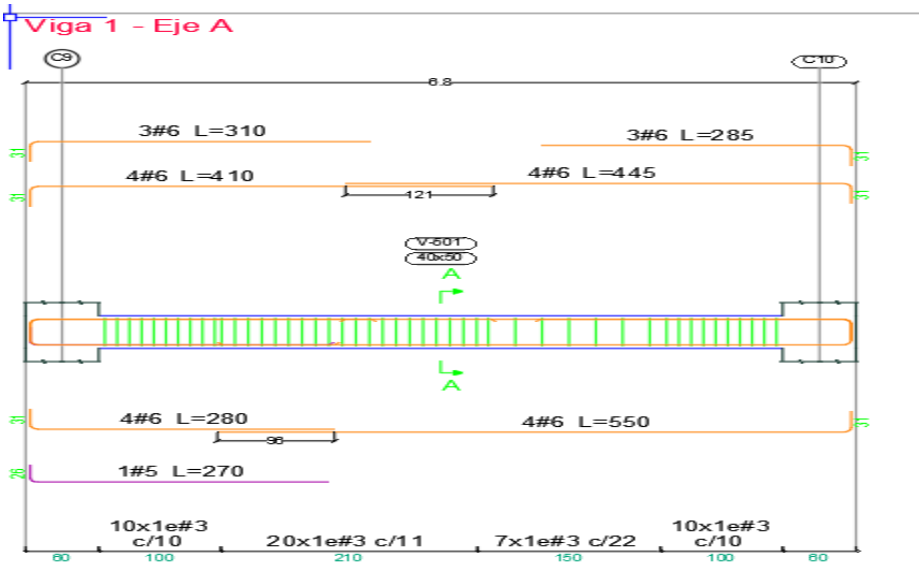



*Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga A N +19.30.*

- DETALLE REFUERZO VIGA A′ (5-6)

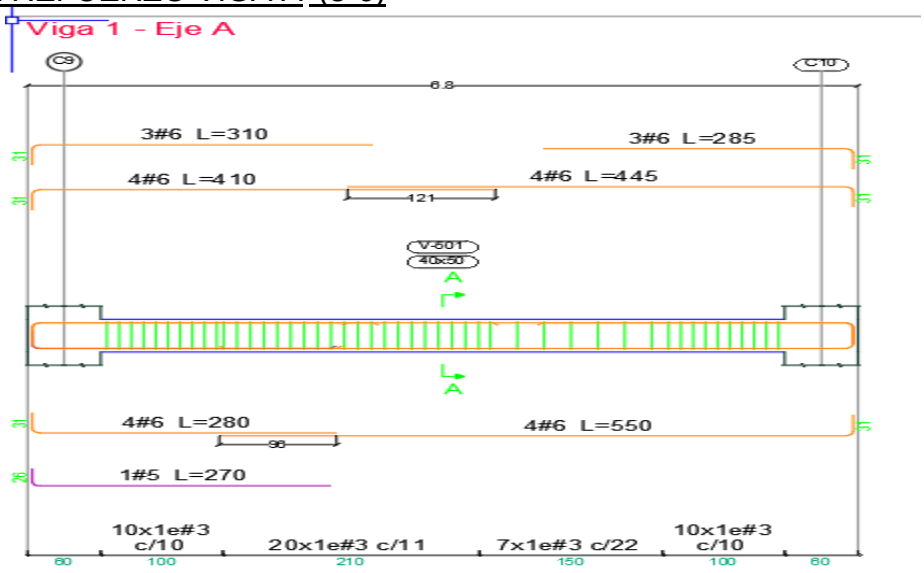
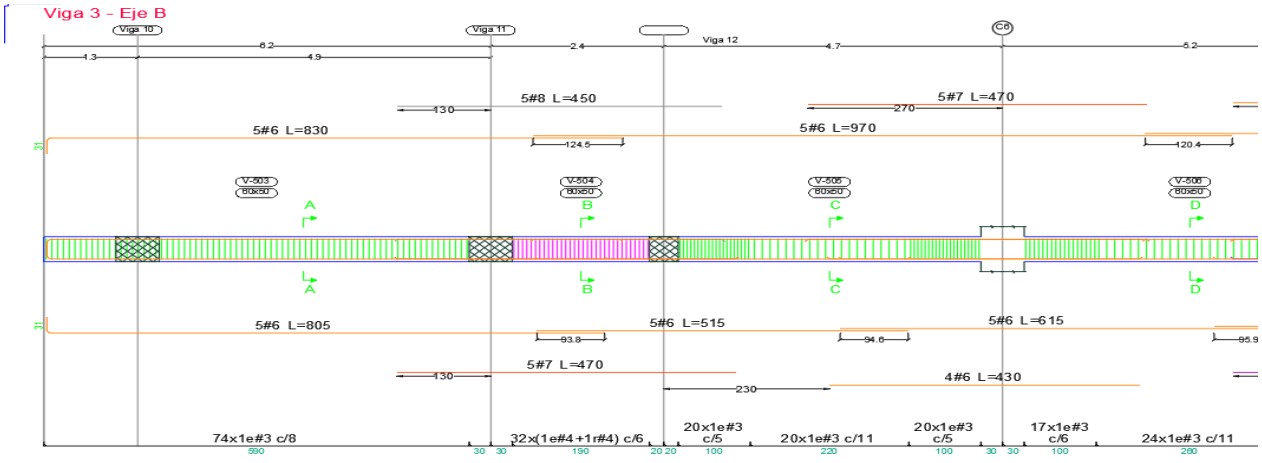



*Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga A' N+19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1′ – 6′) N +15.40



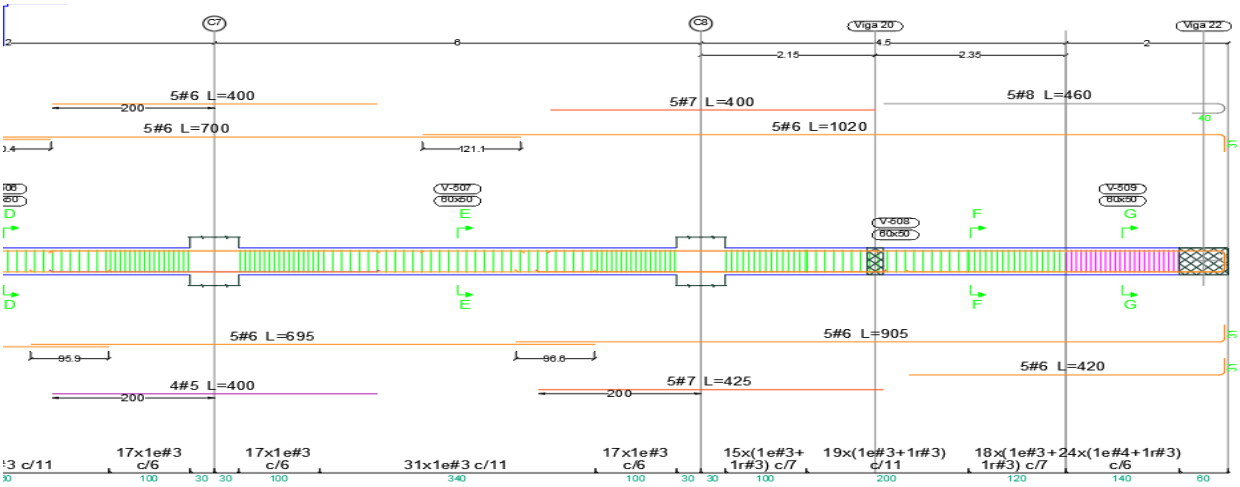
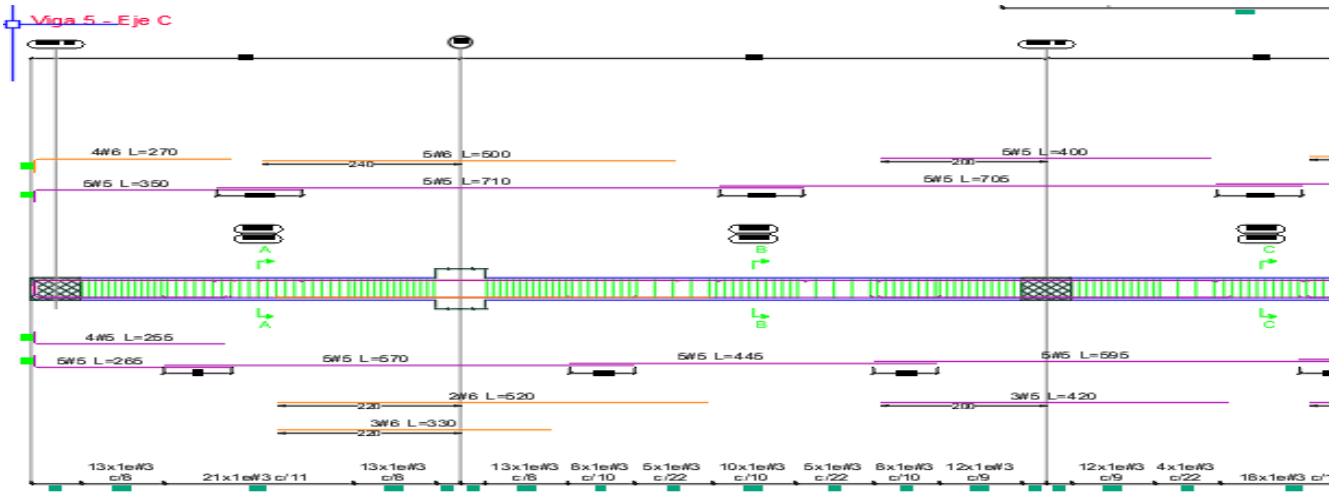



*Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga B N +19.30.*

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1′ -6′) N +19.30



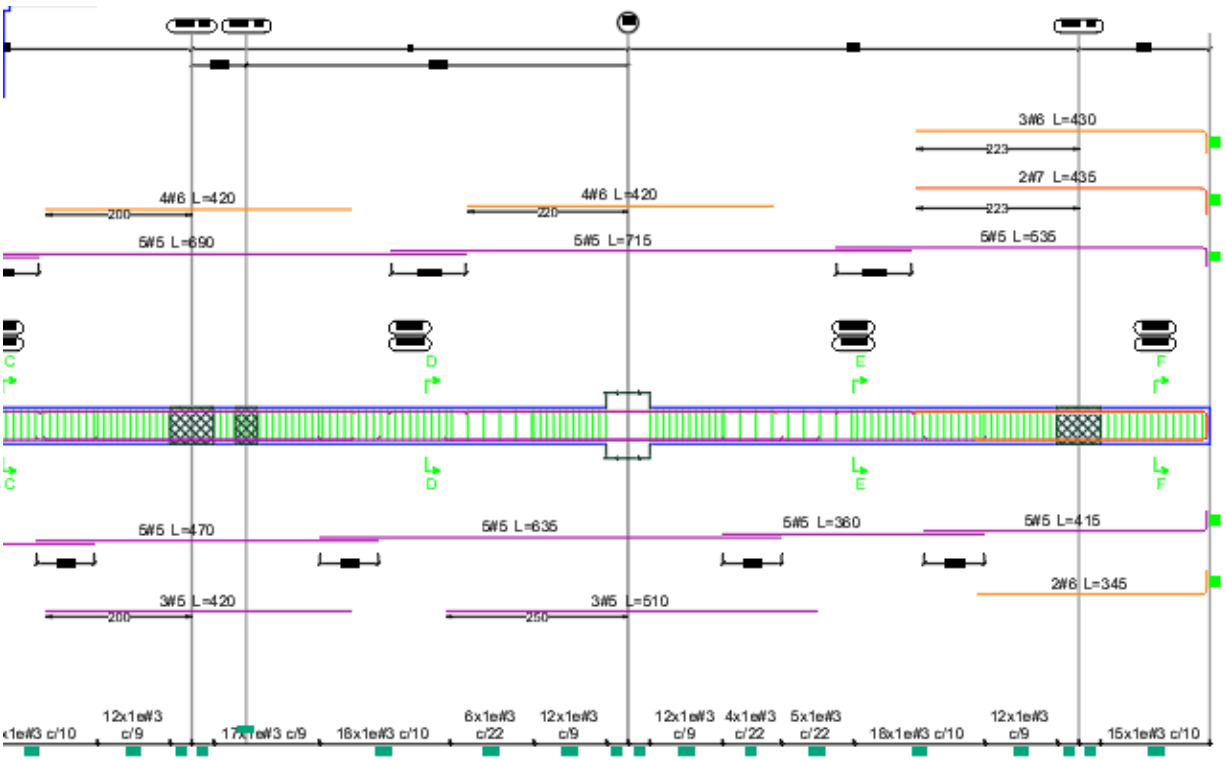



*Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga C N +15.40.*

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2)  N +19.30

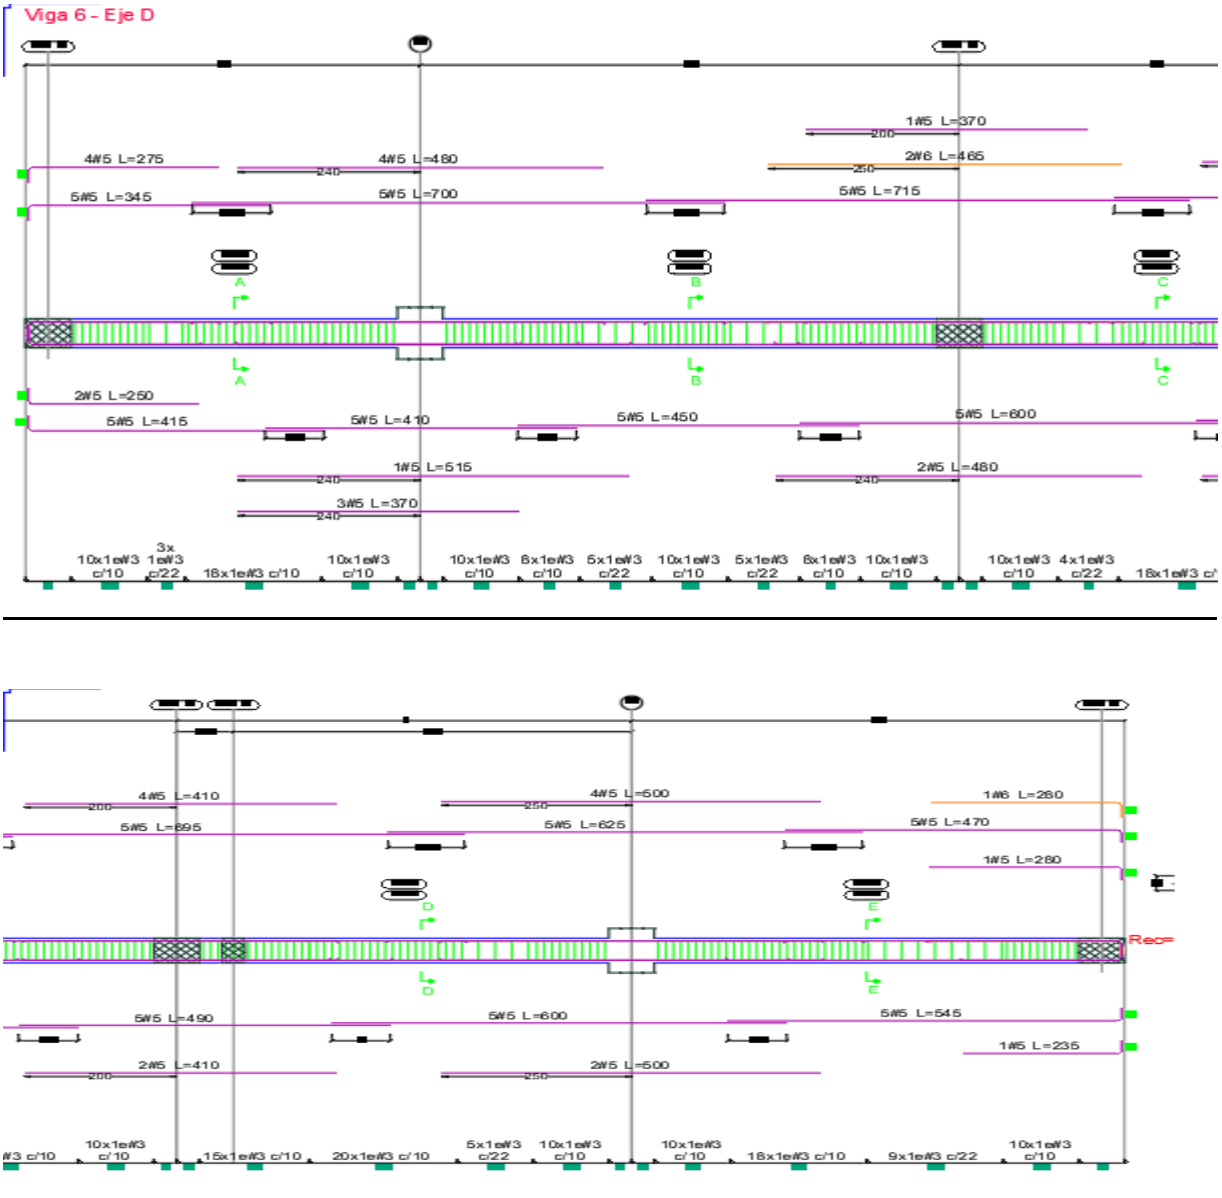



*Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)  N +15.40*

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6')  N +19.30

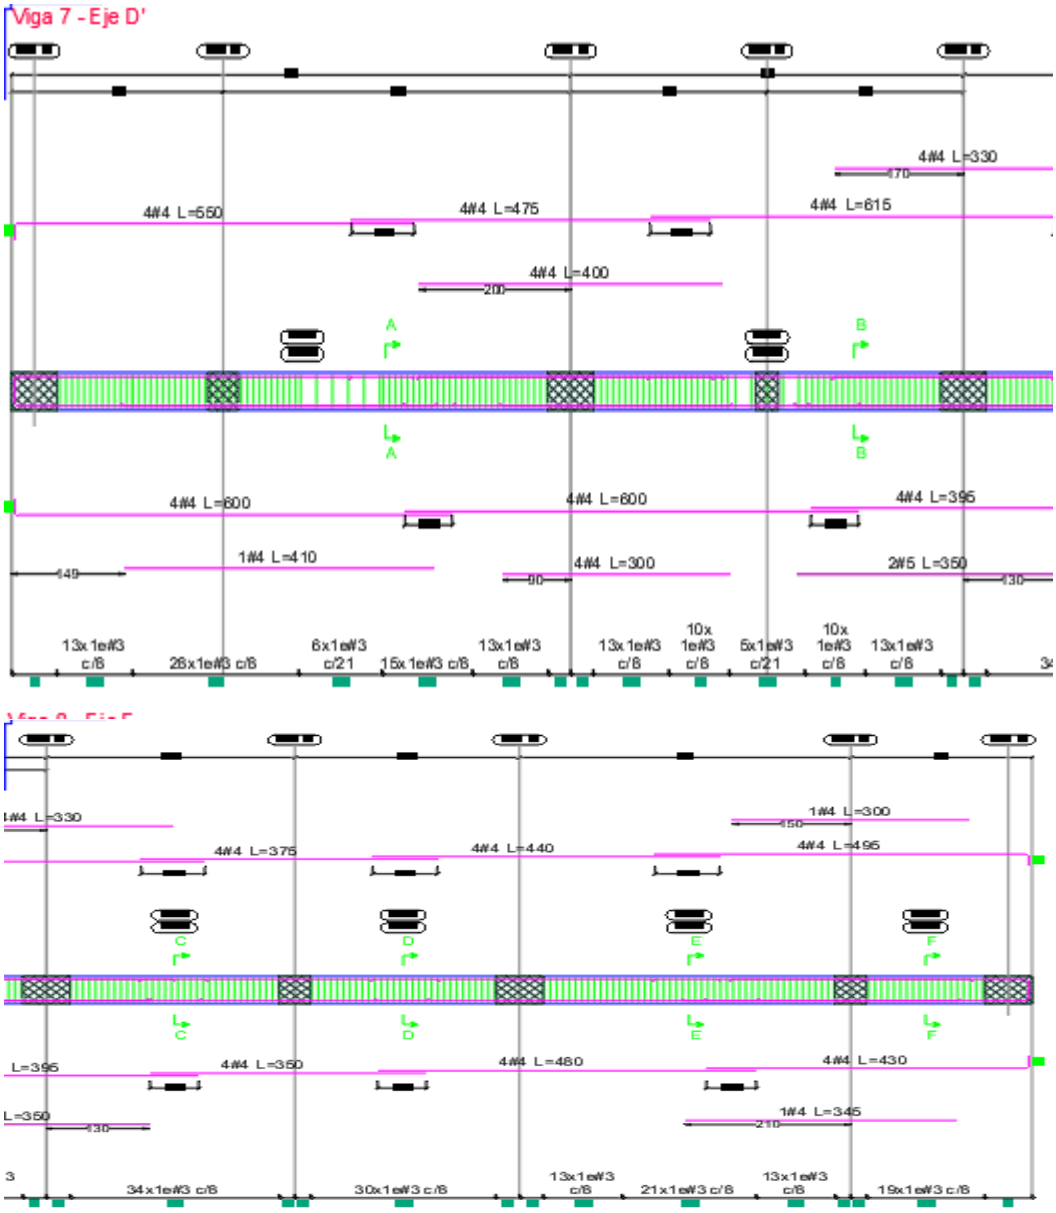



*Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga D (1'-6')  N +15.40.*

- DETALLE REFUERZO VIGA E (1- 6)

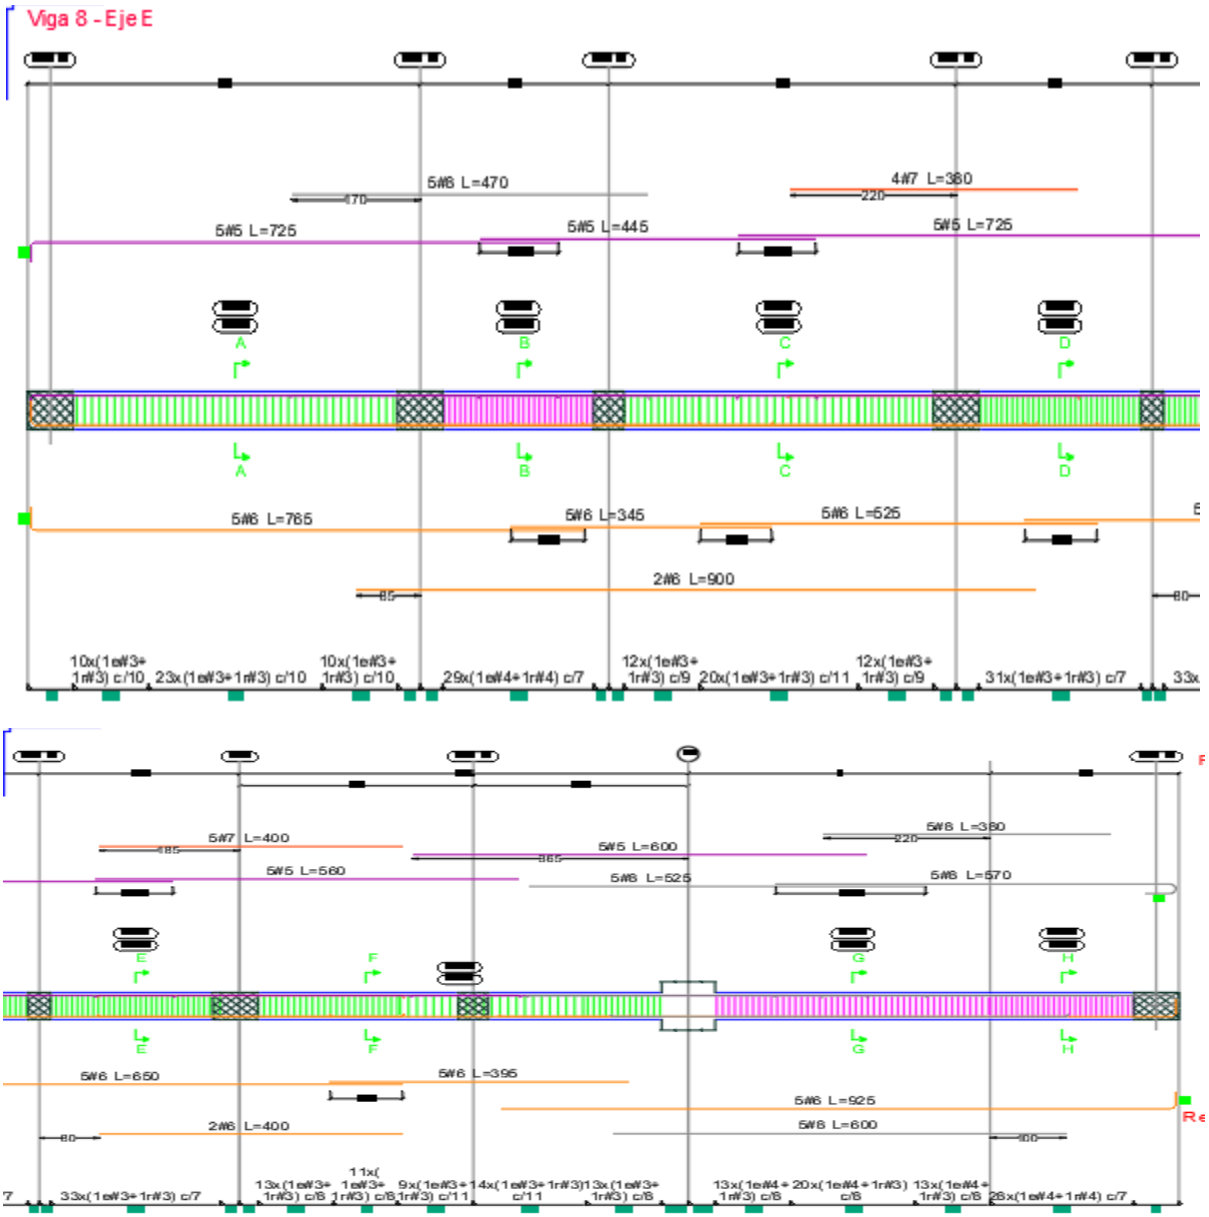



*Ilustración 48. Disposición de refuerzo viga E (1-6) N +19.30*

- *DETALLE REFUERZO VIGA E **

- DETALLE REFUERZO VIGA E *

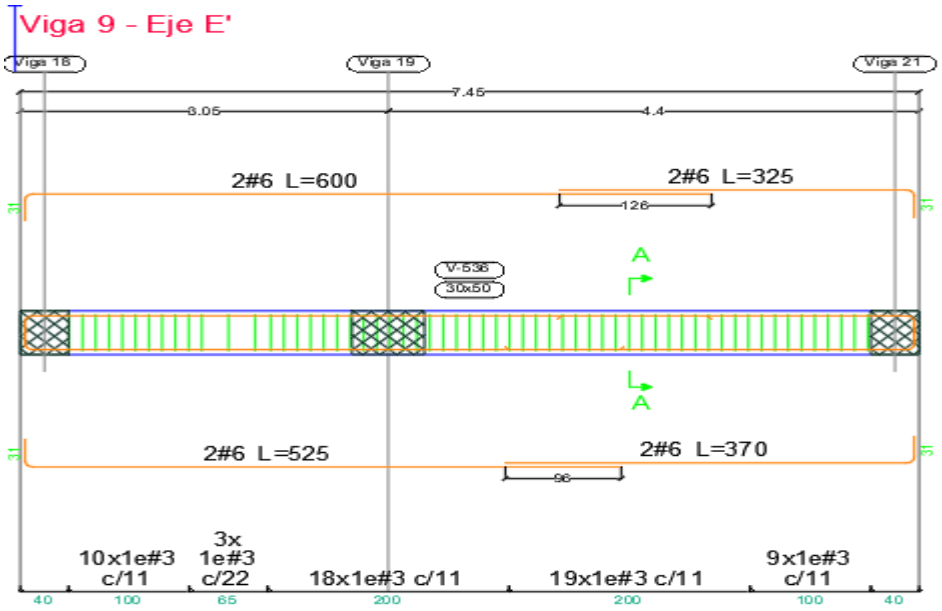



*Ilustración 49. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E) N +19.30

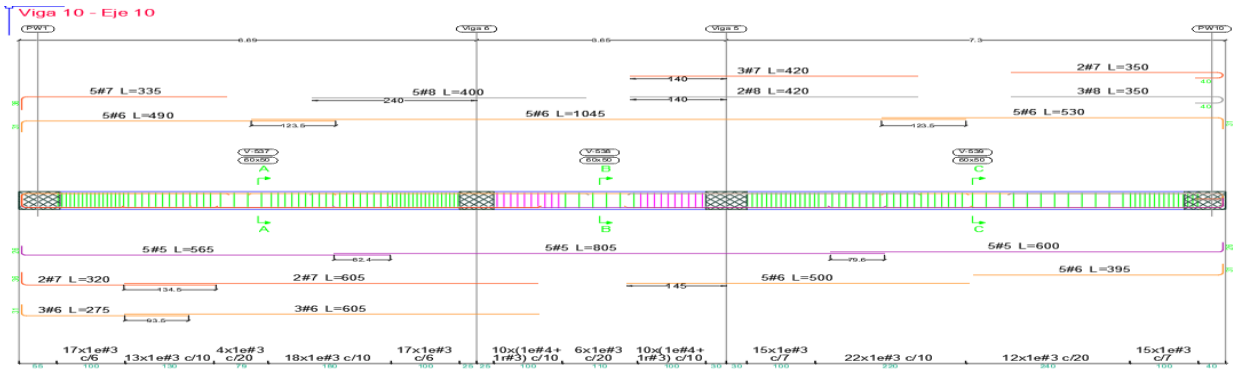



*Ilustración 50. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*) N +19.30*

- **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E)**

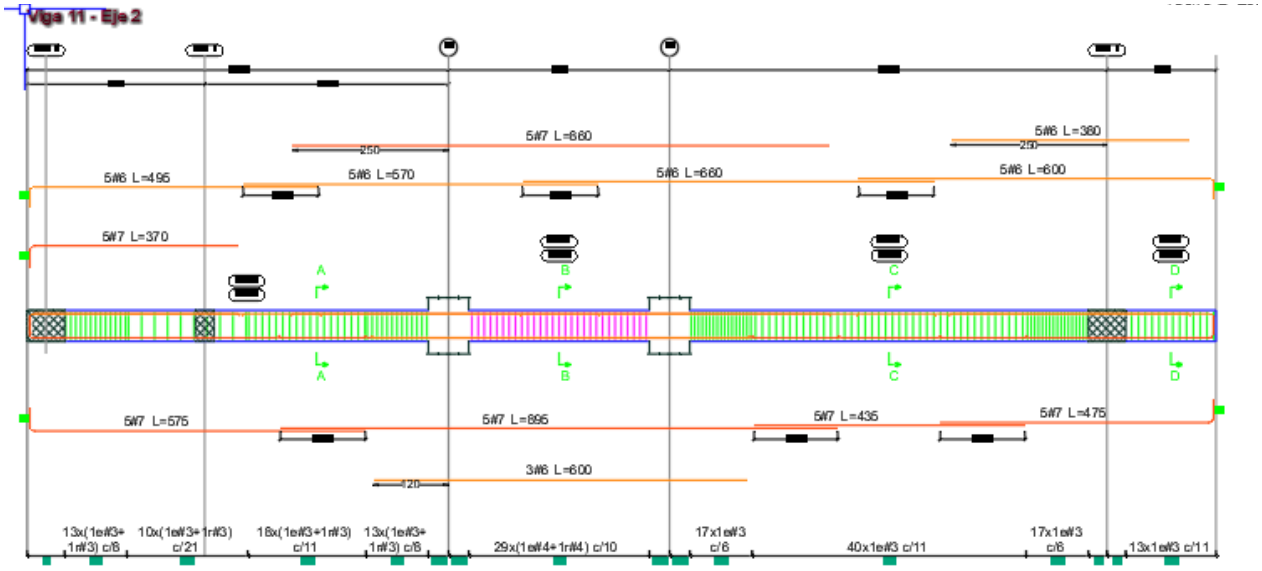



*Ilustración 51. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E)

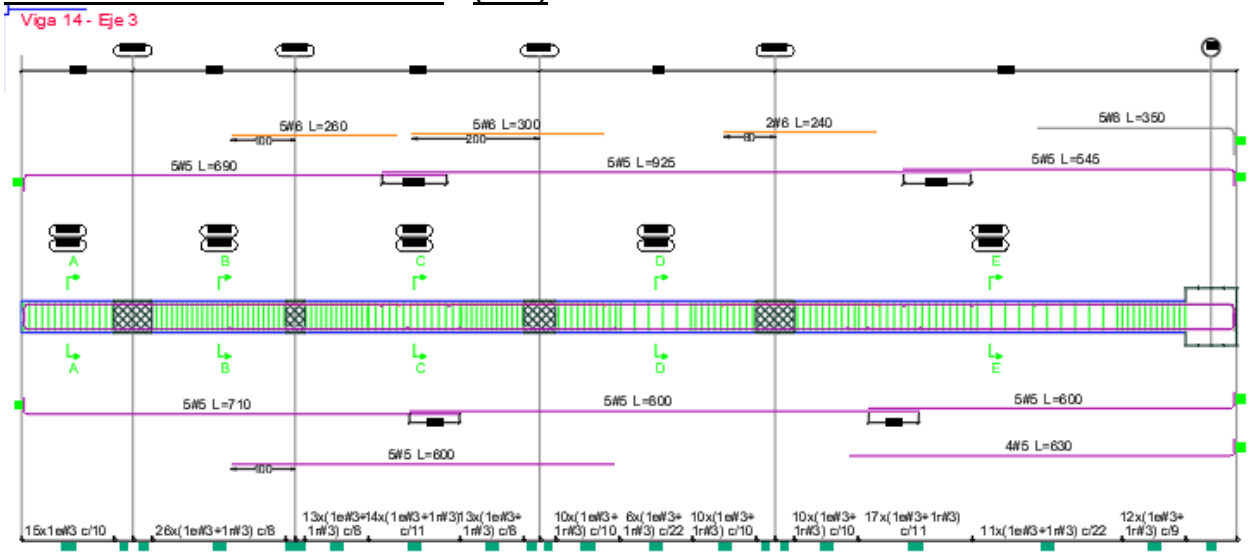



*Ilustración 52. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 3* (B-E)

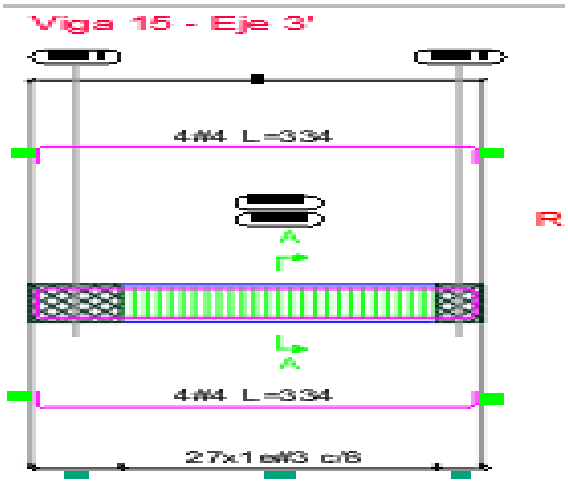



*Ilustración 53. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E) N +15.40*

- *DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E)*

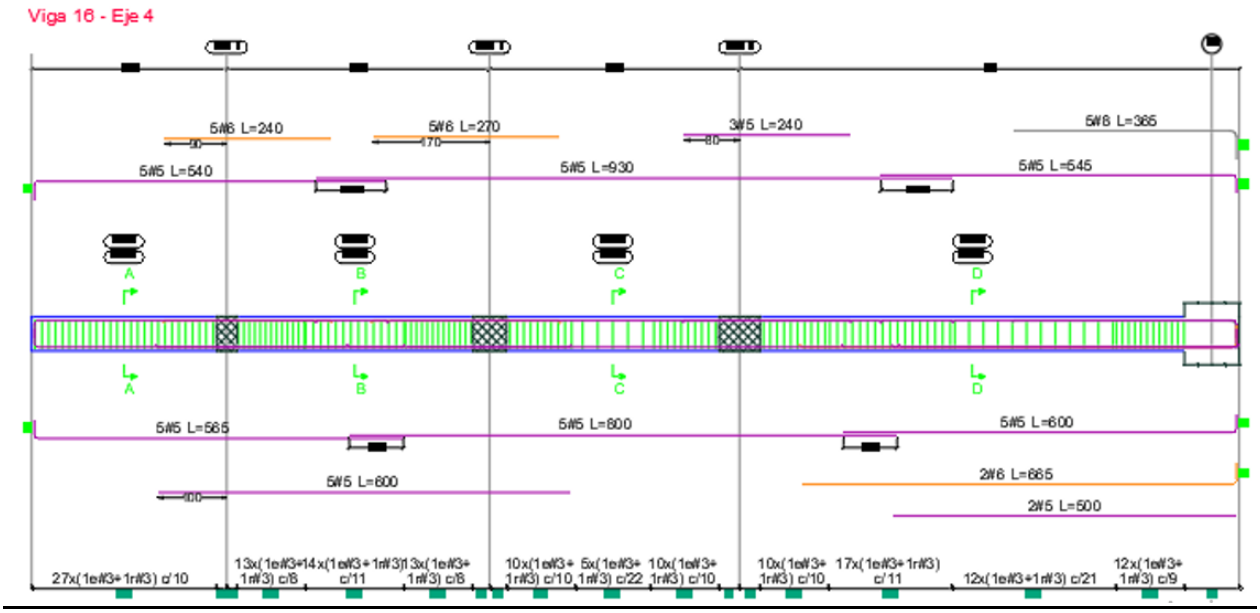



*Ilustración 54. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D)

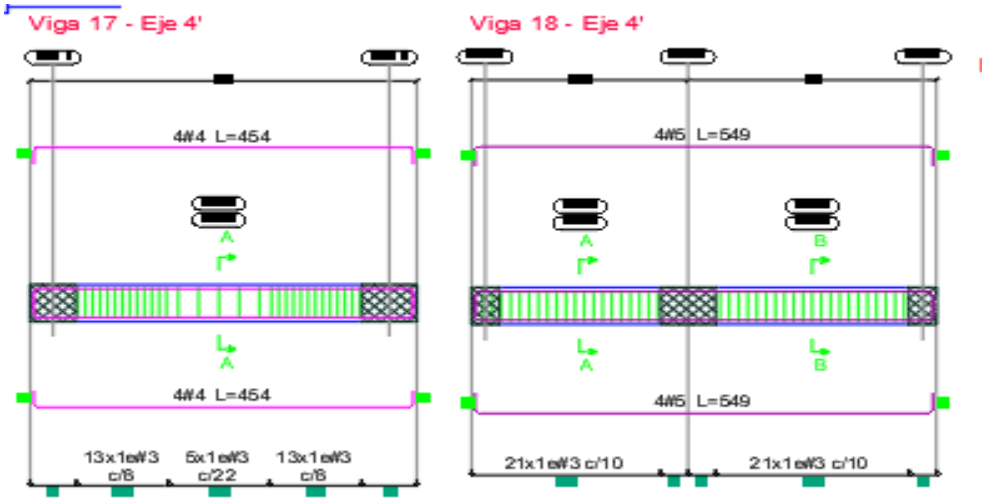



*Ilustración 55. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E) N +19.30

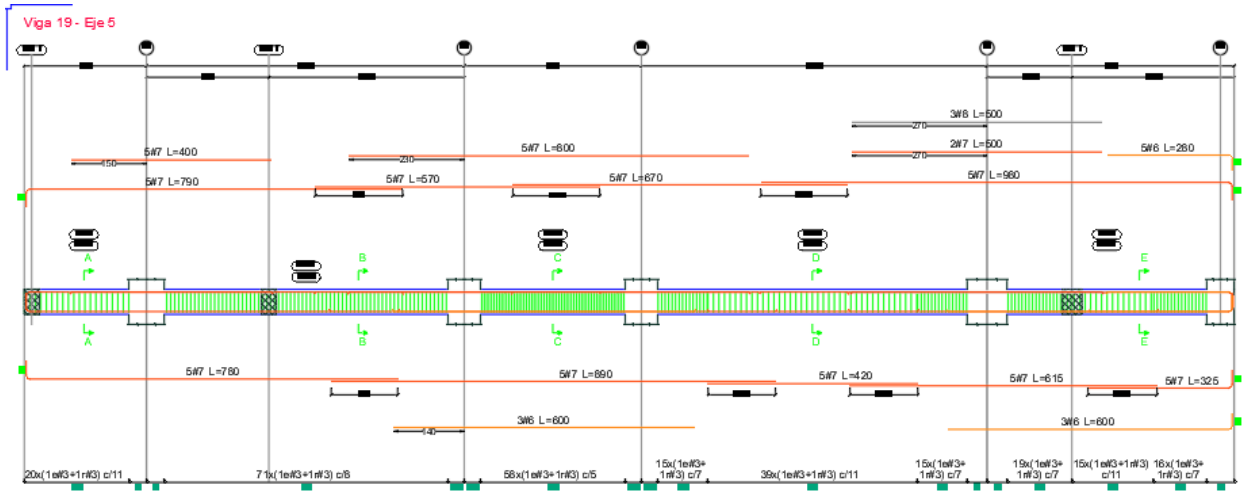



*Ilustración 56.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +15.40*

DETALLE REFUERZO VIGA 5′ (B-E)

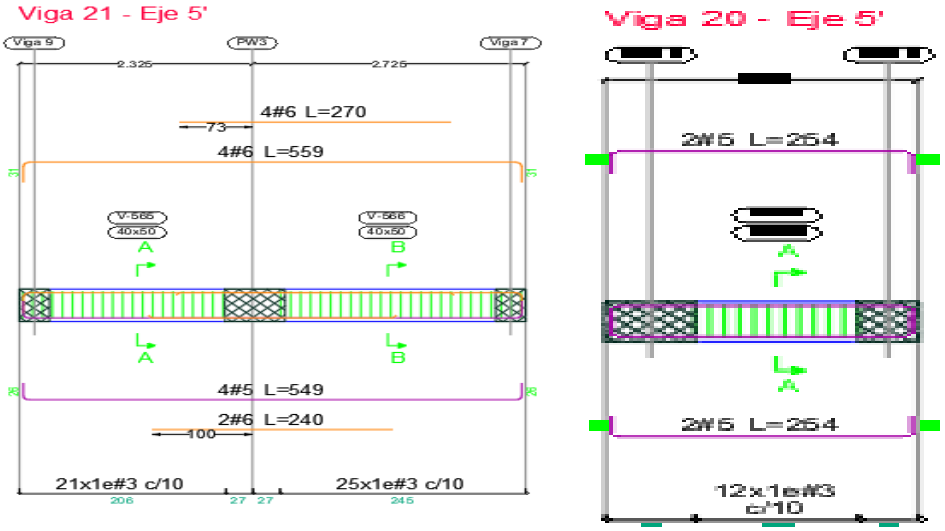



*Ilustración 57. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E) N +19.30

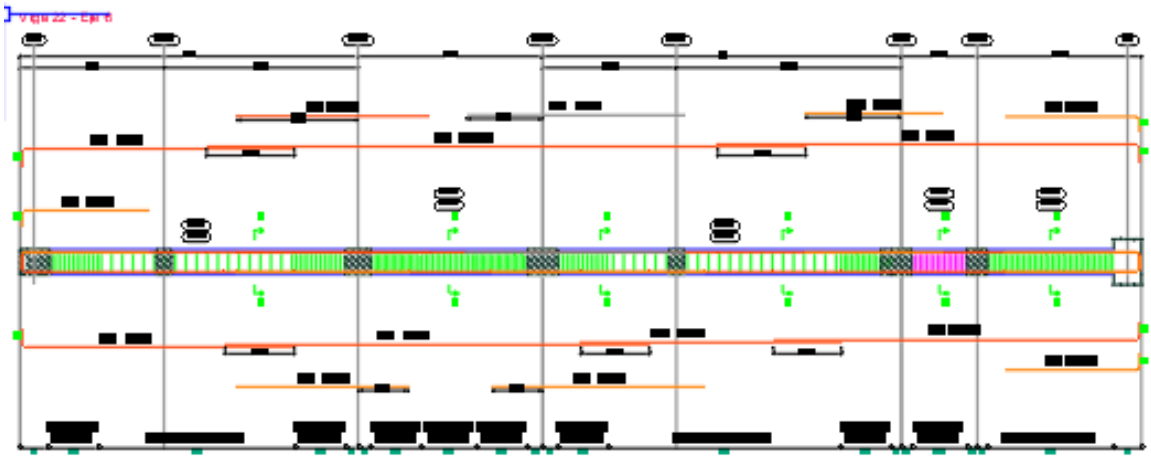


*Ilustración 58. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +19.30*

- DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E) N +15.40

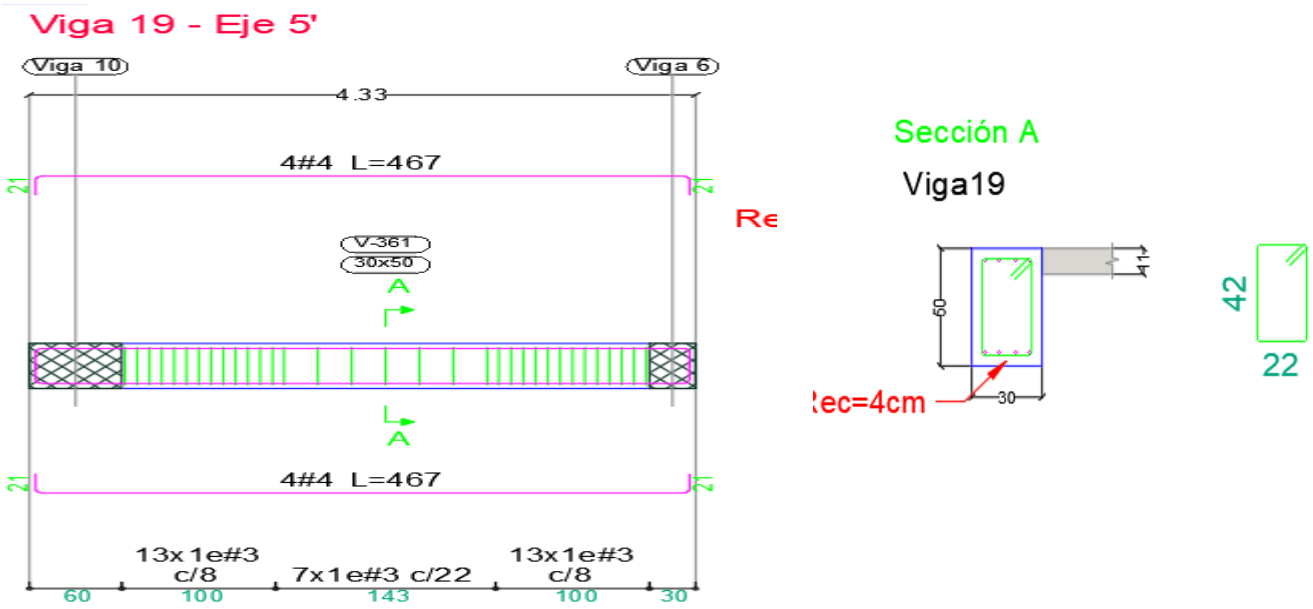



*Ilustración 59. Disposición de refuerzo viga 5 ' (B-E) N +15.40*

## DETALLE VIGAS ENTREPISO N +23.20

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6)

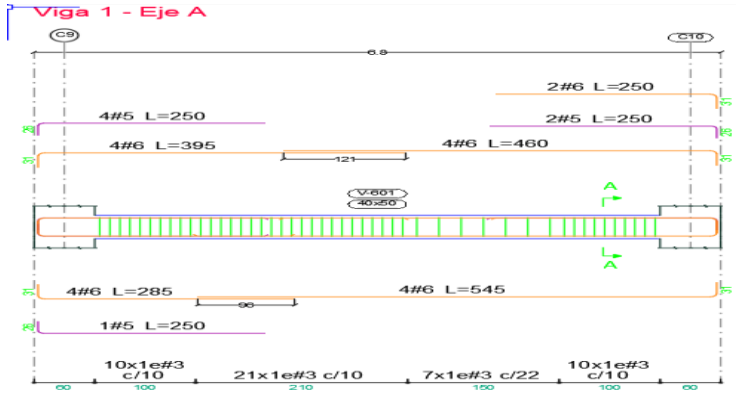



*Ilustración 60. Disposición de refuerzo viga A.*

- DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6)

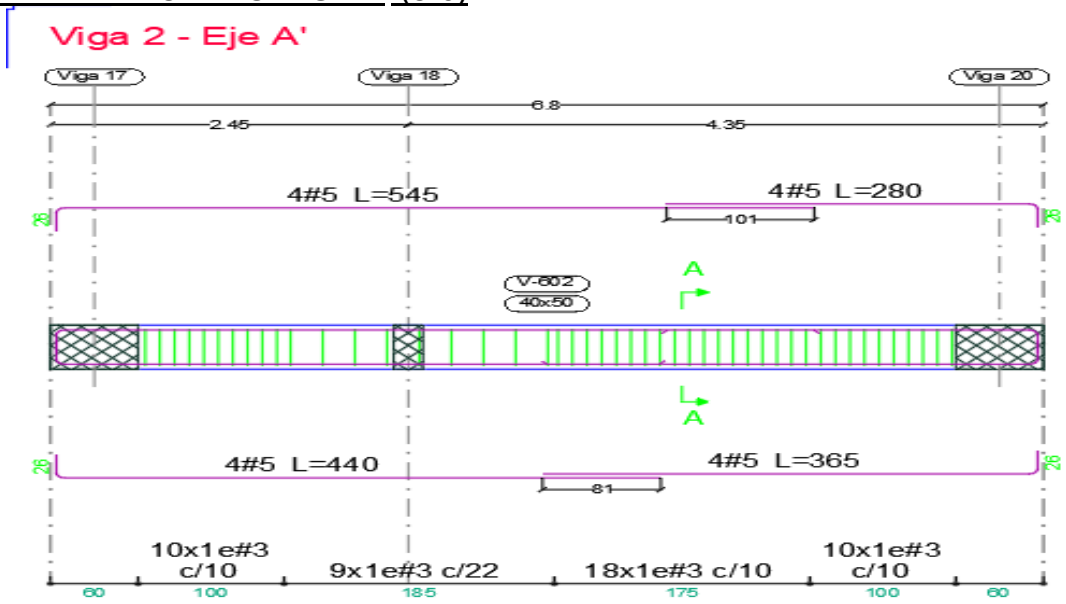
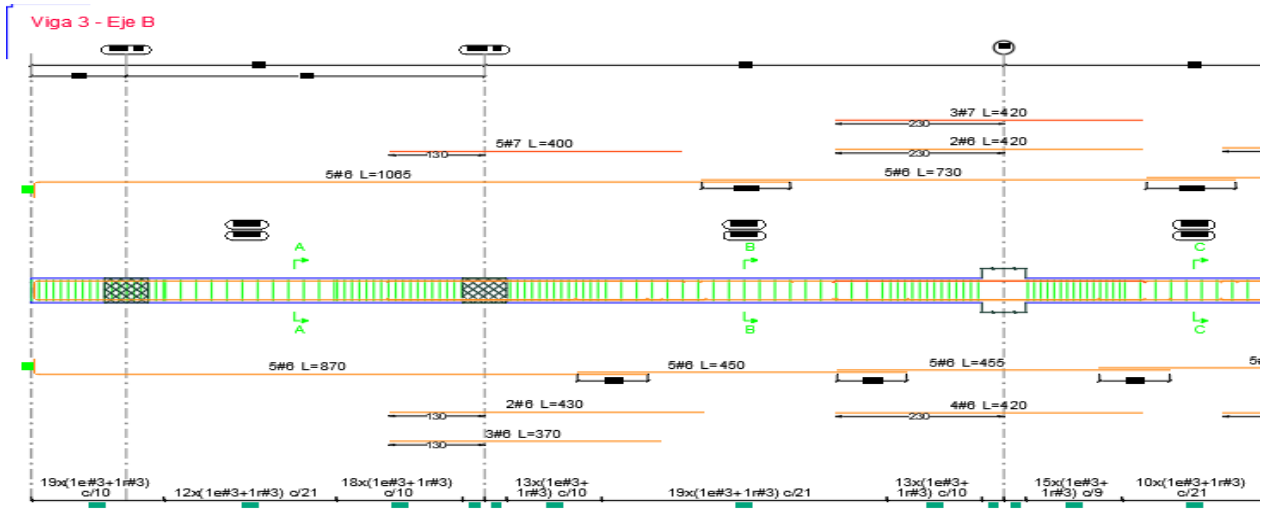



*Ilustración 61. Disposición de refuerzo viga A'*

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6')



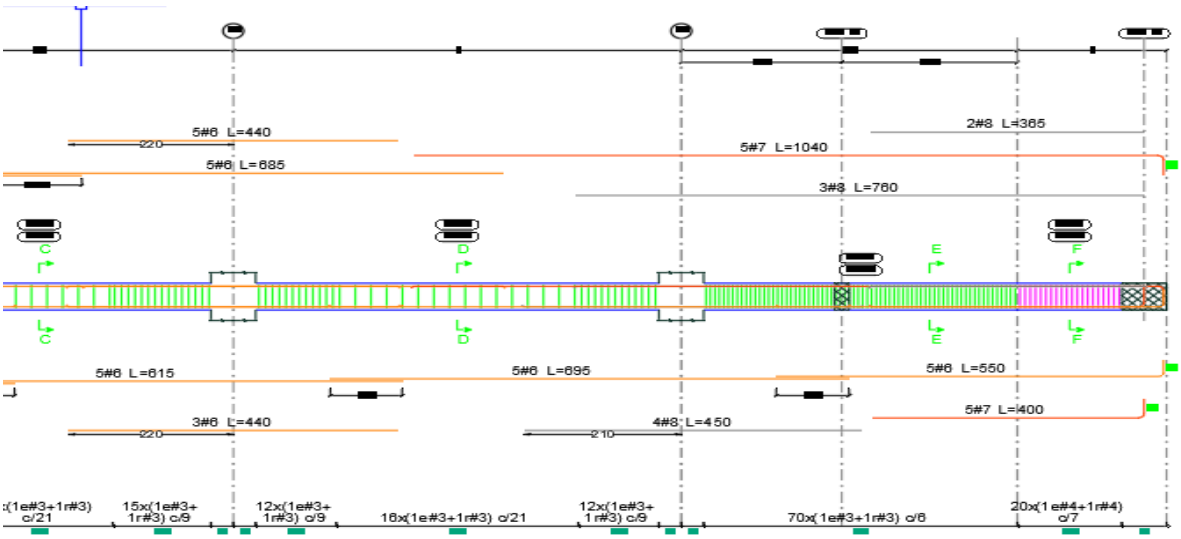



*Ilustración 62. Disposición de refuerzo viga B*

- DETALLE REFUERZO VIGA B* (5 -6')

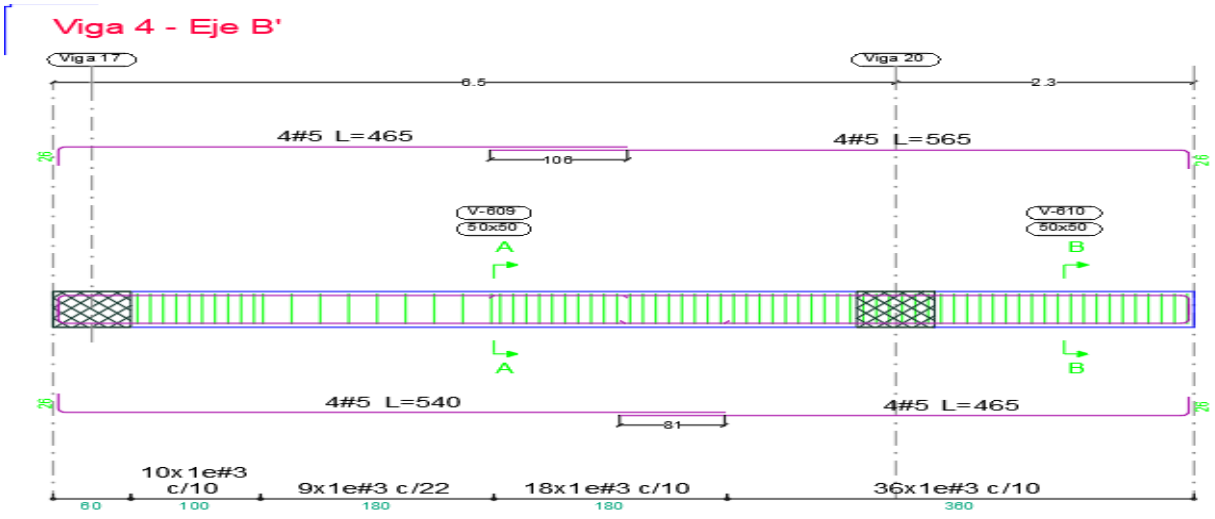
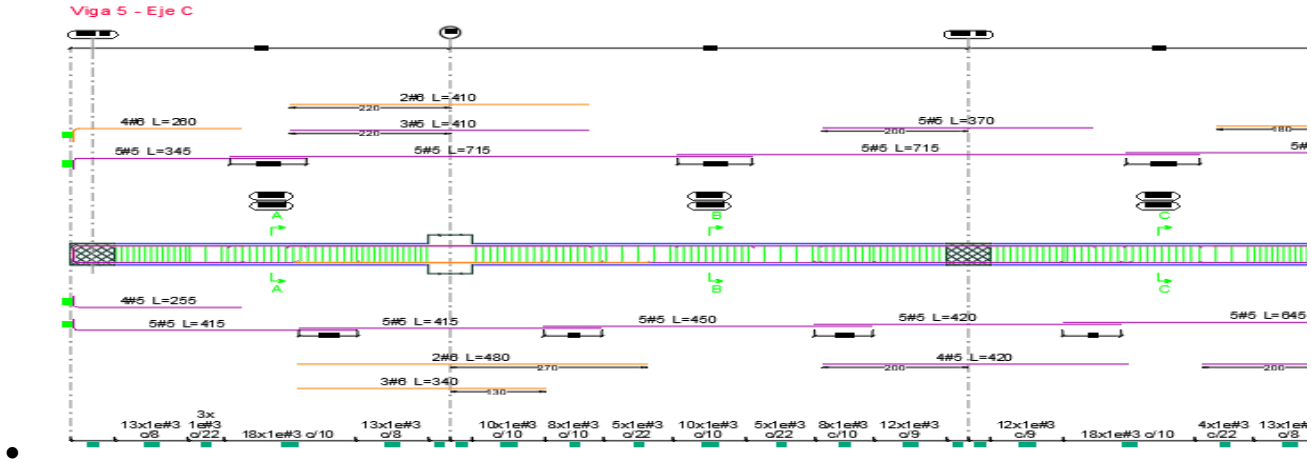



*Ilustración 63. Disposición de refuerzo viga B*(5-6*)*

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1′ -6′)



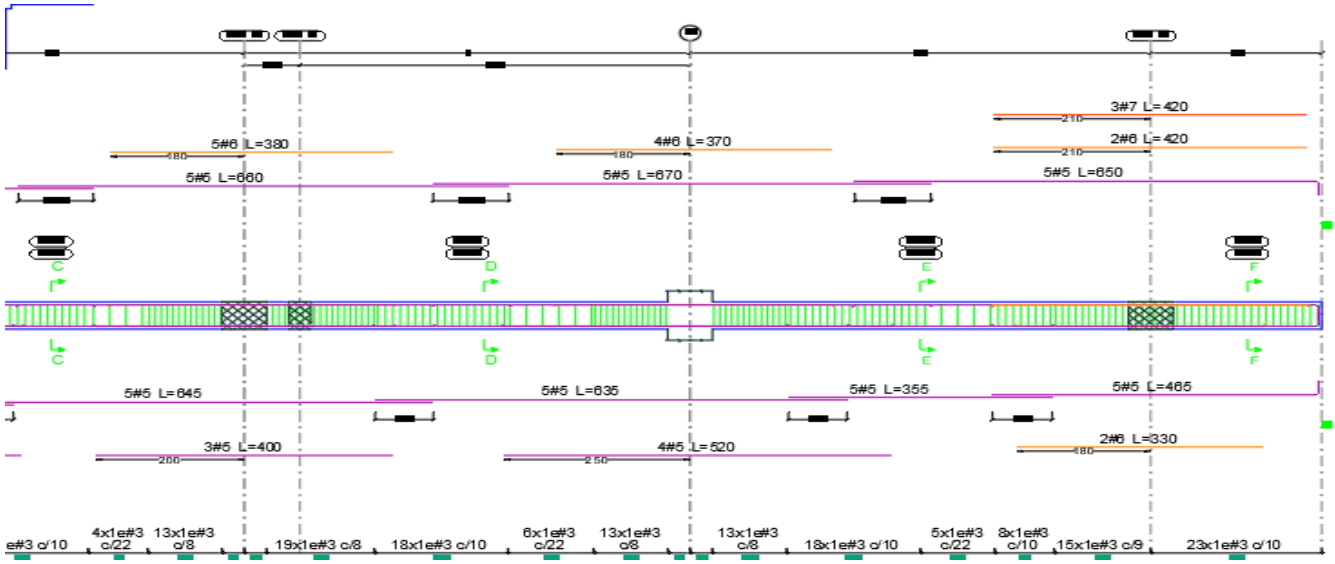




*Ilustración 64. Disposición de refuerzo viga C*

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2)

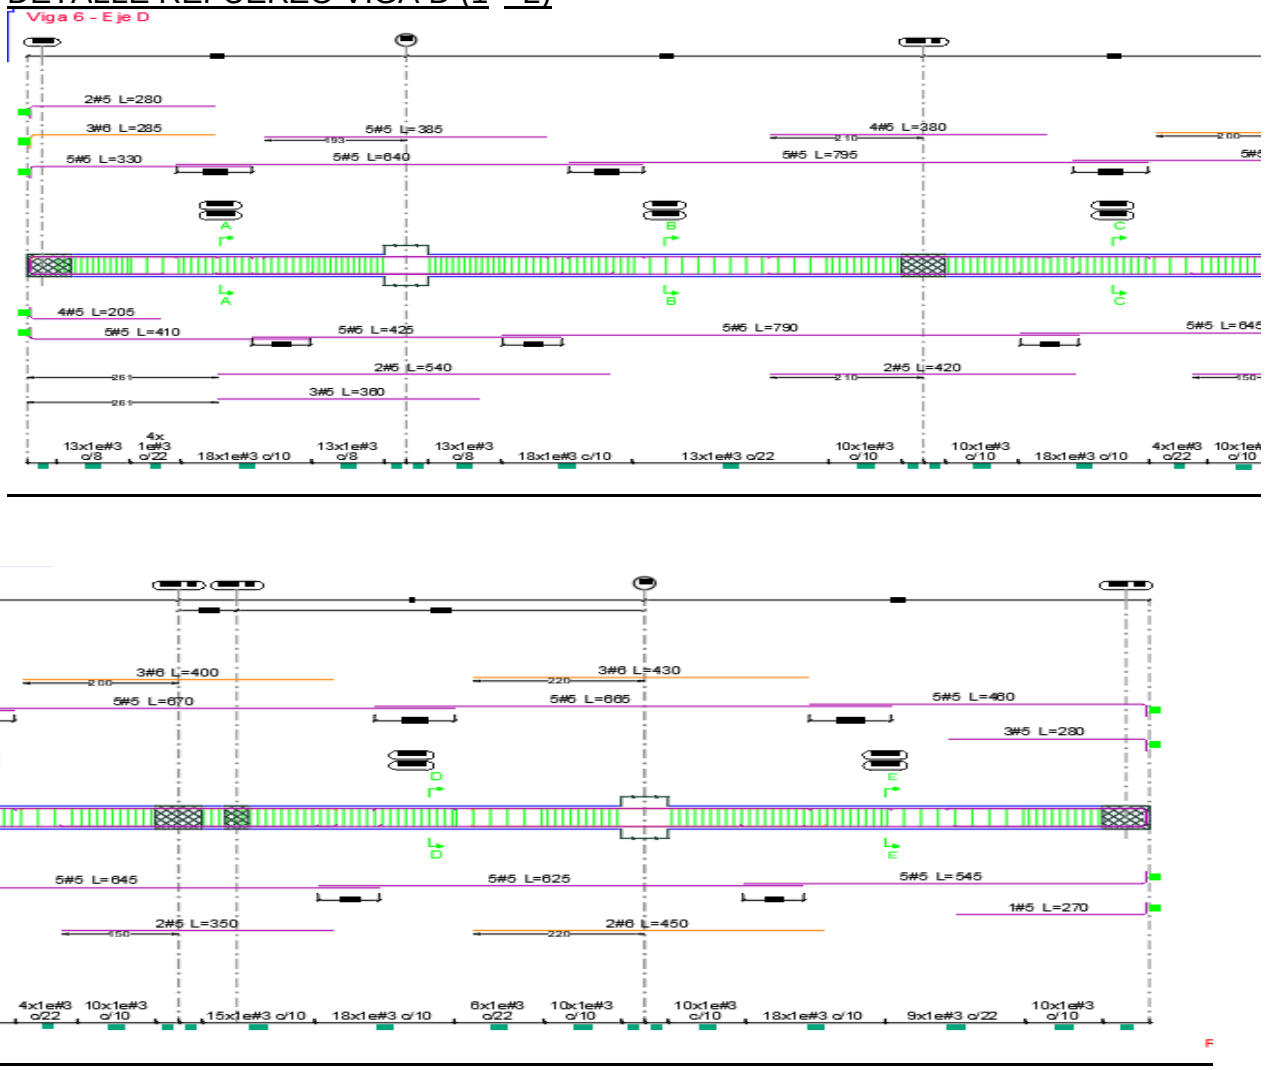



*Ilustración 65. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)*

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6')

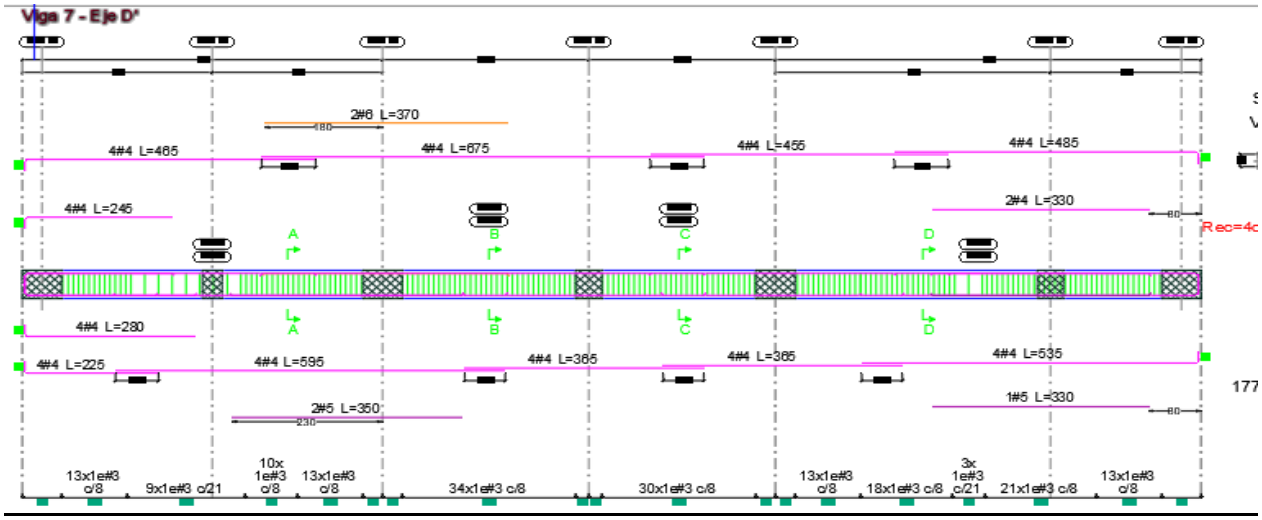
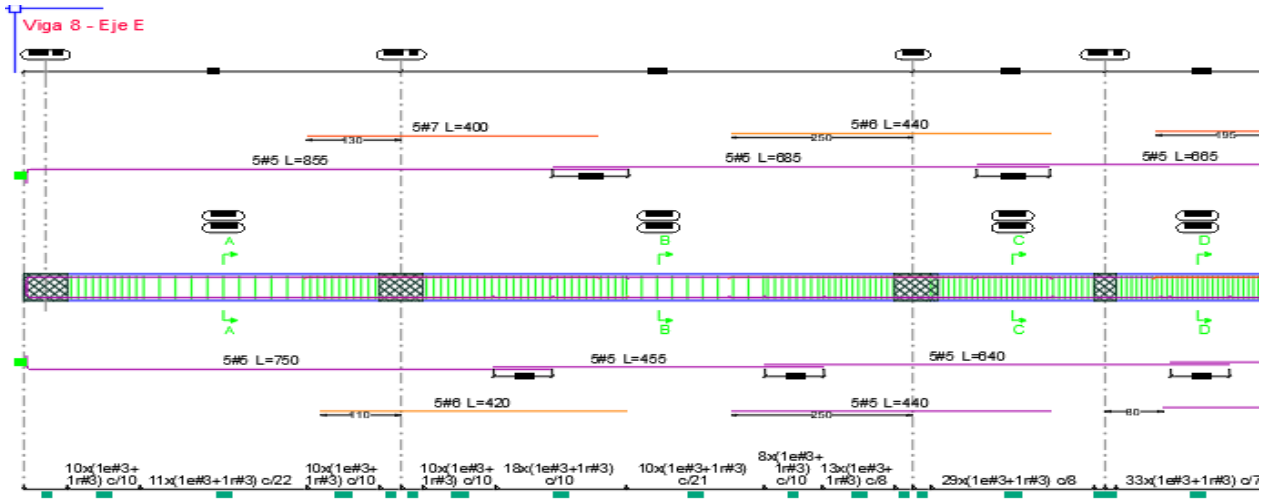



*Ilustración 66. Disposición de refuerzo viga D (1'-6')*

- DETALLE REFUERZO VIGA E (1- 6)



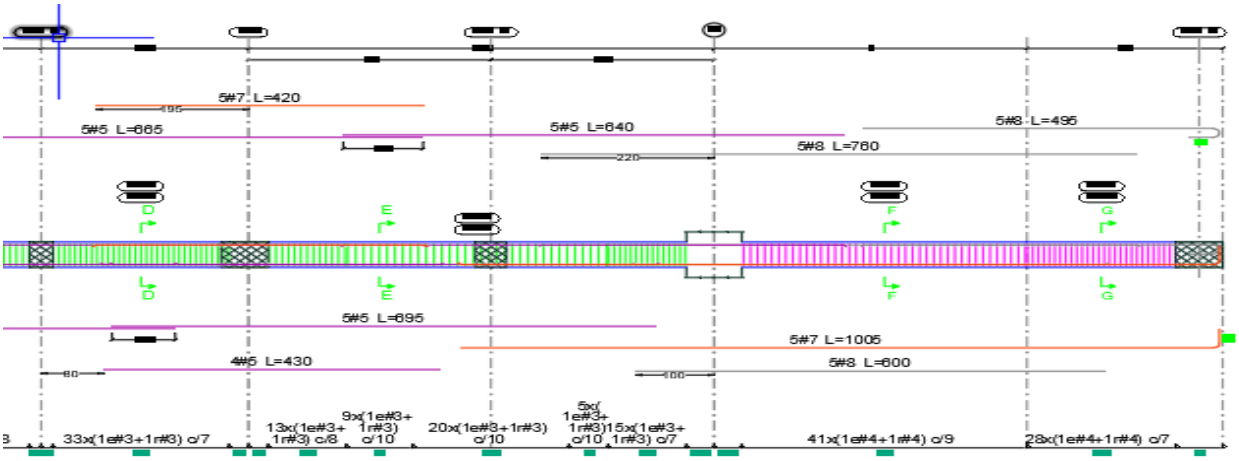



*Ilustración 67. Disposición de refuerzo viga E (1-6)*

- DETALLE REFUERZO VIGA E *

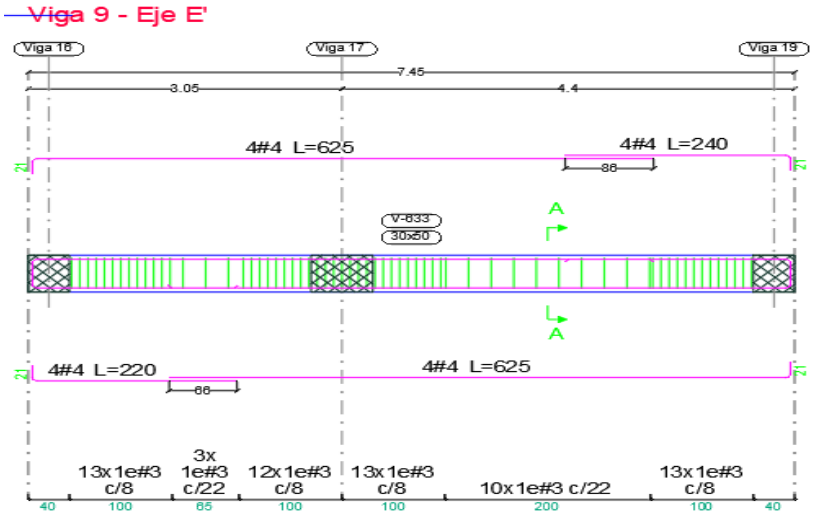



*Ilustración 68. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E)

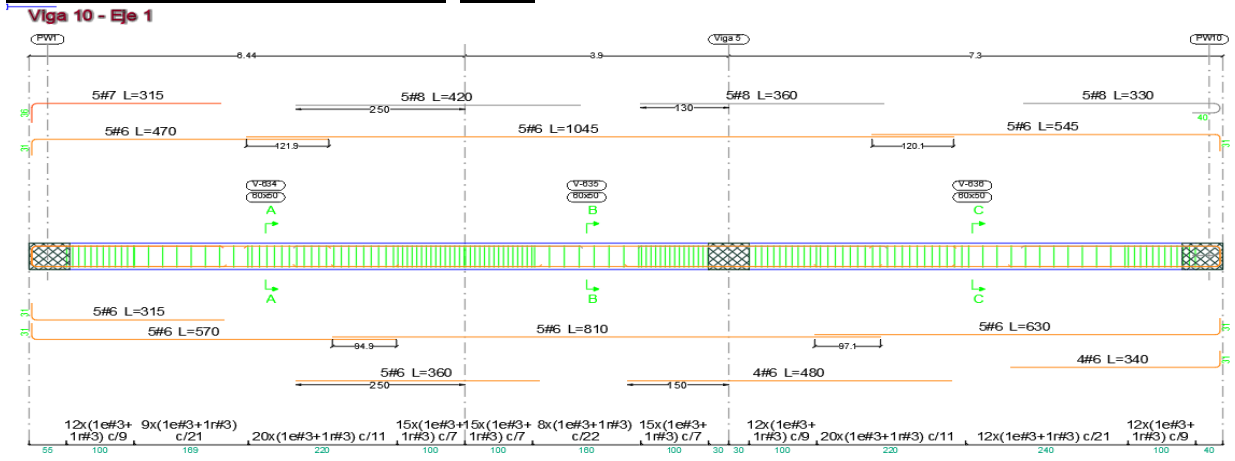



*Ilustración 69. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)*

- **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E)**

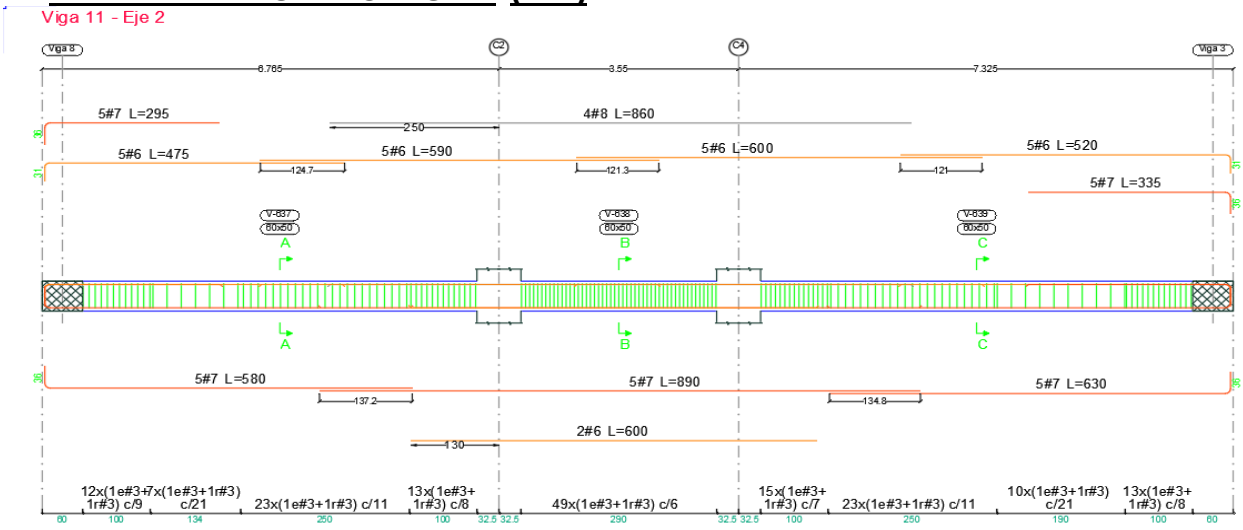



*Ilustración 70. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E)

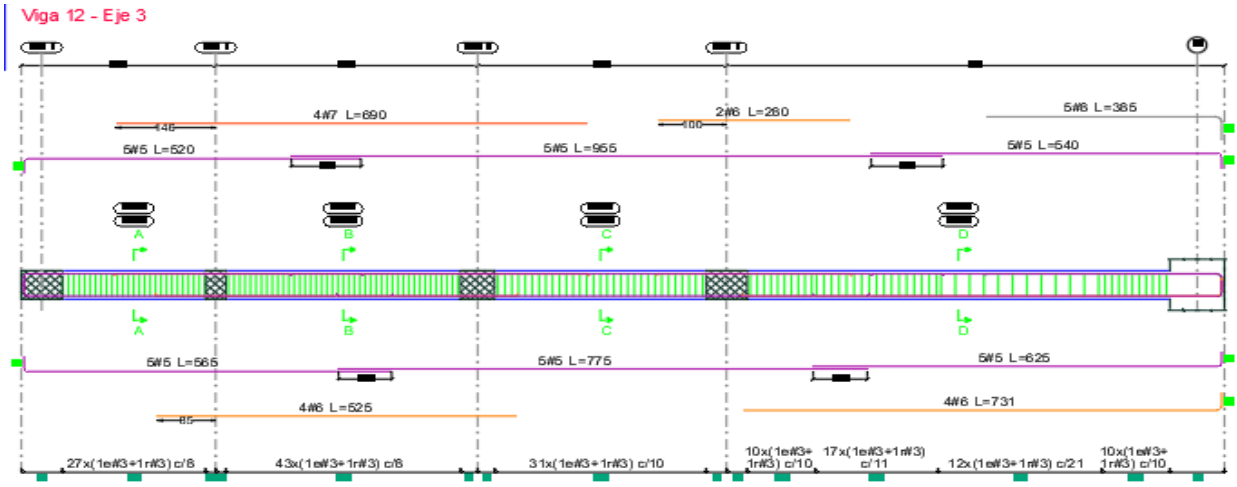



*Ilustración 71. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 3* (B-E)

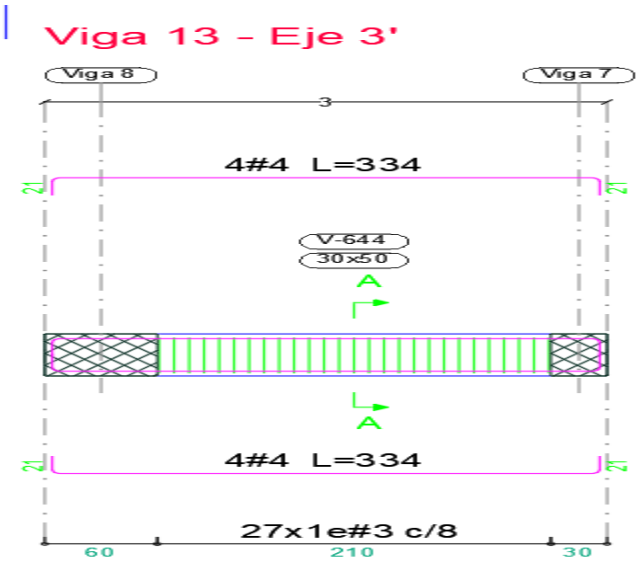



*Ilustración 72. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E)

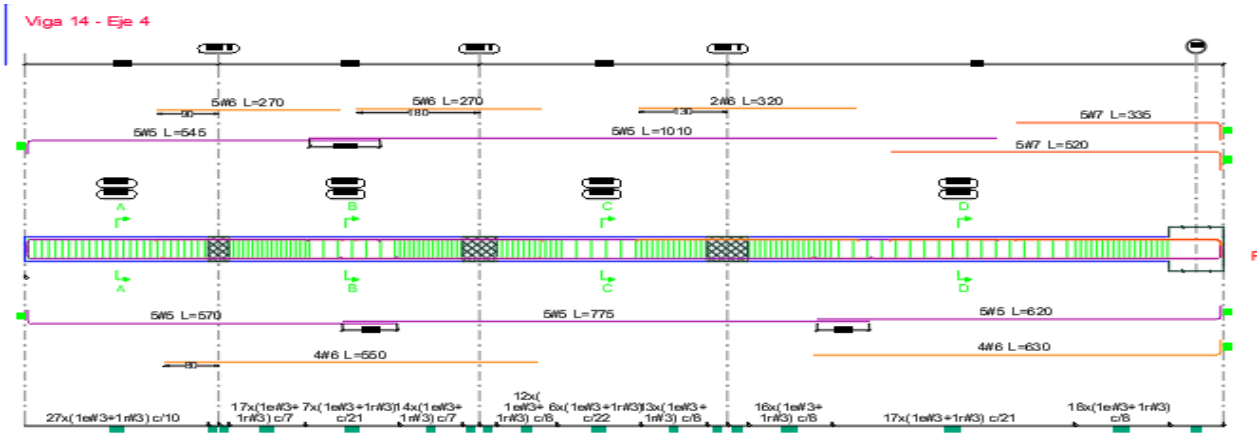



*Ilustración 73. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D)

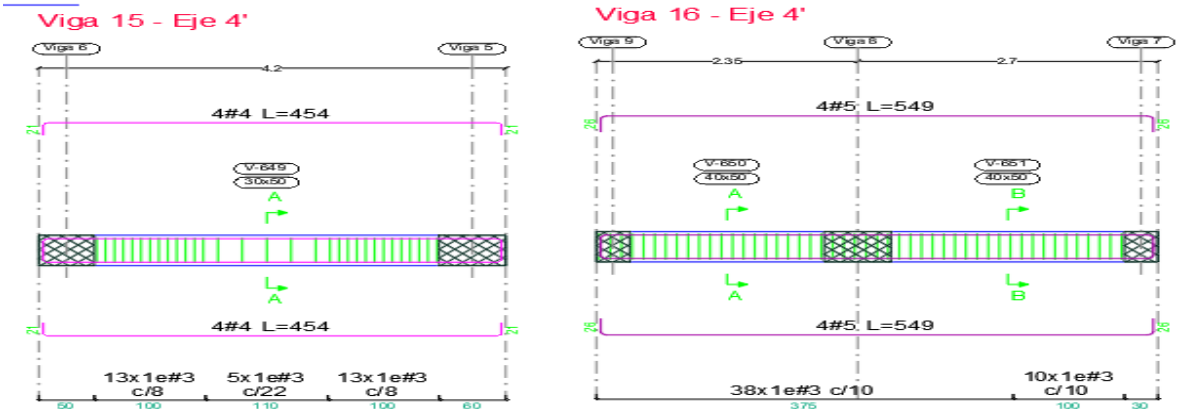



*Ilustración 74. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E)

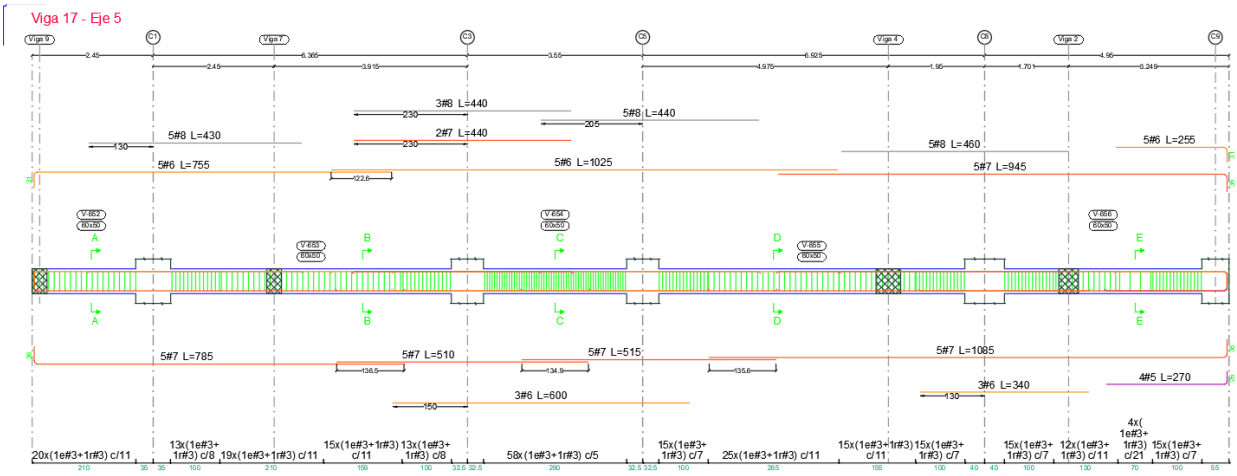



*Ilustración 75.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 5′ (B-E)

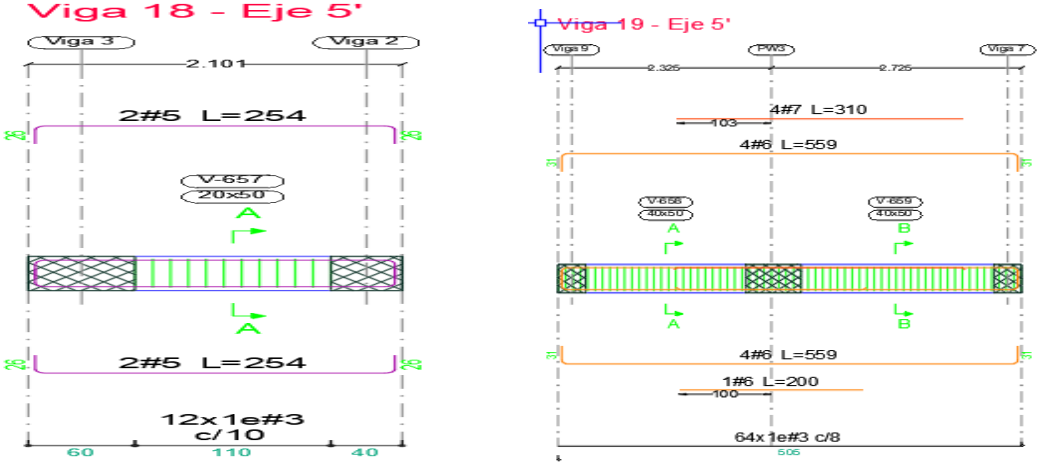



*Ilustración 76. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E)

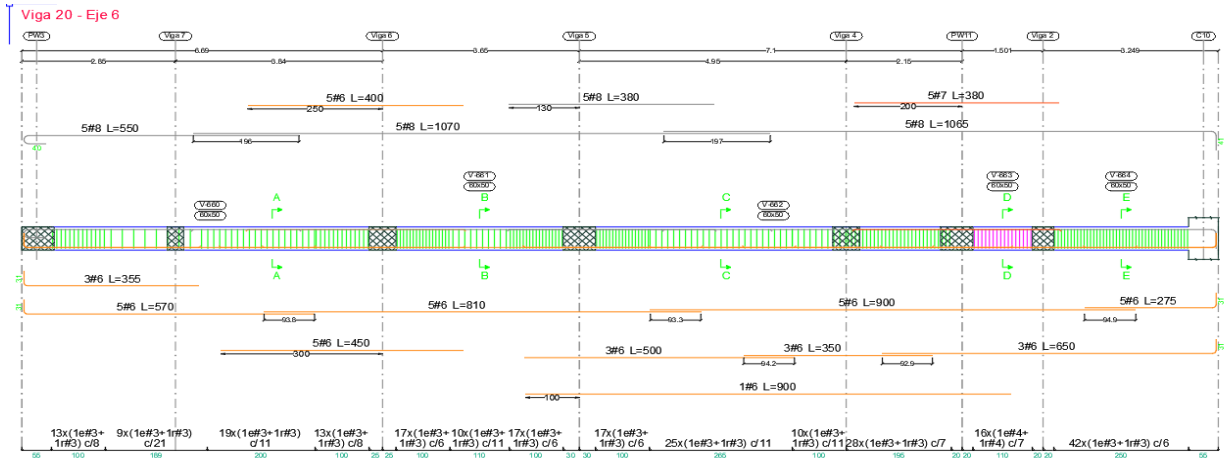



*Ilustración 77. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E)*

## ACERO ESTRUCTURAS

### REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 2 filas, acero transversal de varilla No 6 espaciado 0.20 mts dispuesto en dos filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y acero transversal de varilla N°4 dispuesto en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.

- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°5 dispuestas en 2 filas, refuerzo transversal en varilla No 5 espaciados 0.25 mts en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.25 mts, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 7 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas con espaciamiento 0.15 mts, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo transversal varilla No 6 en 2 filas espaciados 0.15 mts, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varillas No 6 en 3 filas espaciadas 0.12 mt, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

**REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".**

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la

conforman un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1¨ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

## REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO A N+19.30

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5 y 6, en la parte inferior varilla No 5 y 6, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.

## REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+15.40 A N +19.30

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

## ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

- **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO 5 N+19.30**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D,D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

- **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO 6 N+23.20**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D,D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

- **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso 5 N +19,30 Y entrepiso 6 N +23.20, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 6.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 6.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 6.



La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 6.

La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 6.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 6.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 6.

## REGISTRO FOTOGRAFICO
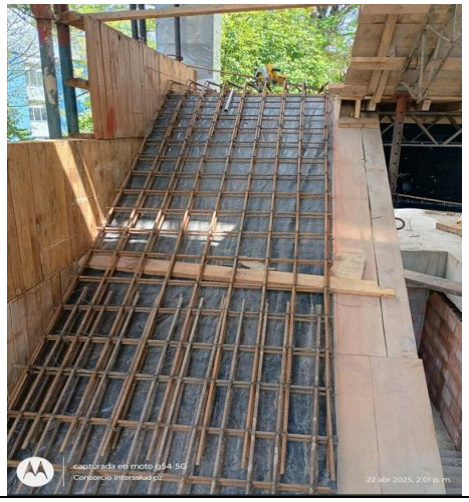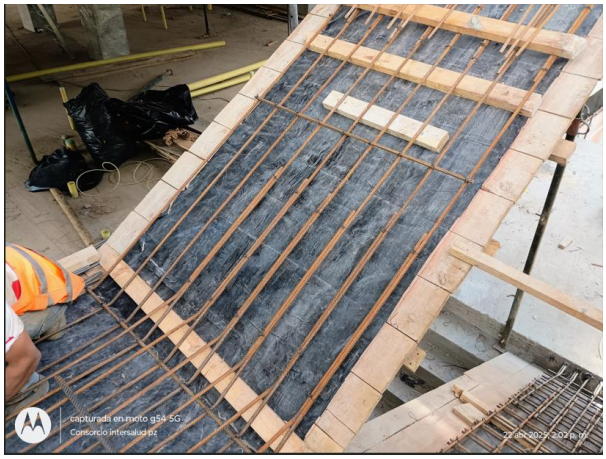
<table>
<tr><td colspan="2">  <br>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa GRADAS DE EMERGENCIA</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa GRADAS CENTRALES</td></tr>
</table>





***CONCRETO PARA ESCALERAS DE EMERGENCIAS 3000 PSI***







***CONCRETO PARA GRADAS CENTRALES 3000 PSI***













Mo,





***ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa COLUMNAS***

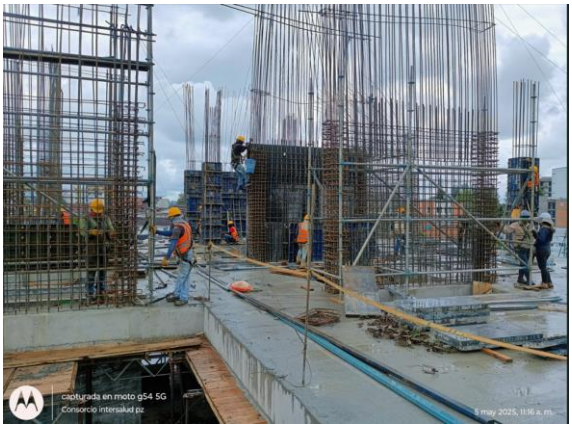


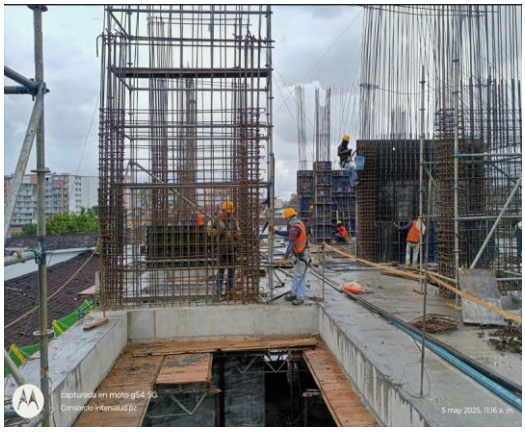


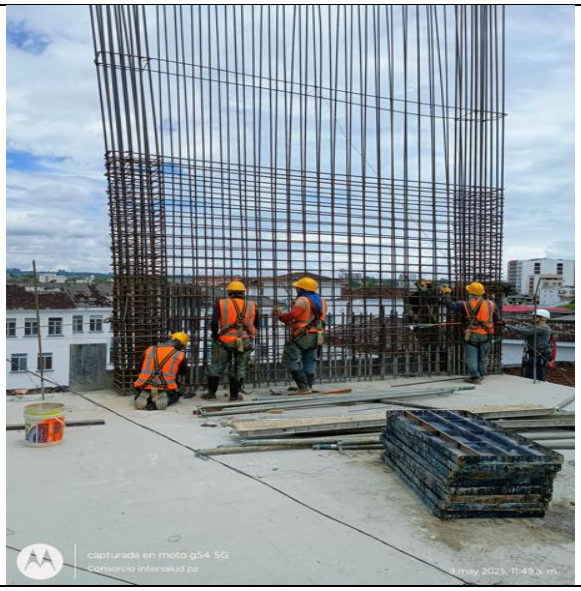

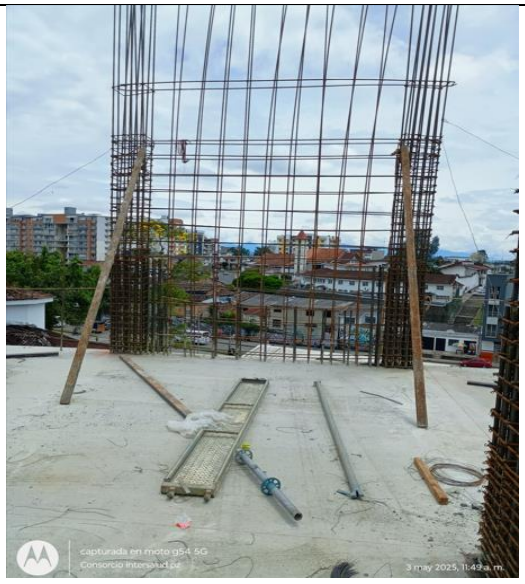***ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa PANTALLAS***

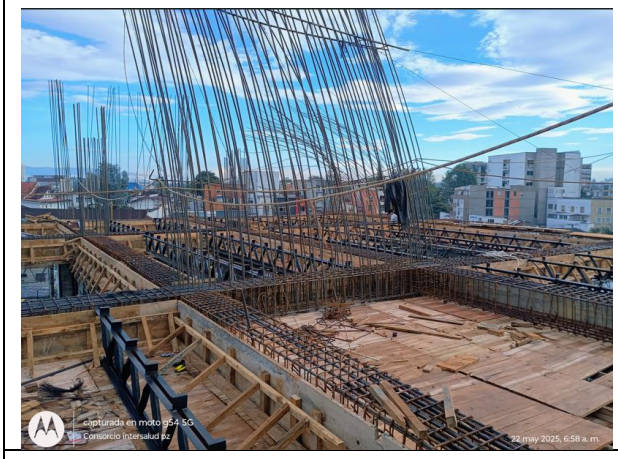


***ACERO REFUERZO Fy=420 Mpa VIGAS JOIST***

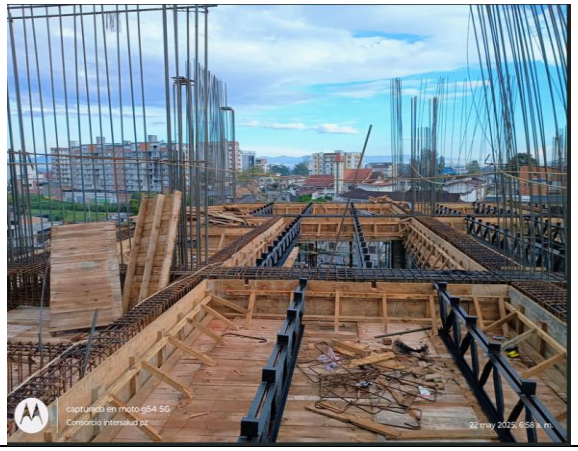












***ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa VIGAS ENTREPISO***







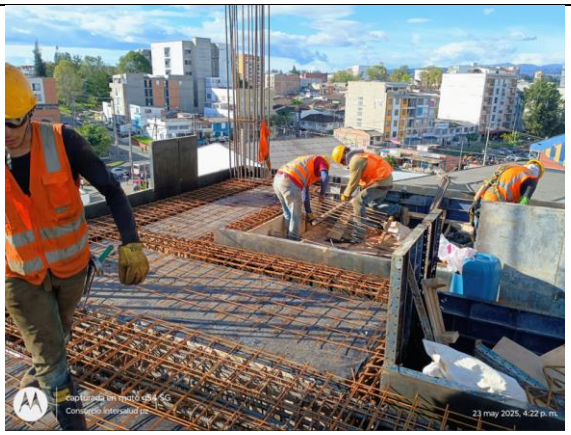


***MALLAS ELECTROSOLDADAS 15X15 Fu=550MPa, Sy=485MPa***






4

***CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS***










***CONCRETO DE 28 Mpa PARA COLUMNAS***






**VISTA GENERAL**



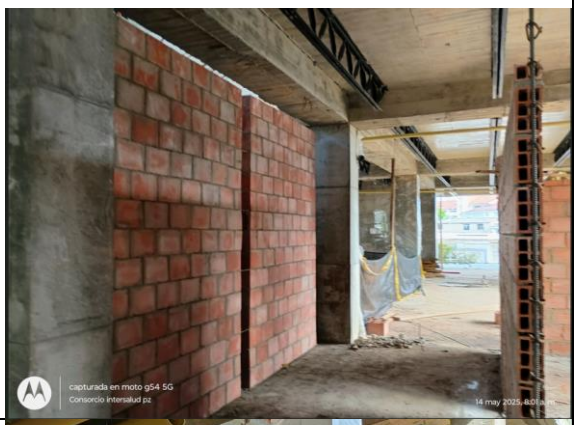










**MAMPOSTERIA**



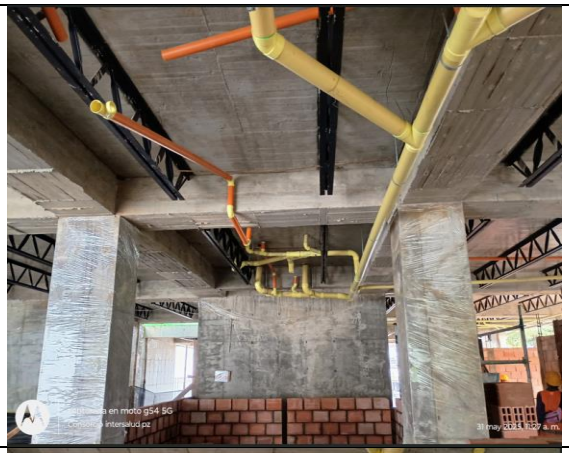



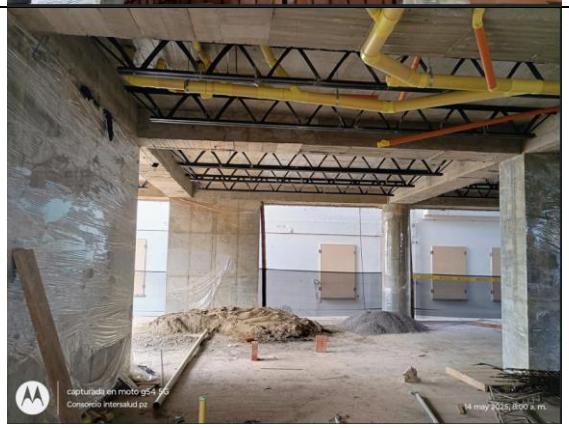

**RED SANITARIA**

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado en obra y con lo estipulado en dichos documentos.

Para la verificación y seguimiento de lo anterior se hizo uso de flexómetros y calibradores para medir directamente las dimensiones, longitudes, diámetros y espaciamientos de los elementos estructurales y el acero de refuerzo en sitio. Esto incluyó la verificación de las vigas joist, las formaletas de vigas y losas, los aceros de la malla electrosoldada, los aceros de columnas y pantallas, y los aceros de las gradas.


Para realizar el control del concreto en sitio, se realizaron ensayos de asentamiento (Slump) y toma de muestras.

- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de junio de 2025 del 29.58% frente un avance programado acumulado del 29.58%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025 es de 2.12% frente a un avance programado del 2.12%.

| FECHA DE CORTE | VALOR PROGRAMADO | PORCENTAJE PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2024 | $109,503,404 | 0.33% | $363.707.100 | 1.12% |
| 30-09-2024 | $858,324,856 | 2.16% | $1.055.624.921 | 3.28% |
| 31-10-2024 | $1.948.435.571 | 6.00% | $2.356.607.214 | 7.26% |
| 30-11-2024 | $2.636.884.000 | 8.12% | $3.049.301.893 | 9.39% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | $3.299.608.964 | 10.13% | $3.705.275.250 | 11.41% |
| 31-1-2025 | $4.715.214.428 | 14.52% | $4.715.214.428 | 14.52% |
| 25-2-2025 | $5.260.776.428 | 16.2% | $5.260.776.428 | 16.2% |
| 25-3-2025 | $6.189.530.785 | 19.06% | $6.423.343.071 | 19.78% |
| 25-4-2025 | $7.546.940.999 | 23.24% | $7.579.414.928 | 23.34% |
| 25-5-2025 | $8.917.340.785 | 27.46% | $8.917.340.785 | 27.46% |
| 25-6-2025 | $9.605.788.071 | 29.58% | $9.605.788.071 | 29.58% |
| AVANCE | $688.447.286 | 2.12% | $688.447.286 | 2.12% |

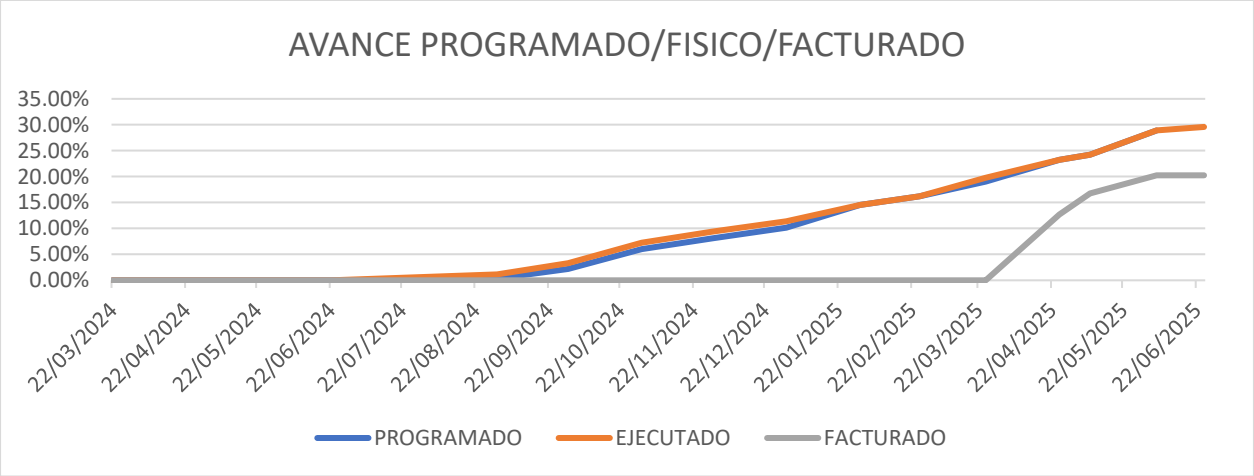


### 4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual

de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de junio de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

| **AUTORIZACIONES DE PAGO** | | |
|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | **VALOR/CONCEPTO** | **ITEM PLAN DE INVERSION** |
| **1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS** | $1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo | Materiales |
| **2. FERRETERÍA GYJ** | $315.150.621 m/cte por concepto de anticipo | Materiales |
| **3. URIEL PALTA AMA** | $2.138.400 m/cte por concepto de anticipo | Transporte |
| **4. UBANER PEREZ** | $6.000.000 m/cte por concepto de anticipo | Mano de obra |
| **5. PEDRO ROMO** | $2.073.600 m/cte por concepto de anticipo | Alquiler de equipos |

| | | |
|---|---|---|
| **6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S** | $182.907.980 m/cte por concepto de anticipo | Mano de obra |
| **7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S** | $521.477.881 m/cte por concepto de anticipo. | Mano de obra |
| **8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN** | $5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo. | Materiales |
| **9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S** | $577.407.941 m/cte por concepto de anticipo. | Mano de obra |
| **10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S** | $309.684.722 m/cte por concepto de anticipo. | Mano de obra |
| **11. DIANA CAROLINA VIVAS** | $133.865.096 m/cte | Mano de obra |
| **12. SILOGISTICA** | $103.240.000 m/cte | Transporte |
| **13. LA ALIANZA GROUP SAS** | $309.835.612 m/cte. | Mano de obra |
| **14. UBANER PEREZ** | $274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo | Mano de obra |
| **15. UBANER PEREZ** | $30.000.000 m/cte | Mano de obra |
| **16. G Y J FERRETERIAS S.A.** | $71.110.589 m/cte | Materiales |

| | | |
|---|---|---|
| **17. IMCOMERSA LUD SAS** | $27.620.616 m/cte | |
| **18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA** | $26.064.505 m/cte | |
| **19.EQUIPAR GLEASON** | $29.741.279 | Alquiler de equipos |
| **20. SILOGISTICA S.A.S** | $21.600 | Transporte |
| **21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS** | $1 | Mano de obra |
| **22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS** | $34.228 | Materiales |

## ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

| ITEM No | DESCRIPCION DEL ITEM | VALOR PROGRAMADO APROBADO | VALOR TRANSFERIDO | % TRANSFERIDO | SALDO FIDUCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE EQUIPOS | $ 85,500,000.00 | $ 85.500.000.00 | 0.02% | $ 0 |
| 2 | TRANSPORTE | $ 105,400,000.00 | $ 105.400.000.00 | 1.08% | $ 0 |
| 3 | MATERIALES | $ 7,205,599,277.00 | $ 7,205.599.277.00 | 73.23% | $ 0 |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 2,345,679,294.00 | $ 2,345,679,293.00 | 24.08% | $ 0 |
| | TOTAL | $ 9,742,178,571.00 | $ 9,742,178,571 .00 | 100% | $ 0 |

El contratista de obra realizó hizo entrega del informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de junio de 2025 mediante oficio EV-C358-23-0465-25.

Cabe destacar que, al término del periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°3, con fecha de corte al 5 de junio de 2025 por un valor de $ 1,131,091,2048 correspondiente al 3.48% del valor contractual quedando un saldo por facturar de $25.897.941.956, en la cual se incluye el cobro de mayores cantidades de obra, las cuales están soportadas con el acta de modificación No 1 de mayores y menores cantidades de obra del 14 de mayo de 2025. Se realiza una amortización del anticipo por un valor de $339.327.314, quedando pendiente por amortizar $7.769.382.587 del anticipo.

El contratista de obra presentó un acta de modificación de cantidades de obra No 2, en la cual se incorporan los Np 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 que corresponden a cimentación y losas de entrepiso.

| | NO PREVISTOS | UND | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|
| **NP 1.28** | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400 | M2 | $21,433 |
| **NP 1.29** | PILOTES D 1.20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE INCLUYE EXCAVACION IZAJE DE CASTILLO CONCRETO TREMIE DESCABECE Y RETIRO DE SOBRANTES | M3 | $2,800,046 |
| **NP 1.30** | CONSTRUCCION LOSA ALIGERADA DE CIMENTACION DE O,7 MTS DE ALTURA CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR 0.10 MTS Y VIGUETAS DE 0.250 X0.60 | M2 | $364,763 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **NP 1.31** | CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI | M3 | $1,498,022 |
| **NP 1.32** | LOSA CONCRETO ALIGRADA ESPESOR 0,11 MTS JOIST 4000 PSI | M2 | $247,387 |
| **NP 1.33** | VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y LONGITUD VARIABLE INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGA EN BARRA DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3 Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | KG | $18,473 |


El contratista hizo entrega del acta de recibo parcial de obra No 4 de fecha del 18 de junio de 2025, en la cual hace el cobro de los Np 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, la cual se encuentra en revisión a la fecha de corte del presente informe.

| **CONTRATO DE OBRA 358-2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE CORTE 25-06-2025** | | | **BALANCE DEL ANTICIPO:** | | |
| **VALOR CONTRATO PPAL** | | $32,473,928,569 | **VALOR ANTICIPO** | | $9,742,178,571 |
| **VALOR CONTRATO ADICIONAL** | | - | **AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES** | $1,633,468,670 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | | $32,473,928,569 | **AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA** | $ 339.327.314 | |
| **VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES** | $ 5,444,895,565 | | **AMORTIZACION ACUMULADA** | $1,972.795.984 | |
| **VALOR FACTURADO MES DE JUNIO** | $ 1,131,091,048 | | % PORCENTAJE ACUMULADO AMORTIZADO | 20.25% | |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR FACTURADO ACUMULADO** | $6.575.986.613 | | **SALDO POR AMORTIZAR** | $7.769.382.587 | |
| **% PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO** | 20.25% | | % PORCENTAJE SALDO POR AMORTIZAR | 79.75% | |
| **SALDO POR FACTURAR** | $25.897.941.956 | | | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$32,473,928,569** | **$32,473,928,569** | **SUMAS IGUALES** | **$9,742,178,571** | **$9,742,178,571** |

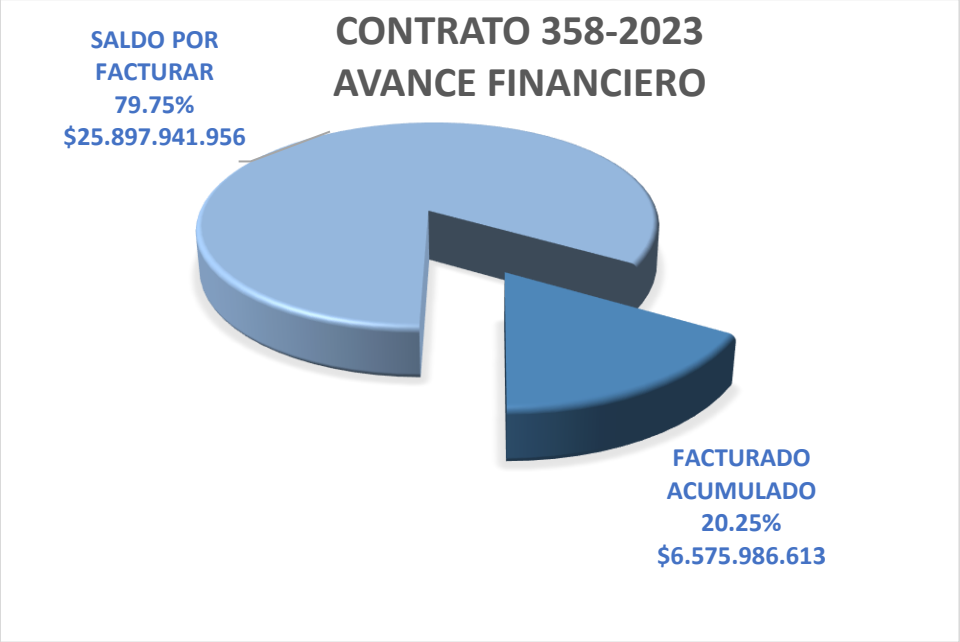


CONTRATO 358-2023
AVANCE FINANCIERO
SALDO POR FACTURAR 79.75% $25.897.941.956
FACTURADO ACUMULADO 20.25% $6.575.986.613

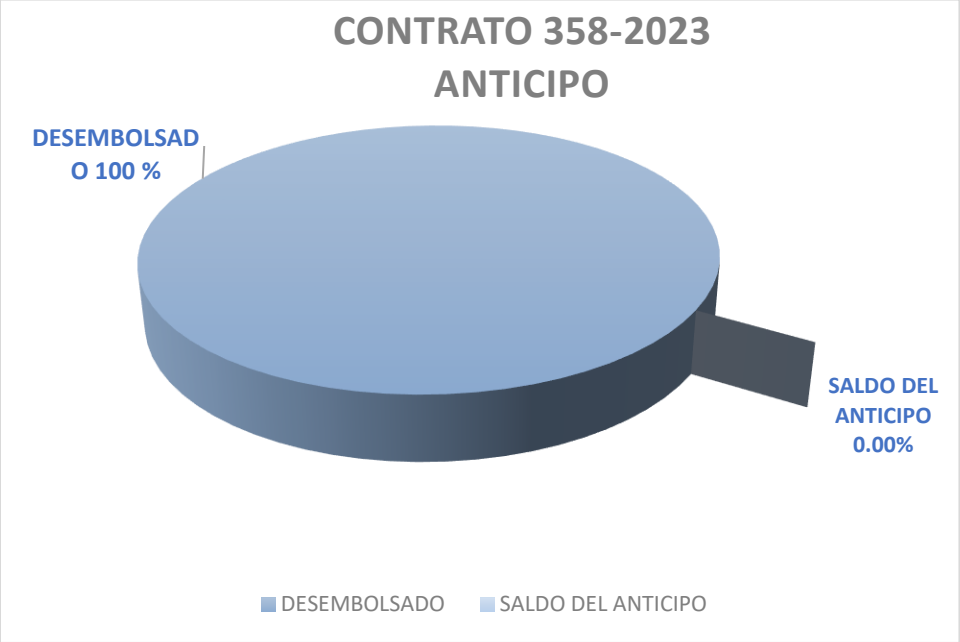

CONTRATO 358-2023
ANTICIPO
DESEMBOLSADO 100 %
SALDO DEL ANTICIPO 0.00%
DESEMBOLSADO
SALDO DEL ANTICIPO

| | |
|---|---|
| • **DESEMBOLSADO: $9,742,178,571.0 M/CTE** | **ANTICIPO $ 9,742,178,571.00 M/CTE** |

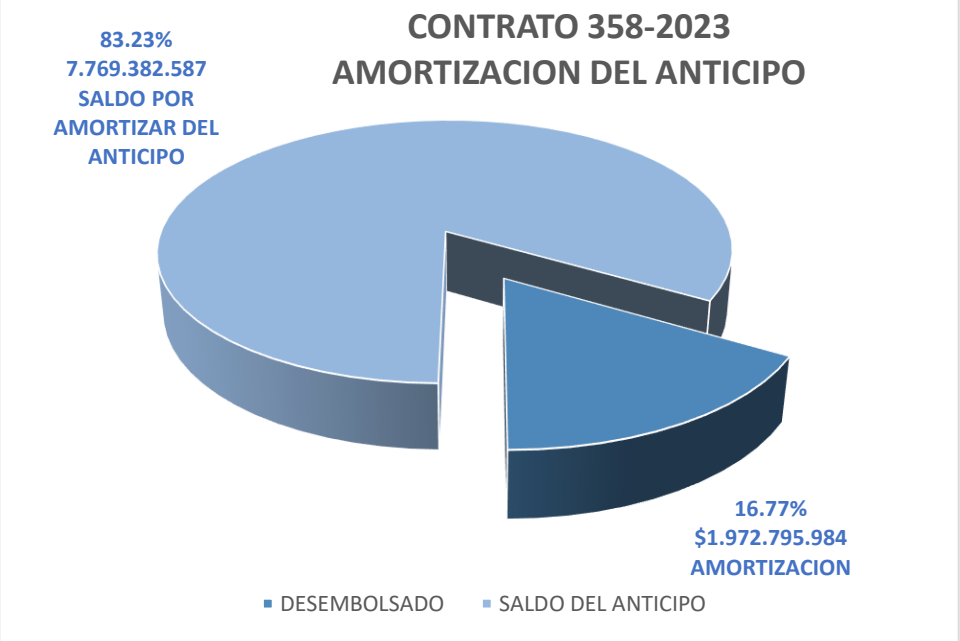


| **CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE CORTE 25-6-2025** | | | **BALANCE DEL ANTICIPO:** | | |
| **VALOR CONTRATO PPAL** | | $ 1.280.412.030 | VALOR ANTICIPO | | $0.00 |
| **VALOR CONTRATO ADICIONAL** | | $0.00 | AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | | $ 1.280.412.030 | AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA | $0.00 | |
| **VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES ACUMULADO** | $ 214.686.368 | | SALDO POR AMORTIZAR | $0.00 | |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $ 44.597.702 | | | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTAS** | $ 259.284.070 | | | | |
| **PORCENTAJE ACUMULADO FACTURADO** | 20.25% | | | | |
| **SALDO POR FACTURAR** | $1.021.127.960 | | | | |
| **PORCENTAJE SALDO POR FACTURAR** | 79.75% | | | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 1.280.412.030** | **$ 1.280.412.030** | **SUMAS IGUALES** | **$0.00** | **$0.00** |

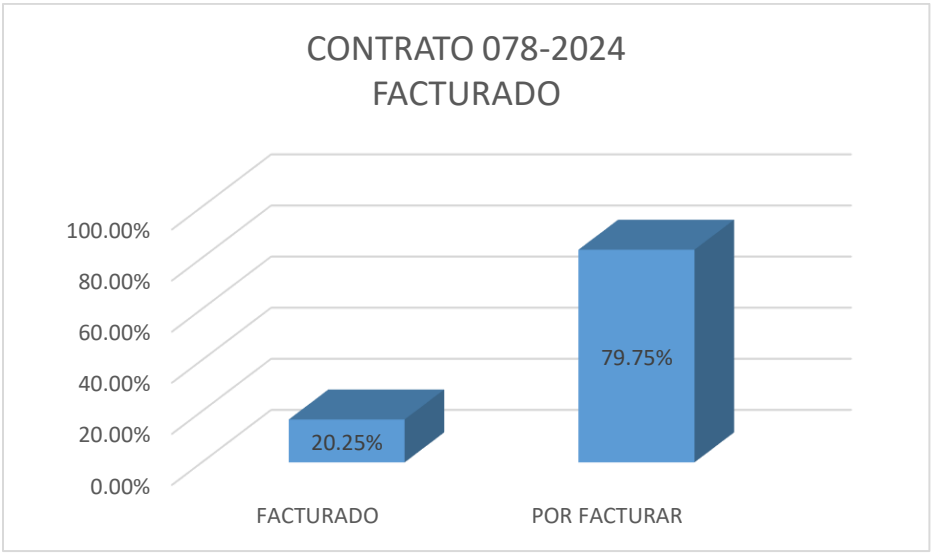

### 4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

**PROGRAMA No 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.**

La ejecución de las actividades forestales correspondientes a la tala de los individuos forestales fue ejecutada al 100% de igual manera las siembras de las plántulas establecidas en la resolución de aprovechamiento emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, sin embargo, no se tiene registro fotográfico del mantenimiento de estas especies por lo cual no se establece la actividad como cumplida hasta el presente periodo.

**PROGRAMA No 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

Se evidencia la presencia de recipientes para la separación de residuos sólidos conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin embargo, se observa una disposición inadecuada de residuos en diferentes sectores de la obra, incluyendo la acumulación en pasillos, zonas de almacenamiento y sobre las mallas de protección contra caídas, lo cual representa un riesgo para la seguridad de los trabajadores y un incumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), el generador de residuos está obligado a garantizar una gestión integral de los mismos, lo cual incluye la recolección, separación

en la fuente, almacenamiento temporal, transporte y disposición final adecuada. Así mismo, la Ley 9 de 1979 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, obligan al empleador a mantener condiciones sanitarias y ambientales seguras en los lugares de trabajo, incluyendo el manejo y disposición adecuada de residuos que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores.

En este sentido, se requiere al contratista la programación y ejecución inmediata de jornadas de limpieza general y retiro de residuos tanto en la planta física como en las mallas de protección, así como la implementación de medidas correctivas para prevenir la recurrencia de estas situaciones. Además, deberá reforzarse la capacitación del personal sobre la correcta disposición de residuos, conforme a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normativa aplicable, garantizando el cumplimiento de los principios de orden, limpieza, prevención de riesgos y sostenibilidad ambiental en el frente de obra.

Registro fotográfico de recipientes si rotulo visible













Por otra parte, se evidencia la desinstalación del punto de acopio de residuos sólidos del lugar originalmente destinado para tal fin, situación que ha conllevado a un desorden en el manejo y almacenamiento de los residuos generados en obra, generando contaminación visual y afectando negativamente la organización y salubridad del área intervenida. Esta situación puede derivar además en impactos ambientales y sanitarios, como la proliferación de vectores, generación de malos olores y el aumento del riesgo de accidentes laborales por obstrucción de zonas de circulación.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2184 de 2019, los residuos deben ser almacenados temporalmente en un sitio de acopio que cumpla condiciones técnicas, higiénicas y de seguridad, claramente señalizado y segregado por tipo de residuo según el código de colores. La ausencia o desplazamiento no autorizado del punto de acopio constituye un incumplimiento a la gestión ambiental responsable del proyecto.

Asimismo, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 establecen la obligación de implementar medidas que garanticen el orden y limpieza en los lugares de trabajo, en especial cuando se trata del manejo de residuos sólidos en obras de construcción, como parte de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Se requiere al contratista restituir de manera inmediata el punto de acopio en una ubicación estratégica, de fácil acceso y señalizada, que cumpla con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y garantice el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, minimizando los impactos negativos sobre el entorno y sobre las condiciones laborales del personal en obra.





En cuanto al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se evidencia la dispersión de este tipo de materiales en varios sectores de la obra, incluyendo zonas de tránsito, áreas de trabajo y espacios próximos a cerramientos provisionales, lo que no solo afecta la organización del frente de obra, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los trabajadores y un posible incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Ante esta situación, se oficia al contratista para que adelante de manera inmediata las labores de recolección, clasificación y traslado de los RCD al sitio de almacenamiento temporal autorizado, el cual debe estar debidamente señalizado, delimitado y acondicionado conforme a lo establecido en la Resolución 472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos de construcción y demolición en Colombia.

Dicha resolución establece que todo generador de RCD debe implementar estrategias para la correcta separación en la fuente, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento y disposición final, minimizando los impactos negativos al medio ambiente. Igualmente, el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1259 de 2008 señalan la obligatoriedad de mantener condiciones óptimas de limpieza y orden en los lugares de trabajo, como parte de una gestión ambiental responsable.

Se reitera al contratista la obligación de cumplir con la normativa vigente, realizar seguimiento a las rutas de manejo interno de RCD dentro del proyecto, capacitar al personal involucrado en estas actividades y garantizar que los residuos sean evacuados únicamente hacia sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.













## PROGRAMA No 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Durante los recorridos de obra realizados por la interventoría, se evidencia un cumplimiento parcial de las actividades relacionadas con el manejo adecuado de materiales de construcción, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Si bien el material pétreo dispuesto para la obra se encuentra en su gran mayoría protegido mediante coberturas plásticas o lonas impermeables, se registra la presencia de material expuesto a la intemperie, lo que representa un riesgo de contaminación por arrastre hídrico o dispersión por viento, especialmente durante eventos de lluvia o fuertes corrientes de aire.

Adicionalmente, se observa el acopio temporal de material pétreo contiguo a los residuos de construcción y demolición (RCD), lo cual puede generar contaminación cruzada por segregación de partículas, dificultando su aprovechamiento y contraviniendo los principios de separación en la fuente establecidos en la Resolución 472 de 2017, que regula la gestión integral de los RCD. Esta situación también puede implicar un incumplimiento de los protocolos de calidad en el manejo de agregados y otros materiales de obra.


Por otro lado, se destaca la disposición ordenada de bloques, acero de refuerzo, formaletas y otros elementos constructivos en zonas de bajo tránsito, lo cual facilita la movilidad dentro del frente de obra y reduce riesgos para el personal, en concordancia con los lineamientos de seguridad establecidos en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que exige la implementación de medidas preventivas para la circulación segura en áreas laborales.

Se recomienda al contratista reforzar las acciones de cobertura y protección de materiales expuestos, reubicar el material pétreo alejado de los puntos de acopio de RCD

y mantener la segregación adecuada según el tipo de material, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y en el PMA del proyecto. Así mismo, se sugiere implementar controles periódicos, señalización adecuada y capacitación al personal sobre buenas prácticas en el manejo de materiales en obra.





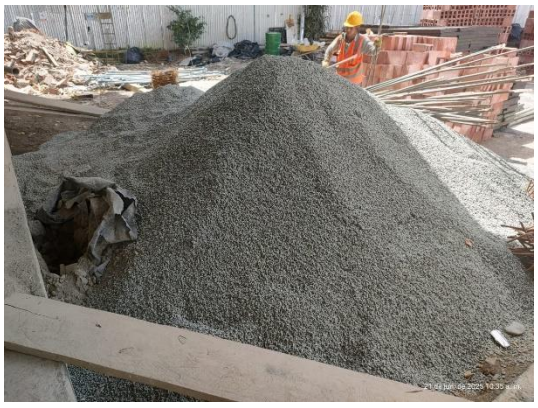







## PROGRAMA No 4 PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

Para las actividades de protección del recurso suelo, se puede evidenciar la instalación de material plástico tipo poliuretano en zonas específicas de la obra, lo cual contribuye tanto a la preservación del suelo natural como a la protección de los materiales de construcción frente a condiciones climáticas adversas. Esta medida preventiva se encuentra alineada con los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y representa una buena práctica en términos de control de impactos directos sobre el componente edáfico.

Adicionalmente, durante los recorridos realizados, no se evidencia la presencia ni el almacenamiento de residuos peligrosos (RESPEL) en la obra que puedan representar un riesgo de afectación al suelo por derrames, lixiviados o segregación inadecuada. Esta observación indica que el manejo de sustancias peligrosas como aceites, combustibles, pinturas o disolventes está siendo controlado, conforme a lo establecido en la Ley 99 de

1993, la Ley 1252 de 2008, y el Decreto 1076 de 2015, que regulan la gestión ambiental y la prevención de la contaminación del suelo y el agua por residuos peligrosos.

No obstante, se recomienda al contratista continuar con la implementación de medidas preventivas para evitar cualquier riesgo de contaminación, incluyendo: la impermeabilización de zonas de almacenamiento de insumos químicos, la señalización y delimitación de las áreas críticas, y el monitoreo periódico del cumplimiento de los protocolos establecidos en la Resolución 1362 de 2007 (para la gestión de RESPEL) y en la Resolución 0312 de 2019 (relativa a condiciones de seguridad en obra).

Así mismo, se sugiere documentar mediante registros fotográficos y fichas técnicas las acciones implementadas para la protección del suelo y el manejo adecuado de materiales y residuos, como evidencia de cumplimiento ambiental en los informes periódicos del proyecto





## PROGRAMA No 5: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.

Durante el presente periodo no se tiene registro de visitas por parte de universidades, instituciones académicas u otro tipo de personal externo a la obra. Sin embargo, se

evidencia que el contratista mantiene disponibles los elementos de protección personal (EPP), tales como cascos, chalecos reflectivos y, en algunos casos, gafas de seguridad, debidamente acopiados en un área accesible y en condiciones aptas para su uso inmediato. Esta disposición demuestra una actitud preventiva y de cumplimiento frente a los protocolos de seguridad establecidos para el ingreso de terceros a la obra, sean estos programados o inesperados.

Dicha medida se encuentra alineada con lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que establece las condiciones mínimas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la obligación de proporcionar EPP a toda persona que ingrese a un área de trabajo con riesgos asociados. También se articula con los principios del Decreto 1072 de 2015, que contempla el deber de garantizar entornos laborales seguros para todos los visitantes y trabajadores.

De igual manera, se evidenció la presencia de un botiquín de primeros auxilios tipo B, acondicionado con los implementos básicos requeridos según la normativa vigente. Este cuenta con suministros médicos esenciales, una camilla rígida para el traslado de personas lesionadas, un extintor con carga vigente y debidamente señalizado, así como una dotación completa de elementos de protección personal adicionales para atención inmediata en caso de emergencia

Se recomienda al contratista mantener actualizados los protocolos de ingreso, contar con un registro de visitas, y reforzar los lineamientos de inducción en seguridad para terceros, como mecanismo para asegurar el cumplimiento normativo y prevenir incidentes en caso de visitas técnicas, académicas o institucionales a la obra.

## PROGRAMA No 6. REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el presente periodo no se llevaron a cabo reuniones presenciales con la comunidad del área de influencia del proyecto. No obstante, se mantienen habilitadas y operativas las líneas de comunicación establecidas para la atención oportuna de inquietudes, sugerencias y reclamos por parte de la ciudadanía. Entre estos canales se destaca el correo electrónico dispuesto por el contratista, el cual se encuentra activo y disponible para recibir comunicaciones en cualquier momento, así como el buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), instalado en la entrada principal de la obra y debidamente identificado, accesible para los residentes del entorno inmediato.

Estas herramientas permiten asegurar la continuidad en la interacción con la comunidad, facilitando el ejercicio del control social y el seguimiento a la gestión del proyecto, aun en los periodos en que no se programen espacios de diálogo directo. Se resalta la importancia de continuar promoviendo la participación comunitaria mediante la divulgación periódica de estos canales a través de medios físicos y digitales, así como con el apoyo de las autoridades locales o líderes comunitarios.

Igualmente, se recomienda fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de los mecanismos de participación, mediante el registro sistemático de las comunicaciones recibidas, la clasificación de temas recurrentes, el análisis de las inquietudes planteadas y la respuesta oportuna y documentada a cada una de ellas. Esto contribuye no solo al cumplimiento del Plan de Manejo Social y Ambiental del proyecto, sino también a la construcción de confianza con la comunidad y al principio de transparencia y rendición de cuentas, conforme a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 sobre participación

ciudadana y el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo a la gestión de proyectos de infraestructura con impacto social.

Así mismo, se recomienda valorar la posibilidad de retomar encuentros presenciales o virtuales en próximos periodos, siempre que las condiciones logísticas y de seguridad lo permitan, para fortalecer el vínculo directo con la comunidad y garantizar una gestión social proactiva e inclusiva.

Se evidencia que se mantiene abierto el canal para la comunicación activa de las PQRs.




**PROGRAMA No 7. SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

Para el presente periodo se evidencia la instalación de barreras de seguridad físicas en los pisos 2, 3 y 4, así como la colocación de mallas de protección contra la caída de objetos, implementadas por el contratista como medida preventiva para mitigar riesgos

asociados a trabajos en altura y proteger tanto a los trabajadores como a terceros. Estas acciones están en línea con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

No obstante, se identificó que la delimitación con cinta de peligro en áreas críticas, como las zonas de corte de acero y preparación de concretos, fue mínima e insuficiente para garantizar un control efectivo del acceso y prevenir posibles incidentes. Estas zonas presentan riesgos significativos por la operación de maquinaria, herramientas cortopunzantes y el manejo de materiales pesados, por lo cual requieren señalización visible, delimitación física robusta y control de ingreso exclusivo para personal autorizado.

Adicionalmente, se evidencia la presencia de señalización informativa y preventiva en diferentes puntos de la obra, incluyendo avisos de uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP), rutas de evacuación y zonas de riesgo, cumpliendo así con lo establecido en el PMA y en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que exige la implementación de señalización adecuada en lugares de trabajo como parte del SG-SST.

Se recomienda al contratista reforzar la señalización temporal en zonas de alto riesgo mediante el uso de vallas, cintas de seguridad, avisos visibles y personal de control, además de realizar inspecciones periódicas para verificar su mantenimiento. Así mismo, se sugiere socializar con el personal operativo la importancia de respetar las áreas delimitadas, como parte del programa de inducción y capacitaciones en seguridad.

Estas medidas contribuirán a fortalecer la cultura de prevención de riesgos en la obra, minimizar la ocurrencia de accidentes y garantizar el cumplimiento normativo, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, el Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas (Resolución 1409 de 2012) y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud laboral.








PELIGRO RIESGO DE CAIDA


PELIGRO RIESGO DE CAIDA


ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

## PROGRAMA No 8 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Con gran preocupación, la interventoría advierte la presencia de un acumulamiento de aguas estancadas al interior de la obra (ver foto), lo cual representa un posible foco de infección y proliferación de vectores, especialmente teniendo en cuenta que la construcción se encuentra contigua a un hospital, donde habita población con condiciones de salud vulnerables.

La acumulación de agua sin tratamiento en áreas de obra puede favorecer la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika o chikunguña, así como de otros vectores y microorganismos patógenos, generando riesgos sanitarios tanto para los trabajadores como para los pacientes, personal médico y la comunidad aledaña.

Esta situación constituye un incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y contraviene lo dispuesto en la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional), que establece la obligación de prevenir condiciones que afecten la salubridad pública. Asimismo, va en contra de lo estipulado en la Resolución 2184 de 2019 y en la Resolución 0312 de 2019 en cuanto a la prevención de riesgos ambientales y laborales asociados a condiciones insalubres.

En consecuencia, se requiere al contratista implementar de forma inmediata medidas de control, tales como:

- Drenaje y evacuación adecuada del agua estancada.
- Desinfección del área afectada.

- Acondicionamiento de pendientes o sistemas de bombeo temporal para evitar nuevos estancamientos.
- Implementación de controles físicos o químicos para vectores si se considera necesario.
- Registro fotográfico del antes y después de la intervención.

Además, se recomienda realizar una evaluación periódica de acumulaciones hídricas y establecer un protocolo de contingencia para su tratamiento inmediato, a fin de proteger la salud pública, cumplir con la normativa ambiental y sanitaria vigente, y garantizar la continuidad segura de las actividades de obra.





## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE JUNIO DE 2025

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, es requisito fundamental contar con la

aprobación oficial del documento PMA. A la fecha, dicho documento aún se encuentra en proceso de ajustes por parte del contratista, lo que ha impedido su validación final por parte de la interventoría y las autoridades competentes.

Si bien se ha evidenciado la ejecución de varios programas y actividades ambientales en el área del proyecto, la ausencia de un PMA aprobado impide definir con precisión los indicadores, metas y cronogramas oficiales que permitan medir objetivamente el nivel de cumplimiento. En consecuencia, hasta tanto no se cuente con la versión definitiva y avalada del PMA, no es posible establecer porcentajes formales de avance en la ejecución de los compromisos ambientales.

Esta situación resalta la importancia de agilizar el proceso de revisión y ajuste del documento, ya que su aprobación no solo es una exigencia normativa, sino que también es una herramienta clave para el seguimiento técnico, el control ambiental del proyecto y la toma de decisiones informadas frente a la gestión de impactos.

Cabe resaltar que dichas situaciones fueron objeto de requerimiento de subsanación inmediata lo cual se consigno previamente mediante oficio CIPZ-078-0283-2025.

Adicionalmente, una vez allegado el informe de avance de obra mensual correspondiente al mes de junio, esta interventoría procedió a realizar la respectiva revisión de la cual surtieron observaciones al componente y fueron enviadas mediante oficio CIPZ-078-0324-2025.

## 5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 21 mayo al 20 de junio 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

| **MARCO LEGAL** | | |
|---|---|---|
| **No.** | **NORMATIVA** | **ASPECTO LEGAL** |
| 1 | Ley 9 de 1979 | Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario |
| 2 | Decreto 1072 de 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único |
| 3 | Resolución 2400 de 1979 | Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal. |
| 4 | Resolución 0312 de 2019 | Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST |
| 5 | Resolución 4272 del 2021 | Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.** La Interventoría realizó la verificación correspondiente

al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales correponden al pago del mes de mayo 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

**RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA**

| ÍTEM | NUMERO DE PLANILLA | PERIODO | FECHA DE PAGO | No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA | OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE** | | | | | |
| 1 | 9487088225 | MAYO | 4/06/2025 | 6 | APORTES EN LINEA |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL** | | | | | |
| 2 | 9487088494 | MAYO | 2025/06/03 | 11 | APORTES EN LINEA |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION** **este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL** | | | | | |
| 3 | 9485488398 | MAYO | 2025/06/20 | 1 | APORTES EN LINEA |
| 4 | 9486899171 | MAYO | 2025/05/30 | 1 | APORTES EN LINEA |
| 5 | 9486194548 | MAYO | 2025/06/05 | 1 | APORTES EN LINEA |
| 6 | 7969353071 | MAYO | 2025/05/30 | 1 | SOI |
| 7 | 9486239024 | MAYO | 2025/06/03 | 1 | APORTES EN LINEA |
| 8 | 9486406079 | MAYO | 2025/06/03 | 1 | APORTES EN LINEA |
| 9 | 9486029310 | MAYO | 2025/05/15 | 1 | APORTES EN LINEA |
| 10 | 4605389356 | MAYO | 2025/05/29 | 1 | SOI |
| 11 | SE REPORTAN 1 INGRESOS, PERO NO SE RELACIONA LA PLANILLA DE INDEPENDIENTE | | | 1 | |
| 12 | SE REPORTAN 1 RETIROS | | | 1 | |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION** | | | | | |

## RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

| ÍTEM | NUMERO DE PLANILLA | PERIODO | FECHA DE PAGO | No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA | OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | SE RELACIONA CONTRATISTA | MAYO | | 1 | NO SE PRESENTA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO |
| **CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ** | | | | | |
| 14 | 9485934181 | MAYO | 2025/06/13 | 27 | APORTES EN LINEA |
| 15 | INGRESOS | MAYO | | **0** | |
| 16 | RETIRO | MAYO | | 2 | |
| **CONTRATIST- TOPOGRAFIA** | | | | | |
| 17 | 9486118745 | MAYO | 2025/06/04 | 2 | |
| **CONTRATIST- TOPOGRAFIA- INDEPENDIENTE** | | | | | |
| 18 | INDEPENDIENTE | MAYO | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| 19 | INGRESOS | MAYO | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| 20 | RETIRO | MAYO | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| **CONTRATISTA- MAMPOSTERIA1-2** | | | | | |
| 21 | TRABAJADORES | MAYO | | 8 | |
| 22 | INGRESO | MAYO | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| 23 | RETIRO | MAYO | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| **CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS** | | | | | |
| 24 | TRABAJADORES | MAYO | | 7 | SE PRESENTAN PLANILLAS ARL, PENDIENTES SALUD Y |

## RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

| ÍTEM | NUMERO DE PLANILLA | PERIODO | FECHA DE PAGO | No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA | OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PENSION DE 3 CONTRATISTAS |
| 25 | INGRESO | ABRIL | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| 26 | RETIRO | ABRIL | | 0 | **SIN NOVEDAD** |
| **TOTAL** | | | | **63** | |

| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **EPS** | **AFP** | **ARL** | **CCF** |
| 1 | ELVIO MARINO SANTIAGO CAMPO | 10.305.105 | SANITAS | PROTECCION | SURA | COMFACAUCA |
| 2 | WILINSON ANDRES QUILINDO CHARO | 1.007.410.693 | EMSSANAR | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 3 | HARLEY RUIZ GAVIRIA | 76.323.117 | EMSSANAR | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 4 | JUAN CARLOS MENESES ARBOLEDA | 1.004.248.033 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 5 | JOSE REINEL CONEJO SANCHEZ | 4789024 | AIC | PORVENIR | SURA | |
| 6 | DIANA MAGALI ARANGO CORREA | 1.144.138.374 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | |
| | | | | | | |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP** | | | | | | |
| 7 | CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ | 10.302.884 | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | N/A |
| 8 | CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES | 34.328.843 | SANITAS | PORVENIR | SURA | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO | 93.395.308 | SANITAS | PORVENIR | SURA | N/A |
| 10 | CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA | 1.061.735.885 | SANITAS | PORVENIR | SURA | N/A |
| 11 | LORENA FALLA FALLA | 1.019.092.020 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | N/A |
| 12 | JULIO CESAR MAYA BASTIDAS | 98.385.333 | SANITAS | PROTECCIÓN | SURA | N/A |
| 13 | JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ | 1.061.748.118 | SANITAS | PORVENIR | SURA | N/A |
| 14 | ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ | 34.533.693 | SANITAS | PENS VEJ ACT | SURA | N/A |
| **15** | JULIAN ANDRES SANCHEZ SANTACRUZ | 76.332.823 | SANITAS | PORVENIR | SURA | N/A |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO** | | | | | | |
| 0 | SIN NOVEDAD | | | | | |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- RETIRO** | | | | | | |
| 16 | JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ | 76.310.636 | NUEVA EPS | PROTECCIÓN | SURA | |
| **CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP** | | | | | | |
| **17** | PEREZ GOMEZ UBANER | 1061600546 | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |

| **CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **EPS** | **AFP** | **ARL** | **CCF** |
| 18 | EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ | 1065097610 | EMSSANAR | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 19 | LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE | 4754652 | AIC | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 20 | MARCO AURELIO BONILLA YATA | 76311480 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES | 1081595473 | EMSSANAR | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 22 | JHON EDILSON ERAZO URBANO | 1085687158 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 23 | WEIMAR HERNAN GUACA | 10317382 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 24 | WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA | 1061779951 | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 25 | WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA | 76327746 | EMSSANAR | COLFONDOS | SURA | COMFACAUCA |
| 26 | RAUL LOZADA BERMEO | 1117839679 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 27 | DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA | 1061792376 | AIC | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 28 | JUAN CARLOS MONSALVE MORALES | 6526535 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 29 | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO | 16891549 | ASMET SALUD | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 30 | CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ | 1061601164 | ASMET SALUD | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 31 | UBANER PEREZ GAVIRIA | 10435329 | ASMET SALUD | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 32 | CARLOS MANUEL POLO NOBLE | 1143353255 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 33 | JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN | 75055901 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |
| 34 | ORLANDO ROJAS SANCHEZ | 1061221640 | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 35 | CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL | 1061810740 | ASMET SALUD | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | OBER FERNEY SANCHEZ SOL | 1061761500 | ASMET SALUD | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 37 | HEIDER SARRIA SARRIA | 10296880 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 38 | ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO | 1061778681 | NUEVA EPS | PROTECCION | SURA | COMFACAUCA |
| 39 | JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ | 1061804575 | ASMET SALUD | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 40 | JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ | 1061017769 | SANITAS | COLFONDOS | SURA | COMFACAUCA |
| 41 | JESUS ALBEIRO IRUA LASSO | 76334379 | SANITAS | PROTECCION | SURA | COMFACAUCA |
| 42 | LUIS HORACIO MUESES CABEZAS | 1061812269 | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 43 | KLEIN JAWER CRUZ BURBANO | 1061738571 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 44 | PAULINO ANGULO MUÑOZ | 76336476 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| **CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS** | | | | | | |
| | SIN NOVEDAD | | | | | |
| **CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS** | | | | | | |
| 45 | LUIS ERNESTO NARVAEZ ESPINOSA | 10568074 | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| 46 | WILMAR ZAMRANO YANDI | 1002849154 | SANITAS | PORVENIR | SURA | COMFACAUCA |
| **CONTRATISTA TOPOGRAFIA** | | | | | | |
| 47 | LUIS ANGEL BAOS | 1.061.804.293 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | COMFACAUCA |
| 48 | FERNANDO CALVACHE BURBANO | 10.304.252 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | |
| **CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO** | | | | | | |
| | SIN NOVEDAD | | | | | |
| **CONTRATISTA TOPOGRAFIA- RETIRO** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SIN NOVEDAD | | | | | |
| **CONTRATISTA – HIDROSANITARIA** | | | | | | |
| **No.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **EPS** | **AFP** | **ARL** | **CCF** |
| 49 | JAIME JUNIAN MUÑOZ GUASAMALLI | 4.617.575 | SURA | COLPENSIONES | SURA | |
| 50 | JOSE CLAUDIO IETER RENGIFO | 76.190.347 | ASMED SALUD | COLPENSIONES | SURA | |
| 51 | LUISA FERNANDA MORENO ORTEGA | 1.088.651.098 | MALLAMAS | PORVENIR | SURA | |
| 52 | ROLANDO BURBANO CALIBIO | 15.571.993 | SANITAS | PORVENIR | SURA | |
| 53 | FERNANDO ANDRES CHACON CABARICO | 1.130.607.657 | SANITAS | | SURA | |
| 54 | HAROLD EVER ZAPATA VALENCIA | 10.593.026 | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | |
| 55 | ARLIN COLLAZOS TROCHEZ | 1.060.868.818 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | |
| **CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- INGRESOS** | | | | | | |
| | SIN NOVEDAD | | | | | |
| **CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- RETIROS** | | | | | | |
| | SIN NIOVEDAD | | | | | |
| **CONTRATISTA - MAMPOSTERIA** | | | | | | |
| **No.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **EPS** | **AFP** | **ARL** | **CCF** |
| **CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- INGRESO** | | | | | | |
| 56 | WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO | 76.325.832 | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | |
| 57 | JESUS EDUARDO | PPT 5403220 | NUEVA EPS | | POSITIVA | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GUERRERO VIERA | | | | | |
| 58 | JESUS ALBERTO MONCAYO MUÑOZ | 1061693041 | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | |
| 59 | RICHARD ANDRES PIAMBA OSORIO | 1058547640 | COOSALUD | PORVENIR | POSITIVA | |
| 60 | JESUS ALDEMER VELASCO GARZON | 1.002.960.492 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | |
| 61 | JULIO CESAR DORADO MUÑOZ | 1061817436 | ASMED SALUD | COLPENSIONES | SURA | |
| 62 | OLIVER ISAI DORADO MUÑOZ | 1118308478 | SOS | PORVENIR | SURA | |
| 63 | JOSE GUILLERMO GUZMAN OROZCO | 10.296.024 | SANITAS | | POSITIVA | |
| **CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- RETIRO** | | | | | | |
| | SIN NOVEDAD | | | | | |
| **TOTAL 63** | | | | | | |

| RELACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA – ALKIEQUIPOS DEL CAUCA L&L SAS** | | | | | | | |
| **No.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CEDULA** | **EPS** | **AFP** | **ARL** | **CCF** | |
| 1 | OSCAR EDINSON ZAPATA URIBE | 1002862116 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | COMFACAUCA | 9486033741 2025/05/07 |
| **CONTRATISTA - FABIO HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ** | | | | | | | |
| 2 | HELBERT ALONSO GOMEZ RUIZ | 10298457 | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | SE PRESENTA CERTIFICACION DE AFILIACION | |
| 3 | TULIO GUZMAN | 6462647 | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | | |
| **TOTAL 3** | | | | | | | |

## RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN DE PERSONAL | CANTIDAD |
|---|---|
| Nuevo | 10 |
| Antiguo | 39 |
| Retiro | 3 |
| Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuente para los datos estadísticos) | 3 |
| Incapacidad laboral | 2 |
| Incapacidad común | 0 |
| **TOTAL, DE PERSONAL** | **66** |
| **TOTAL, DE PERSONAL SIN PERSONAL TRANSITORIO** | **63** |

Indicadores de cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| **INDICADOR** | **% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:** |
| **FORMULA** | $\frac{N°\ de\ \ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ \ de\ trabajadores\ contratados}\frac{13}{13}X100\ \ = \mathbf{100}\%$ |

**EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).** La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los siguientes ingresos:

| No. | EMPRESA/ CONTRATISTA | NOVEDAD | No TRAB |
|---|---|---|---|
| 1 | Consorcio EVOLET | Ingreso solo presentan 3 exámenes sin restricciones- El EMO pendiente corresponde a la vinculación de una pasantía | 4 |
| 2 | PEREZ GOMEZ UBANER | Ingreso | 0 |
| 3 | MAMPOSTERIA- JOSE MELLIZO | Ingreso presenta el total de exámenes sin restricciones | 2 |
| | MAMPOSTERIA- GUILLERMO GUZMAN | Ingreso presenta el total de exámenes sin restricciones | 4 |
| 4 | Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS | Ingreso | 0 |
| 5 | HSA INGENIERIA SAS | Ingreso | 0 |
| 6 | Personal transitorio | | 3 |
| **TOTAL** | | | **13** |

**Nota aclaratoria:** de las 13 inducciones realizadas 3 corresponden al personal transitorio, solo se tendrá en cuenta en los datos y análisis estadísticos de inducciones.

Para los datos estadísticos de HHT y total de trabajadores, estos 3 trabajadores Transitorios, no serán tenidos, por los periodos cortos en que se presta la actividad o servicio.

**DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).** La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1, pr-04Fr-02, Entrega de Dotación y Elementos de Protección, relacionados en la carpeta SST. para los trabajadores de los subcontratistas UBANER PEREZ GOMEZ y HSA INGENIERIA SAS

del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

| **SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | |
|---|---|
| **INDICADOR** | **% Entrega de dotación y EPP al personal** |
| **FORMULA** | $\frac{Numero\ de\ trabajadores\ dotados\ con\ EPP\ 63}{Numero\ de\ trabajadaores\ contratados\quad 63} X\ 100 = \mathbf{100}\%$ |

| No. | EMPRESA/ CONTRATISTA | ACTIVIDAD | No. TOTAL, DE TRABAJADORES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consorcio EVOLET | ADMINISTRATIVOS | 16 | |
| | PEREZ GOMEZ UBANER | ESTRUCTURAL | 30 | |
| 2 | JOSE MELLIZO | MAMPOSTERIA- 1 | 4 | |
| 3 | GUILLERMO GUZMAN | MAMPOSTERIA-2 | 4 | |
| | Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS | TOPOGRAFIA | 2 | |
| 4 | HSA INGENIERIA SAS | HIDRAHULICOS | 7 | |
| 5 | TRANSITORIOS | OPERARIOS | 3 | NO SE TENDRA EN CUENTA PARA CALCULOAR LOS DATOS ESTADISTICOS. |
| **TOTAL** | | | **66** | |
| **TOTAL, SIN PERSONAL TRANSITORIO** | | | **63** | |

**INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.** La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 10 ingresos del personal permanente y transitorios 3 para un total de 13 registró de inducciones en el formato de entrenamiento, correspondientes al periodo del Consorcio EVOLET y sus contratista.

- Consorcio EVOLET: 4
- MAMPOSTERIA- JOSE MELLIZO: 2
- MAMPOSTERIA- GUILLERMO GUZMAN: 4
- Transitorios: 3

Indicadores de Cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| **INDICADOR** | **% Cobertura Inducción y reinducción del personal** |
| **FORMULA** | $\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 13}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes } 13} X\ 100 = \mathbf{100}\%$ |
| **INDICADOR** | **% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal** |
| **FORMULA** | $\frac{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ ejecutadas \quad 13+0}{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ programadas\ 13+0} X\ 100 = \mathbf{100}\%$ |

## CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 6 actividades de capacitación con el área SST, con el tema asociado a la atencion de emergencias, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra

Indicadores de Cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| **INDICADOR** | **% Capacitación del personal** |
| **FORMULA** | $\frac{No.\,de\ trabajadores \text{ prom asisten capacitación al mes } 30}{No.\,de\ trabajadaores \text{ en el mes } 30} X\ 100 = 100\%$ |
| **INDICADOR** | **% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal** |

| | |
|---|---|
| **FORMULA** | $\frac{No.\,de\ capacitaciones\ ejecutadas}{No.\,de\ de\ capacitaciones\ programas}\ \frac{5}{5} X\ 100 = 10\mathbf{0}\%$ |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**Imagen No. 1, 2, 3** Capacitación riesgo eléctrico, primeros auxilios psicológicos, Prevención enfermedad cardiovascular

*FUENTE: CONSORCIO EVOLET*

## COMITÉ PARITARIO DE SST.

| No. | FECHA | TEMA | No. TRABAJADORES ASISTENTES | No. TRABAJADORES PROGRAMADOS | % INDICADOR CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/05/2025 | Riesgo eléctrico | 29 | 29 | 29/29*100 = 100% |
| 2 | 30/05/2025 | Socialización de izaje de cargas – estiramiento muscular | 27 | 27 | 27/27*100 = 100% |
| 3 | 30/05/2025 | Primeros auxilios psicológicos | 33 | 33 | 33/33*100 = 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05/06/2025 | Jornadas de recolección mediante gestores | 36 | 36 | 36/36*100 = 100% |
| 5 | 12/06/2025 | Prevención de enfermedad cardiovascular, hábitos de vida saludables – estiramiento muscular | 27 | 27 | 27/27*100 = 100% |
| **PROMEDIO** | | | | | |

En el informe presentado para el periodo correspondiente no se evidencia el acta de la reunión del COPASST del mes de mayo del 2025 con feche del 8, acta correspondiente al periodo anterior, se relaciona acta de designación de vigía, con periodo de vigencia del 01 de junio del 2025 al 01 junio del 2027.

**COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.**

El contratista aclara que por el numero de personal dependiente que es inferior a 10 colaboradores, no esta obligado a su conformación, se relaciona lo comentado que lo justifica: *"Según la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo de Colombia, modificada por la Resolución 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral es obligatorio para: • Empresas públicas y privadas con 10 o más trabajadores. Las empresas sí debe cumplir con el deber general de prevenir el acoso laboral y promover un ambiente sano, conforme a la Ley 1010 de 2006"*.

**Plan de acción propuesto por el contratista para la intervención en caso de acoso laboral:**

**Plan de Gestión:**

- Se realizarán periódicamente charlas al personal enfocadas en temas como primeros auxilios emocionales, el respeto interpersonal y la importancia de

mantener un ambiente laboral sano y equilibrado.

- Para la atención de situaciones relacionadas con la convivencia laboral, se habilitará un canal confidencial mediante un buzón físico ubicado en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual será revisado semanalmente. En caso de presentarse alguna eventualidad, se garantizará la confidencialidad del proceso.
- Se dejará constancia del caso y se realizará el seguimiento correspondiente con el apoyo del prevencionista de SST, el jefe inmediato y la representante legal del consorcio.
- Se documentarán las acciones correctivas adoptadas, los compromisos adquiridos y el seguimiento a su cumplimiento.

**El contratista en el periodo no relaciona situaciones presentadas asociadas a acoso laboral.**

## AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

| CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **ORIGEN** | **EMPRESA** | **TIEMPO REPORTADO** |
| **1** | ACCIDENTE LABORAL | SIN NOVEDAD | 0 |
| **2** | INCAPACIDAD X A. T | CONSORCIO EVOLET, UBANER | 26+12=38 |
| **3** | ENFERMEDAD LABORAL | SIN NOVEDAD | 0 |
| **4** | INCAPACIDAD X A. L | SIN NOVEDAD | 0 |
| **5** | ENFERMEDAD COMUN | SIN NOVEDAD | 0 |
| **6** | PERMISOS | UBANER PEREZ GOMEZ | 17 DIAS |
| **7** | INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS | SIN NOVEDAD | 0 |
| **TOTAL, DE AUSENTISMO** | | | **55 DIAS** |

| **RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)**<br>21 mayo – 20 Junio 2025 | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **RESULTADO** |
| Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo | 63 |
| Número de accidentes laborales durante el periodo | 0 |
| Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo | 38 |
| Numero de enfermedades laborales del periodo | 0 |
| Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo | 0 |
| Número de enfermedades común durante del periodo | 0 |
| Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo | 0 |
| Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra | 3 |
| Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra | 155+38=193 |
| Frecuencia de Accidentalidad =<br>= No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100<br>No de trabajadores en el mes | 0/63*100 =0% |
| Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes *100<br># de trabajadores en el mes | 38+0/63*100=60. % |
| Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000 | 0*60/1000 = 0 |
| Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo) | 38/25*100 =152 |

*Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo*

**Control a programas epidemiológicos**

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

**Control a programas osteomuscular**

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores. Se evidencia recomendaciones generales.

**ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:**

**Relación de actividades ejecutadas durante el periodo**

**Trabajo de alturas:**

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos

**La interventoría relaciona la gestión presentada por el contratista:**

Instalación de la malla contra caídas y de la línea de vida portátil horizontal, junto con las certificaciones técnicas correspondientes. Se recibe la siguiente documentación al respecto:

- Ensayo dinámico norma UNE EN 1263 INSERLIFT SAS
- Memoria de cálculo y certificación soportes sistema mixto tipo T INSERLIFT SAS
- Certificado 1947 redes anticaídas INSERLIFT SAS
- Certificación del lote San José Popayán sellado
- Ficha_tecnica_sistema_tipo_t_mixto_inserlift oficial
- Certificado del conector de anclaje

La intervención solicita las inspecciones de las medidas preventivas colectivas mediante las observaciones realizadas al informe del periodo.

En el desarrollo de estas actividades se cuentan con 45 personas certificadas para labor en alturas.

**ORDEN Y ASEO**

La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden y aseo, se evidencia la intervención y corrección de observaciones realizadas como prevención del el riesgo locativo y de esta manera prevenir caídas de los colaboradores a nivel y de diferente nivel, Desde a la interventoría se continua con las solicitud del orden y aseo durante la jornada laboral y en especial donde se desempeñan actividades de altura, en los pisos superiores 5, 6 y 7, mantener limpio y sin obstáculos los senderos peatonales, además de identificados.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





**Imagen No. 3 y 4.** Orden y Aseo en Obra

*FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- JUNIO 2025*

## SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







**Imagen No. 5, 6 y 7.** Disposición de recipientes para recolección de residuos según su clasificación, Servicios de baños para el personal de obra, suministro de agua potable para el personal de obra.

*FUENTE: propia -Informe CONSORCIO EVOLET- MAYO 2025*

## PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de emergencia, son los relacionados a continuación:

| EQUIPO | CANTIDAD | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| Botiquines primeros auxilios | 2 | Obra – Oficina -administrativa |
| Camilla rígida | 2 | Área de bienestar – Punto ecológico. |
| Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb | 2 | Oficina administrativa - Obra |

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos

## BRIGADA DE EMERGENCIA

El CONSORCIO EVOLET cuenta con la brigada de emergencia conformación por los siguientes integrantes:

| BRIGADA | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| JEFE DE BRIGADA | Jesús Ruba | 76.334.379 | JESUS RUBA |
| JEFE DE EVACUACIÓN | Guillermo León Escobar | 79.339.308 | |
| BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS | Ubaner Perez | 1061600544 | |
| BRIGADA CONTRA INCENDIOS | Ricardo Bolaños | 4754052 | |
| PERSONAL DE APOYO | José Revelo | 1061725247 | |

Indicadores de Cumplimiento:

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| **INDICADOR** | **% Capacidad de respuesta** |
| **FORMULA** | $\frac{Numero\ de\ \ emergencias\ atendidas\ oportunamente}{Numero\ de\ emergencias\ presentadas} \frac{0}{0} X\ 100 = N.A.$ |
| **INDICADOR** | **% de simulacros realizados** |
| **FORMULA** | $\frac{Numero\ de\ simulacros\ efectuados}{Numero\ de\ simulacros\ programados} X\ 100 = N.A$ |

## INSPECCIONES.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, la programación del plan de trabajo SG-SST para este año, las inspecciones realizadas fueron:

- Inspección equipos de emergencia camilla y botiquín, con fecha del 5 de junio del 2025 por parte del sub contratista, UBANER PEREZ GOMEZ registro SST-ST-07 con fecha 3/ de junio del 2025.
- Inspección de extintor con registro SST-FT-06 con fecha 10 junio del 2025, por parte del sub contratista, UBANER PEREZ GOMEZ.
- Se relaciona inspección de lo equipos eléctricos mediante registro SST-ST-05, con fecha del 26 al 31 mayo del 2025 y 3 al 7, 9 al 14 de junio del 2025.
- Inspección de extintor con registro SST-FT-06 con fecha 10 junio del 2025, por parte del sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- Se verifica el registro del formato SST-FO-33 INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, con fecha de 30 mayo del 2025. Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- Se verifica inspección de herramientas mediante formato SST-FT-33, con fechas del 3 al 7 de junio del 2025, 4 al 14 de junio del 2025,
- Inspección en obra registro SST-FT-10 INSPECCION DE ACCESO PARA TRABAJOS DE ALTURAS, con fecha 26 al 31 mayo del 2025, 3 al 7, 9 al 14, de junio del 2025.
- Se verifica las inspecciones de los equipos para trabajo en alturas mediante registro SST-FT-03 INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA, con fecha del 3 al 7 junio del 2025, de los trabajadores Paulino Angulo, Klein cruz, james Andrada, Heider Sarria, Weimar

Guaca, Jonier Vidal, Ferney Sánchez, Cristian Sánchez, William Levaza, Wilmer Levaza, Johan Cortez, Marcos Bonilla, Ricardo bolaños, Luis Mueses, Jhon Erazo, Edgar Erazo.

- Se evidencia mediante formato CV-SGSST-63.2-V1 con fecha del 28/30/2025, inspección de maquinaria amarilla retroexcavadora y vibro compactador.

Adicionalmente, una vez allegado el informe de avance de obra mensual correspondiente al mes de junio, esta interventoría procedió a realizar la respectiva revisión de la cual surtieron observaciones al componente y fueron enviadas mediante oficio CIPZ-078-0324-2025.

## 6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2025.

*Anexo 6. Informe mensual del periodo del 26 mayo al 25 de junio de 2025 del contratista de obra*

## 7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

En el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de columnas, pantallas y losas de entrepiso N°3(0.00+11.50)

**Resultados de ensayos de resistencia a la compresión losa de entrepiso N°4 (N+15.40), del contratista de obra**

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA ESPECIFICADA | | | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | |
| 343 | 1964 | T39 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 254,2 | 4 | 8171 | 317 | 4512 | 31,1 | 281 | 4000 | 27,6 | 112,8 | 20,3 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1965 | T39 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 248,8 | 4 | 8171 | 311 | 4417 | 30,5 | 281 | 4000 | 27,6 | 110,4 | 20,3 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1966 | T39 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 243,5 | 4 | 8171 | 304 | 4322 | 29,8 | 281 | 4000 | 27,6 | 108,0 | 20,3 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1967 | T40 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 253,4 | 4 | 8171 | 316 | 4498 | 31,0 | 281 | 4000 | 27,6 | 112,4 | 17,8 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1968 | T40 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 252,2 | 4 | 8171 | 315 | 4477 | 30,9 | 281 | 4000 | 27,6 | 111,9 | 17,8 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1969 | T40 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 248,3 | 2 | 8252 | 307 | 4365 | 30,1 | 281 | 4000 | 27,6 | 109,1 | 17,8 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1970 | T41 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 233,6 | 2 | 8171 | 291 | 4145 | 28,6 | 281 | 4000 | 27,6 | 103,6 | 20,3 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1971 | T41 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 226,9 | 3 | 8171 | 283 | 4027 | 27,8 | 281 | 4000 | 27,6 | 100,7 | 20,3 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |
| 343 | 1972 | T41 | 4 | 29-abr-25 | 06-may-25 | 7 | 235,4 | 2 | 8252 | 291 | 4138 | 28,5 | 281 | 4000 | 27,6 | 103,5 | 20,3 | Entrepiso 4 Vigas Hora de toma: 7:00 am |

Se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para su aceptación.

**Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas entrepiso N°6 (N+15.40, N+19.30), del contratista de obra.**

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA ESPECIFICADA | | | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | |
| 358 | **2088** | **T42** | **4** | 08-may-25 | 15-may-25 | **7** | 324,6 | 3 | 8413 | 393 | **5595** | 38,6 | 281 | **4000** | 27,6 | 139,9 | 62,0 | Pantallas y columnas piso 5 (1) |
| 358 | **2089** | **T42** | **4** | 08-may-25 | 15-may-25 | **7** | 301,9 | 3 | 7854 | 392 | **5576** | 38,4 | 281 | **4000** | 27,6 | 139,4 | 62,0 | Pantallas y columnas piso 5 (1) |
| 358 | **2090** | **T42** | **4** | 08-may-25 | 15-may-25 | **7** | 311,4 | 3 | 8171 | 389 | **5526** | 38,1 | 281 | **4000** | 27,6 | 138,2 | 62,0 | Pantallas y columnas piso 5 (1) |
| 358 | **2091** | **T43** | **4** | 08-may-25 | 15-may-25 | **7** | 270,8 | 5 | 8091 | 341 | **4855** | 33,5 | 281 | **4000** | 27,6 | 121,4 | 60,0 | Pantallas y columnas piso 5 (2) |
| 358 | **2092** | **T43** | **4** | 08-may-25 | 15-may-25 | **7** | 270,1 | 5 | 8091 | 340 | **4841** | 33,4 | 281 | **4000** | 27,6 | 121,0 | 60,0 | Pantallas y columnas piso 5 (2) |
| 358 | **2093** | **T43** | **4** | 08-may-25 | 15-may-25 | **7** | 262,9 | 5 | 8012 | 335 | **4759** | 32,8 | 281 | **4000** | 27,6 | 119,0 | 60,0 | Pantallas y columnas piso 5 (2) |

Al realizar un análisis los resultados del contratista de obra, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para aceptación.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

## C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

## RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

**Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.**

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

**C.5.6.2.4** — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de $f'_c$.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

**C.5.6.3.3** — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a $f'_c$.

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que $f'_c$ por más de 3.5 MPa cuando $f'_c$ es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando $f'_c$ es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

> **C.5.6.3.4** — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

> **C.5.6.4.4** — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar $f'_c$, sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a $f'_c$ en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

**C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia**

**C.5.6.5.1** — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que $f'_c$ por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las partes.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

*Anexo 7. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA*

- Resultados resistencia concreto interventoría

| ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD (DÍAS) | CARGA (KN) | ÁREA (mm) | ESFUERZO | | DESARROLLO (%) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Mpa | PSI | | |
| VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +7,60 - PISO 3) | 27/02/2025 | 14/05/2025 | 76 | 386,9 | 8251,6 | 46,9 | 6698 | 167,5 | SI |
| | 27/02/2025 | 14/05/2025 | 76 | 385,0 | 8251,6 | 46,7 | 6665 | 166,6 | SI |
| PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +7,60 - PISO 3) | 21/03/2025 | 14/05/2025 | 54 | 444,1 | 8091,4 | 54,9 | 7840 | 196,0 | SI |
| | 21/03/2025 | 14/05/2025 | 54 | 442,4 | 8011,8 | 55,2 | 7888 | 197,2 | SI |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD (DÍAS) | CARGA (KN) | ÁREA (mm) | ESFUERZO | | DESARROLLO (%) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Mpa | PSI | | |
| VIGA DE ENTREPISO Y LOSA DE ENTREPISO (NIVEL +11,50 - PISO 4) | 27/03/2025 | 14/05/2025 | 48 | 417,7 | 8171,3 | 51,1 | 7302 | 182,6 | SI |
| | 27/03/2025 | 14/05/2025 | 48 | 414,8 | 8091,4 | 51,3 | 7323 | 183,1 | SI |
| | 27/03/2025 | 14/05/2025 | 48 | 412,6 | 8011,8 | 51,5 | 7356 | 183,9 | SI |
| PANTALLAS Y COLUMNAS (NIVEL +11,50 - PISO 4) | 3/04/2025 | 14/05/2025 | 41 | 414,8 | 8171,3 | 50,8 | 7251 | 181,3 | SI |
| | 3/04/2025 | 14/04/2025 | 41 | 415,8 | 8171,3 | 50,9 | 7269 | 181,7 | SI |
| | | | | | | | | | |

*Anexo 8. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA*

## 8. CONCLUSIONES

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de mayo de 2025 del 27.46 % por valor de $8.917.340.785 frente un avance programado del 27.46%, con lo cual

el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025 es de 4.12% frente a un avance programado del 4.22%.

El contratista de obra presentó acta de cobro parcial No 2, por valor de $1.331.595.292, correspondiente al 4.10% del valor contractual, con corte al 8 de mayo de 2025, para un acumulado de facturación de $5.444.895.565 equivalente al 16.77% del valor del contrato.

Se toma el 30% del valor del acta $399.478.588 para amortizar el anticipo del contratista de obra mediante el acta parcial de obra No 2.

El contrato de interventoría, factura en igual porcentaje por lo facturado del contrato de obra, por lo cual el acta parcial No 2 de interventoría es de $52.503.368, con corte al 8 de mayo de 2025, con un valor acumulado facturado del $214.686.368 equivalente al 16.77% del valor del contrato, no se realiza amortización ya que no cuenta con anticipo.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, se realizó el suministro e instalación de aceros para el piso 5 N+15.40 al N+19.30 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, suministro e instalación de aceros de vigas y losa de entrepiso 6 N+19.30.

Se suministró e instaló las vigas joist de la losa de entrepiso 6 N+19.30.

Se realizó el suministro e instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, la losa y vigas de entrepiso N+15.40 al N+19.30 Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo

en cuenta el procedimiento indicado en el aparte C.5.6. EVALUACION Y ACEPTACION DE CONCRETOS DE LA NSR 10

Teniendo en cuenta que se presentó una actualización del PMA a la fecha, se tienen algunas actividades pendientes de seguimiento toda vez que es necesario el periodo de transición para implementarlas, entre esas se encuentran las actividades del programa "PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS".

En general, se presencia la necesidad de capacitaciones y organización de lugares de acopio de residuos puesto que se evidencia desorden en algunos puntos ecológicos, acopio e inadecuada separación en los recipientes.

Se observó adecuada separación de residuos peligrosos, implementación de señalética, provisión y acceso de elementos de protección personal.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. Asimismo, ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.

Para el periodo correspondiente al informe se evidencia la realización de simulacro de evacuación con el personal de obra y el consorcio EVOLET, realizado el día 11 /04/2025.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.

Se han acatado todas las observaciones realizadas en informes anteriores respecto del componente ambiental y del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo posible, entre otras cosas, un seguimiento más claro y una medición de cumplimiento mucho más eficiente.

Las actividades pendientes para realizar en el mes de mayo quedaron consolidadas en cada uno de los programas, así como algunas observaciones para mejora en la medición de cumplimiento para informes posteriores.

# ANEXO 1. POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA – CONTRATO 358 2023

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101279178 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 22 | 11 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO EVOLET | NIT: 901.784.507-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | POPAYAN, CAUCA | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891.580.002-5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 6 NRO. 10 N - 142 | POPAYAN, CAUCA | 8234508 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA
23 ABR 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 22/03/2024 | 23/03/2026 | $6,494,785,713.80 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22/03/2024 | 23/11/2028 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 22/03/2024 | 23/03/2026 | $9,742,178,570.70 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $3,247,392,856.90 | $3,247,392,856.90 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 22/11/2025 | 22/11/2030 | $3,247,392,856.90 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ***21,108,053,569.85 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101051477 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 22 | 11 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO EVOLET | NIT: 901.784.507-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | POPAYAN, CAUCA | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891.580.002-5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 6 NRO. 10 N - 142 | POPAYAN, CAUCA | 8234508 |

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO

PÓLIZA APROBADA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024 | 22/11/2030 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024 | 22/11/2030 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024 | 22/11/2030 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ****1,623,696,428.45 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101051477 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 22 | 11 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO EVOLET | | NIT: 901.784.507-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 3043935212 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | NIT: 891.580.002-5 |
| **DIRECCIÓN:** KR 6 NRO. 10 N - 142 | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 8234508 |

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024 | 22/11/2030 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024 | 22/11/2030 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/03/2024 | 22/11/2030 | $1,623,696,428.45 | $1,623,696,428.45 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101279178 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 22 | 11 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO EVOLET | | NIT: 901.784.507-4 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | NIT: 891.580.002-5 | |
| **DIRECCIÓN:** KR 6 NRO. 10 N - 142 | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 8234508 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO | 19289121-3 | 45.00 |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO | 10301884-2 | 45.00 |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1 | 10.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101051477 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 22 | 11 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO EVOLET | | NIT: 901.784.507-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 3043935212 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | NIT: 891.580.002-5 |
| **DIRECCIÓN:** KR 6 NRO. 10 N - 142 | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 8234508 |

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO | 19289121-3 | 45.00 |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO | 10301884-2 | 45.00 |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1 | 10.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERFINANCIERA MIEMBRO DE LA RED DE SEGUROS DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101279178 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 27 | 08 | 2030 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO EVOLET | NIT: 901.784.507-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | POPAYAN, CAUCA | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891.580.002-5 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 6 NRO. 10 N - 142 | POPAYAN, CAUCA | 8234508 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OFICINA JURÍDICA
29 DIC 2023
VISTO BUENO COORDINADOR JURIDICO
PÓLIZA APROBADA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/12/2023 | 27/12/2025 | $6,494,785,713.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/12/2023 | 27/08/2028 | $1,623,696,428.45 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 27/12/2023 | 27/12/2025 | $9,742,178,570.70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | * SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $3,247,392,856.90 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO | 19289121-3 | 45.00 |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO | 10301884-2 | 45.00 |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1 | 10.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *169,046,816.00 | $ ******25,000.00 | $ **32,123,645.00 | $ ********201,195,461.00 | $ ***21,108,053,569.85 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101051477 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 2023 | 27 | 12 | 2023 | 00:00 | 27 | 08 | 2030 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO EVOLET | | NIT: 901.784.507-4 |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO: 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | NIT: 891.580.002-5 |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142 | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO 8234508 |
| BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | ADICIONAL: | ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 27/12/2023 | 27/08/2030 | $1,623,696,428.45 |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 27/12/2023 | 27/08/2030 | $1,623,696,428.45 |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 27/12/2023 | 27/08/2030 | $1,623,696,428.45 |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO | 19289121-3 | 45.00 |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO | 10301884-2 | 45.00 |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1 | 10.00 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. OFICINA JURIDICA

29 DIC 2023

REVISÓ

PÓLIZA APROBADA

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **27,080,142.00 | $ ******25,000.00 | $ ***5,149,977.00 | $ ********32,255,119.00 | $ ****1,623,696,428.45 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101051477

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranta B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-40-101051477** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **04** | **2025** | **22** | **03** | **2024** | **00:00** | **13** | **05** | **2031** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO EVOLET** | | **NIT: 901.784.507-4** |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO: | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** | | **NIT: 891.580.002-5** |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142 | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8234508 |
| BENEFICIARIO: | 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **22/03/2024** | **13/05/2031** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **22/03/2024** | **13/05/2031** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **22/03/2024** | **13/05/2031** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,912,847.00 | $ *******3,000.00 | $ *****364,011.00 | $ *********2,279,858.00 | $ ****1,623,696,428.45 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101051477

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101051477 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2025 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 13 | 05 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO EVOLET | | **NIT: 901.784.507-4** |
| **DIRECCIÓN:** CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | **NIT: 891.580.002-5** |
| **DIRECCIÓN:** KR 6 NRO. 10 N - 142 | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 8234508 |

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **22/03/2024** | **13/05/2031** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **22/03/2024** | **13/05/2031** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **22/03/2024** | **13/05/2031** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101051477

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-40-101051477** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **04** | **2025** | **22** | **03** | **2024** | **00:00** | **13** | **05** | **2031** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO EVOLET** | | **NIT: 901.784.507-4** |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO: | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** | | **NIT: 891.580.002-5** |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142 | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8234508 |

BENEFICIARIO:




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,912,847.00 | $ *******3,000.00 | $ *****364,011.00 | $ *********2,279,858.00 | $ ****1,623,696,428.45 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11009610188095(3900)000002279858(96)20250322

**REFERENCIA PAGO:**

**1100961018809-5**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101051477 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2025 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 13 | 05 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO EVOLET — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.784.507-4**

**DIRECCIÓN:** CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA — **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA — **TELÉFONO:** 3043935212

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 891.580.002-5**

**DIRECCIÓN:** KR 6 NRO. 10 N - 142 — **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA — **TELÉFONO:** 8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO | 19289121-3 | 45.00 |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO | 10301884-2 | 45.00 |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1 | 10.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101051477

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-44-101279178** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **04** | **2025** | **22** | **03** | **2024** | **00:00** | **22** | **11** | **2030** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO EVOLET** | **NIT: 901.784.507-4** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | POPAYAN, CAUCA | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** | **NIT: 891.580.002-5** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 6 NRO. 10 N - 142 | POPAYAN, CAUCA | 8234508 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **22/03/2024** | **13/09/2026** | **$6,494,785,713.80** | **$6,494,785,713.80** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **22/03/2024** | **13/05/2029** | **$1,623,696,428.45** | **$1,623,696,428.45** |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **22/03/2024** | **13/09/2026** | **$9,742,178,570.70** | **$9,742,178,570.70** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$3,247,392,856.90** | **$3,247,392,856.90** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 13/05/2026 | 13/05/2031 | $3,247,392,856.90 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **25,503,155.00 | $ *******8,000.00 | $ ***4,847,119.00 | $ ********30,358,274.00 | $ ***21,108,053,569.85 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101279178

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-44-101279178** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **04** | **2025** | **22** | **03** | **2024** | **00:00** | **22** | **11** | **2030** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO EVOLET** | | **NIT: 901.784.507-4** |
| DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO: | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** | | **NIT: 891.580.002-5** |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142 | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8234508 |

ADICIONAL:


Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445


| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **25,503,155.00 | $ *******8,000.00 | $ ***4,847,119.00 | $ ********30,358,274.00 | $ ***21,108,053,569.85 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 225483 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11009610188088(3900)000030358274(96)20250322

**REFERENCIA PAGO:**

**1100961018808-8**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101279178 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2025 | 22 | 03 | 2024 | 00:00 | 22 | 11 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO EVOLET | **NIT: 901.784.507-4** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA | | POPAYAN, CAUCA | 3043935212 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | **NIT: 891.580.002-5** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | KR 6 NRO. 10 N - 142 | | POPAYAN, CAUCA | 8234508 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO | 19289121-3 | 45.00 |
| CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO | 10301884-2 | 45.00 |
| CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S | 900552695-1 | 10.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101279178

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO 2. POLIZAS INTERVENTORIA – CONTRATO 078 2024

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

## PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 01 | 02 | 2024 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 01 | 02 | 2024 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO INTERSALUD PZ — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.794.710-6

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELÉFONO: 3016192419

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 01/02/2024 | 01/04/2026 | 256,082,406.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 01/02/2024 | 01/10/2028 | 64,020,601.50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 01/02/2024 | 01/12/2029 | 256,082,406.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 1532 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA
01 FEB 2024
Sergio
GERENTE O ASESOR JURIDICO

REVISO

PÓLIZA APROBADA

| VALOR ASEGURADO | VALOR PRIMA | GASTOS EXPEDICION | IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| $ ********5,413,500 | $ ********4,225,570 | $****15,000.00 | $ ******805,708 | $ ********5,046,279 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| BONILLA DEL SOCORRO TOVAR RODRIGUEZ | 5413 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTÉ ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

**DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195782

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257986CAFB7650 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4351957628**

## PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 25 | 04 | 2024 | 25 | 04 | 2024 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 22/03/2024 | 22/05/2026 | 256,082,406.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 22/03/2024 | 22/11/2028 | 64,020,601.50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22/11/2025 | 22/11/2030 | 256,082,406.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL"

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|
| $ ***576,185,413.50 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ | 5932 | 100.00 | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. NIT 891.580.002-5
02 MAY 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB25790606F5785B


Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA APROBADA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2024

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4351957628**

## PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 28 | 04 | 2025 |

| FECHA DE IMPRESIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 15 | 05 | 2025 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 22/03/2024 | 10/11/2026 | 256,082,406.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 22/03/2024 | 10/05/2029 | 64,020,601.50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 22/11/2025 | 13/05/2031 | 256,082,406.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 172 DÍAS, DE ACUERDO A OTRO SI 001 DE FECHA 15/04/2025 AL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS EN ESTE ANEXO CONTINUAN VIEGENTES.

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***576,185,413.50 | $ **********488,732 | $*****5,000.00 | $ *******93,809 | $ **********587,541 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| ROCIO SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ | 5932 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB257A0E08FC7D57

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
**Dirección:** Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO 3. PLANILLAS INTERVENTORIA JUNIO 2025

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901794710 | 6 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO | POPAYAN-CAUCA | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 1532038138 | 9487122342 | Y | 2025/06/05 | 2025/06/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $396,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 66785383 | ANGULO AGUDELO AIXSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| 2 | CC | 10527864 | GUZMAN ENRIQUEZ AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| 3 | CC | 1061817104 | ORDOÑEZ CORTES ANGELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| 4 | CC | 76313467 | PERAFAN LEDEZMA JESUS EDINSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| **Total** | **Afiliados( 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $5,694,000 | $396,400 | | $0 | $0 | | $396,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901794710 | 6 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO | POPAYAN-CAUCA | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 1532038138 | 9487122342 | Y | 2025/06/05 | 2025/06/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $396,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $396,400 | $0 | $0 | $396,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $396,400 | $0 | $0 | $396,400 |
| **TOTAL** | | | | **4** | **$396,400** | **$0** | **$0** | **$396,400** |

# ANEXO 4. ACTAS DE COMITÉ JUNIO 2025

"Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E."

CONSORCIO INTERSALUD PZ

| ACTA DE COMITÉ N°51 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 | | | | |
| CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 | | | | |
| DIA | MES | AÑO | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN |
| 03 | 06 | 2025 | 09:25 A.M. | 10:30 A.M. |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO/ENTIDAD | NOMBRE | CARGO/ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Córdoba | Contratista de Obra Consorcio Evolet | Michelle Vannessa Proaño | Interventoría Consorcio Intersalud PZ. |
| Cindy Rodriguez | Contratista de Obra Consorcio Evolet | Jesús Edinson Perafan | Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ. |
| Edgar Galvis | Contratista de Obra Consorcio Evolet | Angelica Ordoñez Cortes | Interventoría Consorcio Intersalud PZ. |
| Marco A. Velasco Mejía | Apoyo a la supervisión HUSJ | Juan Francisco Mora | Supervisor HUSJ |

**TEMAS TRATADOS**

| TEMAS | RESPONSABLE | GENERA COMPROMISO | | CONTROL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | Fecha de Control | ¿Cumplió? SI/NO |
| 1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto. | | | X | | |
| 2. Ajuste y verificación de actas anteriores<br><br>La interventoría informa que, se hizo llegar al Dr. Mora las actas de comité N°48 y N°49.<br><br>El Dr. Mora realizó observaciones que ya fueron ajustadas.<br><br>Las actas en mención se ajustaron y serán entregadas nuevamente posterior al presente comité para su verificación y firma de los asistentes.<br><br>La interventoría realiza la aclaración sobre el Acta N°49: En el punto 3, se mencionó que los planos eléctricos ya se habían entregado en esa fecha, pero en realidad, no había sido así. La entrega se realizó para el acta N° 50. Esta aclaración se consignará en la presente acta. | Entidad | X | | 06/06/2025 | |
| 3. La interventoría comunica un avance ejecutado acumulado de 28.04% y un programado acumulado de 28.04%.<br><br>La interventoría comunica que, para el final de esta semana, el contratista de obra debe haber alcanzado un 29.5% de avance, lo que representa un 1.46% de avance adicional en la semana.<br><br>Se reitera al contratista la necesidad de incrementar cuadrillas o verificar actividades para cumplir con el porcentaje de avance establecido para esta semana.<br><br>El plan de contingencia y la reprogramación de obra enviados | Contratista | X | | 06/06/2025 | |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| el 30 de mayo del presente por el contratista están actualmente en revisión por parte de la interventoría.<br><br>En el comité anterior y mediante oficio CIPZ-078-0274-2025, la interventoría solo avaló la reprogramación dentro del plazo contractual.<br><br>La interventoría dejó claro al contratista de obra que no habrá más prórrogas para el proyecto. | | | | | |
| **4.** Ajuste de diseños eléctrico<br><br>La interventoría menciona que, se realizó una reunión para la ubicación de tomas y otros aspectos del plano eléctrico.<br><br>Se propuso una nueva reunión para el día viernes 06 de junio del presente donde participara entidad, interventoria y contratista.<br><br>Anteriormente, se había mencionado por parte de la interventoría que hay cinco componentes clave para definir definitivamente los diseños:<br>o Bombas para la red hidráulica y red contra incendios.<br>o Aires acondicionados.<br>o Apantallamiento.<br>o Helipuerto.<br>o Sistema de iluminación (pendiente de remisión de información). | Entidad<br>Interventoría<br>Contratista<br>Consultoria | X | | 06/06/2025 | |
| **5.** La interventoría informa que, la ingeniera eléctrica Xiomara Giraldo parte de su equipo mínimo, presentó su renuncia irrevocable el día de hoy debido a temas personales y de salud. Por lo cual, esta interventoría solicita comedidamente el plazo de una semana para encontrar un ingeniero eléctrico de reemplazo y posteriormente enviar la hoja de vida correspondiente. Asimismo, se enviará la carta de renuncia de la Ingeniera Xiomara. | Interventoria | | | 06/06/2025 | |
| **6.** Estudio de puesta a tierra<br><br>Dentro de la carta de renuncia la Ing Xiomara Giraldo, ofrece el contacto de una persona que puede alquilar el equipo para mediciones de resistividad del terreno.<br><br>Se reitera que el estudio de resistividad es fundamental para el cálculo correcto del diseño de apantallamiento y puesta a tierra por parte del contratista y consultor respectivamente. | Entidad<br>Contratista | X | | 06/06/2025 | |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Se acuerda agilizar este tema con el consultor. La entidad será la responsable de la gestión, pero la realización del estudio es deber del consultor/diseñador eléctrico. | | | | | |
| **7.** Programación de reunión y observaciones de diseño<br><br>La reunión presencial para entregar las observaciones de diseños, programada inicialmente para mañana, se pospone para el jueves 5 de junio a las 9:00 A.M.<br><br>La interventoría solicita al contratista que las observaciones de diseño, que ya están adelantadas, sean enviadas a la entidad lo antes posible para que el ingeniero David Lemus pueda revisarlas, facilitando una reunión más fluida el jueves.<br><br>La interventoría menciona que, en virtud de la revisión de las observaciones hará lo posible en buscar un ingeniero eléctrico que colabore en la revisión de las observaciones en caso de no conseguir uno de forma inmediata.<br><br>El contratista manifiesta la necesidad de incluir en el acta, que los diseños actuales no los contemplan los cálculos los sistemas eléctricos hospitalarios esenciales (crítico, vital y equilibrado), y, lo cual es una línea normativa que debe cumplirse.<br><br>El ingeniero Armando Cano ingeniero electrico del consorcio evolet y el asesor electrico Edgar Galvis estarán presentes en la reunión del jueves a las 9:00 AM para explicar las observaciones pendientes para el proceso constructivo, asegurando que el consultor cumpla con las normativas para la construcción de este componente del proyecto. | Entidad<br>Interventoria<br>Contratista | <br><br>X | | 05/06/2025 | |
| **8.** Estado del diseño de bombas y aire acondicionado<br><br>La interventoría realiza consulta a la supervisión sobre el estado del diseño de bombas y aires acondicionados, si se trabajará con el diseño inicial o si habrá modificaciones.<br><br>Se solicita que, si se trabaja con el diseño inicial de aire acondicionado, el ingeniero Felipe Restrepo /Diseñador eléctrico de consultoría justifique por qué se "demandó" (redujo la capacidad) al 55%, ya que normativamente no se debe reducir la capacidad. Cabe mencionar que, lo anterior fue consignado mediante oficio CIPZ-078-0280-2025 enviado a la entidad el 26 de mayo del presente.<br><br>La supervisión revisará este punto y se pronunciará en los próximos días sobre las acciones o decisiones a tomar.<br><br>La recomendación por parte del contratista es mantener los parámetros normativos y no reducir la capacidad. | Contratista | X | | 06/06/2025 | |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.** Apantallamiento<br><br>El contratista solicitó el estudio de resistividad del terreno.<br><br>Se discute si esta obligación corresponde al consultor o si debe gestionarse aparte.<br><br>Se reitera que es deber del consultor tener el estudio de resistividad para un cálculo asertivo y correcto del diseño de puesta a tierra, por lo que, la entidad establecerá comunicación con el consultor para la entrega de este estudio. | Entidad | X | | 06/06/2025 | |
| **10.** Provisional de Energia<br><br>El contratista ya instaló el provisional de energía.<br><br>Los documentos y el plano firmado por el ingeniero eléctrico serán remitidos hoy a la entidad.<br><br>Aunque el ingeniero David Lemus / Apoyo eléctrico HUSJ, ya tenía conocimiento, la interventoría remitirá el informe formalmente para que la entidad pueda calcular el cobro correspondiente.<br><br>La supervisión menciona que, actualmente no hay observaciones significativas, pero se emitirá una posición oficial una vez se formalice el informe | Interventoria Contratista | X | | 06/06/2025 | |
| **11.** Seguridad y salud en el trabajo<br><br>La interventoría menciona que se encontraban pendientes del acta de comité anterior y en el oficio CIPZ-078-270-2025 enviado a la entidad el día 21 de mayo del presente:<br><br>o Entrega del *procedimiento* de operación de la pluma grúa. (Pendiente)<br><br>o Mejora de los tableros eléctricos (ya cumplida y enviada por parte del contratista de obra). | Contratista | X | | 06/06/2025 | |
| **12.** Concepto de secretaria de Salud<br><br>Se recibió un nuevo concepto de la Secretaría de Salud que difiere significativamente de las reuniones previas y del primer concepto emitido.<br><br>Se solicitó al contratista, mediante oficio CIPZ-078-0284-2025 del 27 de mayo del presente, la justificación y subsanación de las observaciones realizadas en este nuevo concepto, tanto jurídica como técnicamente.<br><br>Queda pendiente la respuesta del contratista. Posteriormente, la interventoría revisará y remitirá el balance N°3 enviado en el mes de marzo con los informes y | Contratista | X | | 06/06/2025 | |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| la respuesta del contratista para su envío al ministerio. | | | | | |
| **13.** Acta de cobro<br><br>La interventoría menciona lo siguiente:<br><br>Acta de cobro N° 1 de interventoria: Recibida el 30 de mayo.<br><br>Acta de cobro N° 2 de interventoría: Aún no recibida.<br><br>Actas de cobro N° 1 y N° 2 del contratista: Entendido que ya fueron pagadas.<br><br>Para la Acta N° 1 del contratista, se gestionó el envío de los recursos a la cuenta de Casa Odontológica (uno de los consorciados) para evitar pérdidas por el 4x1000, según la opción dada por la fiducia. La fiducia transferirá los recursos a esa cuenta.<br><br>Se solicita a la supervisión los certificados de egreso de las actas N°1 y N°2 del contratista y acta N°1 de interventoria para verificar los descuentos. | Entidad | | X | 06/06/2025 | |
| **14.** Acta de modificación N°1<br><br>La interventoría comunica que el acta de modificación N°1, fue radicada el 20 de mayo del presente.<br><br>Se consulta al ingeniero Marco Velasco / Apoyo a la supervisión, si ya fue revisada, si hay observaciones o si algo debe ser modificado.<br><br>Se informa que, el contratista de obra ya radicó para revisión el primer paquete de memoria de cantidades del acta N° 3 a la interventoría.<br><br>El ingeniero Marco Velasco / Apoyo a la supervisión, ha revisado el acta, pero necesita que quede constatado en acta y firmado/autorizado para avanzar.<br><br>Se aclara que esta acta es de mayores y menores cantidades de obra de las condiciones contractuales, no de "no previstos".<br><br>La supervisión menciona que el proceso requiere paciencia debido al apoyo del ministerio.<br><br>La interventoría deja constancia que existen varias actividades por cobrar que se encuentran pendientes. | Entidad | | X | 06/06/2025 | |
| **15.** Disposición de residuos (Red de media tensión)<br><br>La interventoría informa que realizo la remisión a la entidad de una solicitud del contratista mediante oficio CIPZ-078-0260-2025 del 16 de mayo del presente para la disposición | | | | | |



Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| de residuos.<br><br>Se había acordado que se hiciera en diferentes etapas.<br><br>Este tema deberá ser hablado con el área de mantenimiento del HUS para la conexión de media tensión, ya que implicará mover las ambulancias y se necesitará su apoyo.<br><br>Se recomienda que, previo al inicio de actividades constructivas, sea radicado y aprobado por parte del operador el diseño de media tensión, se aclara que, es función del contratista obtener esta aprobación.<br><br>Una vez aprobado el diseño, la entidad será notificada para que se realice el despeje de los espacios necesarios.<br><br>Importante: Antes de la aprobación, el contratista de obra menciona que, se debe realizar una corrección en el diseño de media tensión para evitar un doble pago, ya que ellos cobran por revisión. Esta corrección debe ser avalada y firmada por el consultor.<br><br>El contratista deberá agilizar la corrección y presentación del diseño. | Entidad Contratista | X | | 06/06/2025 |
| **16.** Verificación de Diseños Eléctricos (Post-Renuncia Ingeniera Xiomara)<br><br>La reunión del jueves a las 9:00 AM es para socializar las observaciones tanto de la interventoría como del contratista<br><br>La interventoría menciona que, la ingeniera Xiomara no ha entregado ninguna observación desde el jueves debido a problemas de salud. La interventoría solo cuenta con el primer oficio entregado. Es por ello que solicita comedidamente que el contratista haga llegar sus observaciones para que pueda revisarlas mientras consigue un nuevo ingeniero eléctrico.<br><br>Se reitera la importancia de tener las observaciones de la red de media tensión lo antes posible para obtener el permiso del operador de red y proceder con la construcción.<br><br>El contratista de obra menciona que el cálculo del sistema de puesta a tierra para la malla de subestación en la red de media tensión está incorrecto (debe ser calibre 2/0) y que esta observación se incluirá en el documento físico que se compartirá el jueves a las 9:00 AM. | Interventoria | X | | 06/06/2025 |
| **17.** Transformador y Cargas eléctricas<br><br>El contratista menciona que el transformador cambiará, incluso si se reducen los aires acondicionados, debido a los cálculos del ingeniero Felipe restrepo. | | X | | |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Los cálculos actuales, sin aires acondicionados, arrojan un consumo de 282 KVA.<br><br>El contratista de obra advierte al Dr. Francisco Mora/ Supervisor, que no se puede dejar el transformador en 290 KVA (como esta en el diseño), ya que esto dejaría una reserva mínima de 5 KVA, equivalente a solo tres oficinas. Es crucial considerar una proyección futura para el edificio, que se utilizará para más que solo exámenes.<br><br>Se discute la diferencia entre cargas fundamentales y no fundamentales:<br><br>Cargas fundamentales (sistema esencial): Incluyen el sistema crítico (tomas junto a las camas), el sistema vital (iluminación junto a las camas) y los equipos que soportan la operación del edificio y los pacientes. Estas cargas no deben ser "demandadas" (reducidas en capacidad).<br><br>Cargas no fundamentales: Tomas normales de servicio y tomas reguladas para computadores. Estas cargas sí pueden ser "demandadas": los primeros 10.000 KVA al 100% y los demás al 50%.<br><br>Se menciona que los cálculos actuales no cuadran, tanto para el ingeniero a cargo como para un revisor externo, dando un cálculo más alto del esperado.<br><br>El contratista de obra subraya la importancia de que el ingeniero electricista tenga experiencia en hospitales, ya que los proyectos hospitalarios son "un mundo" diferente a los residenciales y requieren un enfoque distinto en los cálculos de cargas. | Entidad<br>Interventoria<br>Contratista | | | 06/06/2025 |
| **18.** | Alcance del proyecto y extralimitación de funciones<br><br>La interventoría aclara que la torre de consulta externa no es una torre de hospitalización, y como interventoría, no pueden extralimitar sus funciones exigiendo cargas o proyecciones más allá del objeto contractual, que es construir una torre de consulta externa y administrativa.<br><br>Se reconoce que el crecimiento futuro del hospital es una decisión de la entidad, no una responsabilidad de la interventoría en el marco del contrato actual.<br><br>El transformador actual, con las cargas de la torre de consulta externa (tomas, apagadores y aires), está dimensionado a 300 KVA, lo cual cumple con el objeto del contrato y las normativas para este tipo de edificación.<br><br>Se enfatiza que el equilibrio económico del contrato es crucial, ya que no hay adicionales presupuestados. Cualquier cambio que implique mayores costos y modifique la estructura del cableado debe ser justificado | Contratista<br>Entidad | X | | 3/06/2025 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| técnicamente.<br><br>La entidad busca que se trabaje bajo lo establecido inicialmente. Sin embargo, si técnicamente se demuestra que las cargas actuales no son suficientes, se deberá ampliar, pero siempre con un concepto técnico avalado por la interventoría, la entidad y los contratistas. | | | | | |
| **19.** Cerramiento de ventanas en el tercer piso<br><br>Se envió un oficio a la entidad CIPZ-078-278-2025 del 26 de mayo del presente, solicitando tomar medidas para el cerramiento de ventanas en el tercer piso para evitar quejas de usuarios por falta de privacidad.<br><br>La entidad reconoce el oficio y plantea que aislar o cerrar completamente esas ventanas podría implicar más cargas y sistemas de aire complejos.<br><br>La solución propuesta es implementar un mecanismo de cortinas para evitar que los pacientes sean vistos.<br><br>Se busca evitar situaciones que puedan exponer a lo usuarios<br><br>La administración generará un comunicado interno y hará recomendaciones al equipo para que se tomen precauciones. | | | | | |
| **20.** Obra de Elementos No Estructurales (Ampliación de Zonas Perimetrales)<br><br>El contratista envió un oficio solicitando la ampliación de zonas perimetrales para la construcción de una zona de elementos no estructurales, mencionando la necesidad de excavar un metro.<br><br>La interventoría requiere una justificación técnica detallada para esta excavación. El estudio de suelos inicial del ingeniero Cosme contemplaba excavaciones de 60 cm a 1.50 m debido a la presencia de escombros.<br><br>Se le indicó al contratista que no se puede cimentar sobre escombros, lo que explica la profundidad de la excavación.<br><br>Se solicita al contratista que su especialista estructural mejore y complemente el concepto presentado, incluyendo el cálculo de la losa y el detalle constructivo, ya que actualmente solo se menciona que es una losa sencilla.<br><br>Se aclara que la obra en mención es contractual y está dentro de la implantación aprobada por la curaduría.<br><br>Se menciona que, una vez despejada la parte posterior, también será necesario realizar la misma labor allí. | | | | | |



Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.** La supervisión menciona que, observó personal trabajando el sábado por la tarde, a pesar de las condiciones climáticas adversas (llovizna tirando a lluvia y cielo oscuro).<br><br>Es por ello que, reitera la recomendación de seguridad para el personal en tales condiciones. | | | | | |
| **22.** Diseño del apantallamiento<br><br>La supervisión solicita un soporte de la aprobación del diseño de apantallamiento.<br><br>La interventoría recuerda que este tema se manifestó inicialmente en el acta de comité N° 29, la cual no está firmada oficialmente como un oficio de aprobación.<br><br>Se compartirá la grabación y el acta del comité N° 29 para que la entidad esté consciente de que, aunque no hubo una negación explícita, tampoco hubo una aprobación formal por oficio.<br><br>La supervisión precisa que, no puede permitir "silencios positivos" que se interpreten como aprobaciones.<br><br>La interventoría y el contratista recuerda que en la reunión del comité N° 29, se debatió la posibilidad de realizar el apantallamiento por fuera de las columnas. Además, resaltan que el presupuesto del apantallamiento no debe exceder el inicial.<br><br>Se subraya que la interventoría ha solicitado al contratista el sustento técnico y financiero del apantallamiento, desde el momento que planteó esta alternativa en el acta de comité N°29, lo cual sigue pendiente.<br><br>El contratista menciona que hoy en día, todos los sistemas de apantallamiento se construyen externamente.<br><br>La supervisión enfatiza que no se puede asignar más presupuesto para el apantallamiento.<br><br>La interventoria precisa que, no actuará de forma unilateral y siempre consultará a la entidad.<br><br>Se reitera al contratista que el apantallamiento propuesto no debe costar más de lo presupuestado.<br><br>El contratista confirma que el apantallamiento en sí no genera costos adicionales.<br><br>Sin embargo, se aclara que el incumplimiento de la norma del sistema perimetral de puesta a tierra sí implica un costo adicional, ya que debe pasar de calibre 2 a calibre 1/0 por normativa. | | | | | |




Scanned with CamScanner

Se sugiere que es bueno tener un saldo a favor para eventuales ajustes necesarios como este.

**23.** El comité finaliza a las 10:30 AM.

Se hará entrega al Dr. Mora de las actas de comité 48 y 49 ajustadas, junto con las actas anteriores revisadas, para su revisión y firma, así se pueda proceder a solicitar la firma de los demás asistentes.

**Registro Fotografico Comité N°51 del 03 de junio 2025**

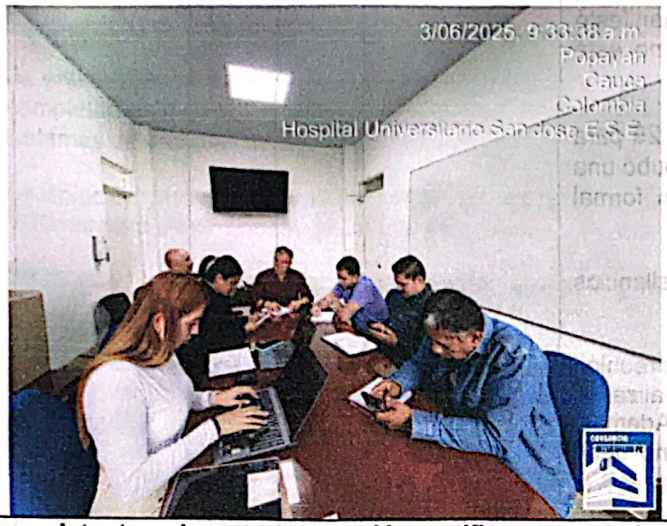


**Los asistentes a la presente reunión certificamos que el contenido del acta es fiel reflejo de lo acordado y se ha redactado de forma veraz. En señal de conformidad, firmamos a continuación.**

**FIRMAS**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Marco A Velasco | Apoyo a la Supervisión | HUSJ | |
| Juan Francisco Hoyos | Supervisor ctto | H.U.S.J | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Scanned with CamScanner

# ANEXO 5. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA CRUZADA

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 |
|---|---|
| | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |
| | CONSORCIO INTERSALUD PZ |

| MES: | jun-25 |
|---|---|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | FECHA RECIBIDO | ORIGEN | DESTINO | ASUNTO | ESTADO | | | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A | |
| 2/06/2025 | EV-C358-23-0441-25 | 2/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de columnas y pantallas piso No. 6. | | | X | |
| 31/05/2025 | EV-C358-23-0440-25 | 3/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión memorias de cantidades paquete N°1 - Acta parcial de obra N°3. | | X | | CIPZ-078-0296-2025 |
| 3/06/2025 | N.A | 3/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Estudio de iluminacion | | X | | CIPZ-078-0294-2025 |
| 3/06/2025 | EV-C358-23-0442-25 | 3/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | reporte personal en obra | | | X | |
| 27/05/2025 | EV-C358-23-0432-25 | 4/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Ampliación zonas para la prolongación de la zona de cafetería y andenes. | | X | | CIPZ-078-0309-2025 |
| 4/06/2025 | n.a | 4/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | COPIA ESCANEADA ACTAS #1 Y #2 EVOLET, ACTA#1 INTERSALUD PZ | | | X | |
| 4/06/2025 | EV-C358-23-0443-25 | 4/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta al oficio CIPZ-078-0291-2025. Provisional de energia | | X | | CIPZ-078-0291-2025 |
| 6/06/2025 | EV-C358-23-0445-25 | 6/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Diseño cimentación ampliación zona de cafetería y andenes perimetrales | | X | | CIPZ-078-0309-2025 |
| 6/06/2025 | N.A | 6/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión de comprobantes de pago de actas parciales de cobro – Contrato 358 de 2023 y 078 de 2024 | | X | | CIPZ-078-0295-2025 |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 |
|---|---|
| | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |
| | CONSORCIO INTERSALUD PZ |

| MES: | jun-25 |
|---|---|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | FECHA RECIBIDO | ORIGEN | DESTINO | ASUNTO | ESTADO | | | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A | |
| 6/06/2025 | EV-C358-23-444-25 | 6/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Informe mensual abril - mayo 2025 contrato 358 2023 | | | X | |
| 9/06/2025 | n.a | 9/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Informe tecnico de resistividad del terreno | | | X | |
| 9/06/2025 | n.a | 9/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA | Entrega de actas de comité No. 48, 49, 50 y 51 – Respuesta al oficio CIPZ-078-0301-2025 | | | X | |
| 23/05/2025 | EV-C358-23-0447-25 | 10/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio de Interventoría CIPZ-078-0299-2025 / Observaciones componente electrico del proyecto | | X | | CIPZ-078-0299-2025 |
| 10/06/2025 | n.a | 10/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Acta parcial de cobro N°1 interventoria | | | X | |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 |
|---|---|
| | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |
| | CONSORCIO INTERSALUD PZ |

| MES: | jun-25 |
|---|---|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | FECHA RECIBIDO | ORIGEN | DESTINO | ASUNTO | ESTADO | | | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A | |
| 10/06/2025 | n.a | 10/06/2025 | SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | PLAZO PARA ENTREGA DE INFORME Y PETICION DE CONCEPTO SOBRE NUEVAS OBSERVACIONES. | | | X | |
| 11/06/2025 | EV-C358-23-0448-25 | 11/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión acta de obra No. 3 y atención al comunicado No. CIPZ-078-0304-2025. | | | X | |
| 11/06/2025 | n.a | 11/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Scaner del acta de obra No. 3 | | | X | |
| 11/06/2025 | EV-C358-23-0450-25 | 11/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reporte personal en obra | | | X | |
| 12/06/2025 | EV-C358-23-0452-25 | 12/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | REPROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN AL OFICIO No. CIPZ-078-0303-2025 | | X | | CIPZ-078-0303-2025 |
| 9/06/2025 | EV-C358-23-0451-25 | 12/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Cambio de residente de obra | | | X | |
| 12/06/2025 | n.a | 12/06/2025 | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Envío de oficio – Solicitud de aclaración sobre rendimientos financieros (mayo 2025) | | X | | CIPZ-078-0312-2025 |
| 12/06/2025 | EV-C358-23-0453-25 | 12/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Reiteración a la solicitud de aprobación del balance de obra No. 3 e ítems no previstos. | | X | | CIPZ-078-0313-2025 |
| 12/06/2025 | n.a | 12/06/2025 | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | ACEPTACION PROFESIONAL ELECTRICISTA JUAN JOSE MOSQUERA | | | X | |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 |
|---|---|
| | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |
| | CONSORCIO INTERSALUD PZ |

| MES: | jun-25 |
|---|---|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | FECHA RECIBIDO | ORIGEN | DESTINO | ASUNTO | ESTADO | | | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A | |
| 17/06/2025 | EV-C358-23-0457-25 | 17/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de losa de entrepiso No. 6. | | | X | |
| 16/06/2025 | EV-C358-23-0455-25 | 16/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-0309-2025 / Propuesta para losas de piso áreas perimetrales | | X | | CIPZ-078-0309-2025 |
| 18/06/2025 | EV-C358-23-0458-25 | 18/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Ajuste a la reprogramación y atención al oficio No. CIPZ-078-0274-2025 | | X | | CIPZ-078-0274-2025 |
| 18/06/2025 | EV-C358-23-0446-25 | 18/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta CIPZ-078-269-2025 | | X | | CIPZ-078-269-2025 |
| 17/06/2025 | EV-C358-23-0456-25 | 18/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta oficio CIPZ-078-0311-2025 / Requerimientos sistema de apantallamiento | | X | | CIPZ-078-0311-2025 |
| 20/06/2025 | N.A | 20/06/2025 | JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Mesa tecnica anden perimetral | | | X | |
| 21/06/2025 | EV-C358-23-0460-25 | 21/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Remisión informe mensual No. 16, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de mayo y 25 de junio del | | X | | CIPZ-078-0324-2025 |
| 24/06/2025 | EV-C358-23-0461-25 | 24/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0312-2025, aclaración sobre el valor consignado a la entidad por concepto de rendimientos financieros. | | X | | CIPZ-078-0312-2025 |
| 24/06/2025 | EV-C358-23-462-25 | 24/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE PRESIÓN | X | | | |

| TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 |
|---|---|
| | OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" |
| | CONSORCIO INTERSALUD PZ |

| MES: | jun-25 |
|---|---|

| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | FECHA RECIBIDO | ORIGEN | DESTINO | ASUNTO | ESTADO | | | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A | |
| 25/06/2025 | EV-C358-23-0465-25 | 25/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | Informe fiducia No. 7 | | | | |
| 24/06/2025 | EV-C358-23-0463-25 | 25/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD | ELEMENTOS DE FACHADA PISOS 2 Y 3 | | | | |
| 25/06/2025 | EV-C358-23-0464-25 | 25/06/2025 | CONSORCIO EVOLET | MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ | reporte personal en obra | | | | |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | CONSORCIO INTERSALUD PZ |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 3/06/2025 | CIPZ-078-0290-2025 | REITERACION INSTRUCCIONES PARA LIBERACION DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | X | | | |
| 4/06/2025 | CIPZ-078-0291-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0434-25 – PROVISIONAL ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0434-25 |
| 3/06/2025 | CIPZ-078-0292-2025 | SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS ACTUALIZADOS – CONTRATO N°358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | X | | | |
| 5/06/2025 | CIPZ-078-0293-2025 | REMISION OFICIO EV-C358-23-0434-25 PROVISIONAL ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO | | X | | EV-C358-23-0434-25 |
| 5/06/2025 | CIPZ-078-0294-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 3 DE JUNIO 2025 – ESTUDIO DE ILUMINACION | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0295-2025 | SOLICITUD DE COMPROBANTES DE PAGO ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 Y N°2 – CONTRATO 358 2023 CONTRATO 078 DE 2024 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO | | X | | 4/06/2025 |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0296-2025 | REVISION MEMORIAS DE CANTIDADES PAQUETE N°1 – ACTA PARCIAL N°3 DEL 31 DE MAYO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0297-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0431-25 – VIGAS JOIST Y VIGAS VOLADIZO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0431-25 |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 6/06/2025 | CIPZ-078-0298-2025 | RESPUESTA OFICIO 28 DE MAYO – SOLICITUD DE SOPORTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA CAMBIO EN EL APANTALLAMIENTO Y MANEJO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO | | X | | 28 DE MAYO 2025 |
| 7/06/2025 | CIPZ-078-0299-2025 | SOLICITUD OBSERVACIONES ELECTRICAS – CONTRATO 358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0447-25 |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024<br>OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"<br>CONSORCIO INTERSALUD PZ | CONSORCIO INTERSALUD PZ |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DEL OFICIO | CONSECUTIVO | ASUNTO | ORIGEN | DESTINO | ESTADO | | | FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION |
| | | | | | PENDIENTE | CONTESTADA | N/A | |
| 7/06/2025 | CIPZ-078-0300-2025 | REMISION COMPROBANTES DE PAGO ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 Y N°2 – CONTRATO 358 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 9/06/2025 | CIPZ-078-0301-2025 | SOLICITUD ENTREGA ACTAS DE COMITÉ FIRMADAS | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO | | X | | 9/06/2025 |
| 9/06/2025 | CIPZ-078-0302-2025 | REMISION INFORME TECNICO RESISTIVIDAD DEL TERRENO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 9/06/2025 | CIPZ-078-0303-2025 | REVISION REPROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0452-25 |
| 10/06/2025 | CIPZ-078-0304-2025 | REVISION ACTA DE RECIBO DE OBRA N°3 DEL 5 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0448-25 |
| 10/06/2025 | CIPZ-078-0305-2025 | REMISION INFORMES MENSUALES MAYO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | | X | |
| 10/06/2025 | CIPZ-078-0306-2025 | SOLICITUD ENTREGA OPORTUNA INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 11/06/2025 | CIPZ-078-0307-2025 | SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL – INGENIERO ELECTRICISTA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | X | | 12-jun-25 |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | CONSORCIO INTERSALUD PZ |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 11/06/2025 | CIPZ-078-0308-2025 | REITERACION OFICIO CIPZ-078-0284-2025 JUSTIFICACION AL CONCEPTO EMITIDO POR SECRETARIA DE SALUD Y COMPLEMENTACION BALANCE N°3 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0453-25 |
| 11/06/2025 | CIPZ-078-0309-2025 | RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0445-25 “DISEÑO CIMENTACIÓN AMPLIACIÓN ZONA DE CAFETERÍA Y ANDENES PERIMETRALES” | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0445-25 |
| 12/06/2025 | CIPZ-078-0310-2025 | SOLICITUD SOBRE INGENIERO ELECTRICO EQUIPO MINIMO CONTRATO 358 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | X | | | |
| 12/06/2025 | CIPZ-078-0311-2025 | REITERACION REQUERIMIENTOS APANTALLAMIENTO EDIFICIO | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0456-25 |
| 13/06/2025 | CIPZ-078-0312-2025 | REMISION OFICIO ENTIDAD 12 DE JUNIO DE 2025 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MAYO 2025) | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0461-25 |
| 13/06/2025 | CIPZ-078-0313-2025 | REMISION BALANCE N°3 CONTRATO 358 2023 OFICIO EV-C358-23-0453-25 DEL 12 DE JUNIO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | | X | |
| 14/06/2025 | CIPZ-078-0314-2025 | REVISION REPROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA OFICIO EV-C358-23-0452-25 DEL 12 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0458-25 |
| 18/06/2025 | CIPZ-078-0315-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°3 DE OBRA - CONTRATO N°358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | | X | |
| 16/06/2025 | CIPZ-078-0316-2025 | OBSERVACIONES ELECTRICAS CONTRATO 358 2023 - INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | X | | | |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 19/06/2025 | CIPZ-078-0317-2025 | REVISION PREACTA N°4 OFICIO EV-C358-23-0454-25 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 20/06/2025 | CIPZ-078-0318-2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N°3 DE INTERVENTORIA CONTRATO 078 2024 - CONTRATO N°358 DE 2023 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | | X | |
| 20/06/2025 | CIPZ-078-0319-2025 | SOLICITUD DE COMPROBANTE DE PAGO ACTA PARCIAL DE COBRO N°2 – CONTRATO 078 DE 2024 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | X | | | |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0320-2025 | RESPUESTA OBSERVACIONES ELECTRICAS CONTRATISTA OFICIO EV-C358-23-0447-25 DEL 23 DE MAYO 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | X | | EV-C358-23-0447-25 |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0321-2025 | CONVOCATORIA REUNION ELECTRICA | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0322-2025 | APROBACIÓN CRONOGRAMA DE OBRA – PLAN DE CONTINGENCIA DEL 18 DE JUNIO DE 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | | X | |
| 24/06/2025 | CIPZ-078-0323-2025 | REVISION ACTA N°4 OFICIO EV-C358-23-0459-25 DEL 20 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0324-2025 | REVISION INFORME MENSUAL N°16 MES JUNIO 2025– OFICIO EV-C358-23-0460-25 DEL 21 DE JUNIO. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0460-25 |
| 25/06/2025 | CIPZ-078-0325-2025 | REMISION OFICIO EV-C358-23-0461-25 – "RESPUESTA AL OFICIO NO. CIPZ-078-0312-2025, ACLARACIÓN SOBRE EL VALOR CONSIGNADO A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE | CONSORCIO INTERSALUD PZ | JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ | | | X | |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0326-2025 | REITERACIÓN OBSERVACIONES REVISION ACTA N°4<br>OFICIO EV-C358-23-0459-25<br>DEL 20 DE JUNIO DE 2025. | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | **CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024**<br>**OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"**<br>**CONSORCIO INTERSALUD PZ** | |
|---|---|---|

**MES CORRESPONDIENTE:** jun-25

| TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL OFICIO** | **CONSECUTIVO** | **ASUNTO** | **ORIGEN** | **DESTINO** | **ESTADO** | | | **FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION** |
| | | | | | **PENDIENTE** | **CONTESTADA** | **N/A** | |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0327-2025 | INSPECCIÓN AMBIENTAL A OBRA 21 DE JUNIO DE 2025 | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | | X | |
| 26/06/2025 | CIPZ-078-0328-2025 | SOLICITUD ENTREGA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | CONSORCIO INTERSALUD PZ | ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET | | X | | EV-C358-23-0469-25 |

# ANEXO 6. INFORME MENSUAL DEL PERIODO DEL 26 MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025 DEL CONTRATISTA DE OBRA

# ANEXO 7. RESULTADO RESISTENCIA CONCRETOS CONTRATISTA

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
## NTC 673

FGLR-67
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Dias) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA ESPECIFICADA | | | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | | | |
| 419 | **2334** | **T47** | **4** | 26-may-25 | **03-jun-25** | **8** | 260,7 | 3 | 8171 | 325 | **4627** | 31,9 | 211 | **3000** | 20,7 | 154,2 | 20,0 | Escalera emergencia hora de toma: 13:00 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Grava 3/4 |
| 419 | **2335** | **T47** | **4** | 26-may-25 | **03-jun-25** | **8** | 259,5 | 4 | 8252 | 321 | **4562** | 31,5 | 211 | **3000** | 20,7 | 152,1 | 20,0 | Escalera emergencia hora de toma: 13:00 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Grava 3/4 |
| 419 | **2336** | **T47** | **4** | 26-may-25 | **03-jun-25** | **8** | 250,7 | 3 | 8171 | 313 | **4450** | 30,7 | 211 | **3000** | 20,7 | 148,3 | 20,0 | Escalera emergencia hora de toma: 13:00 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Grava 3/4 |

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
## NTC 673

FGLR-67
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Dias) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA ESPECIFICADA | | | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | | | |
| 419 | **2337** | **T48** | **4** | 27-may-25 | **03-jun-25** | **7** | 172,4 | 5 | 8252 | 213 | **3031** | 20,9 | 211 | **3000** | 20,7 | 101,0 | 19,0 | Columnetas piso 1 hora de toma: 14:00 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 419 | **2338** | **T48** | **4** | 27-may-25 | **03-jun-25** | **7** | 167,6 | 4 | 8171 | 209 | **2974** | 20,5 | 211 | **3000** | 20,7 | 99,1 | 19,0 | Columnetas piso 1 hora de toma: 14:00 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 419 | **2339** | **T48** | **4** | 27-may-25 | **03-jun-25** | **7** | 176,2 | 4 | 8252 | 218 | **3098** | 21,4 | 211 | **3000** | 20,7 | 103,3 | 19,0 | Columnetas piso 1 hora de toma: 14:00 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO
## NTC 220

FGLR-329
Versión 05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | Consorcio Evolet | **ORDEN SERVICIO No.:** | **439** |
| **OBRA:** | Nueva Torre Hospital Universitario San José | | |
| **LOCALIZACIÓN OBRA:** | Carrera 6#10N-142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca | | |
| **CONTRATISTA:** | N.A | | |
| **INTERVENTORÍA:** | N.A | | |

**HOJA No:** 1

| NUMERACIÓN INTERNA | TIPO DE MUESTRA | ELEMENTO DE TOMA DE LA MUESTRA | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA DE DISEÑO | | | EVOLUCIÓN % | FLUIDEZ % | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | |
| 28 | T49 | Morteros primer piso | 03-jun-2025 | 10-jun-2025 | 7 | 165,0 | **2347** | 16,2 | 126 | 1800 | 12,6 | 130,9 | N.A | En obra Proporción 1:4 Materiales N.S |
| 29 | T49 | | 03-jun-2025 | 10-jun-2025 | 7 | 169,7 | **2414** | 16,6 | 126 | 1800 | 12,6 | 134,7 | N.A | |
| 30 | T49 | | 03-jun-2025 | 10-jun-2025 | 7 | 166,1 | **2363** | 16,3 | 126 | 1800 | 12,6 | 131,8 | N.A | |

OBSERVACIONES: Datos suministrados por el cliente. Muestra tomada por personal del Cliente.

REVISÓ
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**
**GEOTECNOLOGO**
**M.P. # 19516030791 CAU**

APROBÓ
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
## NTC 673

FGLR-67
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Dias) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA ESPECIFICADA | | | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | | | |
| 419 | **2340** | **T49** | **4** | 28-may-25 | **04-jun-25** | **7** | 251,2 | 4 | 8171 | 313 | **4458** | 30,7 | 211 | **3000** | 20,7 | 148,6 | 20,0 | Viguetas 1er piso hora de toma: 14:50 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 419 | **2341** | **T49** | **4** | 28-may-25 | **04-jun-25** | **7** | 240,3 | 3 | 8171 | 300 | **4265** | 29,4 | 211 | **3000** | 20,7 | 142,2 | 20,0 | Viguetas 1er piso hora de toma: 14:50 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 419 | **2342** | **T49** | **4** | 28-may-25 | **04-jun-25** | **7** | 258,5 | 4 | 8171 | 323 | **4587** | 31,6 | 211 | **3000** | 20,7 | 152,9 | 20,0 | Viguetas 1er piso hora de toma: 14:50 | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. : # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
## NTC 673

FGLR-67
Versión 06

**CLIENTE:** Consorcio Evolet

**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José

**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

**CONTRATISTA:** N.A

**INTERVENTORÍA:** N.A

| O.S No. | IDENTIFICACIÓN INTERNA | IDENTIFICACIÓN CLIENTE | TAMAÑO DE MUESTRA (IN) | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Dias) | LECTURA CARGA (KN) | PATRÓN DE FALLA | ÁREA (mm²) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA ESPECIFICADA | | | EVOLUCIÓN (%) | ASENTAM. (cm) | ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA | MATERIALES / PROPORCIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | | | |
| 439 | **2456** | **T50** | **4** | 04-jun-25 | **11-jun-25** | **7** | 354,2 | 1 | 8171 | 442 | **6288** | 43,4 | 281 | **4000** | 27,6 | 157,2 | 65,0 | Piso 6<br>PW1-2-6-10<br>C2-C4-C10<br>Hora toma: 5:00 am | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 439 | **2457** | **T50** | **4** | 04-jun-25 | **11-jun-25** | **7** | 343,5 | 5 | 8252 | 425 | **6038** | 41,6 | 281 | **4000** | 27,6 | 151,0 | 65,0 | Piso 6<br>PW1-2-6-10<br>C2-C4-C10<br>Hora toma: 5:00 am | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 439 | **2458** | **T50** | **4** | 04-jun-25 | **11-jun-25** | **7** | 348,6 | 1 | 8171 | 435 | **6187** | 42,7 | 281 | **4000** | 27,6 | 154,7 | 65,0 | Piso 6<br>PW1-2-6-10<br>C2-C4-C10<br>Hora toma: 5:00 am | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 439 | **2459** | **T51** | **4** | 04-jun-25 | **11-jun-25** | **7** | 304,8 | 1 | 8171 | 380 | **5410** | 37,3 | 281 | **4000** | 27,6 | 135,2 | 65,0 | Piso 6<br>PW3-4-5-7-8-9<br>C3-5-7-8-9-10<br>Hora toma: 8:00 am | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 439 | **2460** | **T51** | **4** | 04-jun-25 | **11-jun-25** | **7** | 314,0 | 4 | 8171 | 392 | **5573** | 38,4 | 281 | **4000** | 27,6 | 139,3 | 65,0 | Piso 6<br>PW3-4-5-7-8-9<br>C3-5-7-8-9-10<br>Hora toma: 8:00 am | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |
| 439 | **2461** | **T51** | **4** | 04-jun-25 | **11-jun-25** | **7** | 316,7 | 4 | 8171 | 395 | **5621** | 38,8 | 281 | **4000** | 27,6 | 140,5 | 65,0 | Piso 6<br>PW3-4-5-7-8-9<br>C3-5-7-8-9-10<br>Hora toma: 8:00 am | Premezclado | Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente |

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. : # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO



www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

# RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO
## NTC 220

FGLR-329
Versión 05

**CLIENTE:** Consorcio Evolet
**ORDEN SERVICIO No.:** 459
**OBRA:** Nueva Torre Hospital Universitario San José
**LOCALIZACIÓN OBRA:** Carrera 6#10N-142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
**CONTRATISTA:** N.A
**INTERVENTORÍA:** N.A

**HOJA No:** 2

| NUMERACIÓN INTERNA | TIPO DE MUESTRA | ELEMENTO DE TOMA DE LA MUESTRA | FECHA VACIADO | FECHA PRUEBA | EDAD (Días) | RESISTENCIA OBTENIDA | | | RESISTENCIA DE DISEÑO | | | EVOLUCIÓN % | FLUIDEZ % | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kg/cm² | PSI | Mpa | Kg/cm² | PSI | Mpa | | | |
| 31 | T52 | Mampostería piso 2 Mortero tipo S | 09-jun-2025 | 17-jun-2025 | 8 | 103,0 | **1465** | 10,1 | 126 | 1800 | 12,6 | 81,7 | N.A | En obra Proporción 1:4 Materiales N.S |
| 32 | T52 | | 09-jun-2025 | 17-jun-2025 | 8 | 104,2 | **1482** | 10,2 | 126 | 1800 | 12,6 | 82,7 | N.A | |
| 33 | T52 | | 09-jun-2025 | 17-jun-2025 | 8 | 103,6 | **1473** | 10,2 | 126 | 1800 | 12,6 | 82,2 | N.A | |
| 34 | T53 | Mampostería piso 2 Mortero tipo S | 12-jun-2025 | 19-jun-2025 | 7 | | | | 126 | 1800 | 12,6 | ## | N.A | En obra Proporción 1:4 Materiales N.S |
| 35 | T53 | | 12-jun-2025 | 19-jun-2025 | 7 | | | | 126 | 1800 | 12,6 | # | N.A | |
| 36 | T53 | | 12-jun-2025 | 19-jun-2025 | 7 | | | | 126 | 1800 | 12,6 | # | N.A | |

OBSERVACIONES: Datos suministrados por el cliente. Muestra tomada por personal del Cliente.

REVISÓ
**KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ**
**GEOTECNOLOGO**
**M.P. # 19516030791 CAU**

APROBÓ
**FERNANDO MUÑOZ FUENTES**
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

# ANEXO 8. RESULTADO RESISTENCIA CONCRETO INTERVENTORIA

**INGEOTED S.A.S.**

**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO**
**NTC 637**

**SOLICITADO POR** CONSORCIO INTERSALUD PZ **REFERENCIA**

**PROYECTO** CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCES DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

**LOCALIZACIÓN** HOSPITAL UNIVERSITARIO DE POPAYÁN, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**CONTRATISTA** CONSORCIO INTERSALUD PZ

**RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa):** 28 ASENTAMIENTO (cm): TOMA REALIZADA POR: CLIENTE

| MUESTRA No | CILINDRO No | ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD (DÍAS) | CARGA (KN) | ÁREA (mm) | ESFUERZO | | DESARROLLO (%) | CUMPLE | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Mpa | PSI | | | |
| 1 | 1 | GRADAS DE EMERGENCIA | 29/04/2025 | 16/06/2025 | 48 | 358.6 | 8494.9 | 42.2 | 6030 | 150.8 | SI | 3 |
| | 2 | | 29/04/2025 | 16/06/2025 | 48 | 349.9 | 8251.6 | 42.4 | 6057 | 151.4 | SI | 3 |
| 2 | 3 | LOSA DE ENTREPISO, PISO 5 (NIVEL +15,40 ) | 29/04/2025 | 16/06/2025 | 48 | 349.3 | 8171.3 | 42.7 | 6106 | 152.7 | SI | 3 |
| | 4 | | 29/04/2025 | 16/06/2025 | 48 | 348.7 | 8011.8 | 43.5 | 6217 | 155.4 | SI | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

REALIZÓ

BAIRON FELIPE MACA GIRÓN
GEOTECNOLOGO M.P. 063016-0693216CAU

REVISÓ

JUAN SEBASTIAN URBANO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGEOTED S.A.S.

INGENIERIA, GEOTECNIA, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS

**INGEOTED S.A.S.**

**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO**
**NTC 637**

**SOLICITADO POR** CONSORCIO INTERSALUD PZ **REFERENCIA**

**PROYECTO** CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCES DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

**LOCALIZACIÓN** HOSPITAL UNIVERSITARIO DE POPAYÁN, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**CONTRATISTA** CONSORCIO INTERSALUD PZ

**RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa):** 28 ASENTAMIENTO (cm): TOMA REALIZADA POR: CLIENTE

| MUESTRA No | CILINDRO No | ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DE TOMA | FECHA DE ENSAYO | EDAD (DÍAS) | CARGA (KN) | ÁREA (mm) | ESFUERZO | | DESARROLLO (%) | CUMPLE | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Mpa | PSI | | | |
| 1 | 1 | PANTALLAS Y COLUMNAS | 8/05/2025 | 16/06/2025 | 40 | 412,8 | 8494,9 | 48,6 | 6941 | 173,6 | SI | 3 |
| | 2 | | 8/05/2025 | 16/06/2025 | 40 | 405,0 | 8251,6 | 49,1 | 7011 | 175,3 | SI | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

INGEOTED
INGENIERIA, GEOTECNIA, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS

REALIZÓ

BAIRON FELIPE MACA GIRÓN
GEOTECNOLOGO M.P. 063016-0693216CAU

REVISÓ

JUAN SEBASTIAN URBANO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGEOTED S.A.S.
