ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 17 (PERIODO JUNIO 26 - JULIO 25 DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 17

CONSORCIO INTERSALUD PZ

Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	**Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M.** Representante legal Consorcio Intersalud PZ

JULIO 25 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9
2.1. Localización 10
2.2. Justificación. 11
2.3. Características del Proyecto. 12
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 13
3.1. Contrato de Obra. 13
3.2. Póliza del Contrato de Obra. 14
3.3. Contrato de Interventoría. 16
3.4. Pólizas de Interventoría. 17
4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 18
4.1. Gestión Administrativa 18
4.1.1 Personal de Interventoría 18
4.1.2 Personal del contratista de obra. 19
4.1.3. Comités de obra. 19
4.1.4 Correspondencia Cruzada 20
4.2. Gestión Técnica 26
4.2.1 Avance de obra 26
4.3. Gestión Financiera 114
4.4. Gestión Socioambiental 121
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 137
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA 163
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION. 163

8. CONCLUSIONES 170

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 10
Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1. 30
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 31
Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3. 32
Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. 33
Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. 34
Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. 35
Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2 36
Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3. 37
Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. 38
Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. 39
Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. 40
Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. 41
Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. 42
Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. 43
Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. 44
Ilustración 17. Disposición acero de refuerzo columna C1. 45
Ilustración 18. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 46
Ilustración 19. Disposición acero de refuerzo columna C3. 47
Ilustración 20. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. 48
Ilustración 21. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. 49

Ilustración 22. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. 50
Ilustración 23. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2 51
Ilustración 24. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3. 52
Ilustración 25. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. 53
Ilustración 26. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. 54
Ilustración 27. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. 55
Ilustración 28. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. 56
Ilustración 29. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. 57
Ilustración 30. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. 58
Ilustración 31. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. 59
Ilustración 32. Disposición de vigas joist entrepiso 5 N+23.20. 61
Ilustración 33. Detalle joist VT 02..... 62
Ilustración 34. Detalle joist VT 03..... 62
Ilustración 35. Detalle joist VT 04..... 63
Ilustración 36. Detalle joist VT 05..... 63
Ilustración 37. Detalle joist VT 06..... 64
Ilustración 38. Detalle joist VT 07..... 64
Ilustración 39. Detalle joist VT 10..... 65
Ilustración 40. Detalle joist VT 11..... 65
Ilustración 41. Detalle joist VT 12..... 66
Ilustración 42. Detalle joist VT 13..... 66
Ilustración 43. Disposición de vigas joist entrepiso 6 N+23.20 67
Ilustración 44. Disposición de vigas joist entrepiso 7 N+27.10 68
Ilustración 45. Detalle joist VT 02..... 69

Ilustración 46. Detalle joist VT 03..... 69
Ilustración 47. Detalle joist VT 04..... 70
Ilustración 48. Detalle joist VT 05..... 70
Ilustración 49. Detalle joist VT 06..... 71
Ilustración 50. Detalle joist VT 07..... 71
Ilustración 51. Disposición de refuerzo viga A. 72
Ilustración 52. Disposición de refuerzo viga A'..... 72
Ilustración 53. Disposición de refuerzo viga B 73
Ilustración 54. Disposición de refuerzo viga B*(5-6*)..... 74
Ilustración 55. Disposición de refuerzo viga C 75
Ilustración 56. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)..... 76
Ilustración 57. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') 76
Ilustración 58. Disposición de refuerzo viga E (1-6)..... 77
Ilustración 59. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)..... 78
Ilustración 60. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*)..... 78
Ilustración 61. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) 79
Ilustración 62. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) 79
Ilustración 63. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E)..... 80
Ilustración 64. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) 80
Ilustración 65. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C)..... 81
Ilustración 66.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) 81
Ilustración 67. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)..... 82
Ilustración 68. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) 82
Ilustración 69. Disposición de refuerzo viga A. 83

Ilustración 70. Disposición de refuerzo viga A' 83
Ilustración 71. Disposición de refuerzo viga B 84
Ilustración 72. Disposición de refuerzo viga B*(5-6*) 85
Ilustración 73. Disposición de refuerzo viga C 86
Ilustración 74. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) 87
Ilustración 75. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') 87
Ilustración 76. Disposición de refuerzo viga E (1-6) 88
Ilustración 77. Disposición de refuerzo viga E (1*-6*) 89
Ilustración 78. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) 89
Ilustración 79. Disposición de refuerzo viga 3(B-E) 90
Ilustración 80. Disposición de refuerzo viga 3*(B-E) 90
Ilustración 81. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) 91
Ilustración 82. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C) 92
Ilustración 83.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) 92
Ilustración 84. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E) 92
Ilustración 85. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) 93

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra 14
Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 14
Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 15
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 15
Tabla 5. Contrato de Interventoría 16
Tabla 6. Pólizas de Interventoría 17

Tabla 7. Personal de Interventoría. 18

Tabla 8. Personal del contratista de obra. 19

Tabla 9. Actas de comité 20

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra. 15

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría. 17

Anexo 3. Planillas personal Interventoría 19

Anexo 4. Actas de comité junio - julio de 2025 20

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. 26

Anexo 6. Informe de fiducia N°7 117

Anexo 7. Informe mensual del periodo del 26 junio al 25 de julio de 2025 del contratista de obra 163

Anexo 8. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA 169

Anexo 9. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA 169

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del 26 DE JUNIO A 25 DE JULIO DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	**CONSORCIO EVOLET**
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte ($32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Ampliación de plazo	Ciento setenta y dos (172) días
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025.
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		$ 3.247.392.856,90

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 3	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178 Anexo 4	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	13-sept-2026	$ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	13-sept-2026	$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	13-may-2029	$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años. Cero (0) meses y (0) días.		$ 3.247.392.856,90

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477 Anexo 4	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45
Vehículos propios y no propios	22-marzo-2024	13-may-2031	$ 1.623.696.428,45

Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	**CONSORCIO INTERSALUD PZ**
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva.
Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Ampliación de plazo Otro si No .01	Ciento setenta y dos (172) días.
Plazo final estimado	Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días.
Fecha de terminación inicial	22 de noviembre de 2025
Fecha de terminación final	13 de mayo de 2026.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de $1.280.412.030

Tabla 5. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-may-2026	$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	$256.082.406,00

Tabla 6. Pólizas de Interventoría

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría.

Póliza ampliación de plazo de interventoría OTROSI N°01.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 3	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	10-nov-2026	$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	10-may-2029	$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	13-may-2031	$256.082.406,00

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 26 DE JUNIO al 25 DE JULIO DE 2025.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Augusto Guzmán Enríquez
Ingeniero eléctrico	Juan José Mosquera
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixsa Angulo Agudelo
Abogado Jurídico	José Alexander Romero
Contador publico	Fernando Trujillo
Personal Adicional	
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniero Ambiental	Andres Felipe Orozco

Tabla 7. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Suplente representante legal	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	Fabio Humberto Carvajal
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastían Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Marlene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Lorena Falla Falla
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria

Tabla 8. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron dos (2) comités técnicos

COMITÉ	FECHA
53	03-07-2025

Visita Ministerio de Salud	09-07-2025
54	19-07-2025

Tabla 9. Actas de comité

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

Cabe resaltar que, para el presente informe no se anexaran las actas de comité, debido a que, se encuentran en trámite de firmas por parte de la entidad contratante. En virtud de lo anterior dichas actas se anexarán para el informe del siguiente mes.

Anexo 4. Actas de comité julio de 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 26 de JUNIO al 25 de JULIO de 2025.

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO
1/07/2025	CIPZ-078-0330-2025	REMISIÓN BALANCE DE OBRA N°3 , CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
1/07/2025	CIPZ-078-0331-2025	REMISION INFORMES MENSUALES JUNIO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
4/07/2025	CIPZ-078-0332-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°4 DE OBRA – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
4/07/2025	CIPZ-078-0333-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-462-25 DEL 24 DE JUNIO – "PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE PRESIÓN"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
7/07/2025	CIPZ-078-0334-2025	REMISION INFORMACION ENTIDAD – DISEÑOS ELEC-CCTV-DTI-TORRE HUSJ	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

11/07/2025	CIPZ-078-0335-2025	REMISIÓN OFICIO EV-C358-23-0480-25 "SOLICITUD DE DISEÑOS Y ACLARACIONES TÉCNICAS DEL HELIPUERTO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
9/07/2025	CIPZ-078-0336-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0480-25 "SOLICITUD DE DISEÑOS Y ACLARACIONES TÉCNICAS DEL HELIPUERTO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/07/2025	CIPZ-078-0337-2025	RESPUESTA CORREO ENTIDAD 3 JULIO 2025 – "REMISIÓN DE DISEÑOS ELEC-CCTV-DTI-TORRE HUSJ"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
10/07/2025	CIPZ-078-0338-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°4 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
10/07/2025	CIPZ-078-0339-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0480-25 – REVISION MEMORIAS DE CANTIDAD CORRESPONDIENTES ACTA DE OBRA N°5 PAQUETE N°1 CON FECHA DE CORTE 2 DE JULIO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
15/07/2025	CIPZ-078-0340-2025	INFORME SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD TEMAS COMPONENTE SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
10/07/2025	CIPZ-078-0341-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0473-25 – "SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROFESIONAL ELÉCTRICO DEL EQUIPO MÍNIMO CONTRATO 358 DEL 2023."	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/07/2025	CIPZ-078-0342-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0481-25 - SEGUNDA REVISION MEMORIAS DE CANTIDAD ACTA DE OBRA N°5	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/07/2025	CIPZ-078-0343-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/07/2025	CIPZ-078-0344-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO SG-SST - VERIFICACION DE DOCUMENTOS JULIO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/07/2025	CIPZ-078-0345-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0455-25 Y EV-C358-23-0477-25 DEL 3 DE JULIO DE 2025. PROPUESTA PARA LOSAS DE PISO ÁREAS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/07/2025	CIPZ-078-0346-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0480-25 DEL 8 DE JULIO – "SOLICITUD DE APROBACIÓN PLANOS ASCENSOR"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
14/07/2025	CIPZ-078-0347-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0463-25 DEL 24 DE JUNIO 2025 – "ELEMENTOS DE FACHADA PISOS 2 Y 3"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
15/07/2025	CIPZ-078-0348-2025	REITERACION OFICIO CIPZ-078-0329-2025 "RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0456-25 – REQUERIMIENTOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

15/07/2025	CIPZ-078-0349-2025	DISEÑOS AIRE ACONDICIONADO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
15/07/2025	CIPZ-078-0350-2025	SOLICITUD INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTAS DE COBRO N°3 Y N°4 – CONTRATO 358 2023 Y CONTRATO 078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
16/07/2025	CIPZ-078-0351-2025	RESPUESTA EV-C358-23-0484-25 – "SOLICITUD PROCESO DE REVISIÓN DE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES DE LAS ACTAS DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
17/07/2025	CIPZ-078-0352-2025	RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 09 Y 17 DE JULIO DE 2025– "SOLICITUD DE INFORME SOBRE EL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO
21/07/2025	CIPZ-078-0353-2025	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL JULIO 2025 – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/07/2025	CIPZ-078-0354-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°5 DE OBRA – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/07/2025	CIPZ-078-0355-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
23/07/2025	CIPZ-078-0356-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0488-25 DEL 21 DE JULIO 2025 "INFORME DE OBRA No. 17, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE JUNIO Y 25	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
23/07/2025	CIPZ-078-0357-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0474-25 DEL 02 DE JULIO 2025 "REMISION DE PRESUPUESTO Y APUS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA N°358 DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/07/2025	CIPZ-078-0358-2025	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL – DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
25/07/2025	CIPZ-078-0359-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°5 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
28/07/2025	CIPZ-078-0360-2025	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL JULIO 2025 OFICIO EV-C358-23-0488-25 – CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

- ## CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
1/07/2025	EV-C358-23-0472-25	1/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de aprobación del balance de obra.
1/07/2025	EV-C358-23-0471-25	1/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficio con radicado CIPZ-078-0327-2025 del 26 de junio de 2025, respecto a inspección ambiental a obra 21 de
2/07/2025	EV-C358-23-0474-25	2/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión presupuesto y APUS Plan de Manejo Ambiental Contrato de obra pública No. 358 de diciembre de 2023.
2/07/2025	EV-C358-23-0475-25	2/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.
3/07/2025	EV-C358-23-0473-25	3/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio No. CIPZ-078-0310-2025, y solicitud de aprobación del profesional Eléctrico del equipo mínimo Contrato 358 del 2023.
3/07/2025	N.A	3/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de Diseños ELEC-CCTV-DTI-TORRE HUSJ
3/07/2025	EV-C358-23-0477-25	3/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Complemento al oficio EV-C358-23-0455-25/Propuesta para losas de piso áreas perimetrales
3/07/2025	EV-C358-23-0476-25	3/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Diseños eléctricos y de aire acondicionado
3/07/2025	N.A	3/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE BALANCE DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA CTO 358 DE 2023 HOSPITAL SAN JOSE POPAYAN
4/07/2025	EV-C358-23-0478-25	4/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Acta de obra No. 4 firmada
4/07/2025	EV-C358-23-0479-25	4/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Validación para el inicio de actividades no contempladas en presupuesto y diseños.
4/07/2025	EV-C358-23-0480-25	4/07/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Solicitud de diseños y aclaraciones técnicas del Helipuerto
7/07/2025	EV-C358-23-0479-25	7/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Evidencia de Actividades SST.
8/07/2025	EV-C358-23-0480-25	8/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de aprobación Planos ascensor.

9/07/2025	n.a	9/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud equipo minimo de trabajo interventoria
14/07/2025	EV-C358-23-0483-25	14/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud.
14/07/2025	EV-C358-23-0484-25	14/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud proceso de revisión de las memorias de cantidades de las actas de obra.
15/07/2025	EV-C358-23-0485-25	15/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de entrepiso No 7.
16/07/2025	n.a	16/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteracion solicitud equipo minimo de trabajo interventoria
16/07/2025	N.A	17/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Diseño de Aire Acondicionado – Contrato N° 358 de 2023.
16/07/2025	N.A	17/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de especificación sobre la responsabilidad de subsanar incongruencia en plantas estructurales – Contrato de
17/07/2025	EV-C358-23-0486-25	17/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUETA A OFICIO CIPZ-078-0347-2025
17/07/2025	N.A	17/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Convocatoria a Comité de Avance de Obra – viernes 19 de julio de 2025
17/07/2025	N.A	17/07/2025	MINISTERIO DE SALUD ING ANDRES FELIPE SOSSA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - DIDIER	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE BALANCE DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA CTO 358 DE 2023 HOSPITAL SAN JOSE POPAYAN
18/07/2025	EV-C358-23-0487-25	18/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.
18/07/2025	N.A	18/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Diseño de aires acondicionados
21/07/2025	N.A	21/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTA DE OBRA No. 5 CONSOLIDADA Y SCANEADA CON FIRMAS
21/07/2025	EV-C358-23-0488-25	21/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME DE OBRA No. 17, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE JUNIO Y 25 DE JULIO DEL 2025 Y ATENCIÓN AL
22/07/2025	n.a	22/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME No. 7 Fiducia

22/07/2025	EV-C358-23-0489-25	22/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA A OFICIO CIPZ-078-0346-2025
23/07/2025	EV-C358-23-0491-25	23/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	AJUSTES A LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS
23/07/2025	EV-C358-23-0492-25	23/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Ajuste a la reprogramación
24/07/2025	EV-C358-23-0493-25	24/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de columnas y pantallas piso No. 8
24/07/2025	EV-C358-23-0494-25	24/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al Requerimiento de Interventoría, oficio No. CIPZ-078-0355-2025

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 26 de Junio al 25 de Julio de 2025, el contratista de obra terminó las actividades de armado de la formaleta para la losa de entrepiso 7 N +27.10, el armado de aceros de las vigas de entrepiso 7 N +27.10, la instalación de malla electrosoldada para la losa de entrepiso 7 N +27.10, se instalaron las vigas joist de entrepiso 7 N +27.10.

Se realizó la fundición de las vigas y losa de entrepiso 6 N+ 23.20 y entrepiso 7 N+ 27.10

Se realizó la instalación de aceros de columnas y pantallas para el piso 7 N+23.20 a N+27.10 y piso 8 N+27.10 a N+31.00

Se realizó la instalación de formaleta para columnas y columnas y pantallas del piso 7 N+23.20 a N+27.10 y piso 8 N+27.10 a N+31.00

Se realizó la instalación de concretos de columnas y columnas y pantallas para el piso 7 N+23.20 a N+27.10 y piso 8 N+27.10 a N+31.00.

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas de emergencia del nivel 5 a 6 N+19.30 a N+23.20.

Se instaló la formaleta y aceros para las gradas centrales del nivel 5 a 6 N+19.30 a N+23.20

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas centrales del nivel 5 a 6 N+19.30 a N+23.20.

Se instaló concreto de 3000 psi para las gradas de emergencia del nivel 5 a 6 N+19.30 a N+23.20

Por otro lado, se construyeron muros en mampostería estructural en las fachadas y muros confinados en las zonas húmedas y muros perimetrales de las gradas centrales y de emergencia en los pisos 2, 3 y 4.

Se realizó la instalación de redes sanitarias bajo el piso 2 y piso 3.

Los aceros de vigas y losas fueron verificados que cumplieran en diámetro, cuantía, longitud, espaciamientos, posición conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría.

Se verificó que las vigas joist de los entrepisos cumplieran en dimensión, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento, conforme a los diseños estructurales, para lo cual se utilizó flexómetro y calibrador.

Se verificó que el acero de la malla electrosoldada, cumplieran con lo estipulado en los diseños aprobados por la curaduría, se verificó las dimensiones de las formaletas de las

vigas de entrepiso cumplieran con los diseños estructurales se verificó los niveles de la formaleta de la losa de entrepiso entrepiso 6 N+23.20 y entrepiso 7 N+27.10

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las vigas y losa de entrepiso entrepiso 6 N+23.20 y entrepiso 7 N+27.10, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, para lo cual los asentamientos de los concretos de cada vehículo de suministro se encontraron dentro del margen de las 7" más o menos 1", se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia exigida conforme a los diseños estructurales.





Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Se verificó que los aceros de las columnas y pantallas del entrepiso piso 7 N+23.20 a N+27.10 y piso 8 N+27.10 cumplieran con el diámetro, longitud, cuantía, disposición, espaciamiento, conforme a lo establecido en los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las columnas y pantallas de entrepiso piso 7 N+23.20 a N+27.10 y piso 8 N+27.10 a N+31.00, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 4000 psi de resistencia mínima.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 8" más o menos 1".

Se realizó el control de la disposición de los aceros de las gradas de emergencia del entrepiso 5 N+15.40 a N+19.30 cumple en diámetro, cuantía, longitud, disposición, espaciamiento y espaciamiento, conforme a los diseños estructurales.

Se realizó el control de los concretos suministrados para la fundición de las de las gradas de emergencia del entrepiso 5 N+15.40 a N+19.30, se realizaron ensayos de asentamiento del concreto con lo cual se verificó que cumplía con lo estipulado en los diseños, se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión cuyos resultados estuvieron por encima de las 3000 psi de resistencia.

Los asentamientos de los concretos de cada vehículo que entregaba en obra, se controlaron de manera que se mantuvieran en un rango de asentamiento entre las 7" más o menos 1".

Para los muros de mampostería, se realizó control de localización y dimensiones, se verificó la instalación de los anclajes de los arranques de los refuerzos a la losa inferior, se controló el correcto vaciado de las dovelas y de las columnetas de confinamientos, se verificó la correcta instalación de los aceros de refuerzo tanto en dovelas como en columnetas.

Para la tubería sanitaria, se ha llevado control del sentido de flujo de la tubería, pendientes y dimensiones, conforme a los diseños, se realizó recomendaciones de ajustes a trazados en la zona del cuarto eléctrico, para minimizar los riesgos por filtraciones al sector, se ha verificado que no existan filtraciones con ensayos de estanquidad de la tubería.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N+ 23.20 A N +27.10

- COLUMNA C1

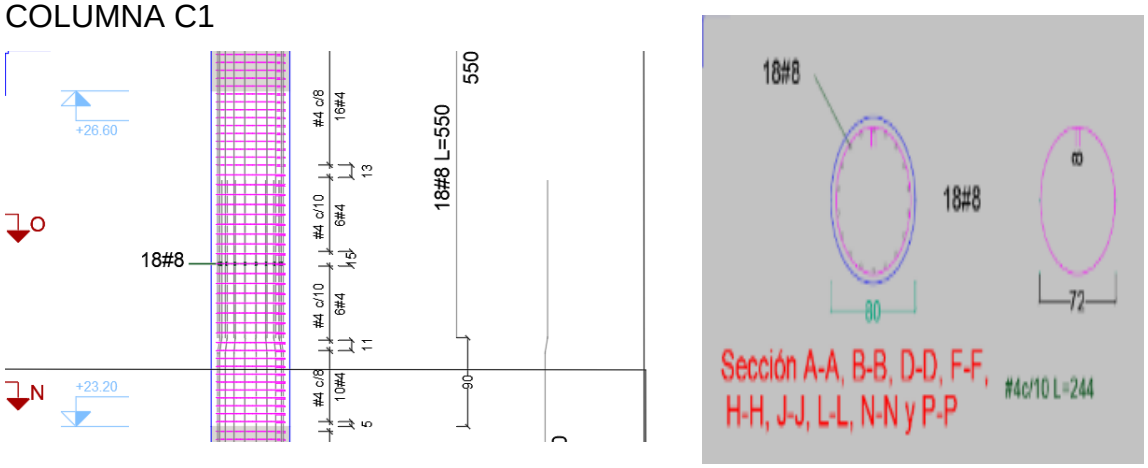


Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1.

- COLUMNA C2, C4 y C5

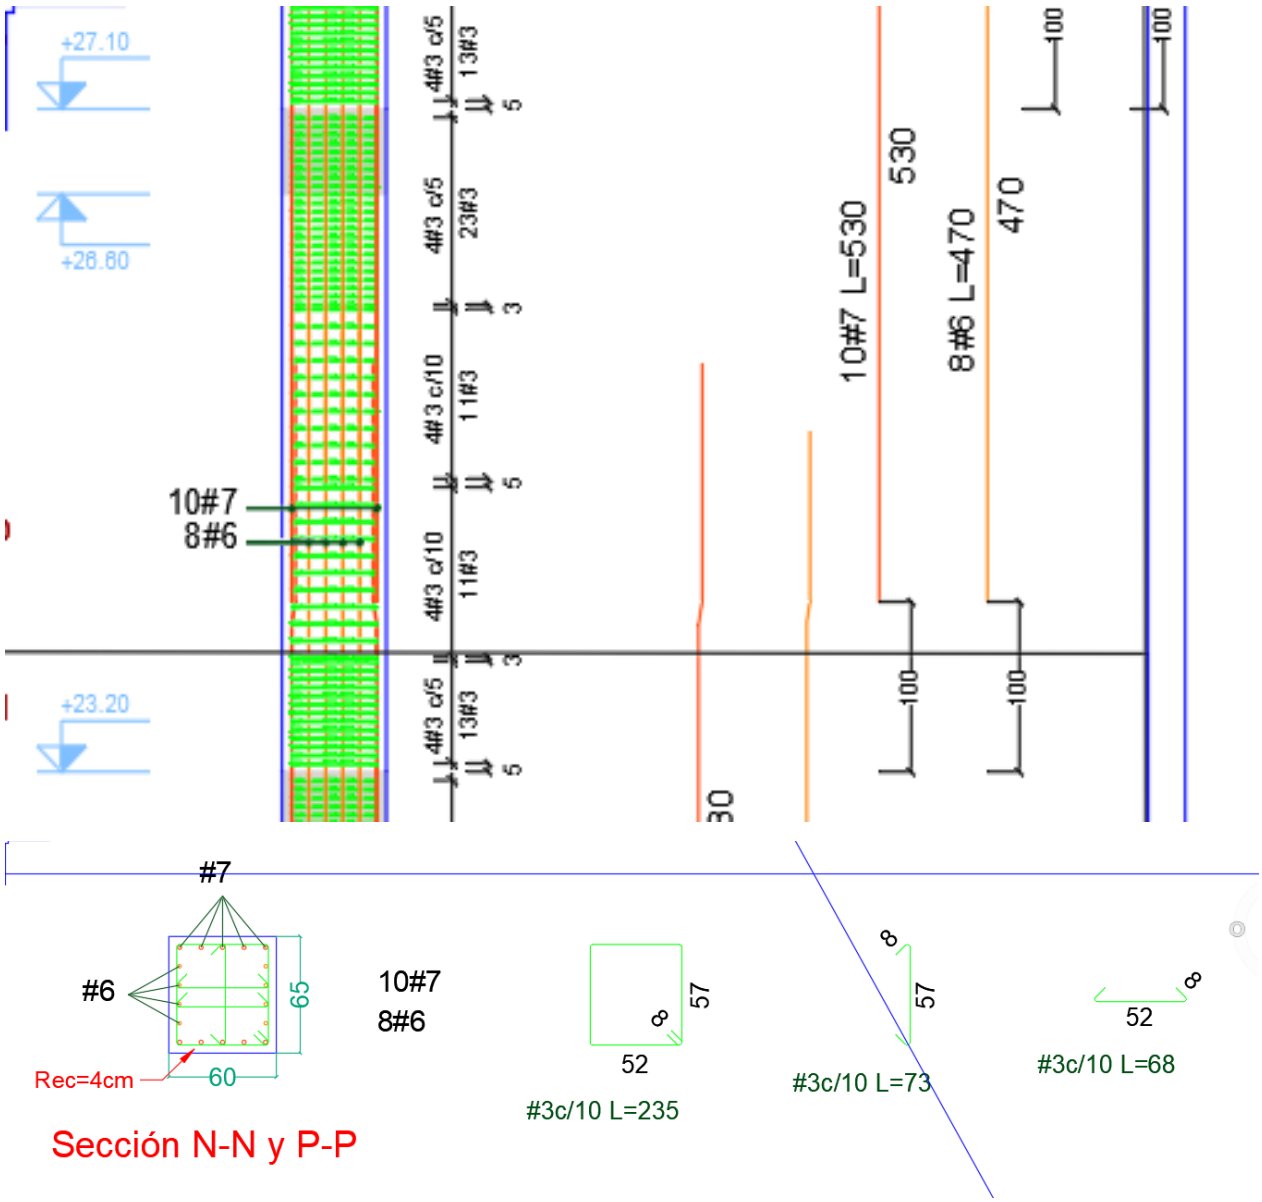


Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5

- COLUMNA C3

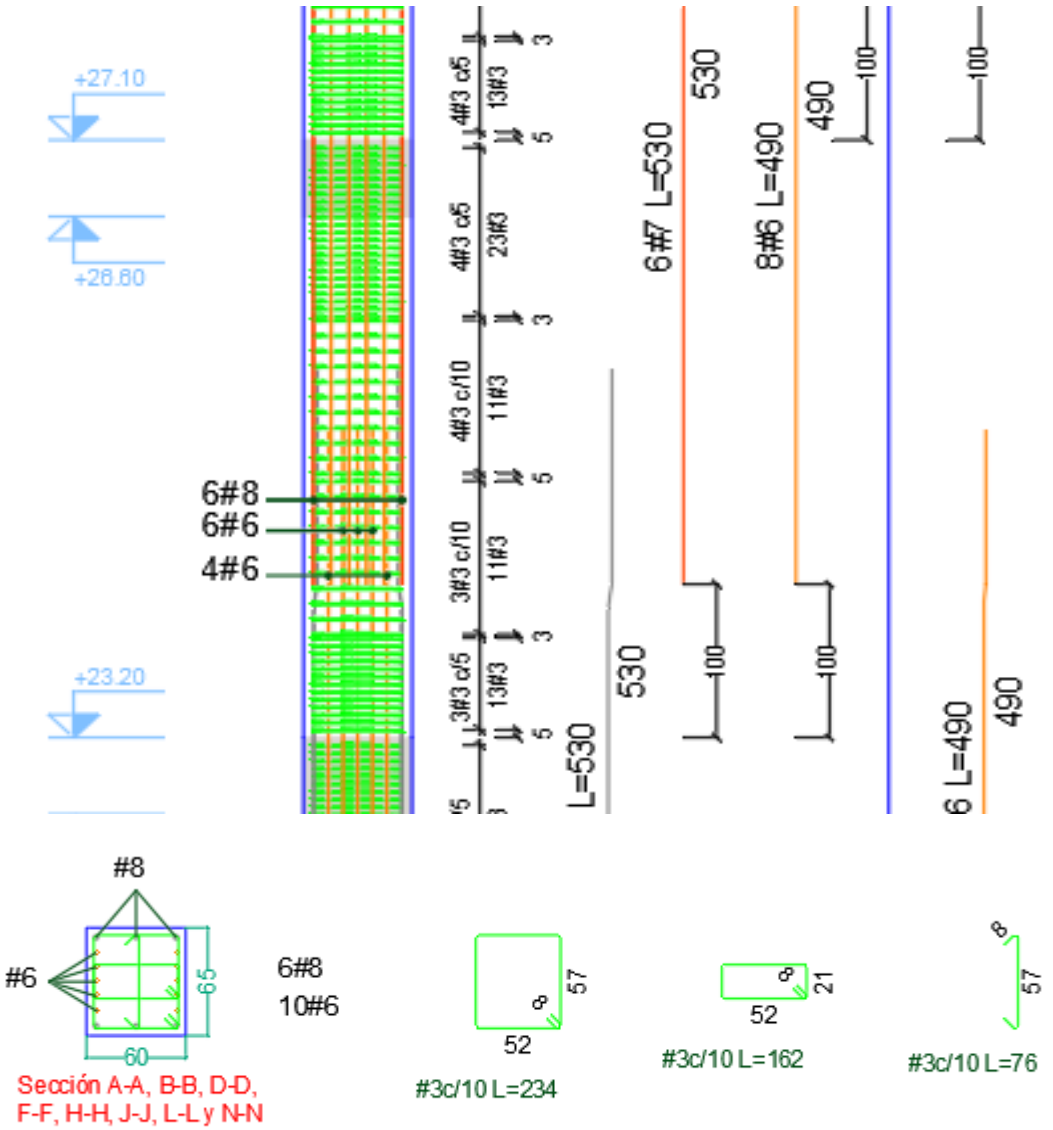


Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.

- COLUMNA C6, C7 y C8

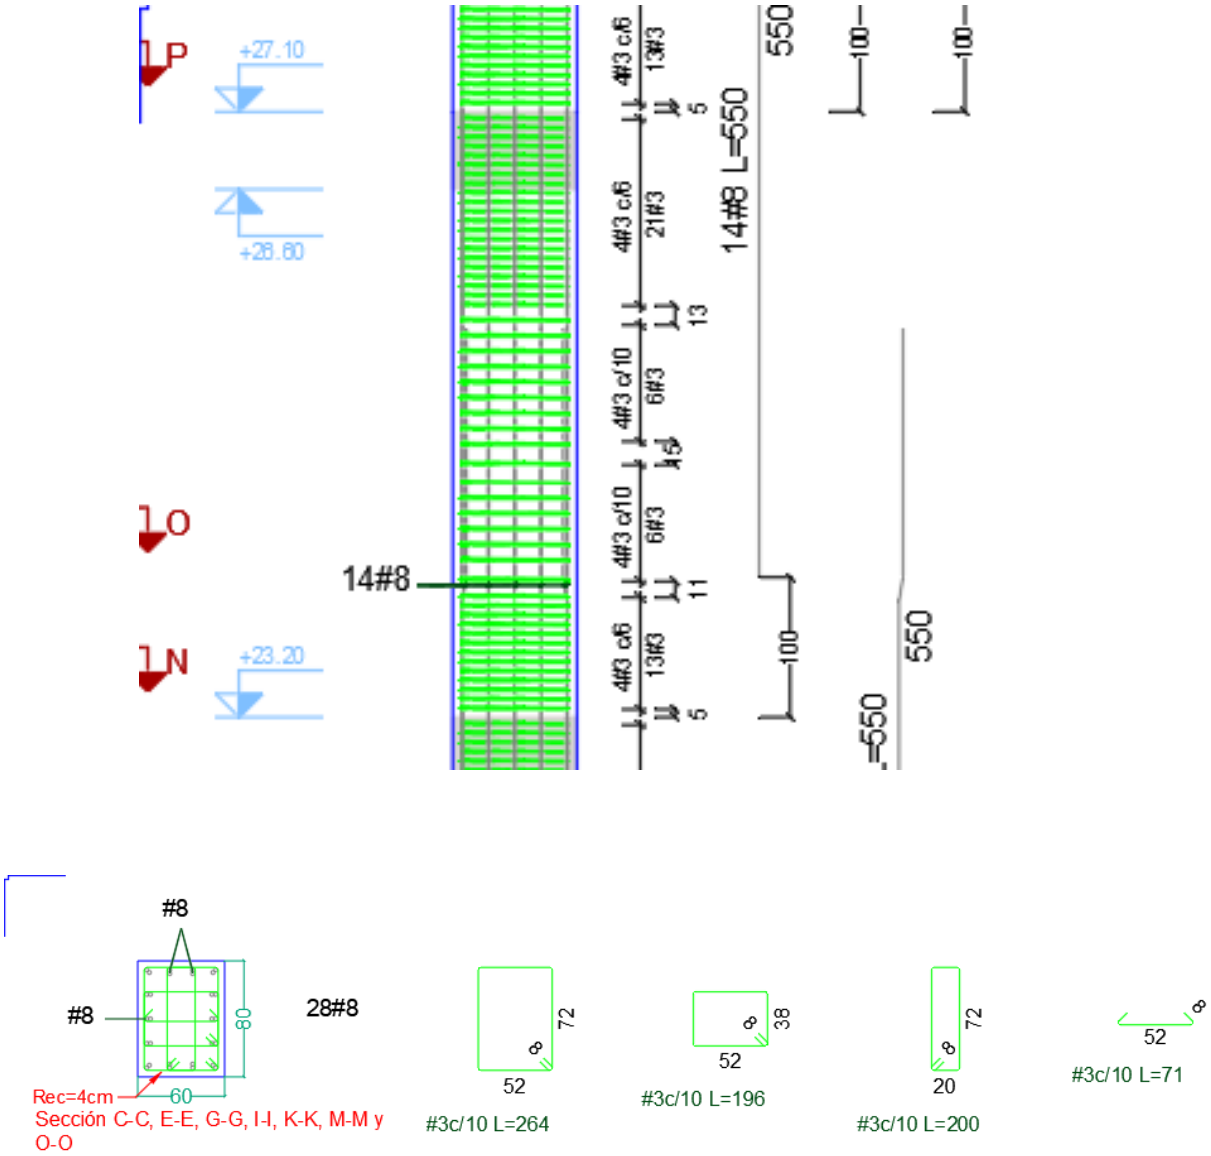


Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.

- COLUMNA C9 y C10

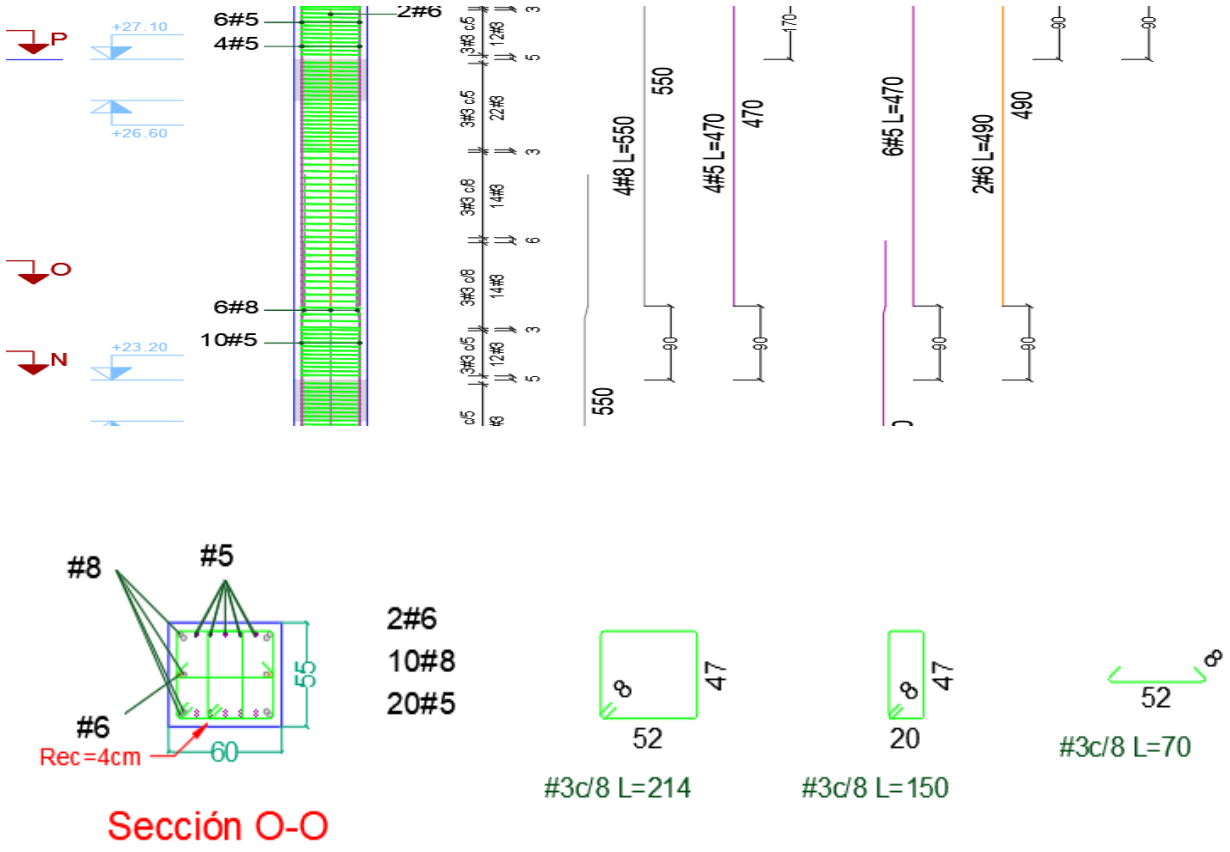


Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +23.20 A N +27.10

- PANTALLA PW1

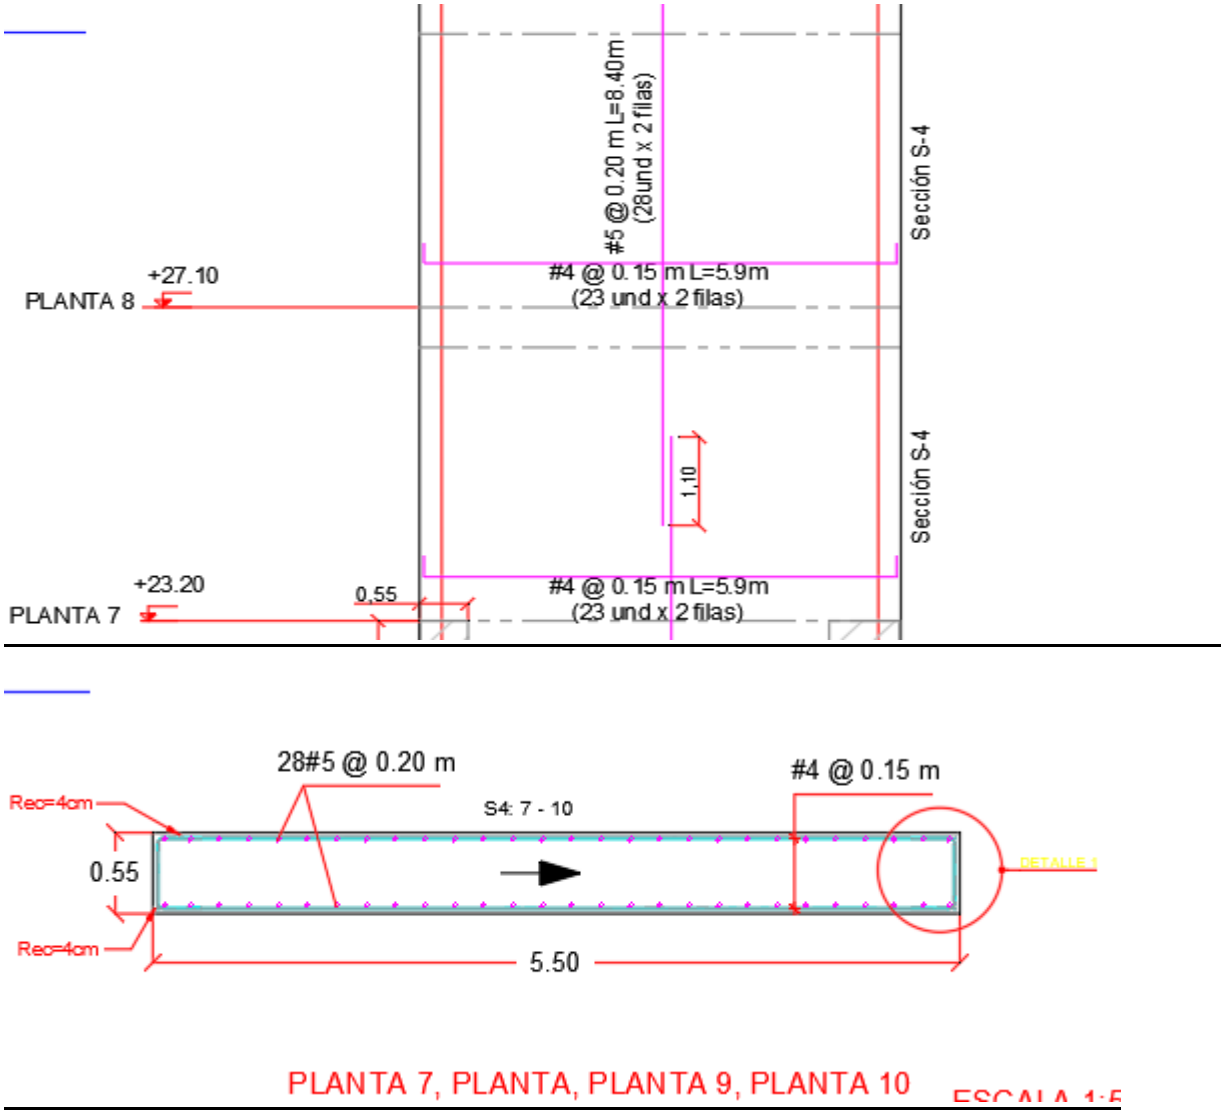


Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

- PANTALLA PW2



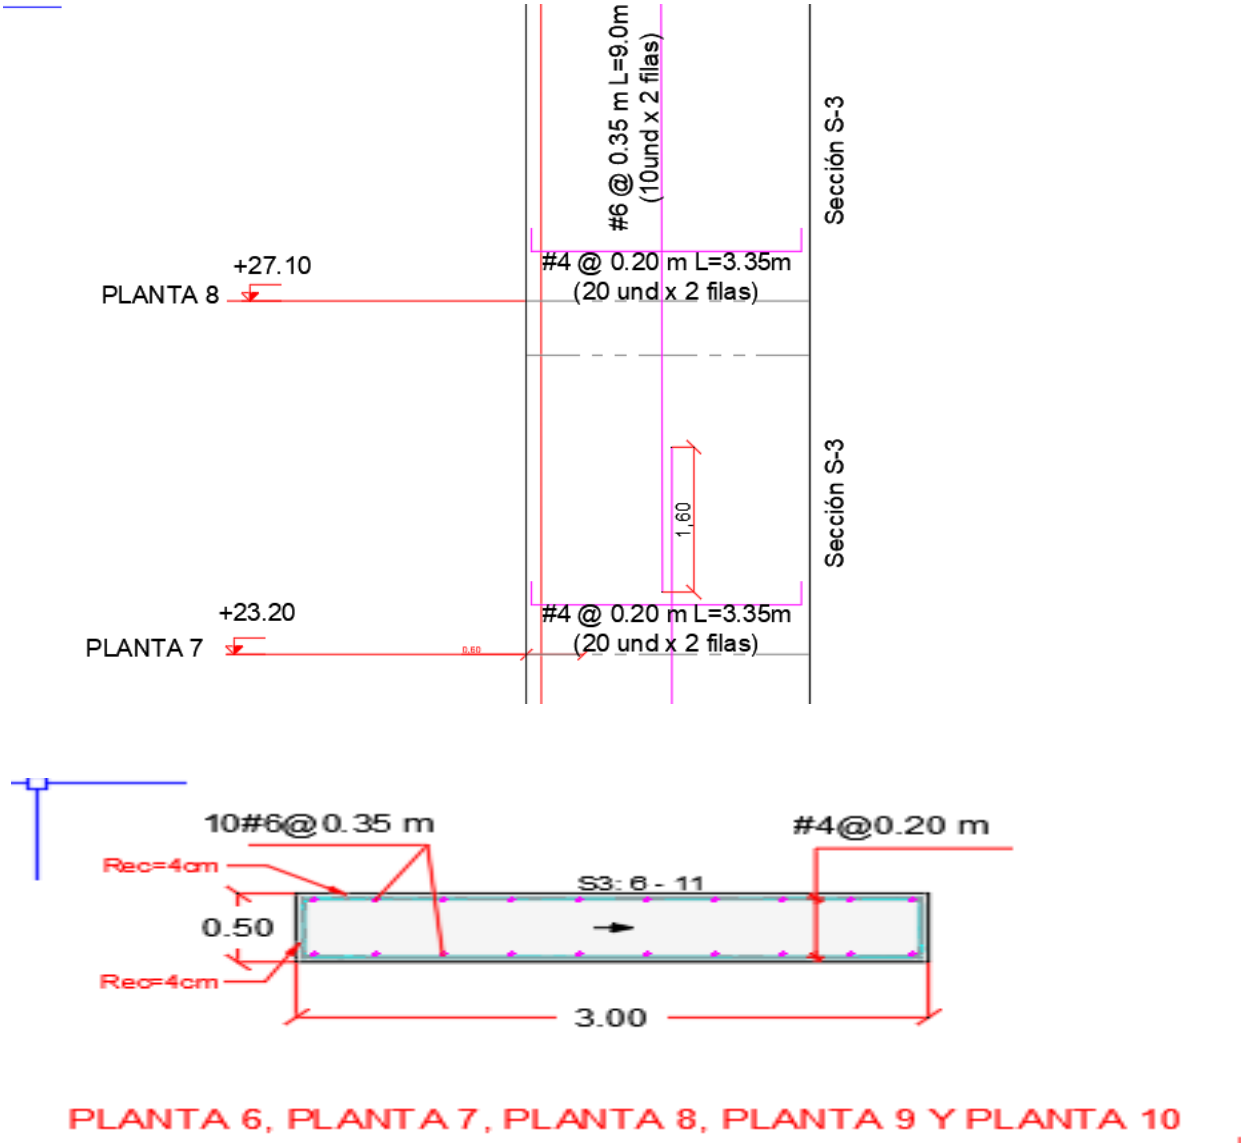


Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2

- PANTALLA PW3

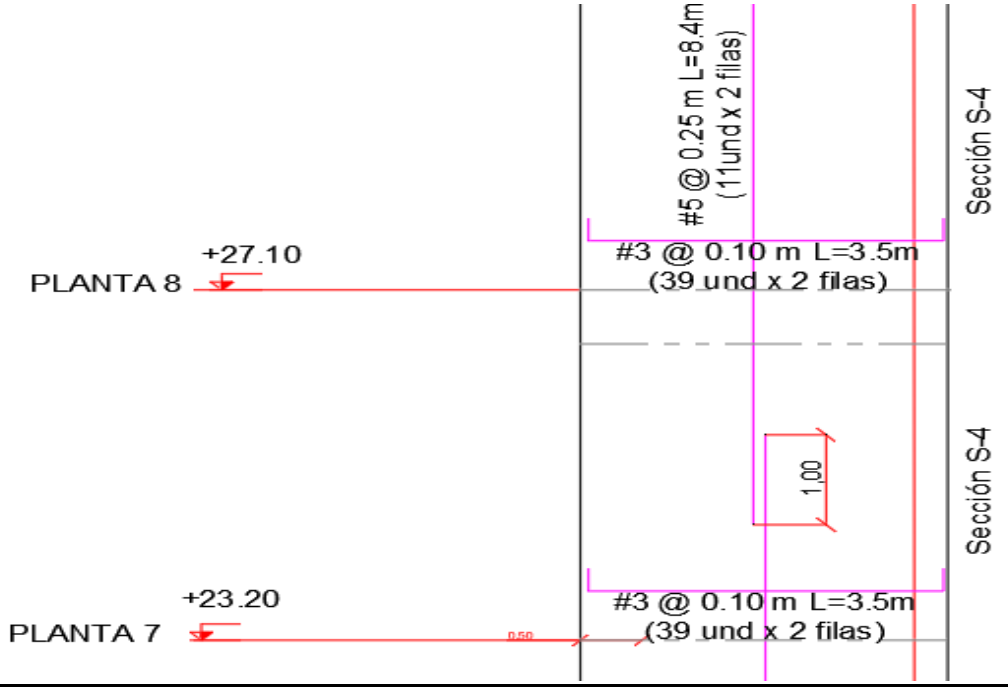


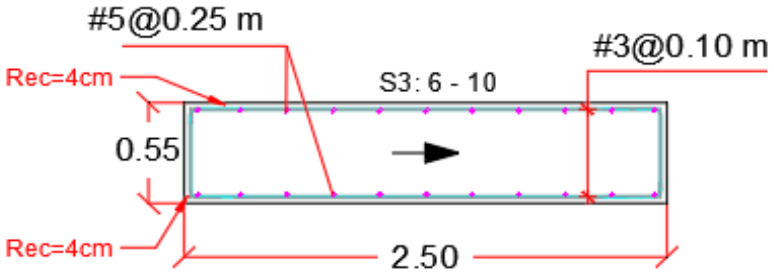


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.

- PANTALLA PW4

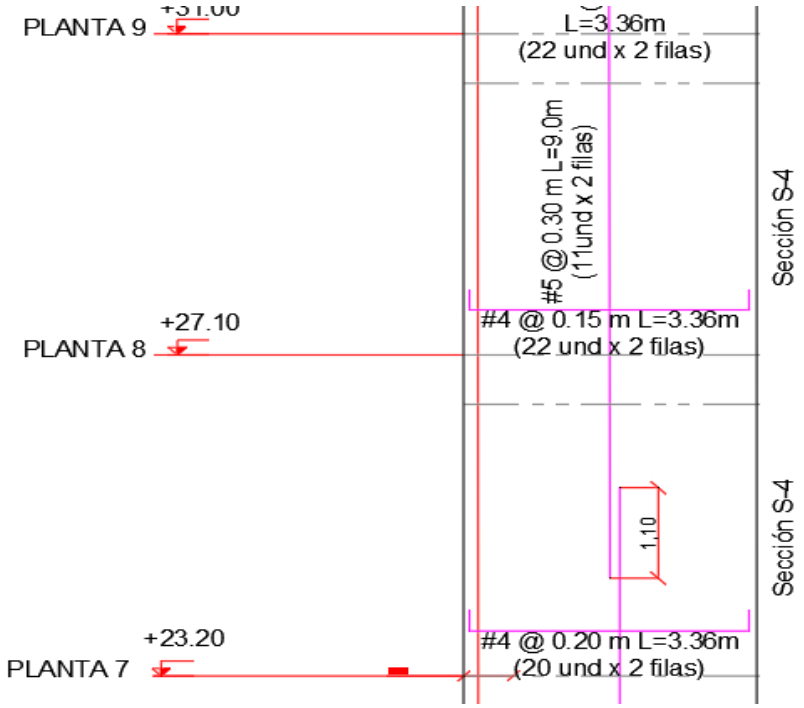


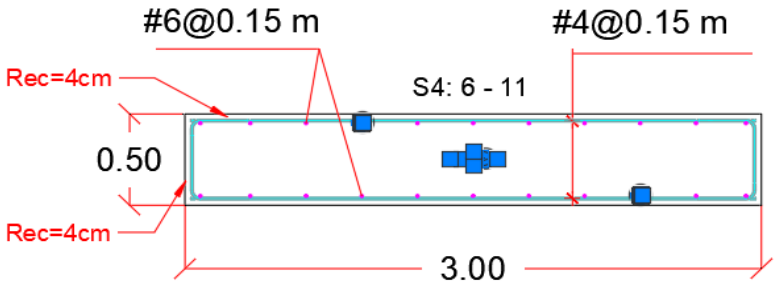


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9, PLANTA 10 Y PLANTA 11

Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

- PANTALLA PW5 .

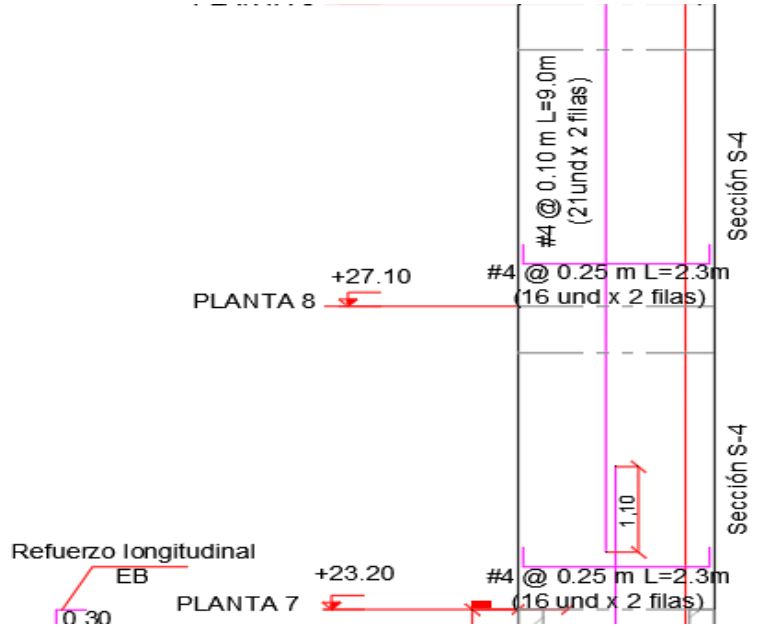


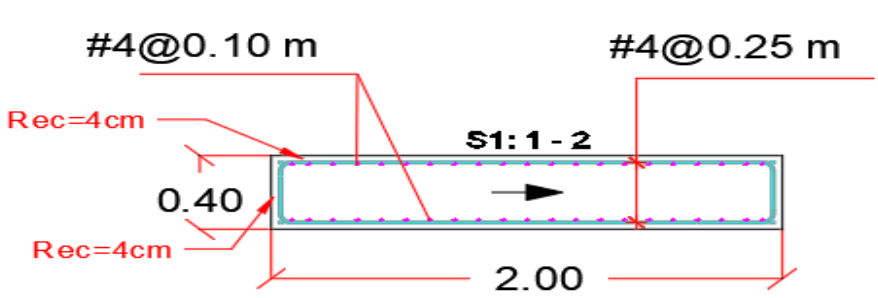


PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

- PANTALLA PW6

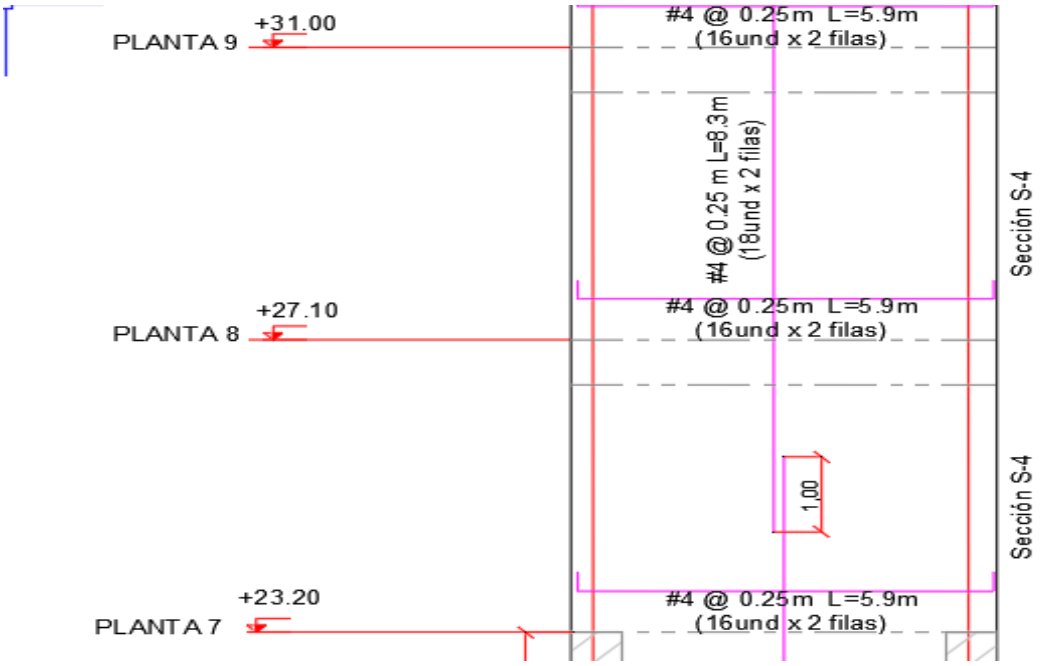





PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

- PANTALLA PW7

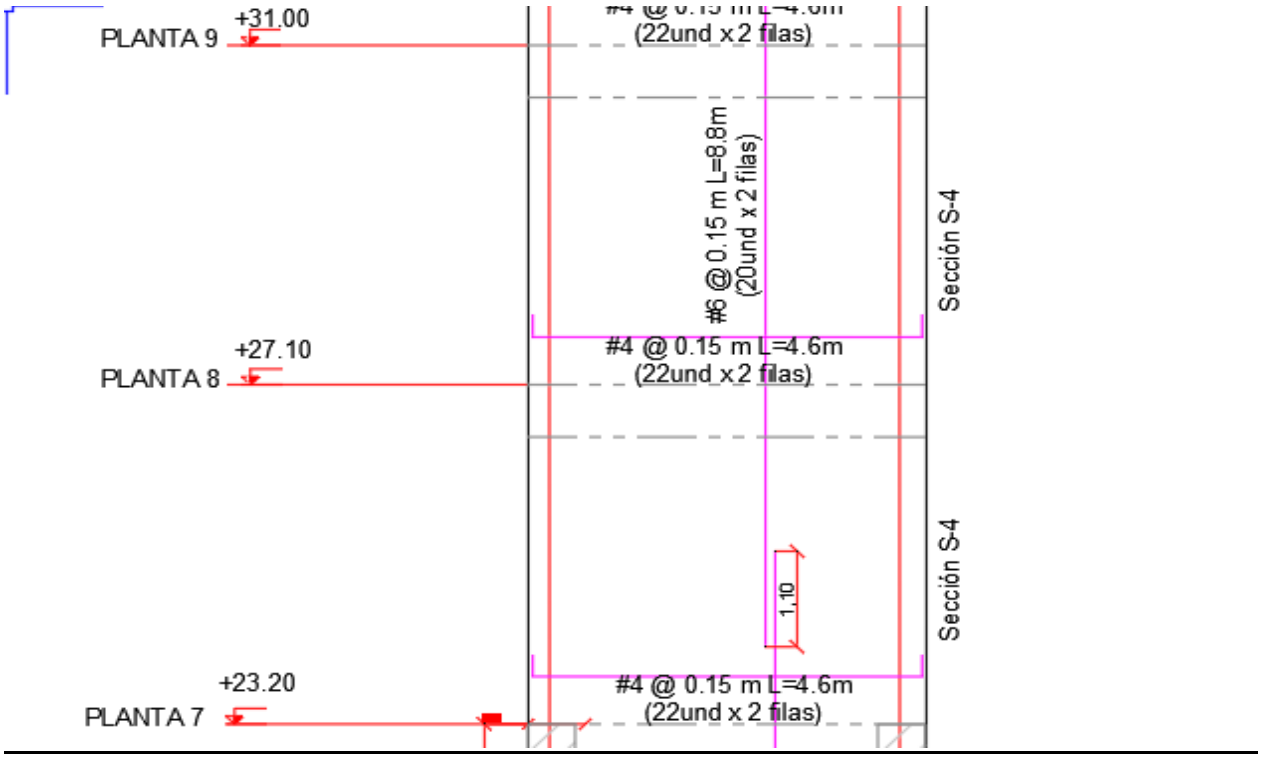


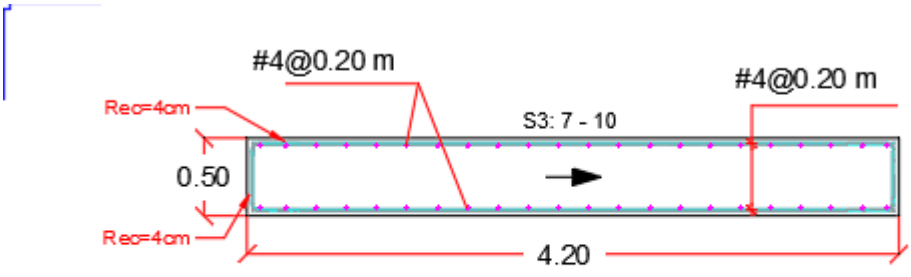

PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

- PANTALLA PW8

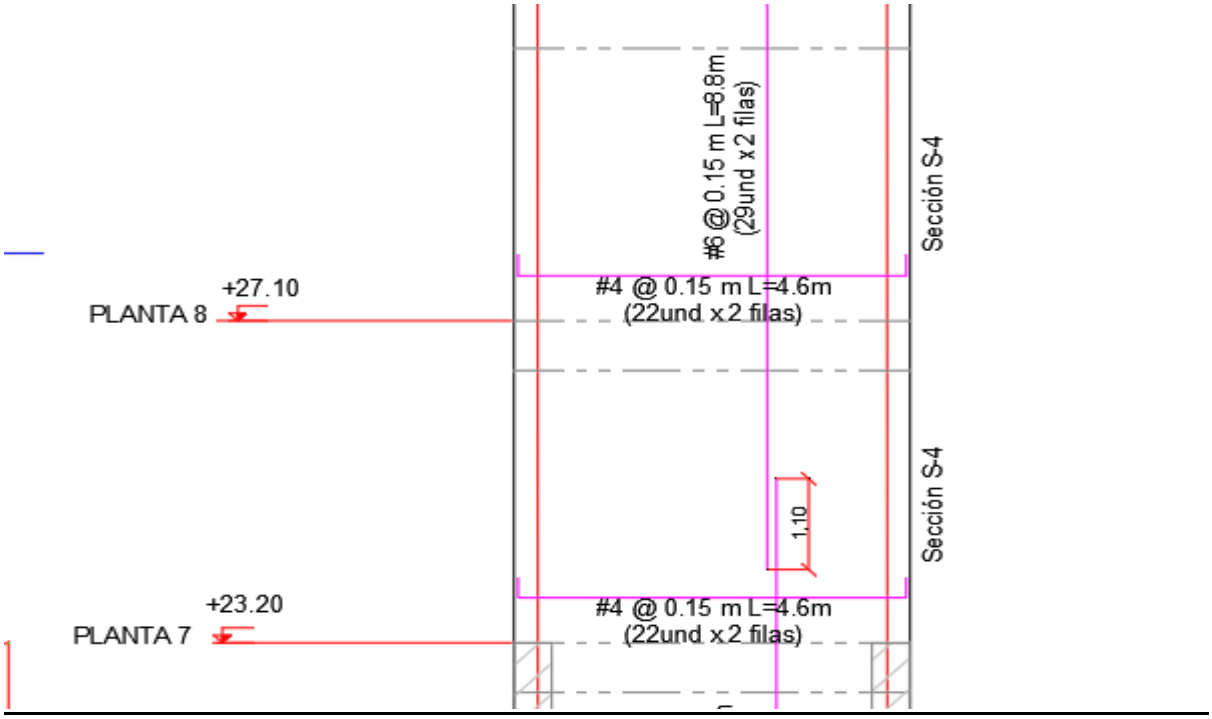



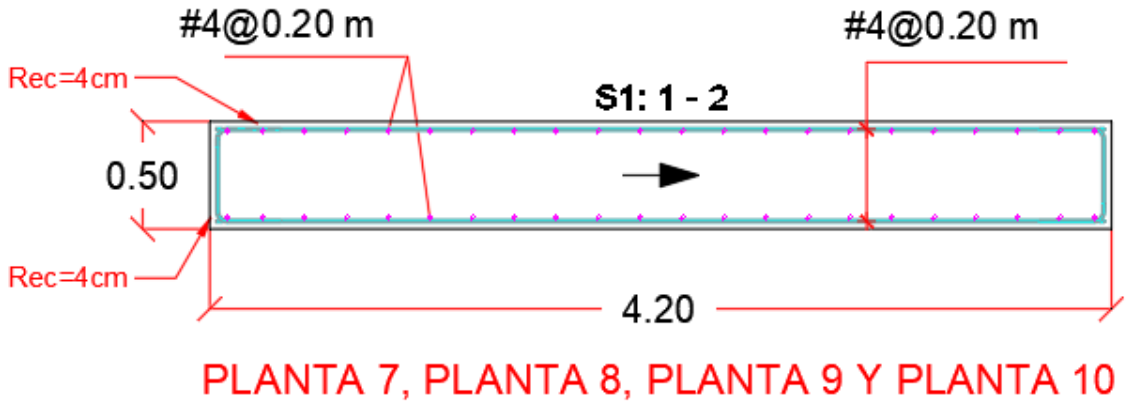


Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.

- PANTALLA PW9

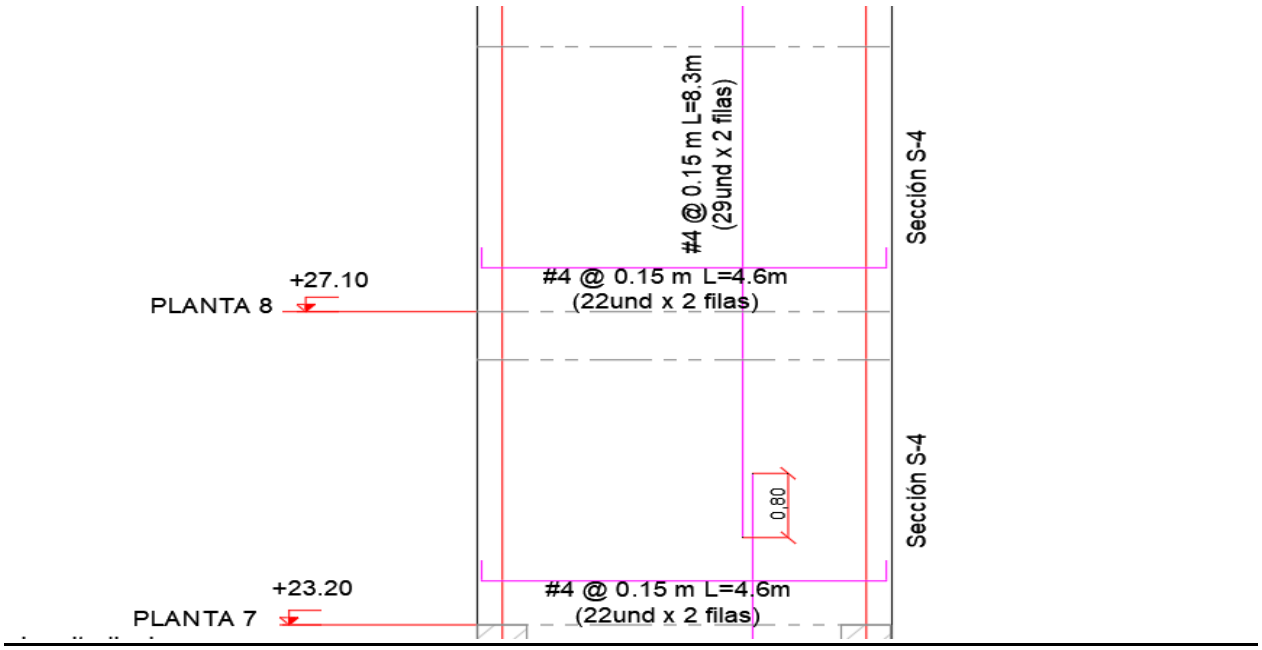

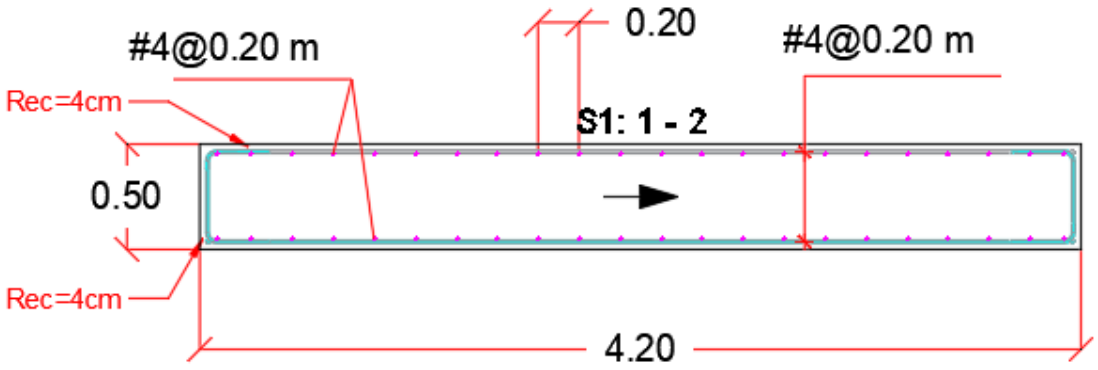

PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

- PANTALLA PW10

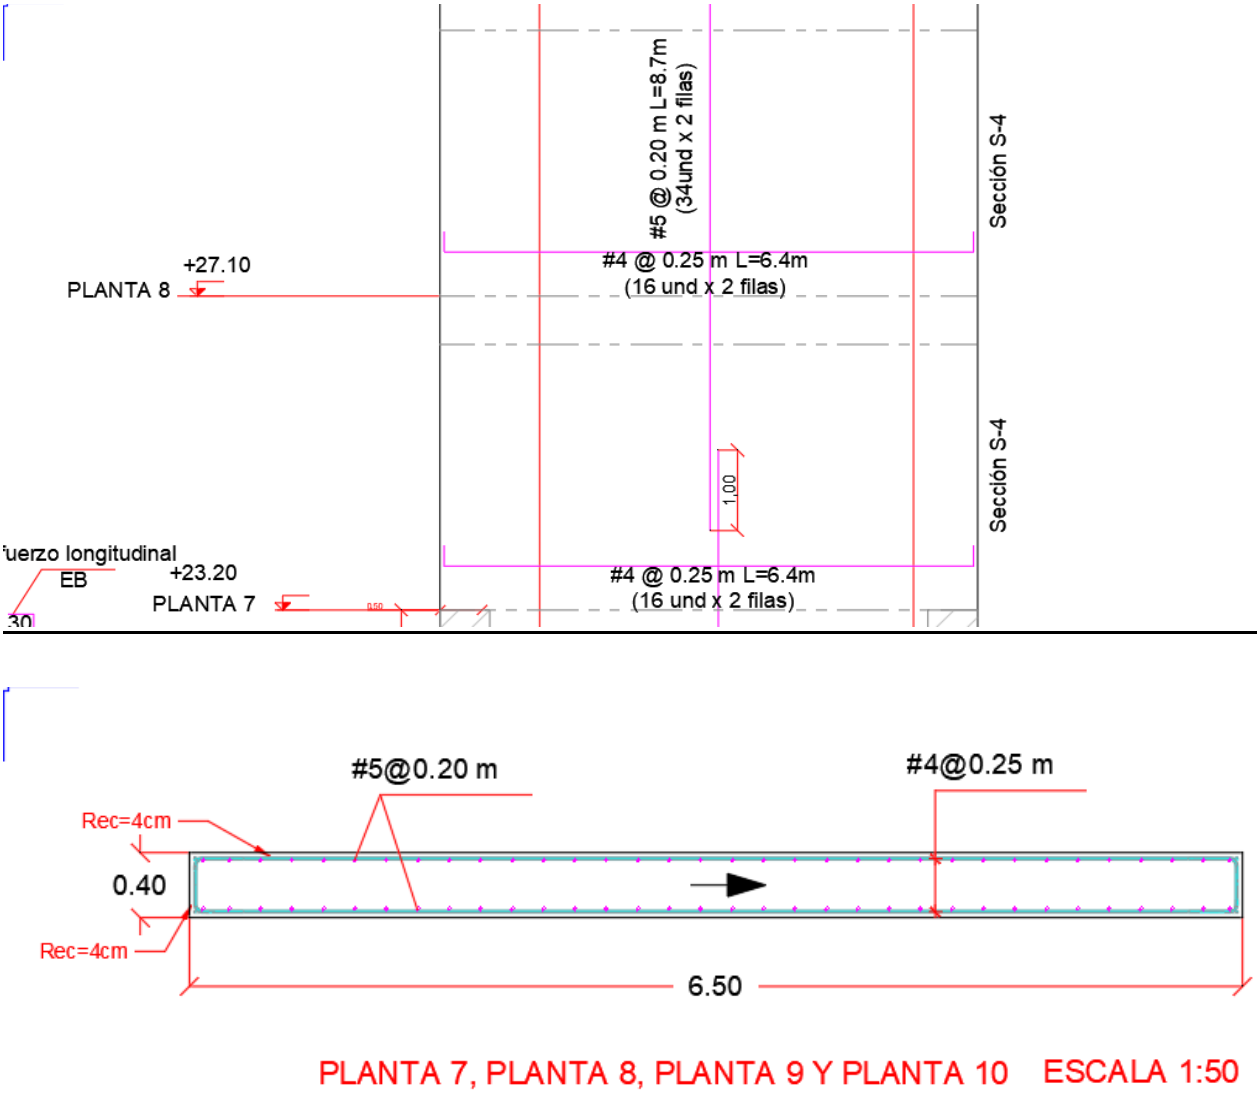


Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N+ 27.10 A N +31.00

- COLUMNA C1

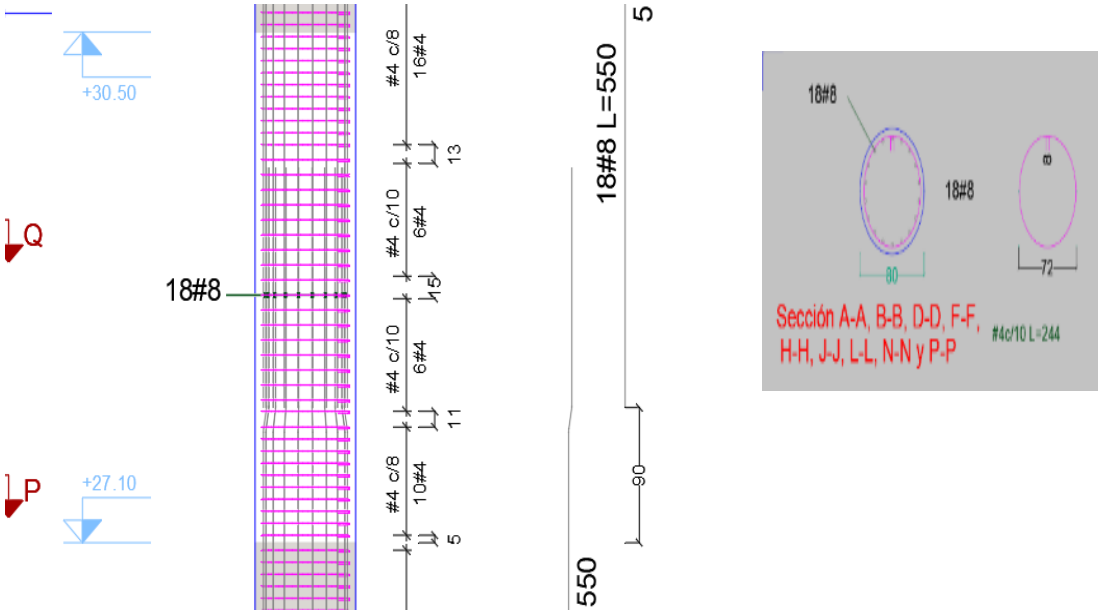


Ilustración 17. Disposición acero de refuerzo columna C1.

- COLUMNA C2, C4 y C5

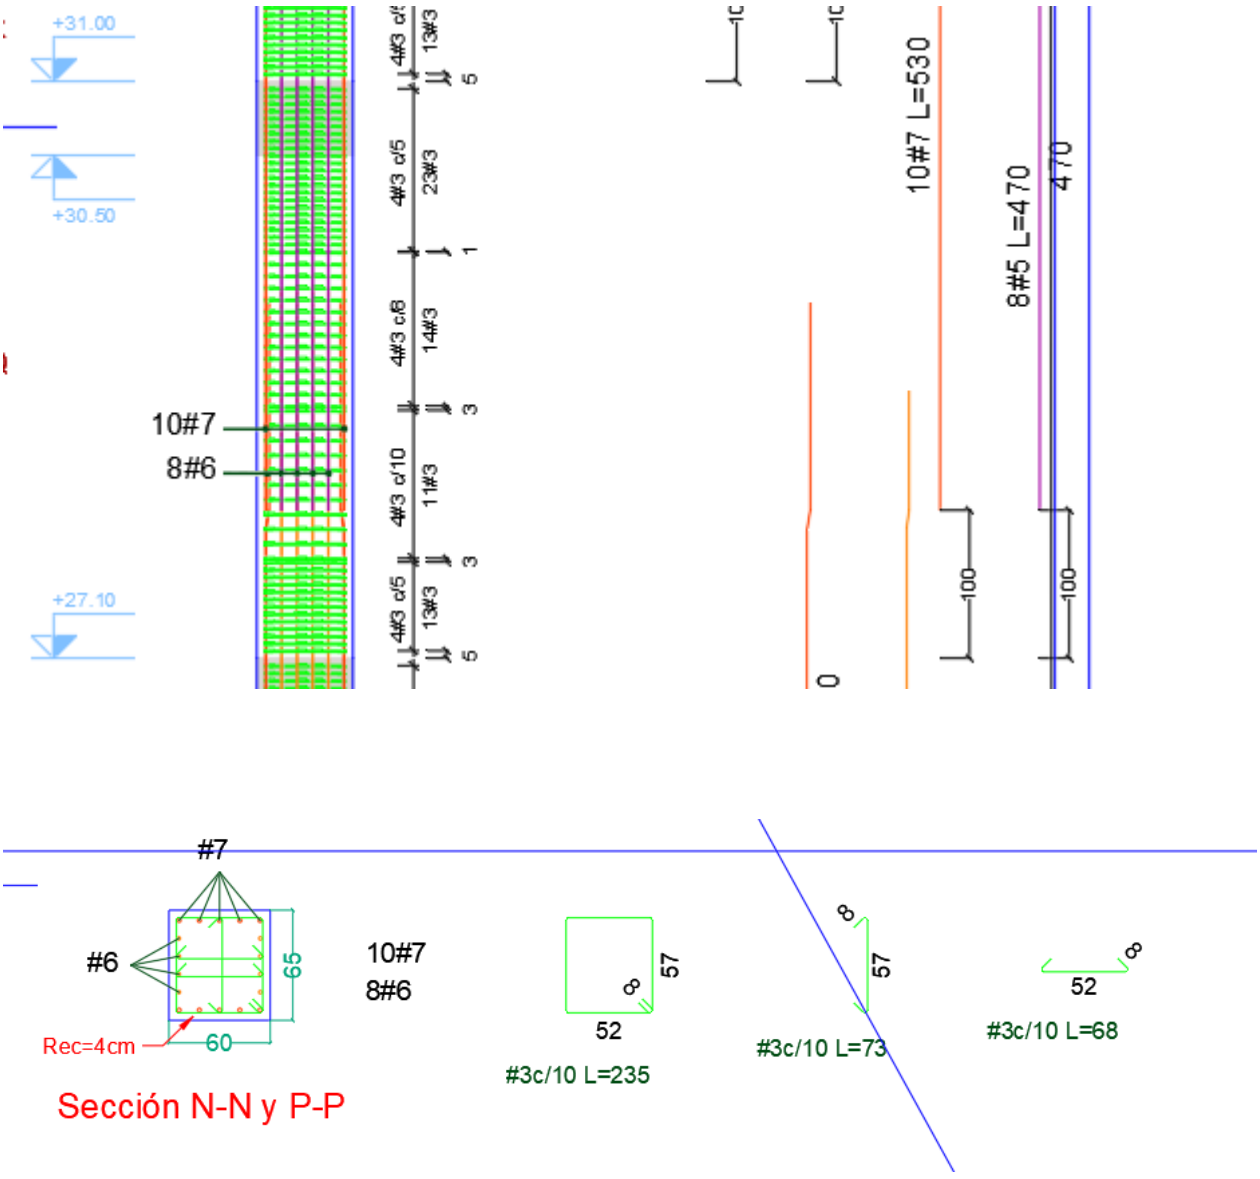


Ilustración 18. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5

- COLUMNA C3

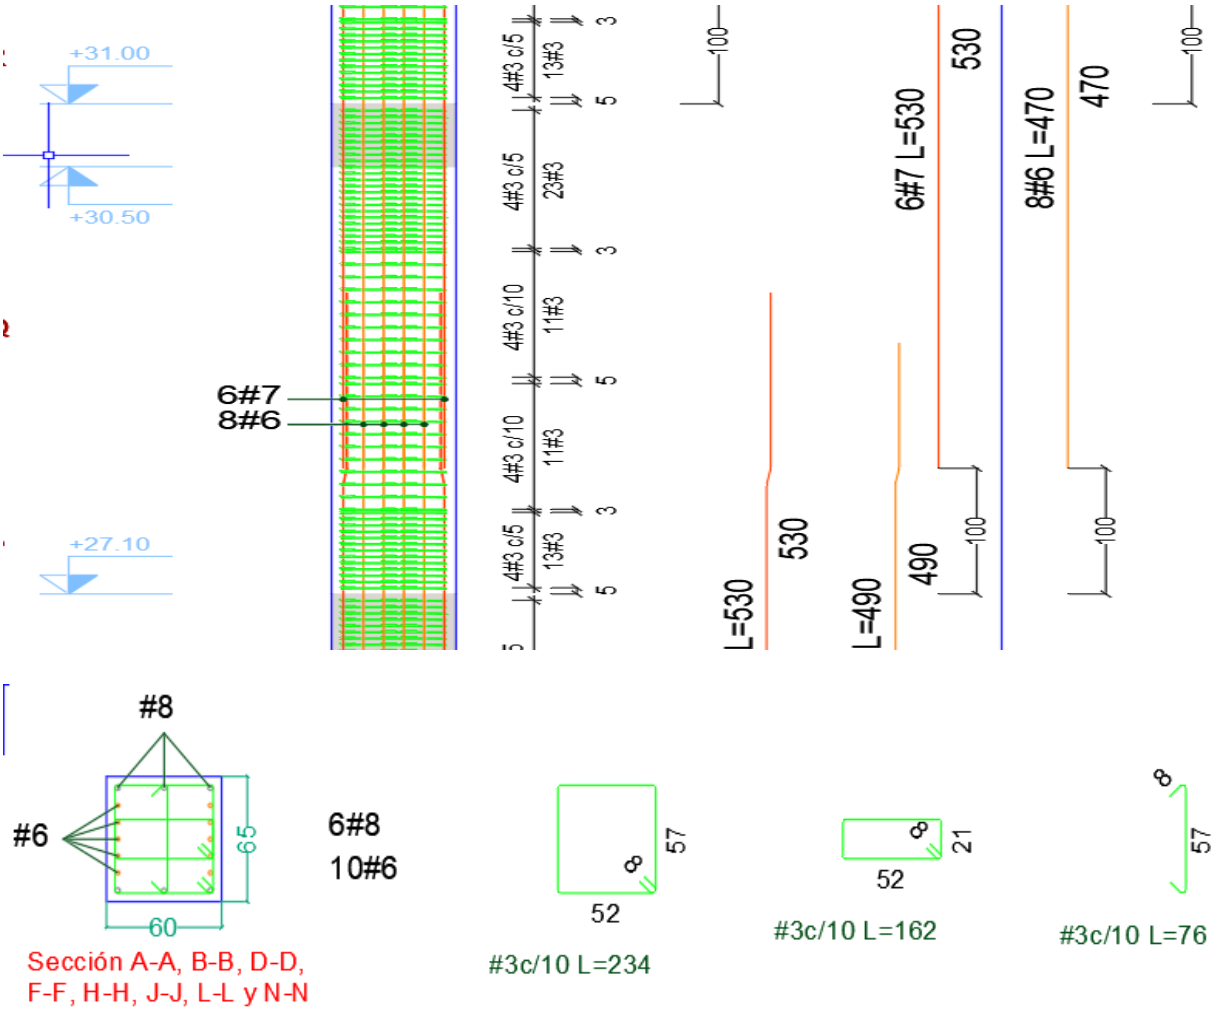


Ilustración 19. Disposición acero de refuerzo columna C3.

- COLUMNA C6, C7 y C8

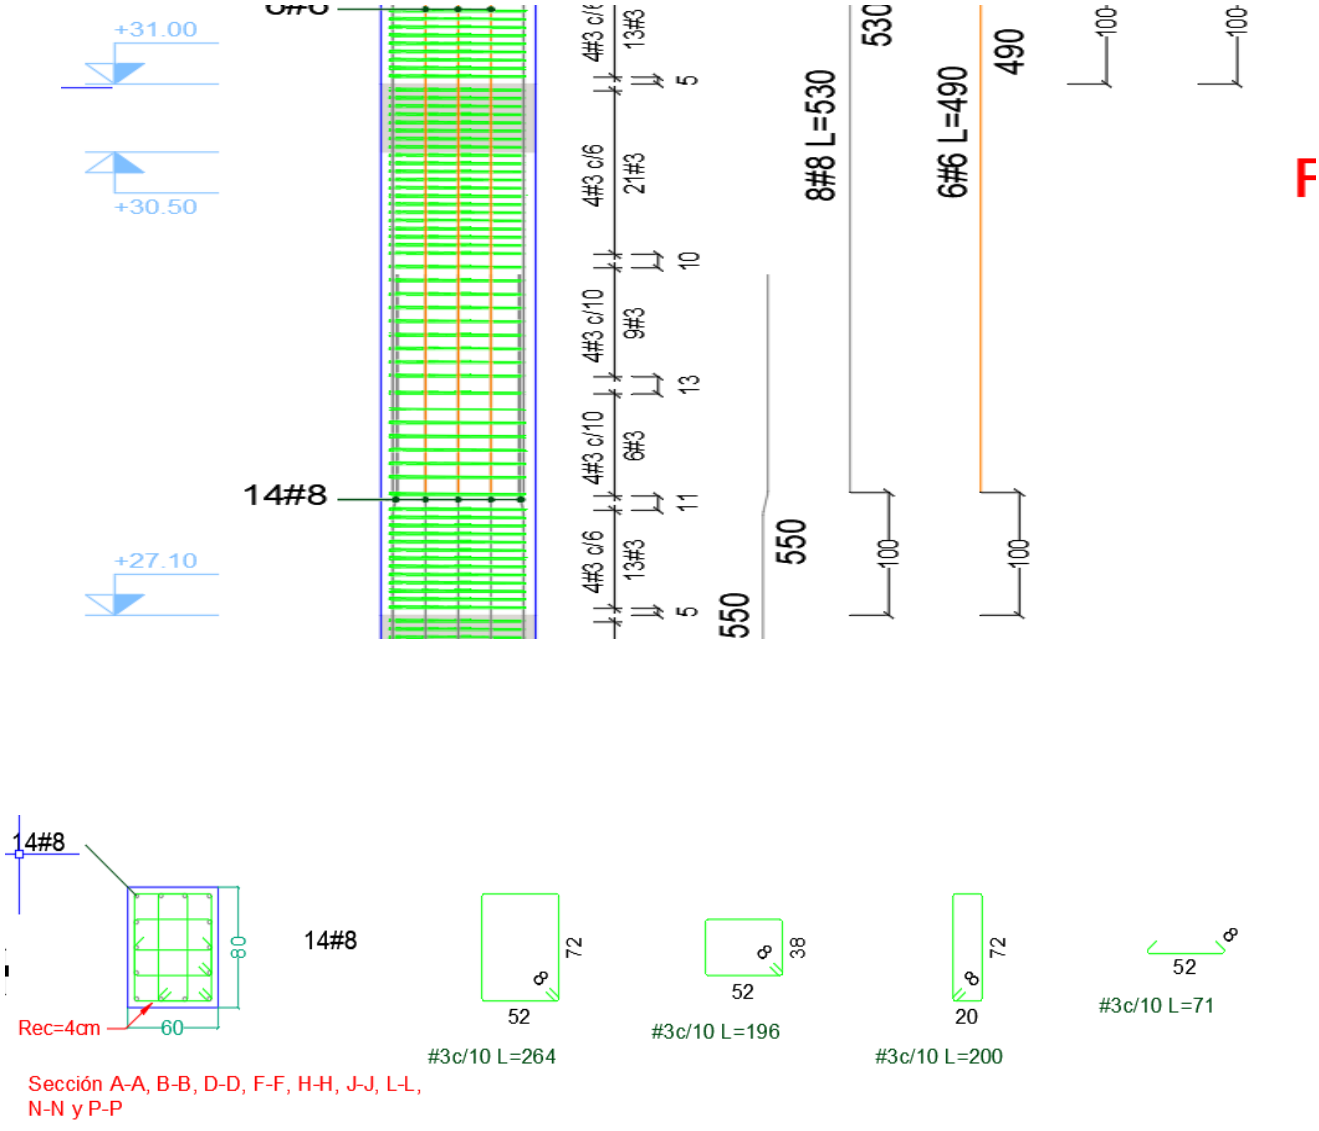


Ilustración 20. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.

- COLUMNA C9 y C10

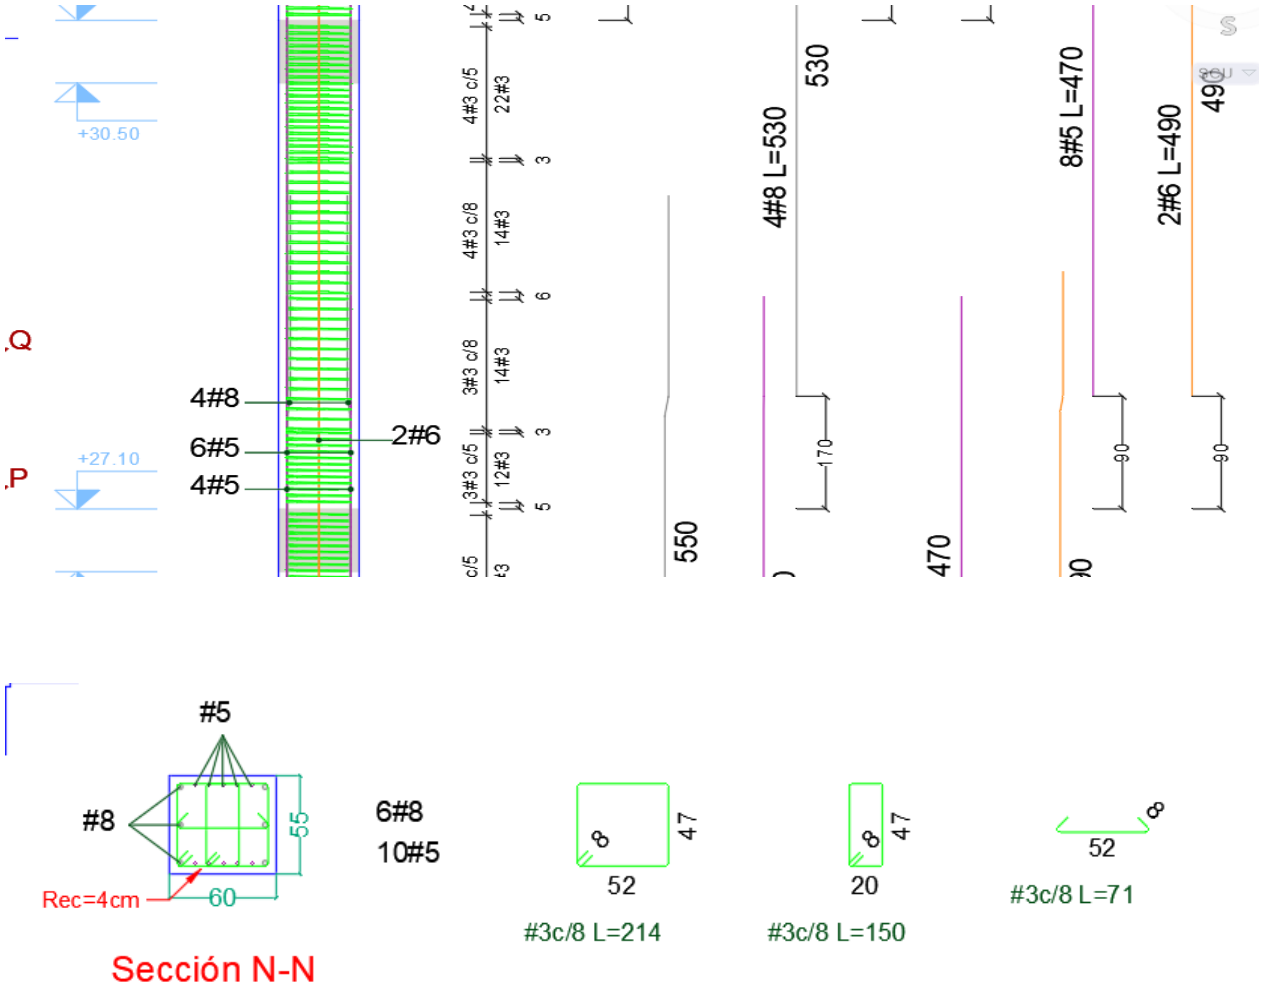
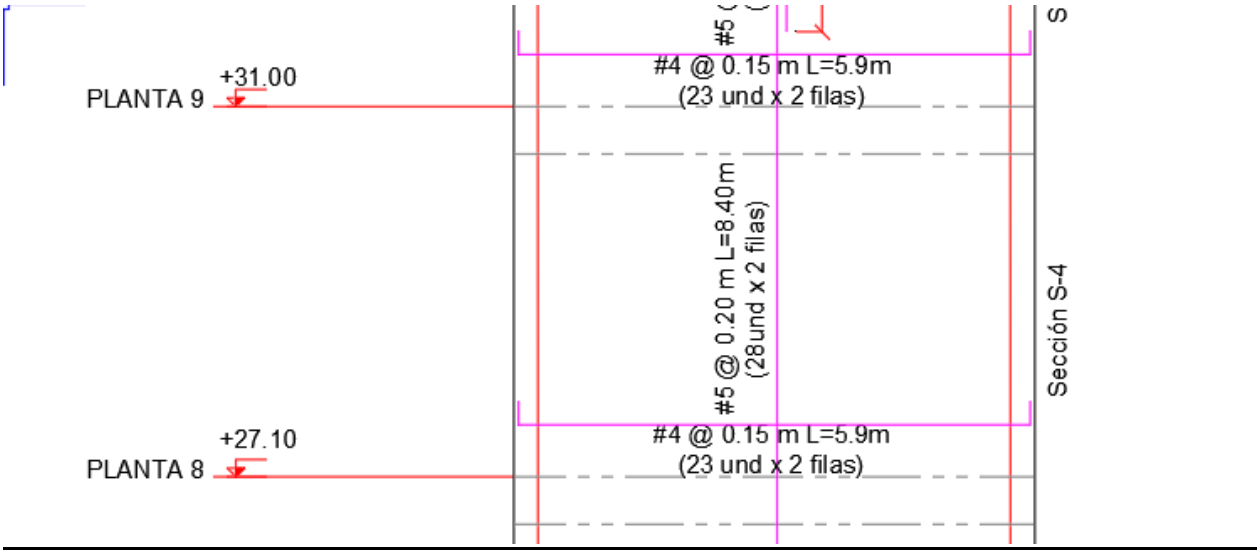


Ilustración 21. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +27.10 A N +31.00

- PANTALLA PW1




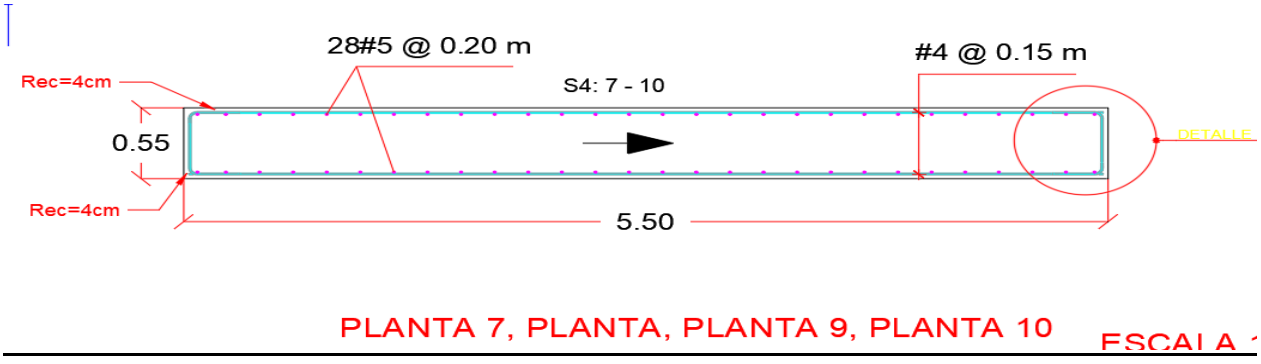


Ilustración 22. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.


- PANTALLA PW2

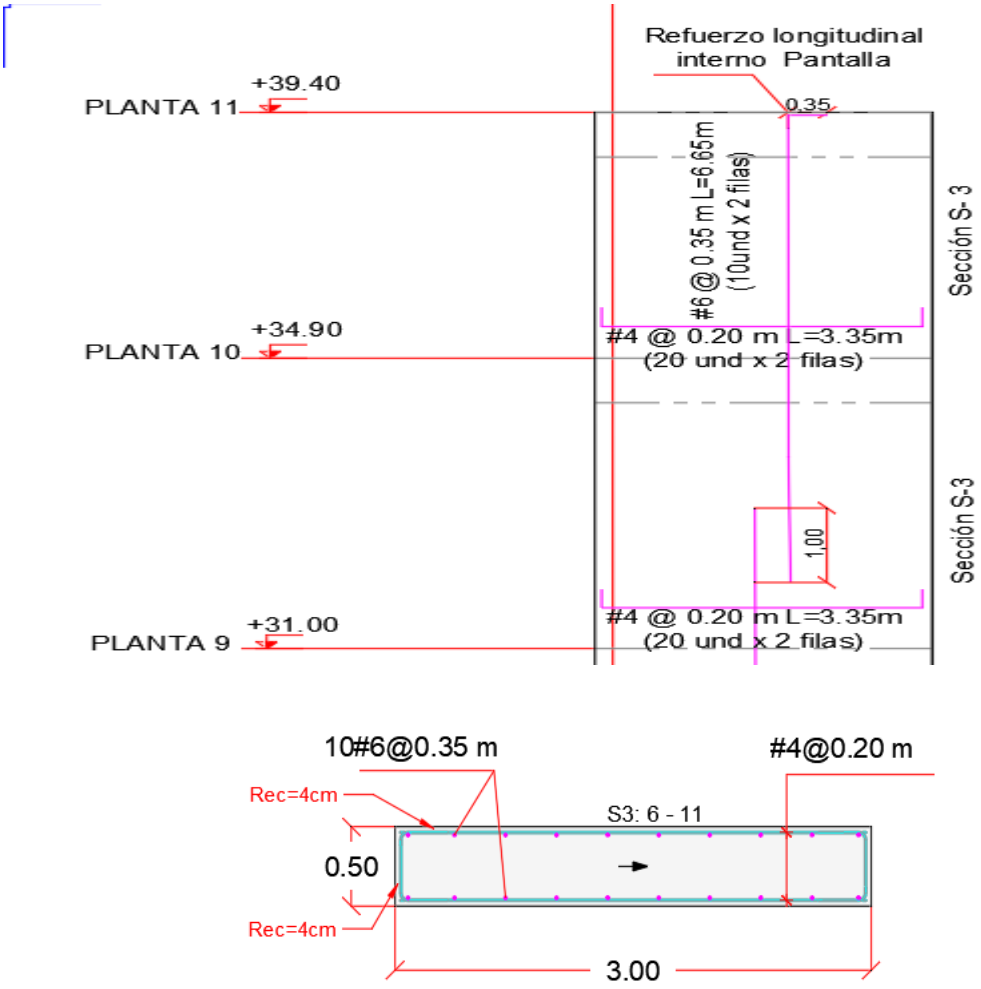


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 23. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2

- PANTALLA PW3

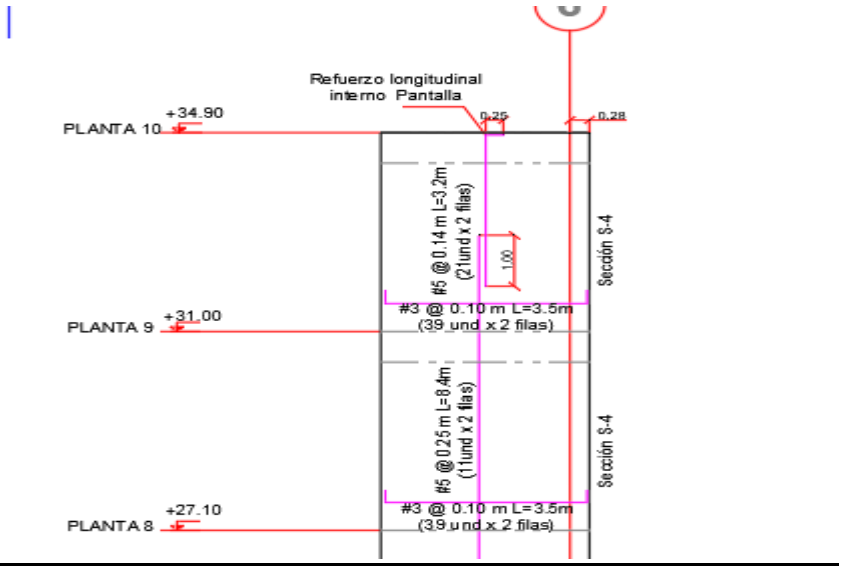


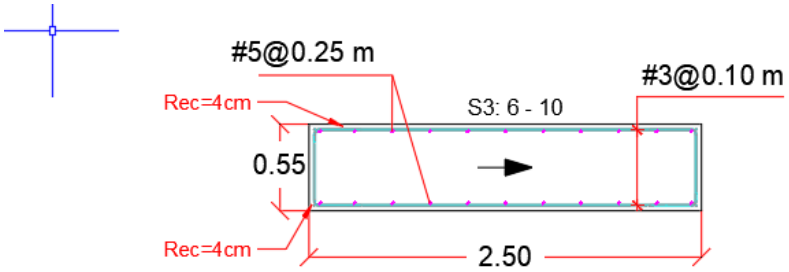


PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 24. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.

- PANTALLA PW4

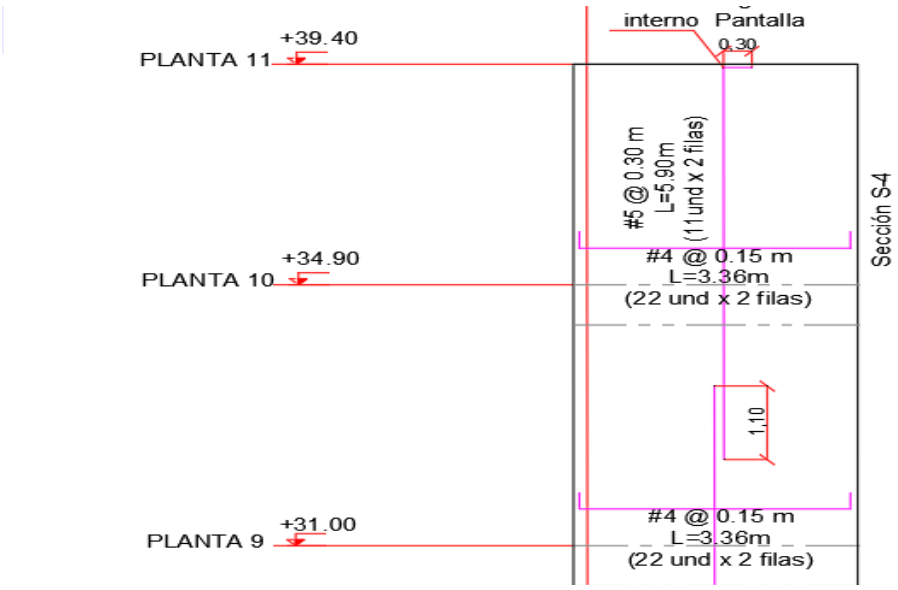





PLANTA 6, PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9, PLANTA 10 Y PLANTA 11

Ilustración 25. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

- PANTALLA PW5

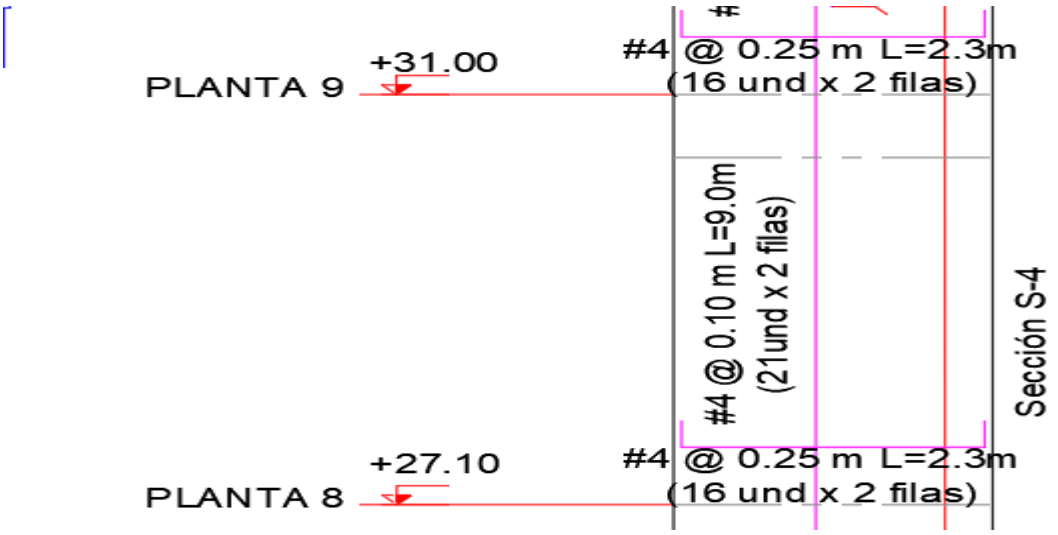


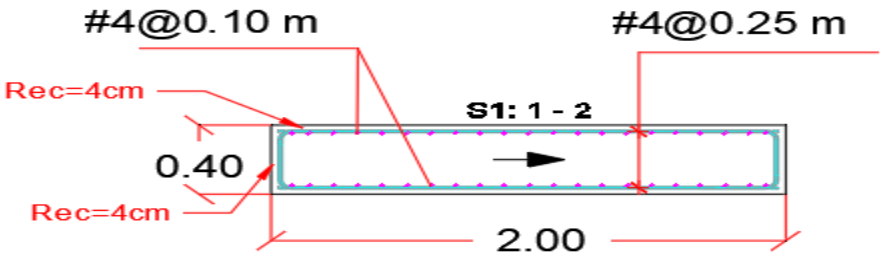


PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 26. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

- PANTALLA PW6

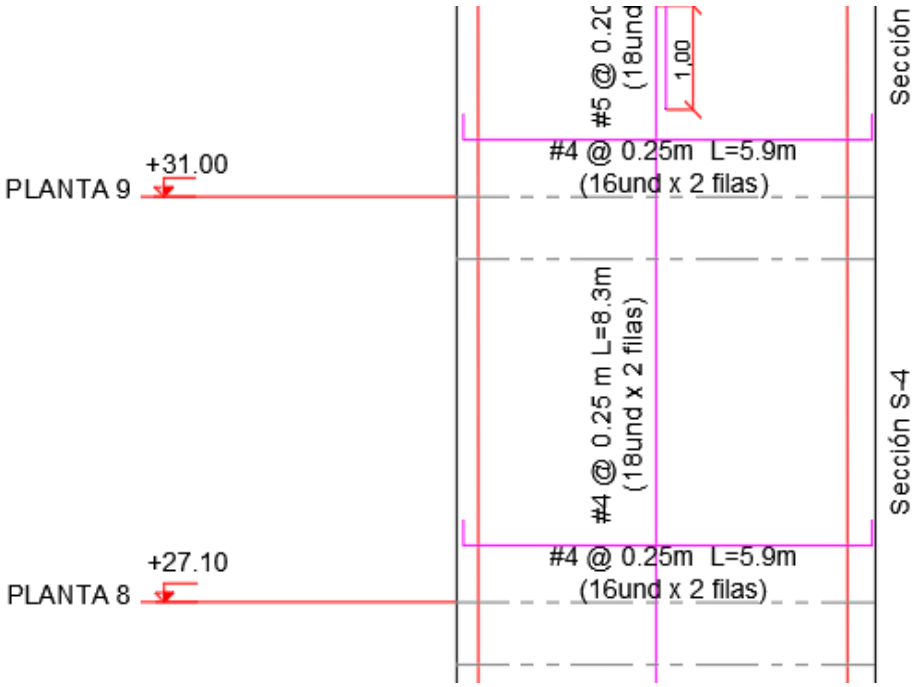


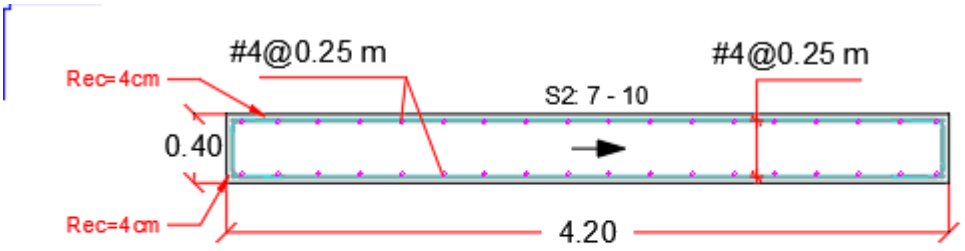


PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 27. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

- PANTALLA PW7

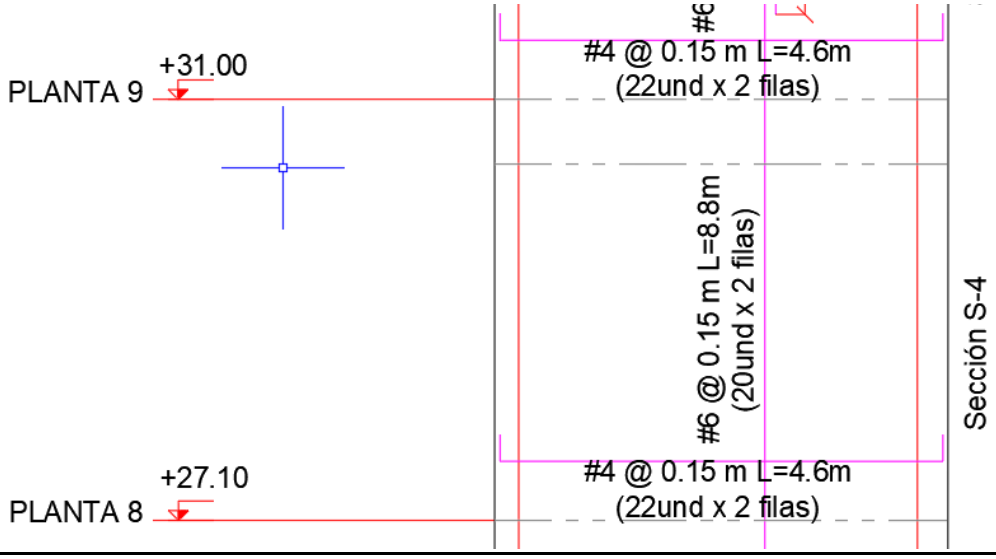


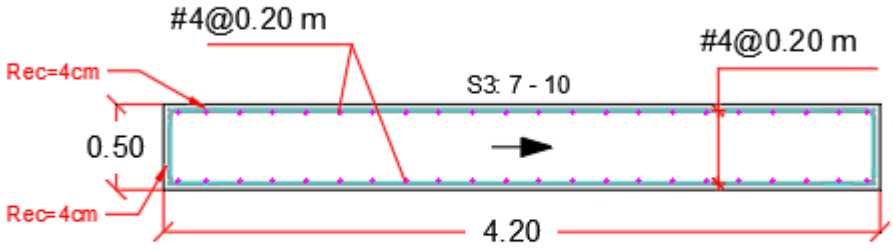

PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 28. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

- PANTALLA PW8

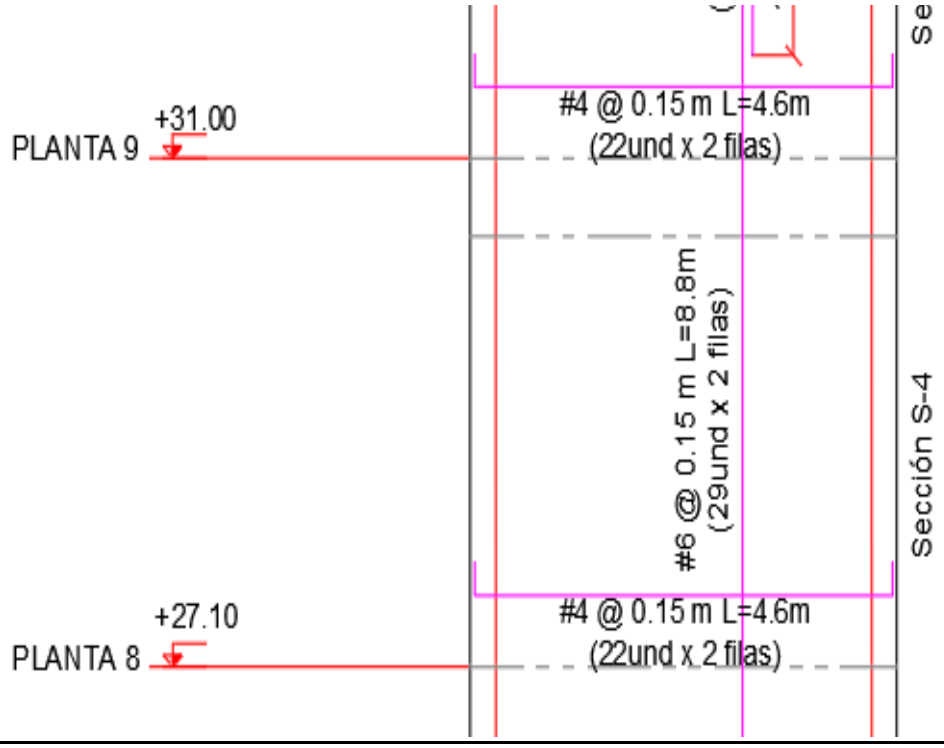



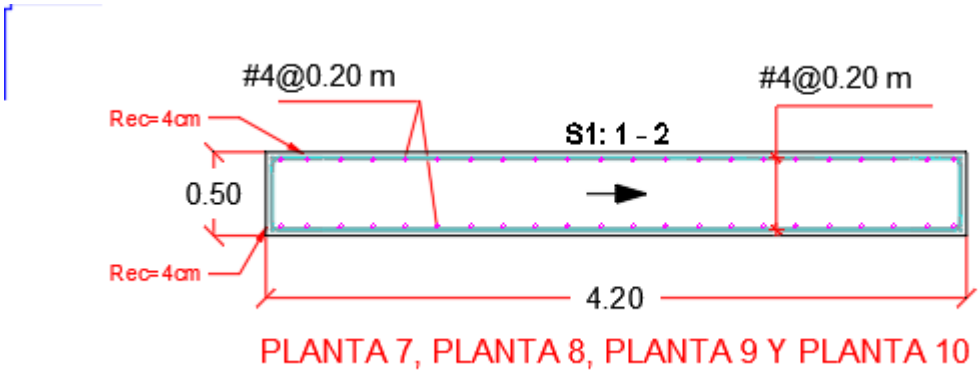


Ilustración 29. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.

- PANTALLA PW9

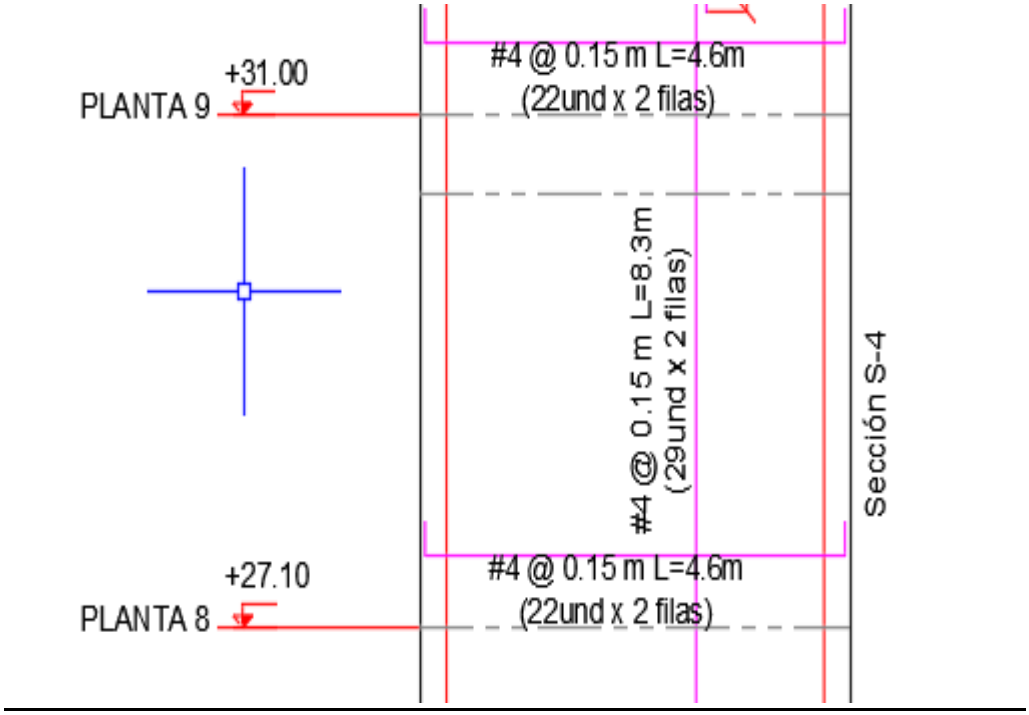


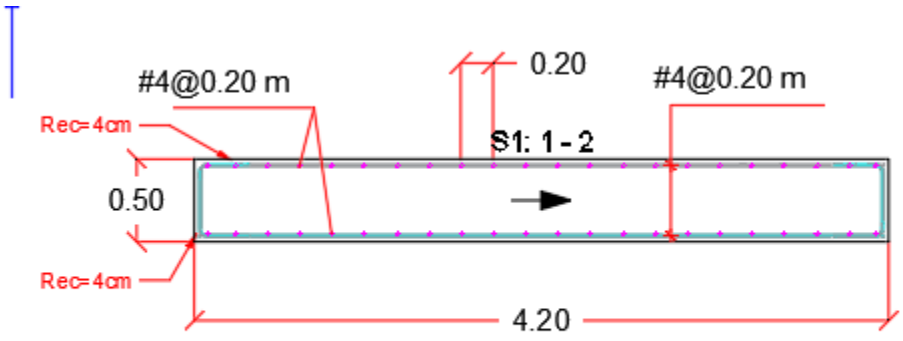

PLANTA 7, PLANTA 8, PLANTA 9 Y PLANTA 10

Ilustración 30. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

- PANTALLA PW10

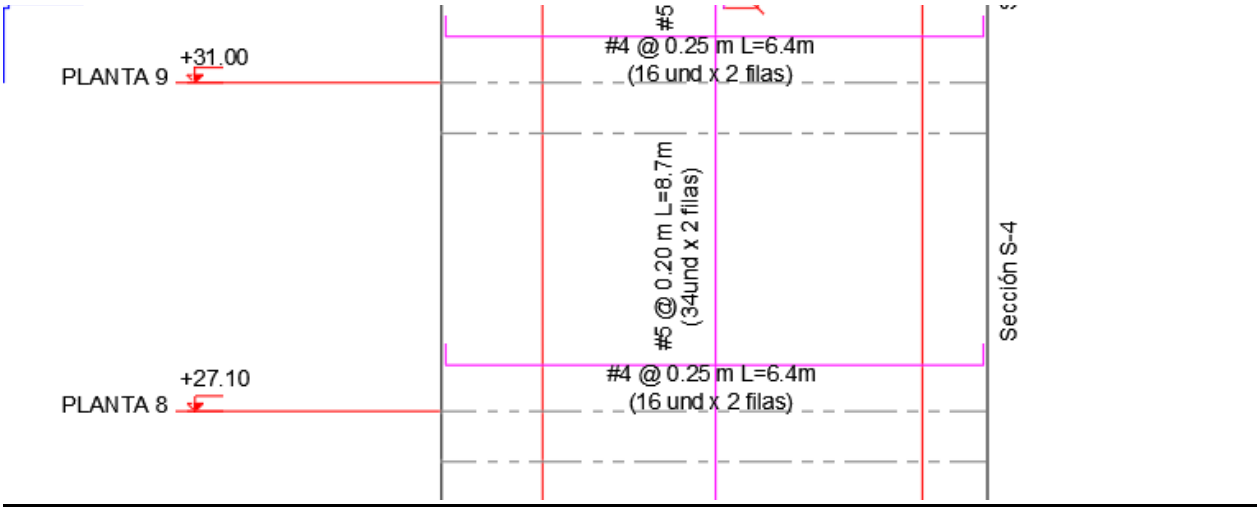


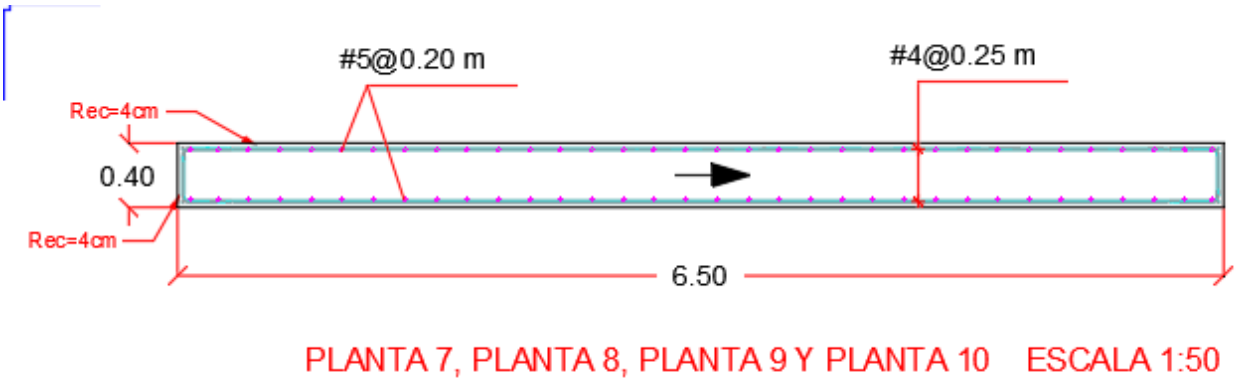


Ilustración 31. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO 4 N +19.30 y ENTREPISO 5 N+23.20

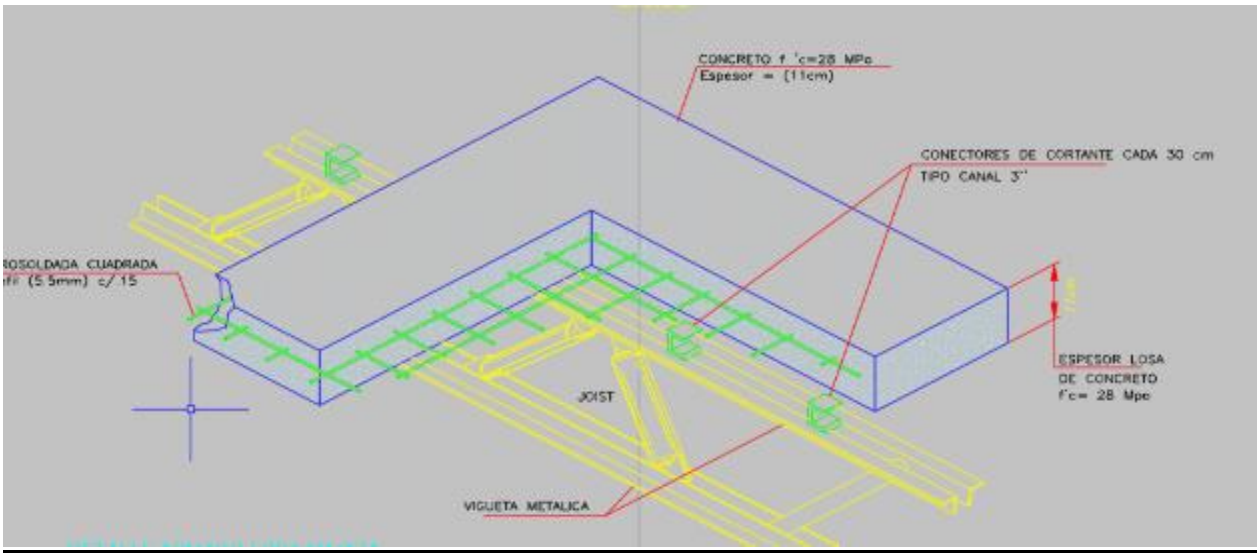

RESUMEN DE LA LOSA	
ITEM	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR DE LA LOSA (cm)	11.0
Malla de retracción para la placa:	Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 - Doble

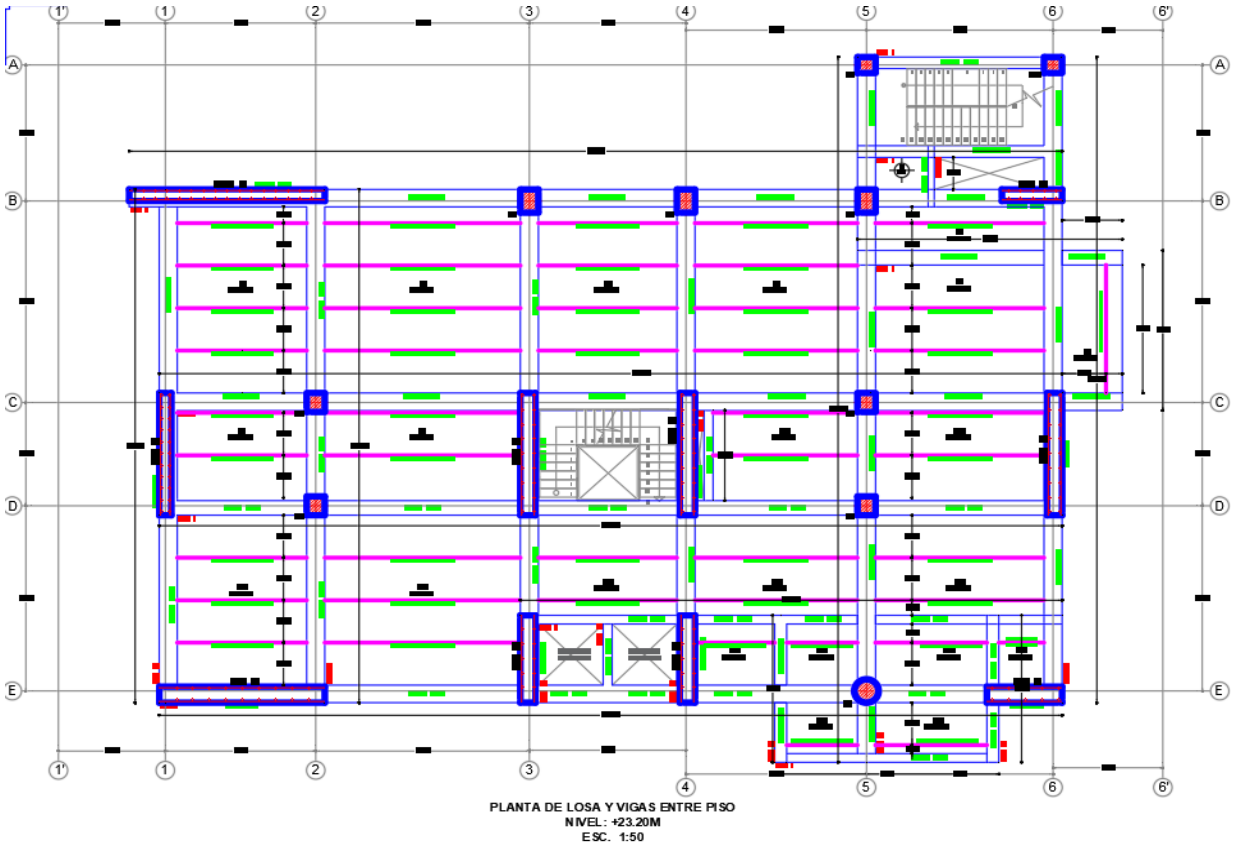


Ilustración 32. Disposición de vigas joist entrepiso 5 N+23.20.

DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO 6 N +23.20

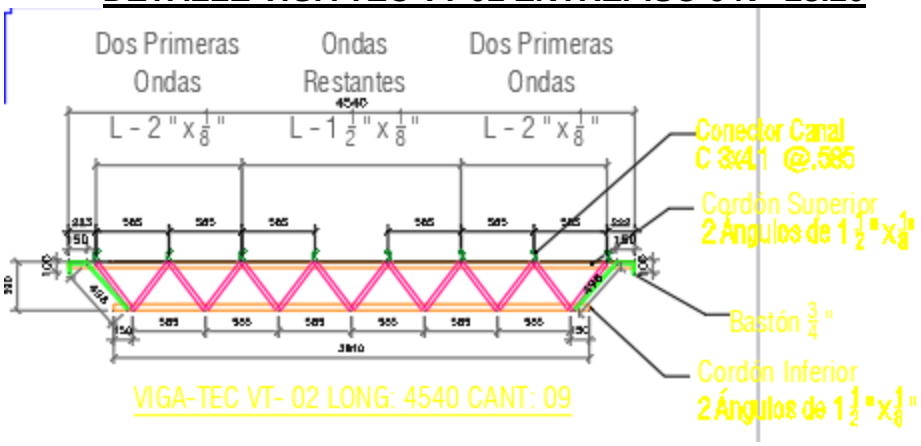


Ilustración 33. Detalle joist VT 02

DETALLE VIGA TEC VT 03

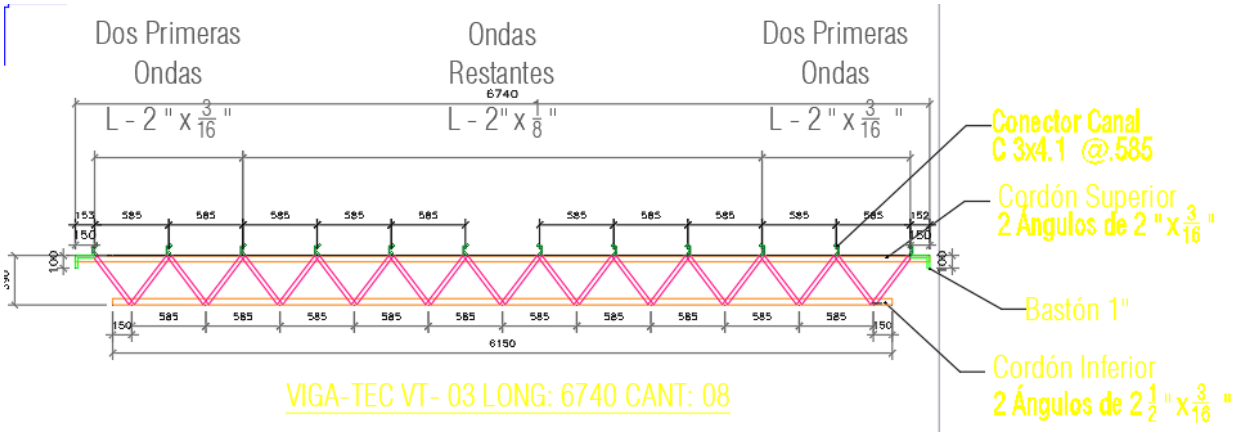


Ilustración 34. Detalle joist VT 03.

DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO 6 N +23.20

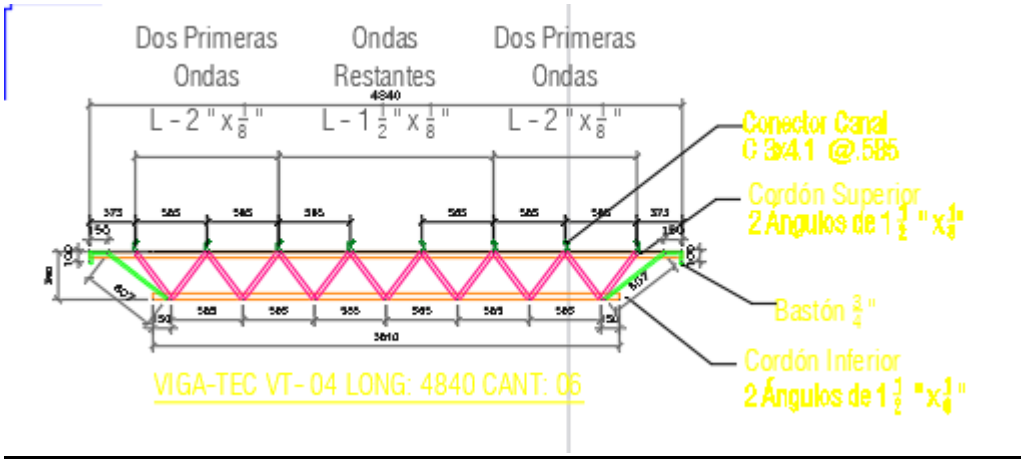


Ilustración 35. Detalle joist VT 04

DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO 6 N +23.20

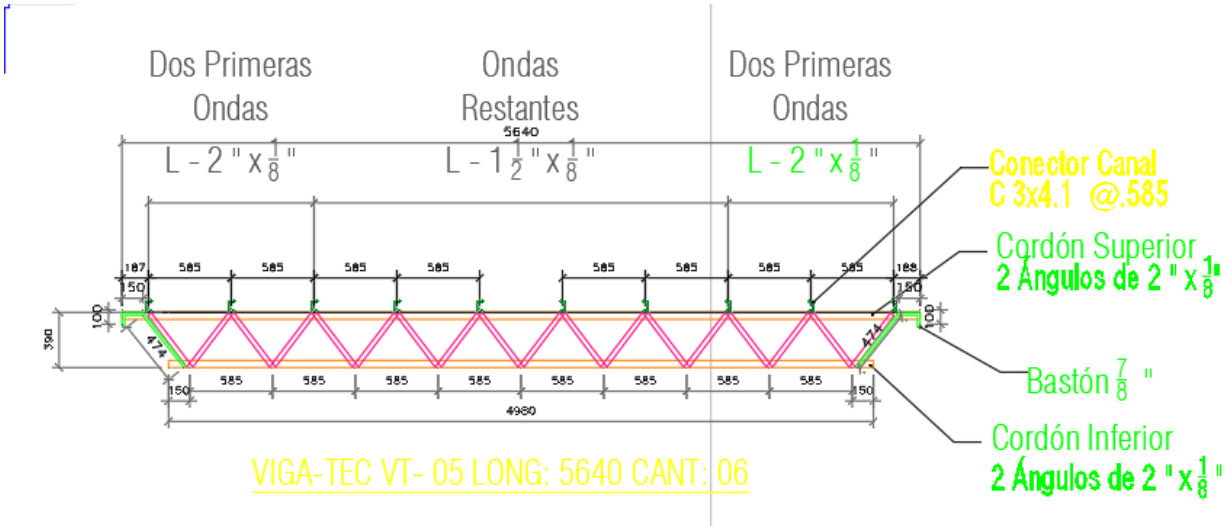


Ilustración 36. Detalle joist VT 05.

DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO 6 N +23.20

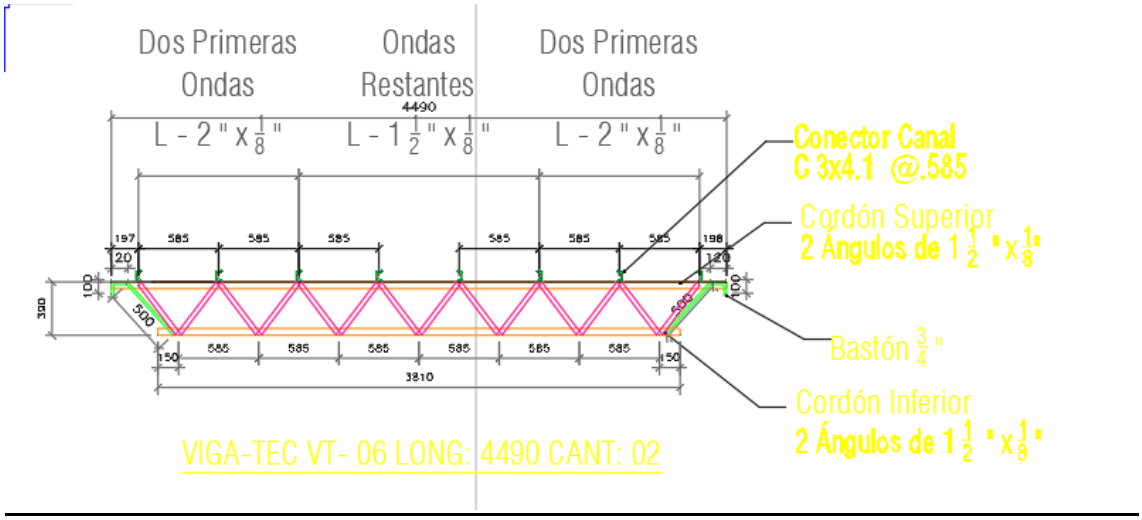


Ilustración 37. Detalle joist VT 06.

DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO 6 N +23.20

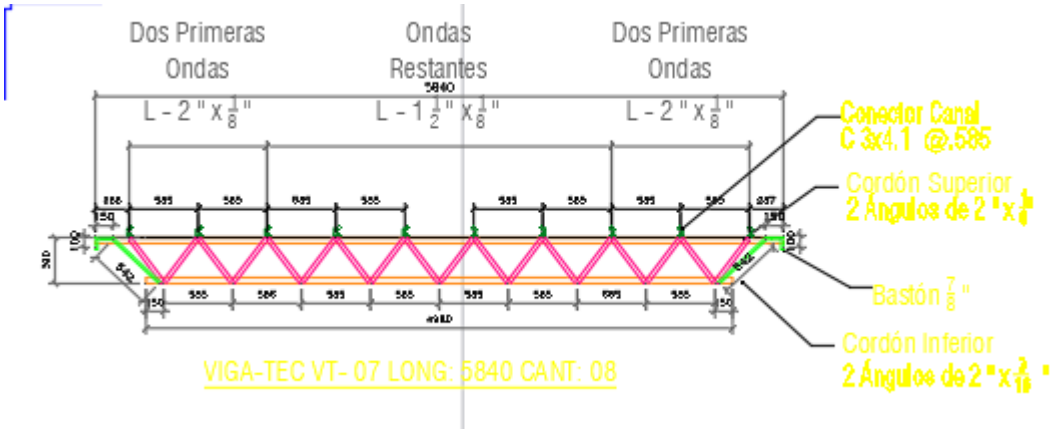


Ilustración 38. Detalle joist VT 07.

DETALLE VIGA TEC VT 10 ENTREPISO 6 N +23.20

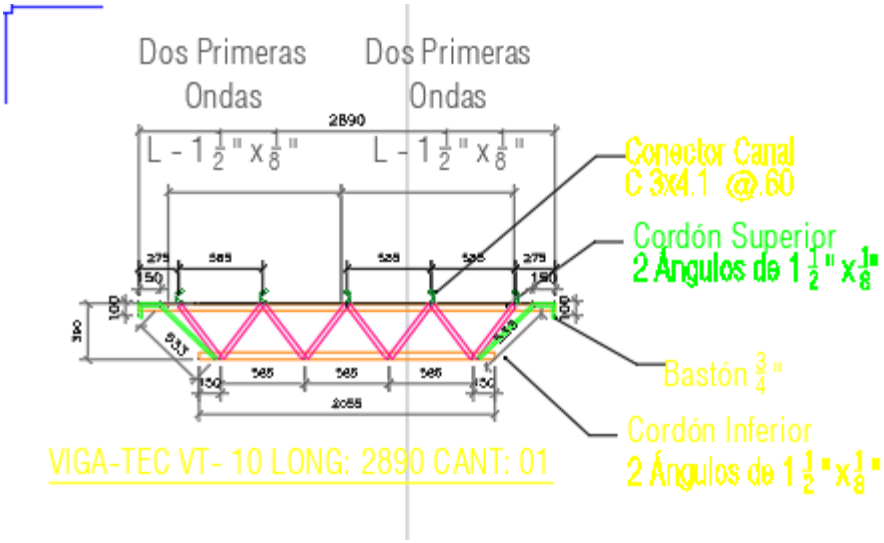


Ilustración 39. Detalle joist VT 10

DETALLE VIGA TEC VT 11 ENTREPISO 6 N +23.20

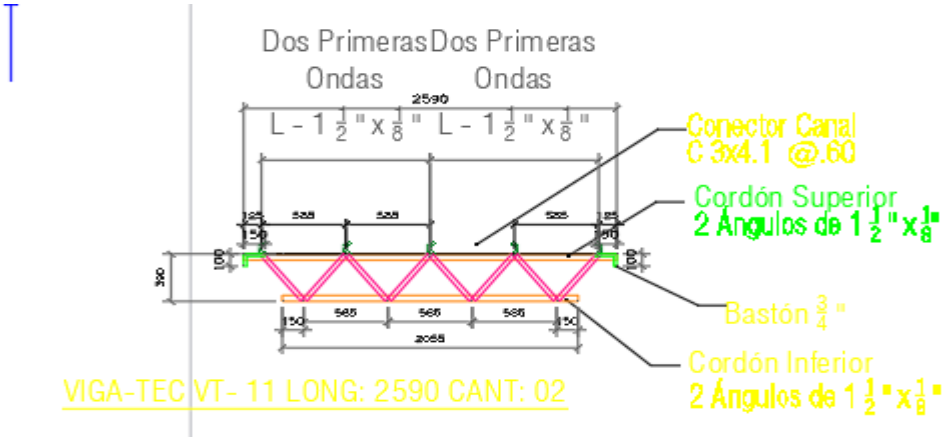


Ilustración 40. Detalle joist VT 11

DETALLE VIGA TEC VT 12 ENTREPISO 6 N +23.20

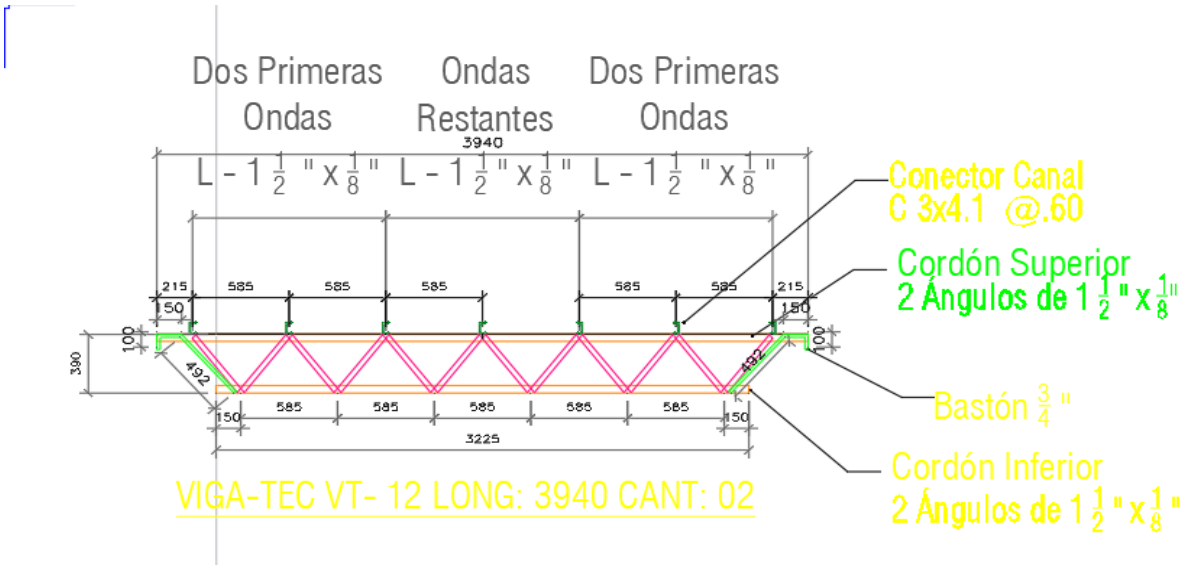


Ilustración 41. Detalle joist VT 12

DETALLE VIGA TEC VT 13 ENTREPISO 6 N +23.20

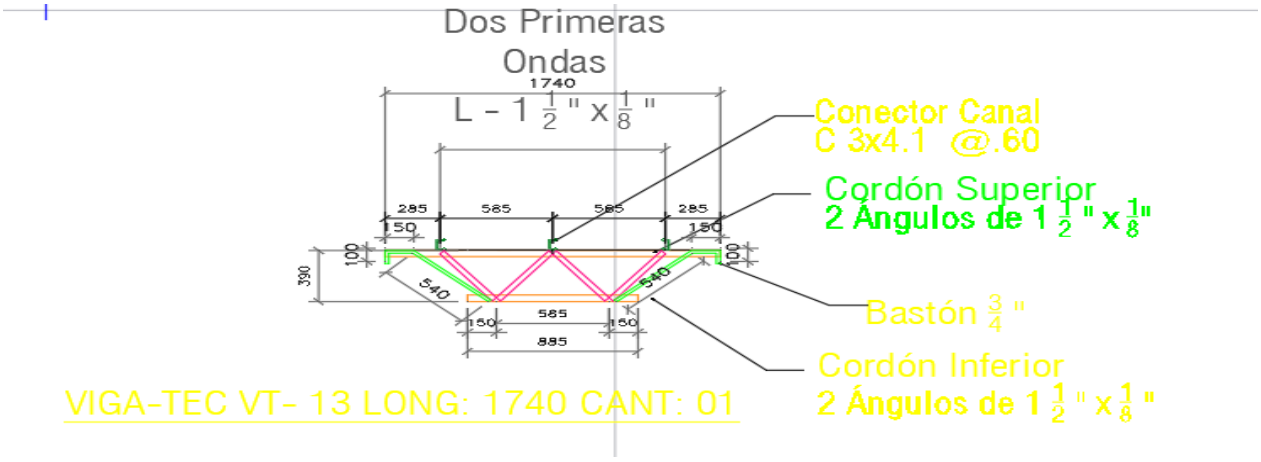


Ilustración 42. Detalle joist VT 13

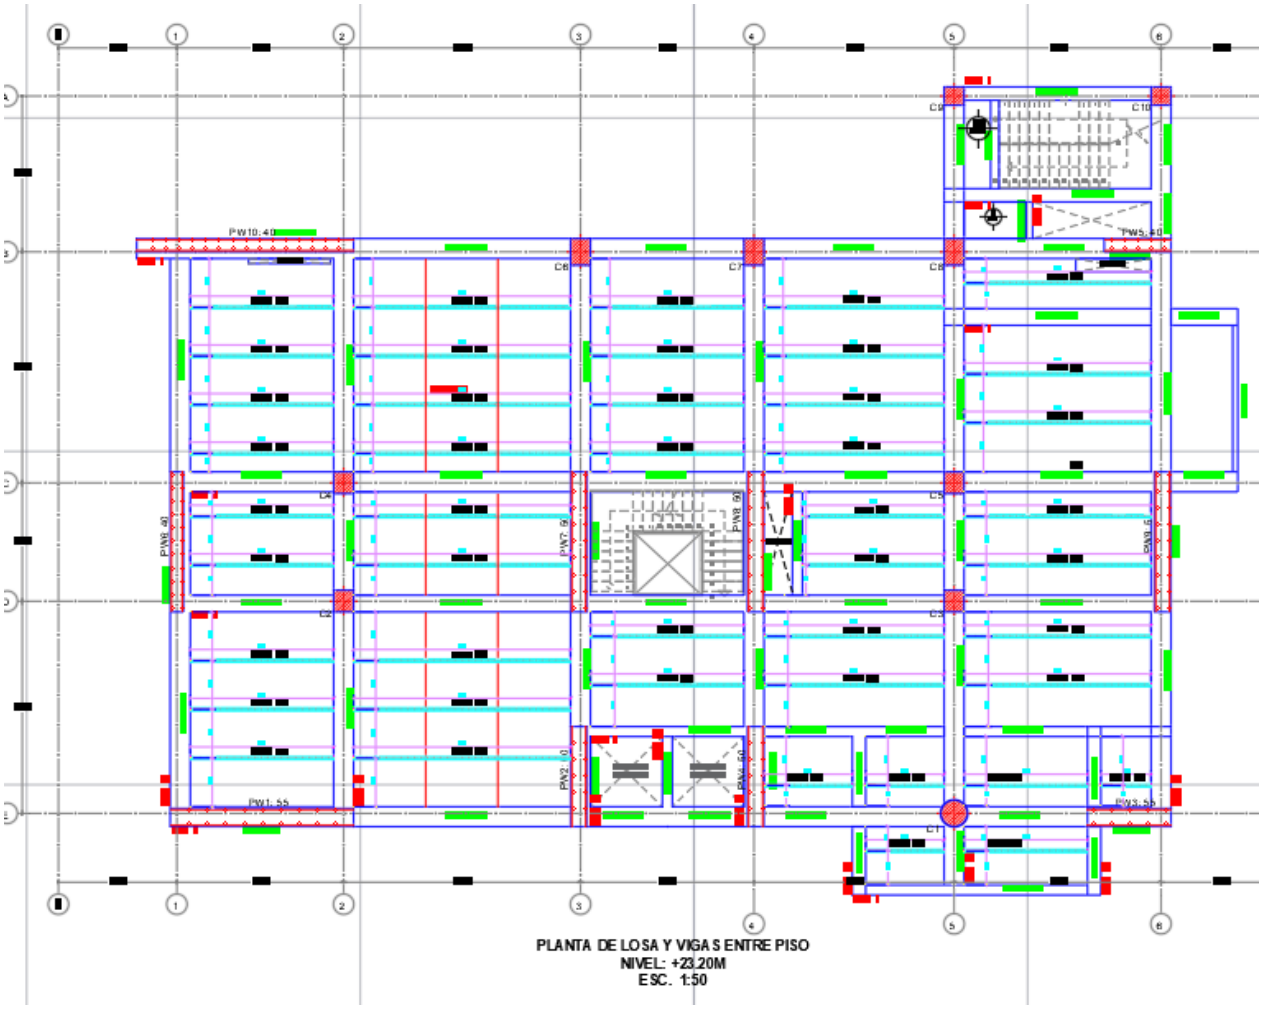


Ilustración 43. Disposición de vigas joist entrepiso 6 N+23.20

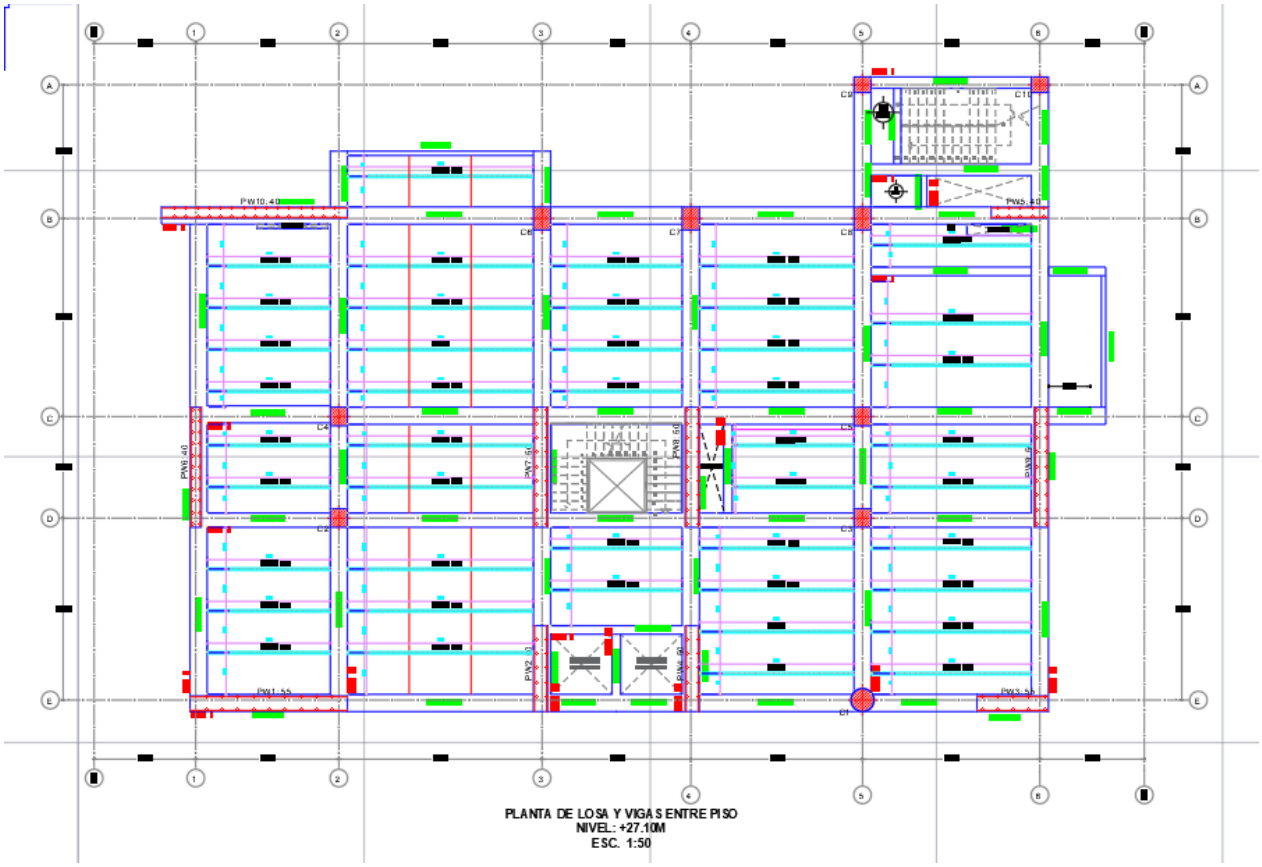


Ilustración 44. Disposición de vigas joist entrepiso 7 N+27.10

DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO 7 N +27.100

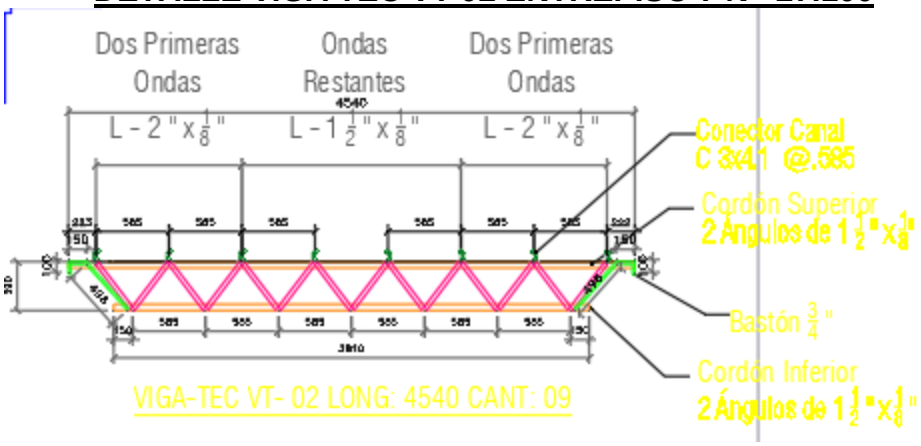


Ilustración 45. Detalle joist VT 02

DETALLE VIGA TEC VT 03

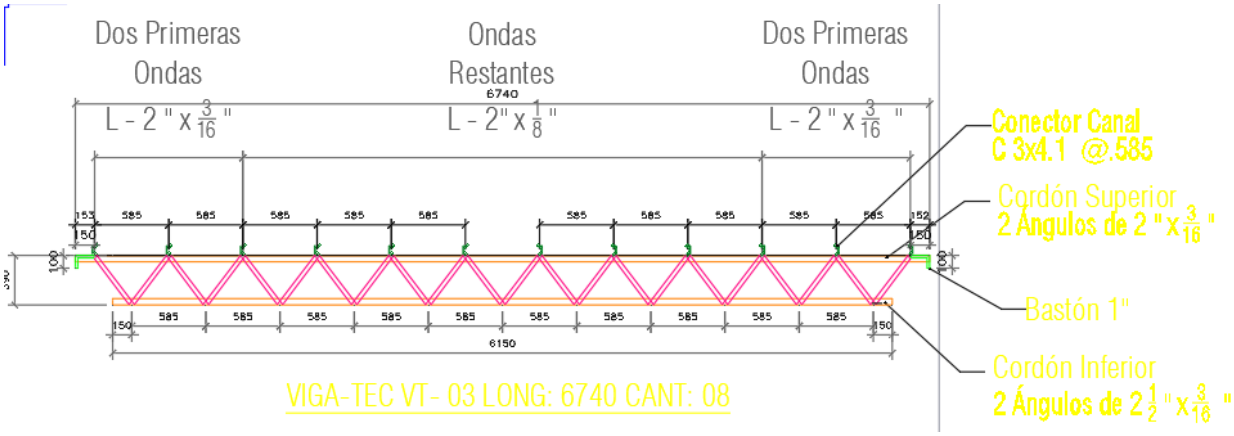


Ilustración 46. Detalle joist VT 03.

DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO 7 N +27.10

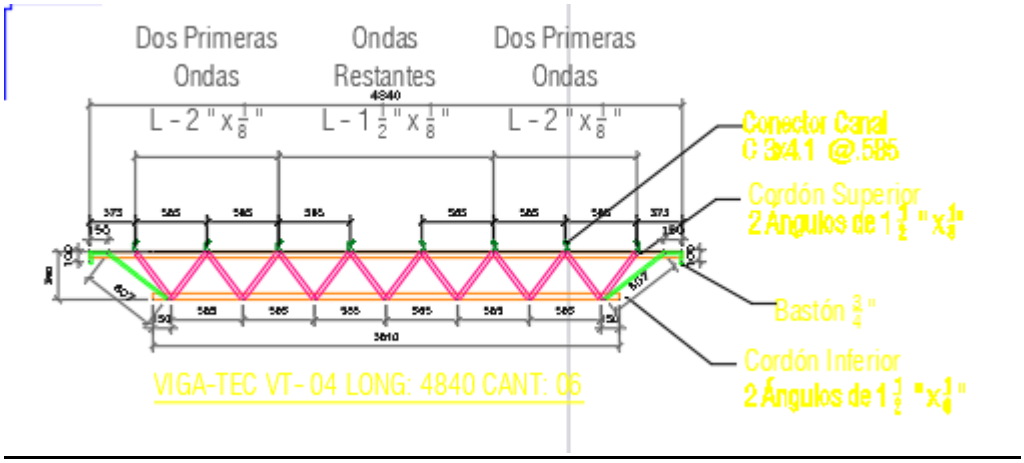


Ilustración 47. Detalle joist VT 04

DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO 7 N +27.10

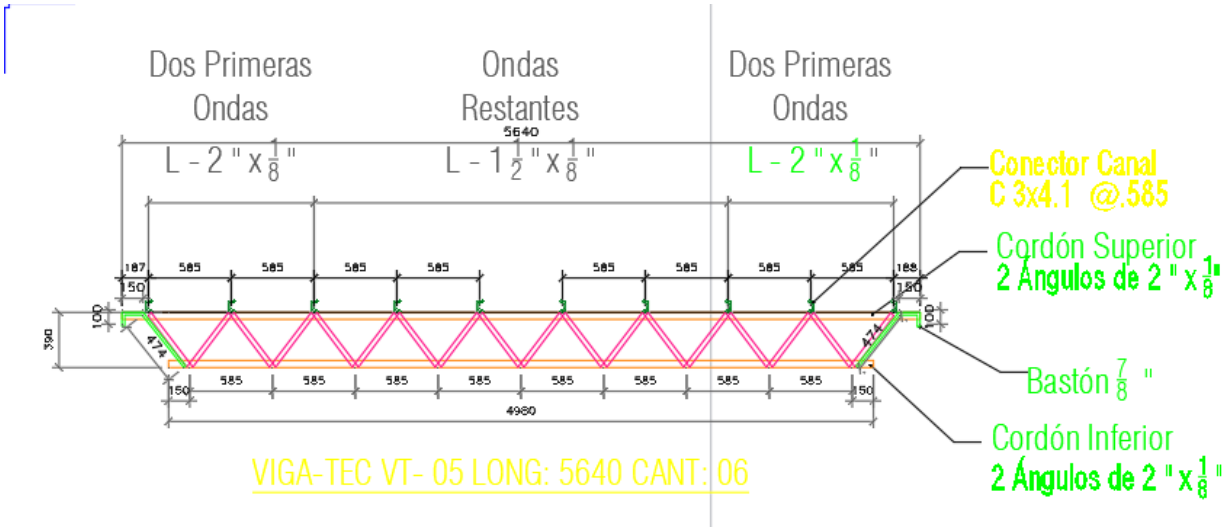


Ilustración 48. Detalle joist VT 05.

DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO 7 N +27.10

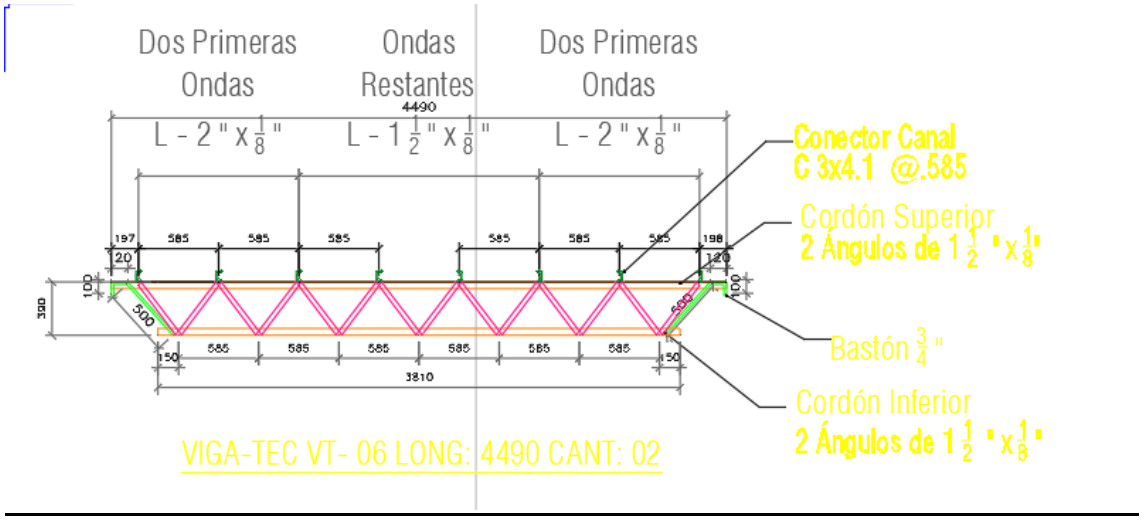


Ilustración 49. Detalle joist VT 06.

DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO 7 N +27.10

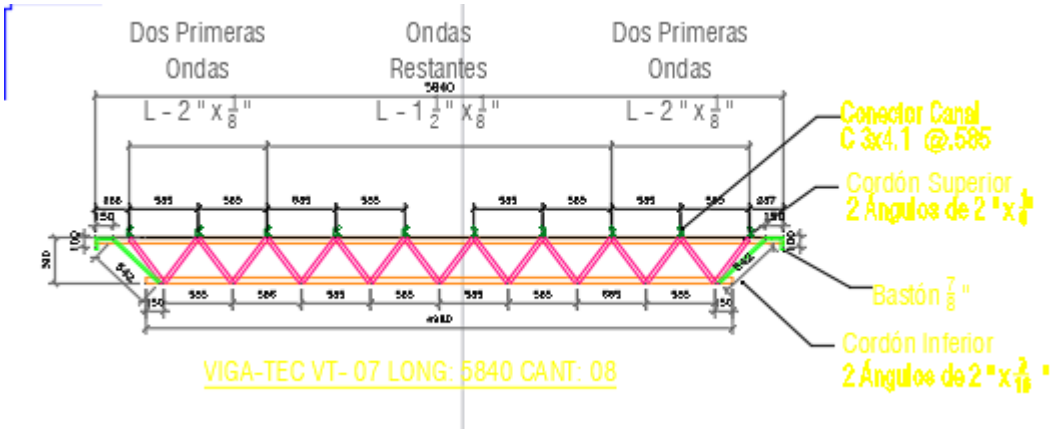


Ilustración 50. Detalle joist VT 07.

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6)

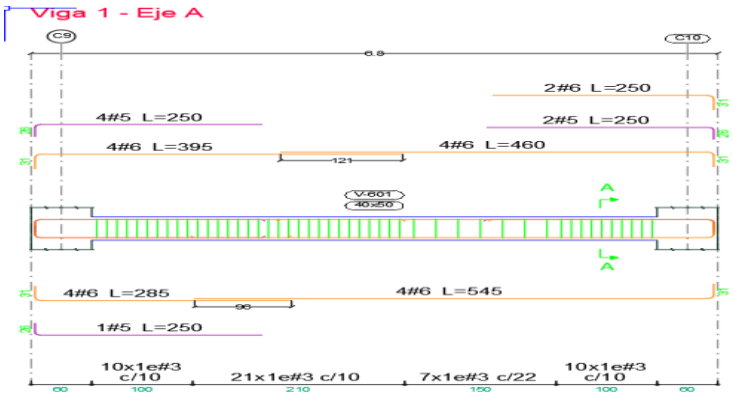


Ilustración 51. Disposición de refuerzo viga A.

- DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6)

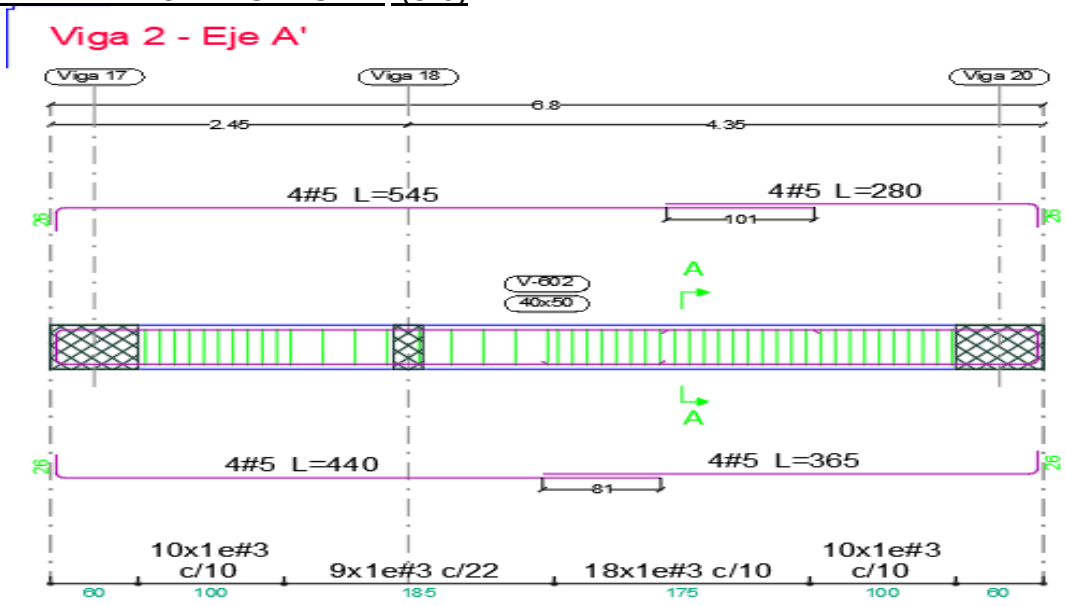


Ilustración 52. Disposición de refuerzo viga A'

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6')

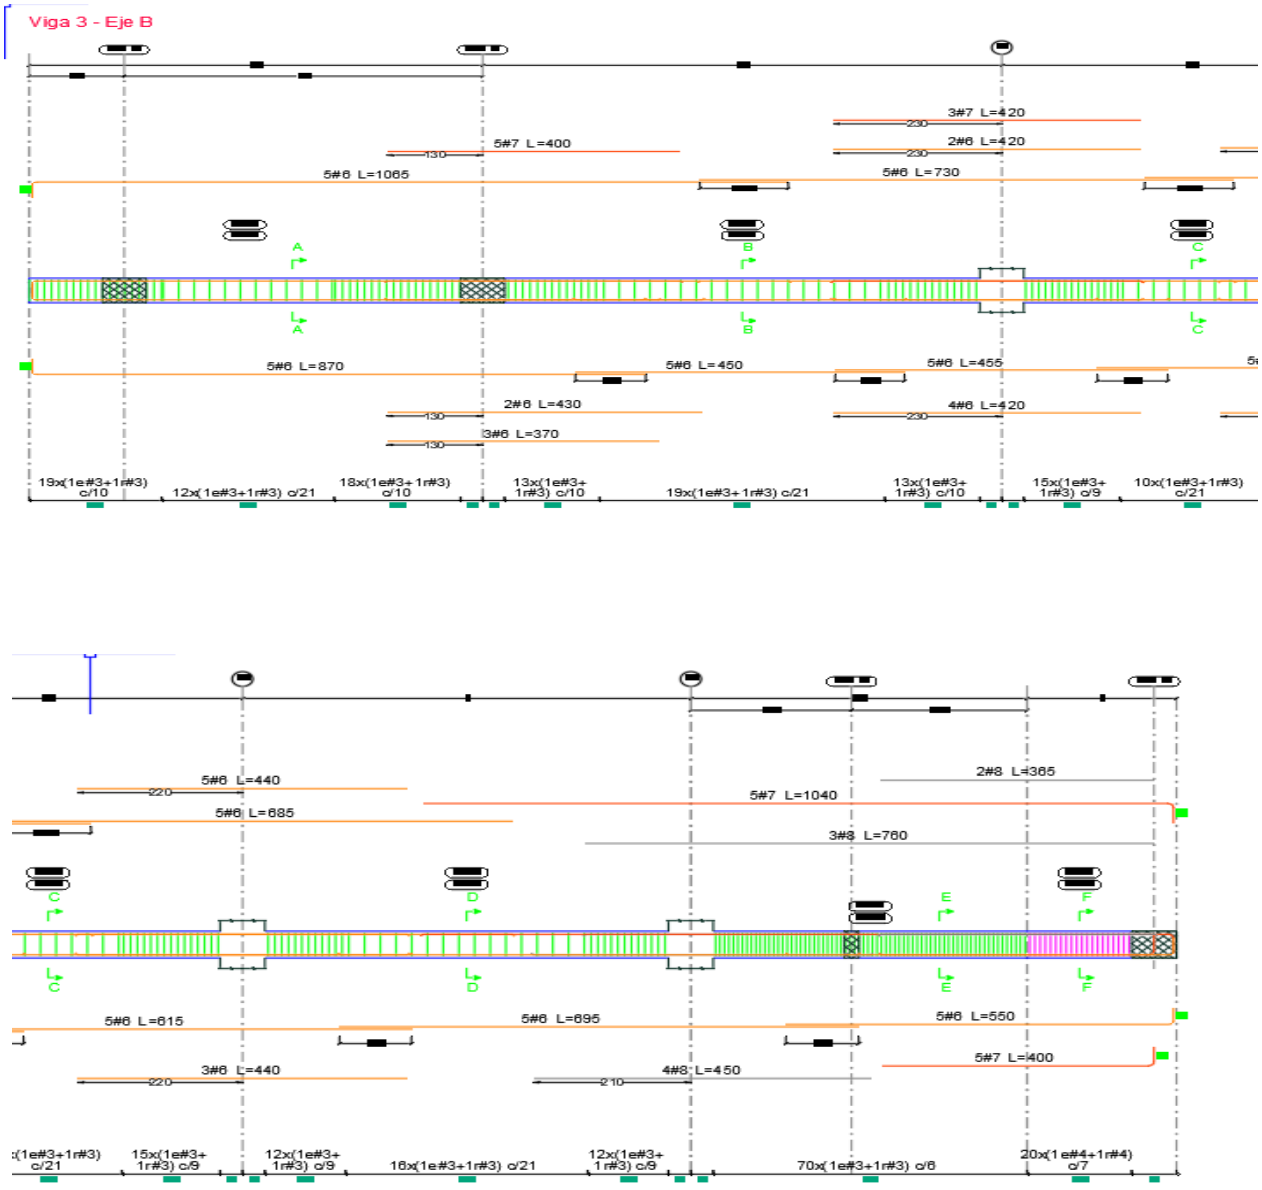


Ilustración 53. Disposición de refuerzo viga B

- DETALLE REFUERZO VIGA B* (5 -6')

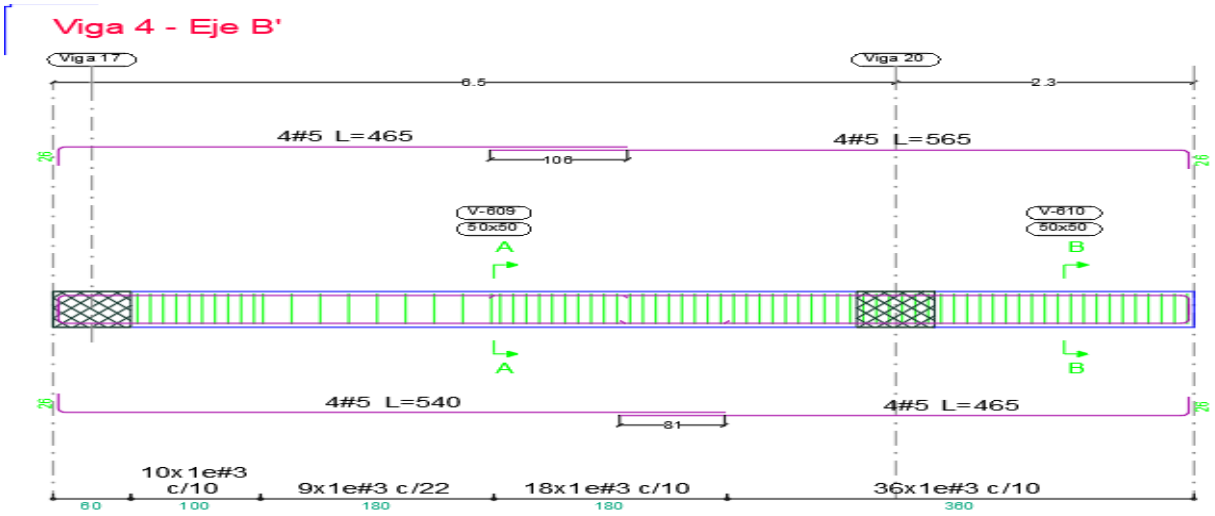
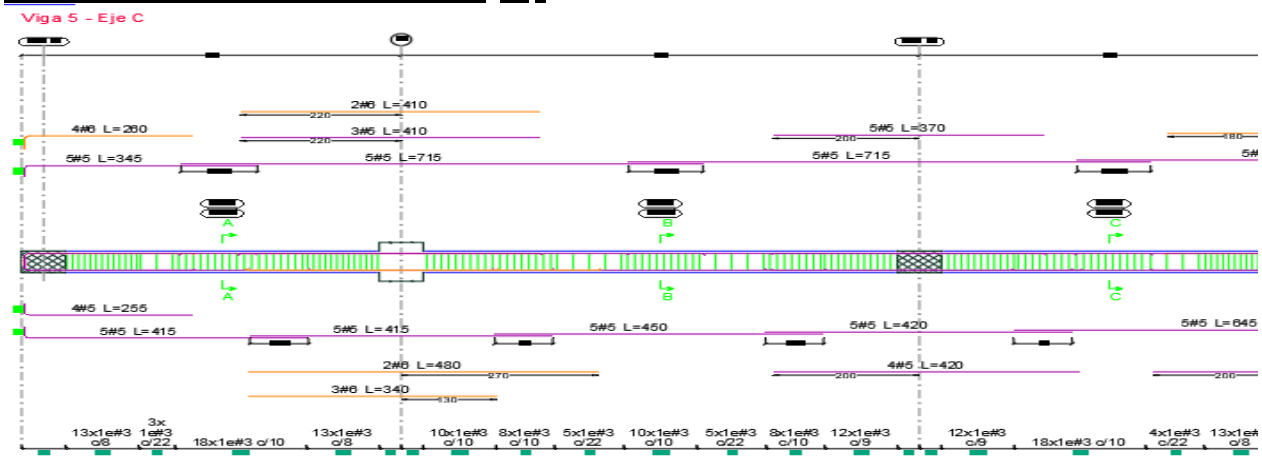


Ilustración 54. Disposición de refuerzo viga B(5-6*)*

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1' -6')



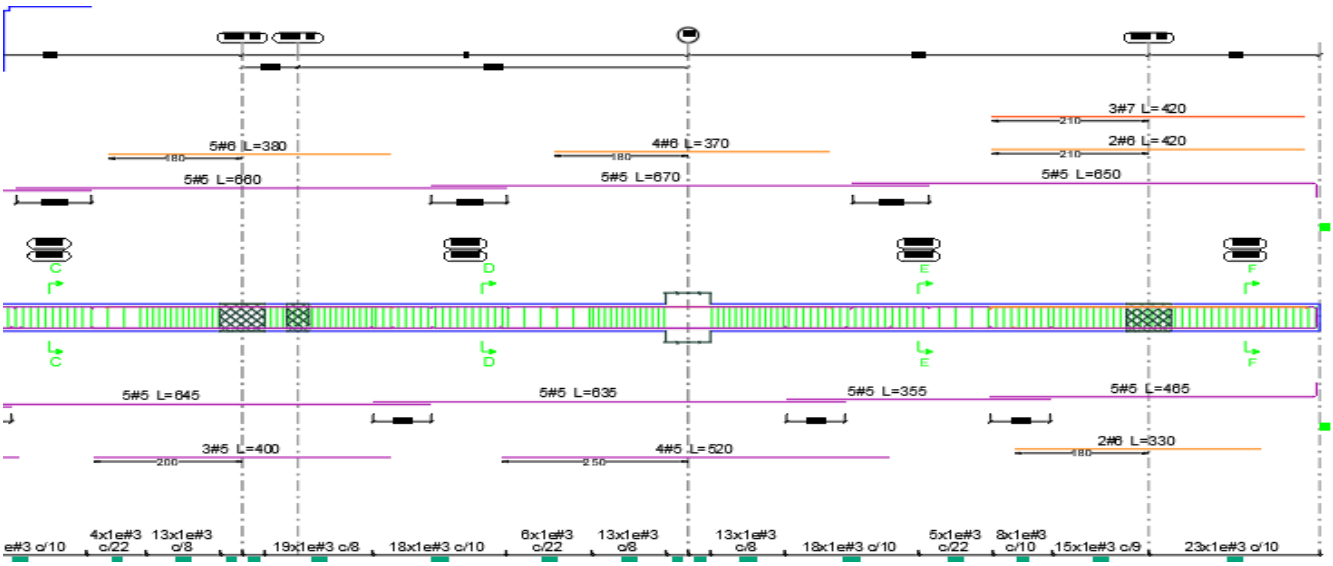
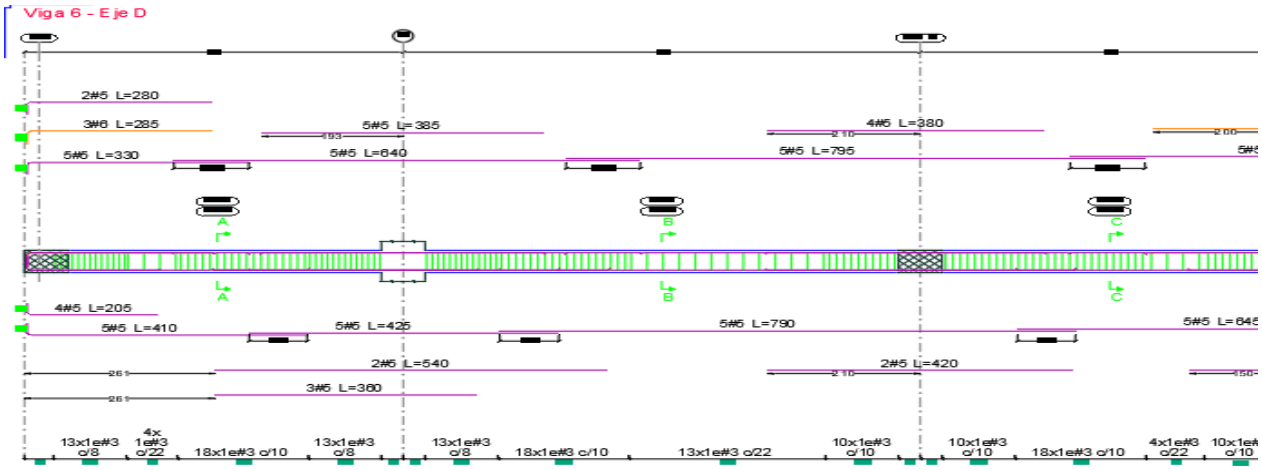


Ilustración 55. Disposición de refuerzo viga C

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2)



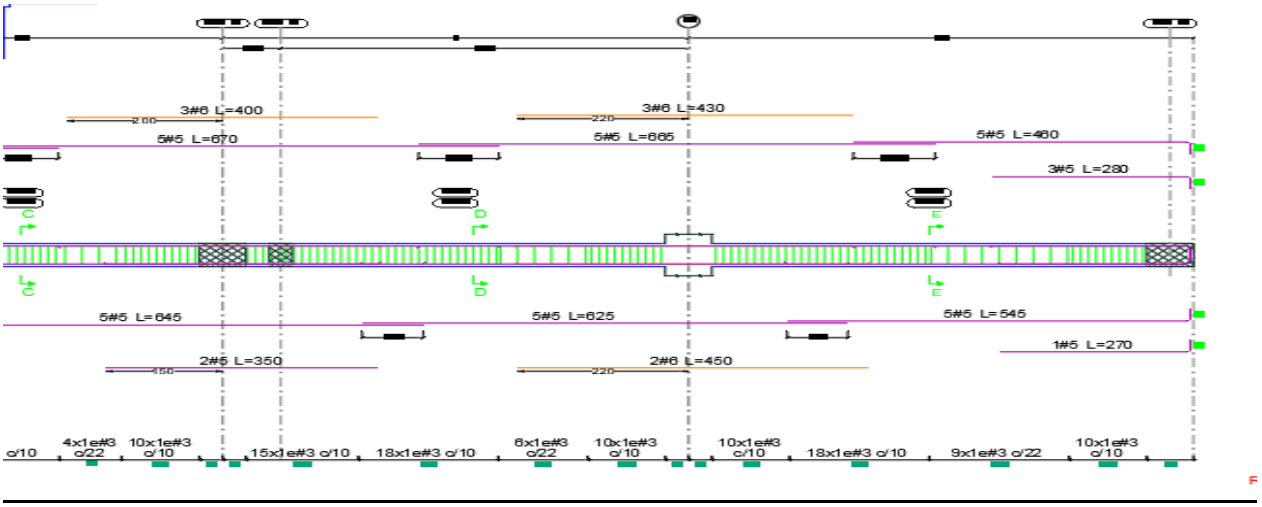


Ilustración 56. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6')

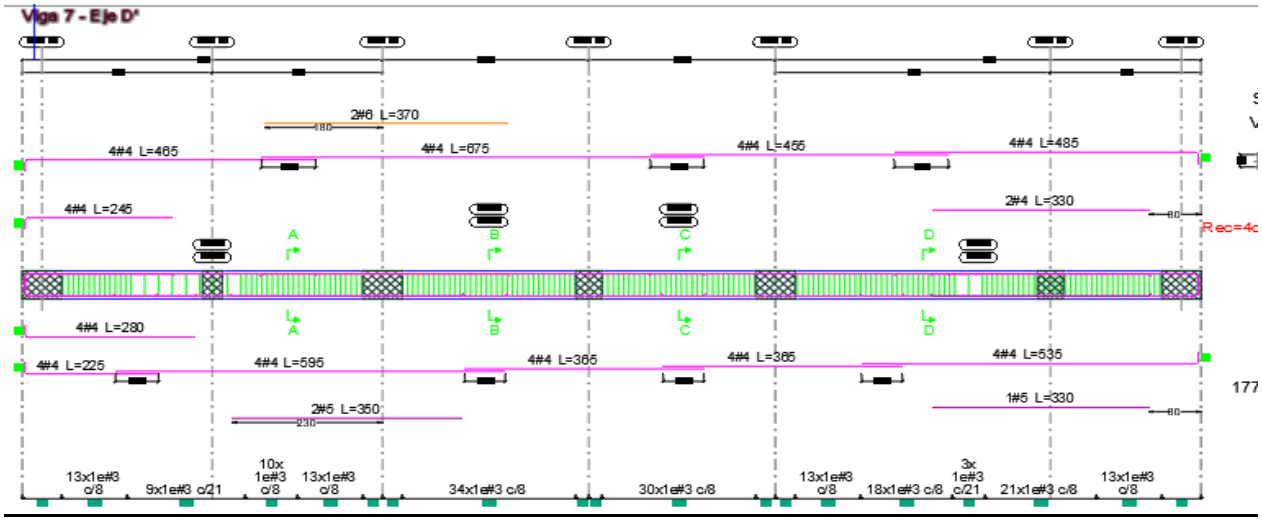


Ilustración 57. Disposición de refuerzo viga D (1'-6')

- DETALLE REFUERZO VIGA E (1- 6)

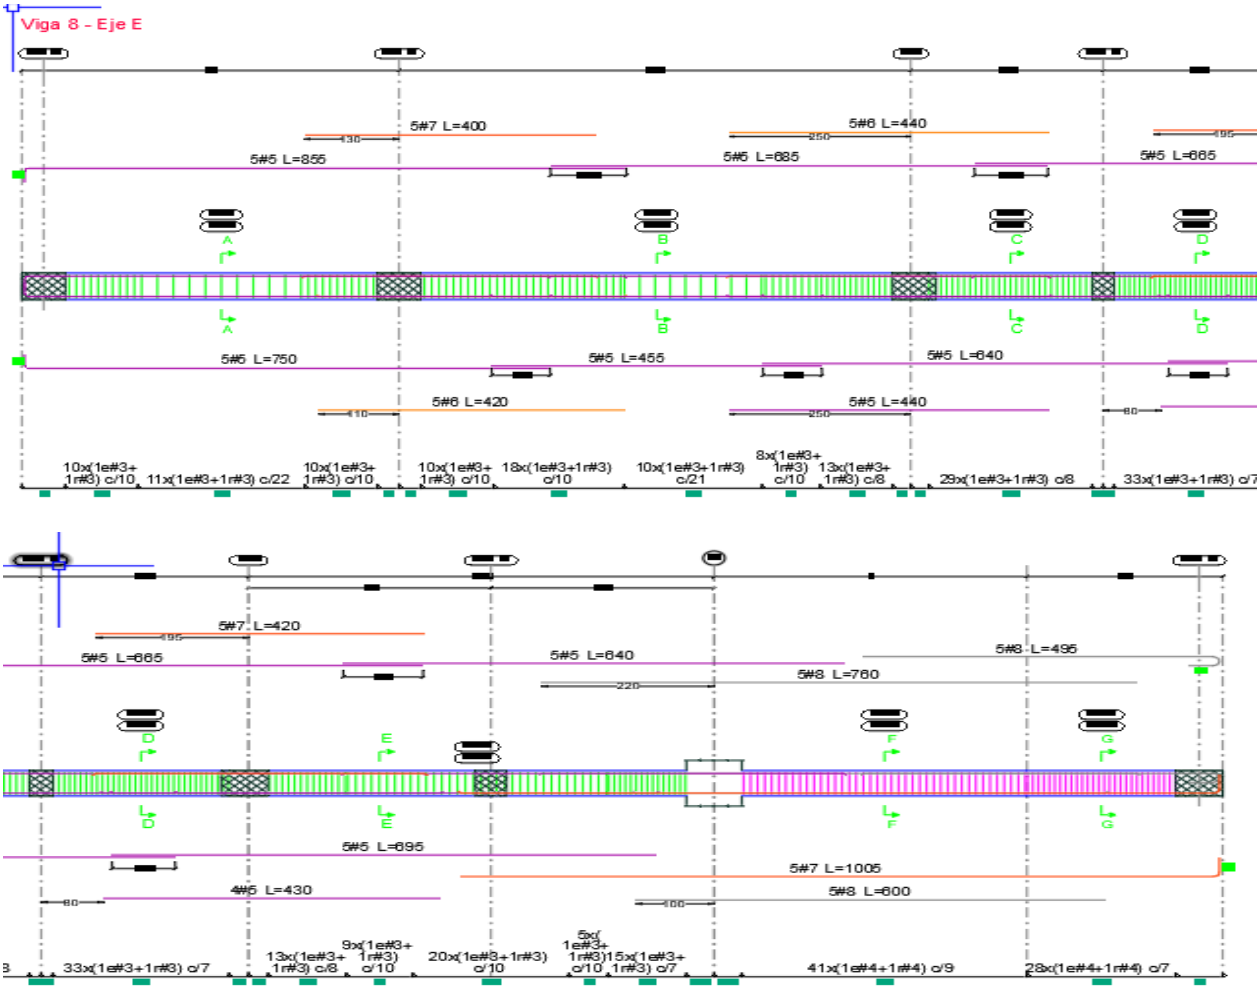


Ilustración 58. Disposición de refuerzo viga E (1-6)

- DETALLE REFUERZO VIGA E *

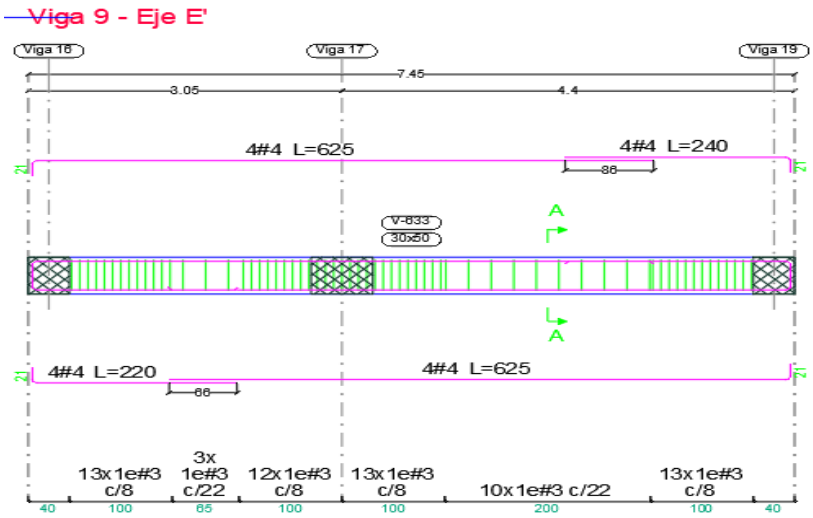


Ilustración 59. Disposición de refuerzo viga E (1-6*)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E)

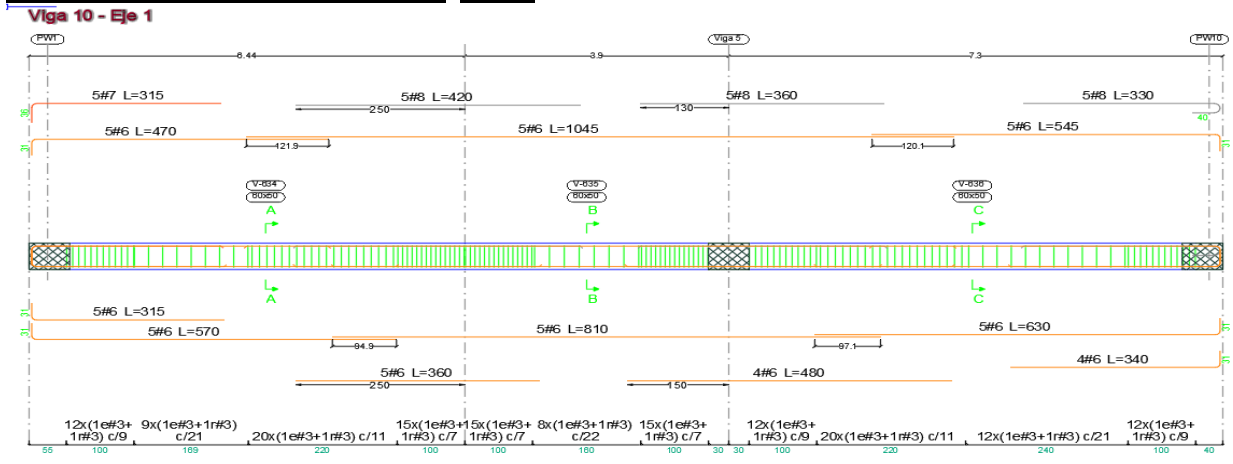


Ilustración 60. Disposición de refuerzo viga E (1-6*)*

- **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E)**

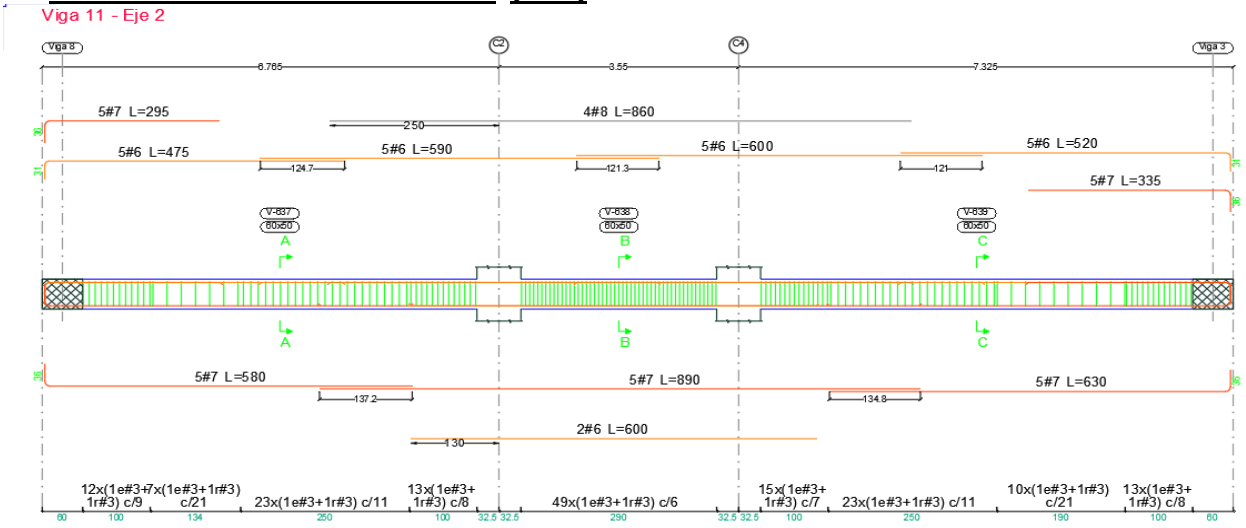


Ilustración 61. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E)

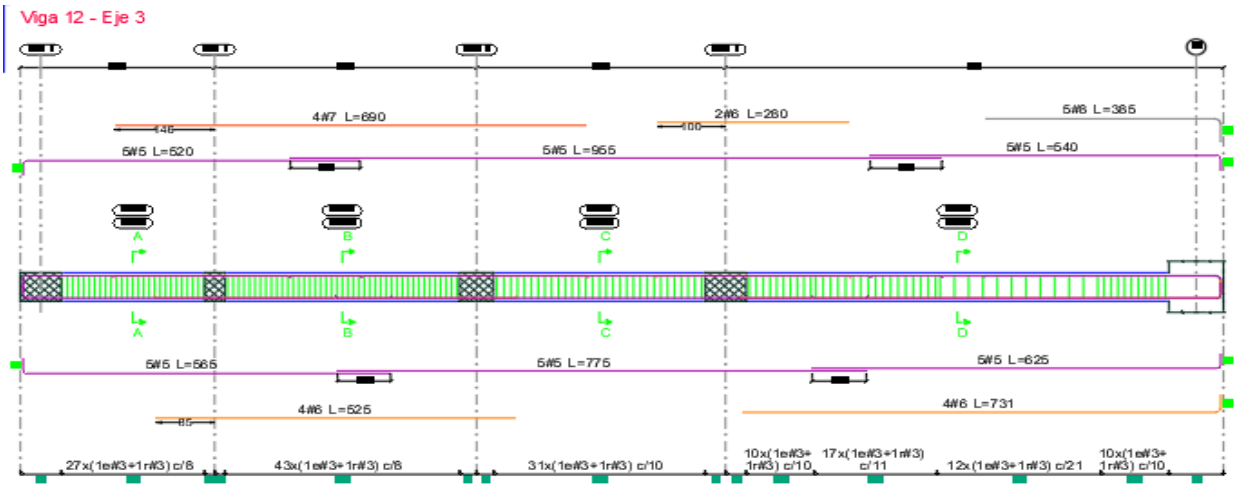


Ilustración 62. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 3* (B-E)

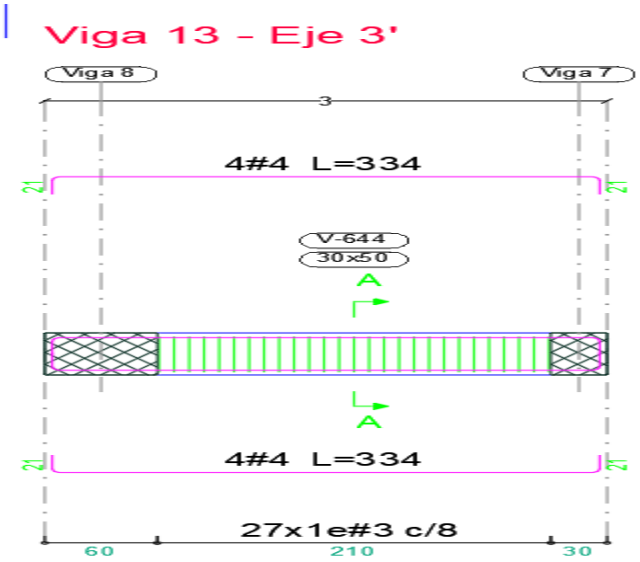


Ilustración 63. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E)

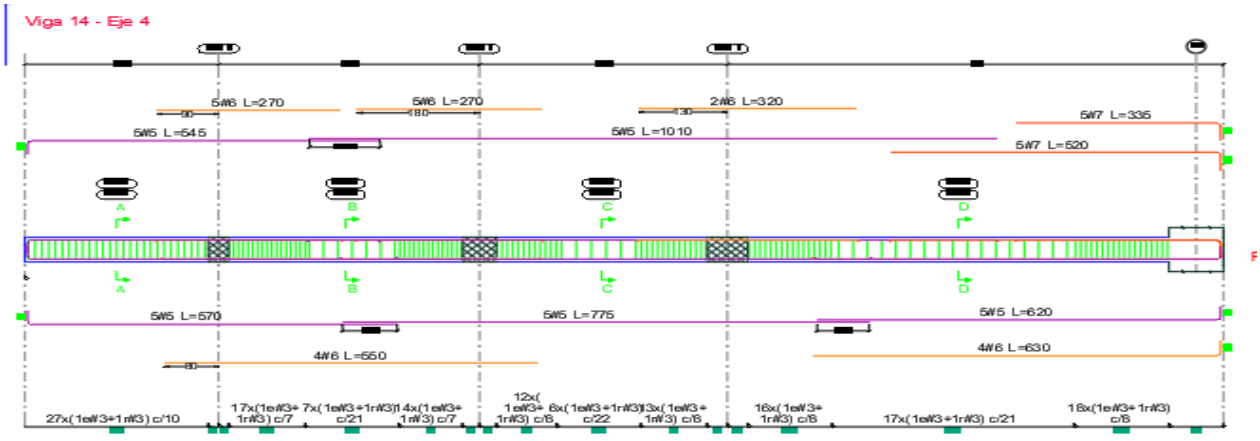


Ilustración 64. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D)

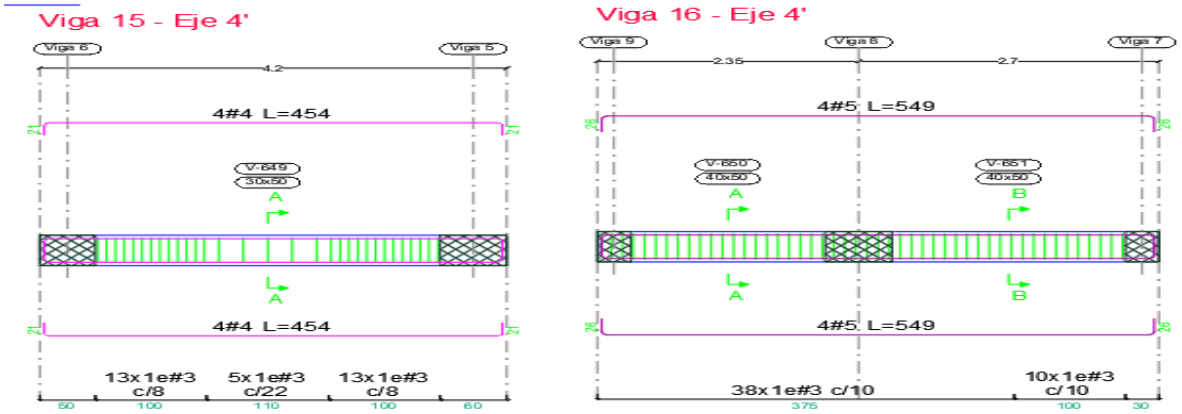


Ilustración 65. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C)

- DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E)

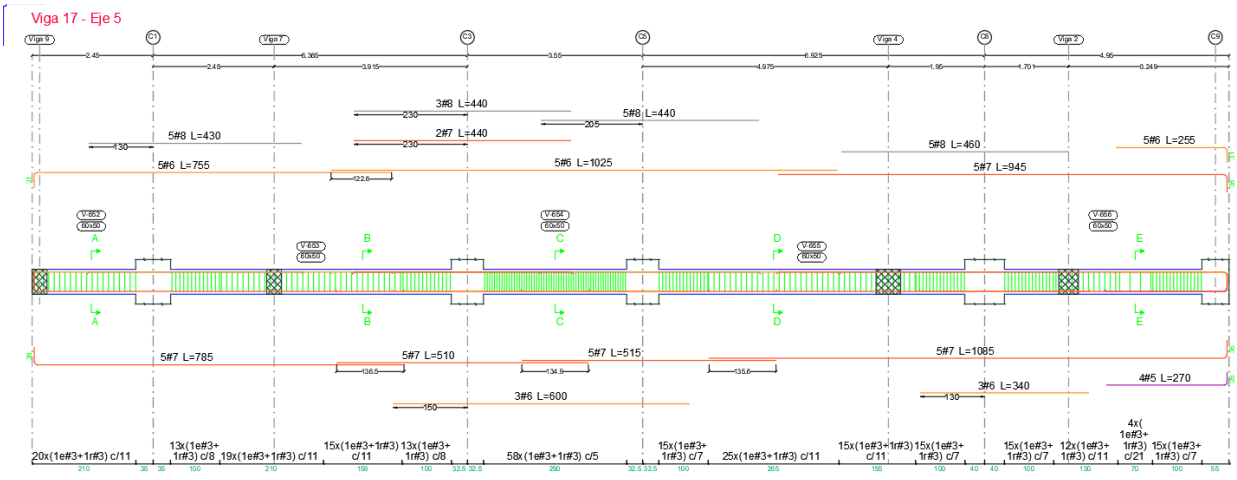


Ilustración 66.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)

DETALLE REFUERZO VIGA 5' (B-E)

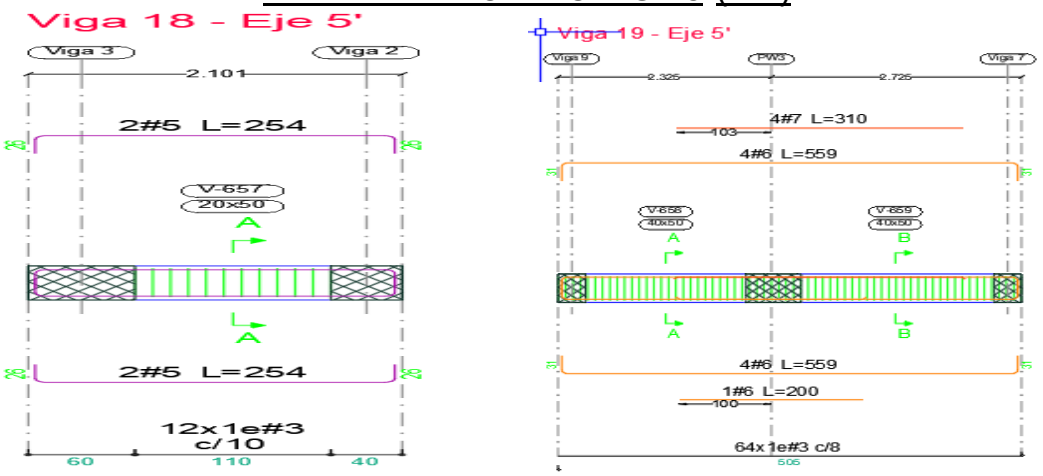


Ilustración 67. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)

- ## DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E)

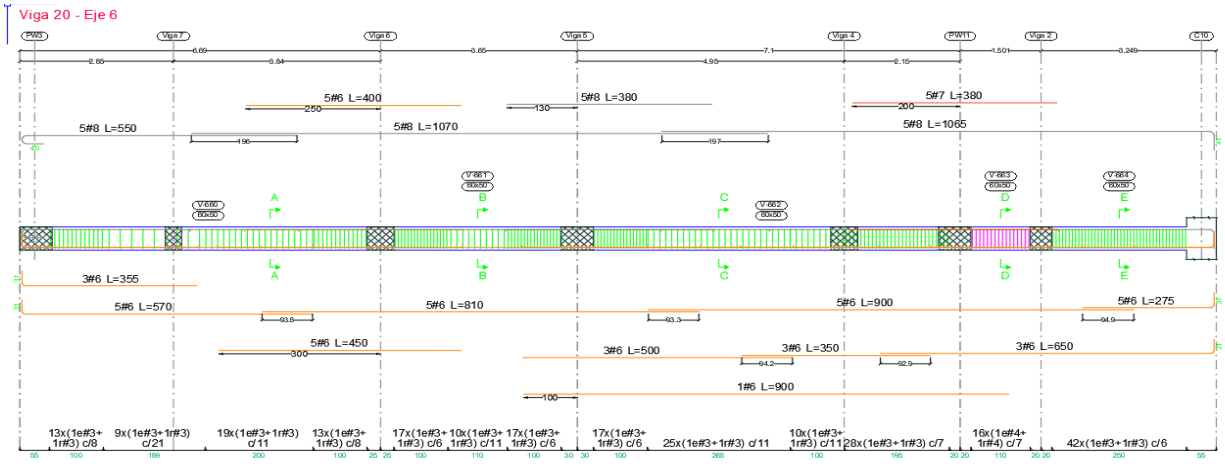


Ilustración 68. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E)

DETALLE VIGAS ENTREPISO N +27.10

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6)

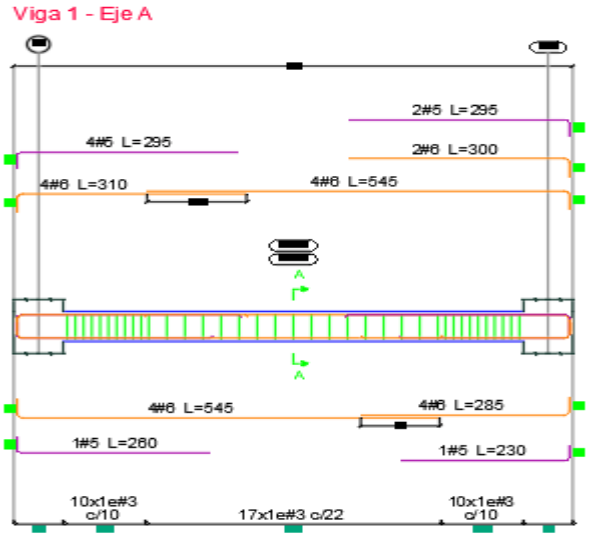


Ilustración 69. Disposición de refuerzo viga A.

- DETALLE REFUERZO VIGA A′ (5-6)

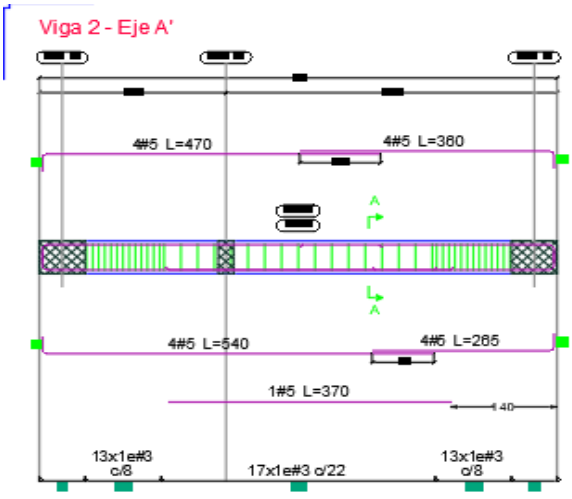


Ilustración 70. Disposición de refuerzo viga A'

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6')

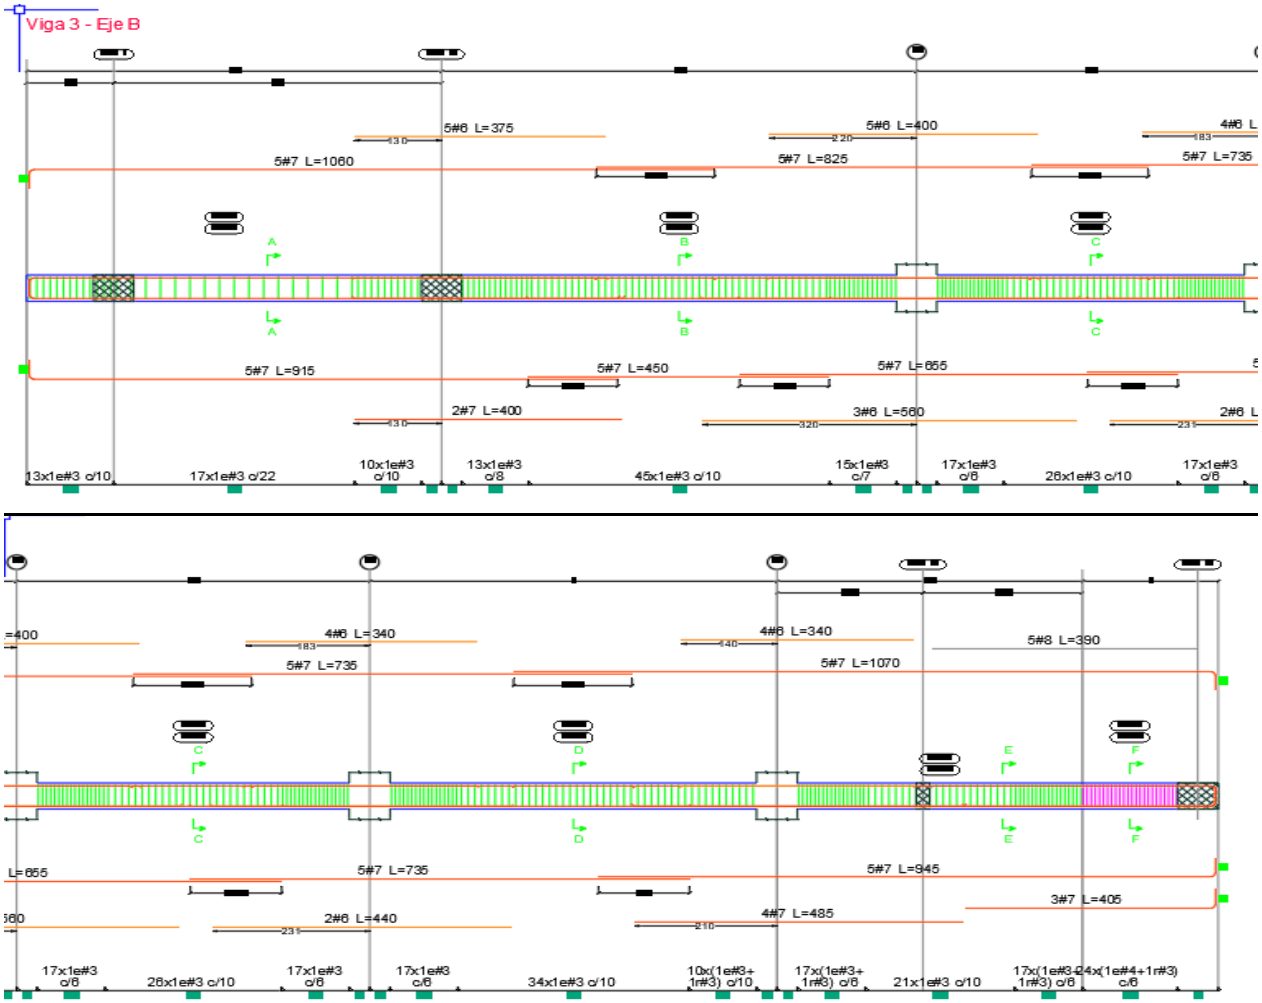


Ilustración 71. Disposición de refuerzo viga B

- DETALLE REFUERZO VIGA B* (5 -6′)

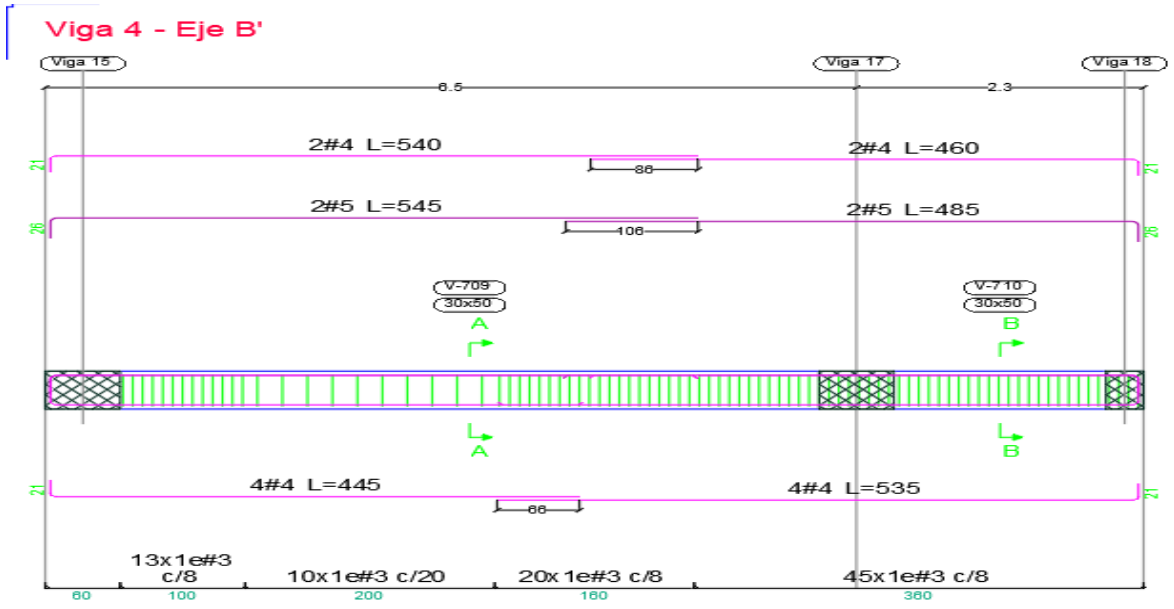
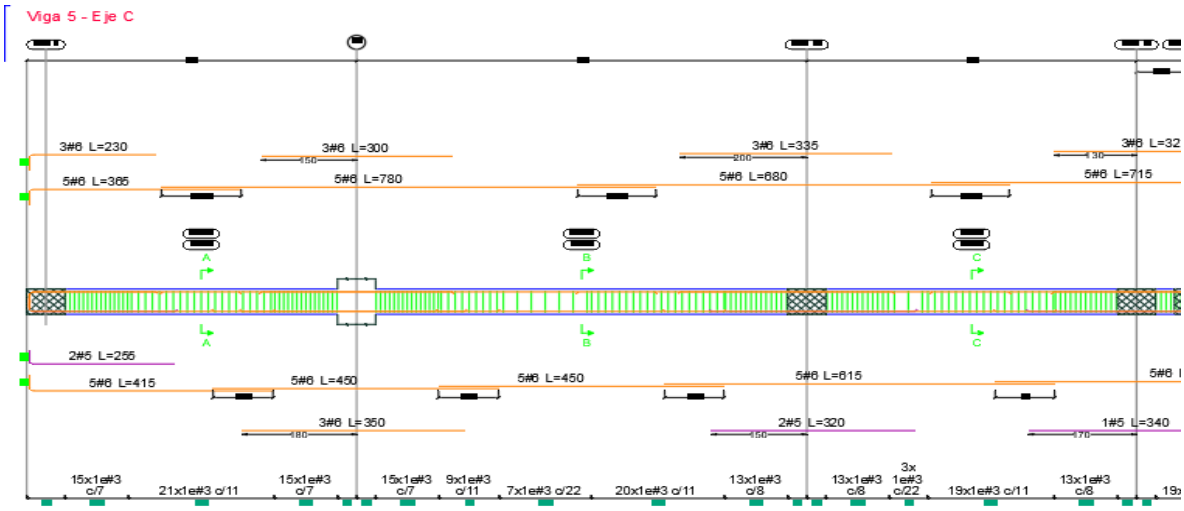


Ilustración 72. Disposición de refuerzo viga B(5-6*)*

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1′ -6′)



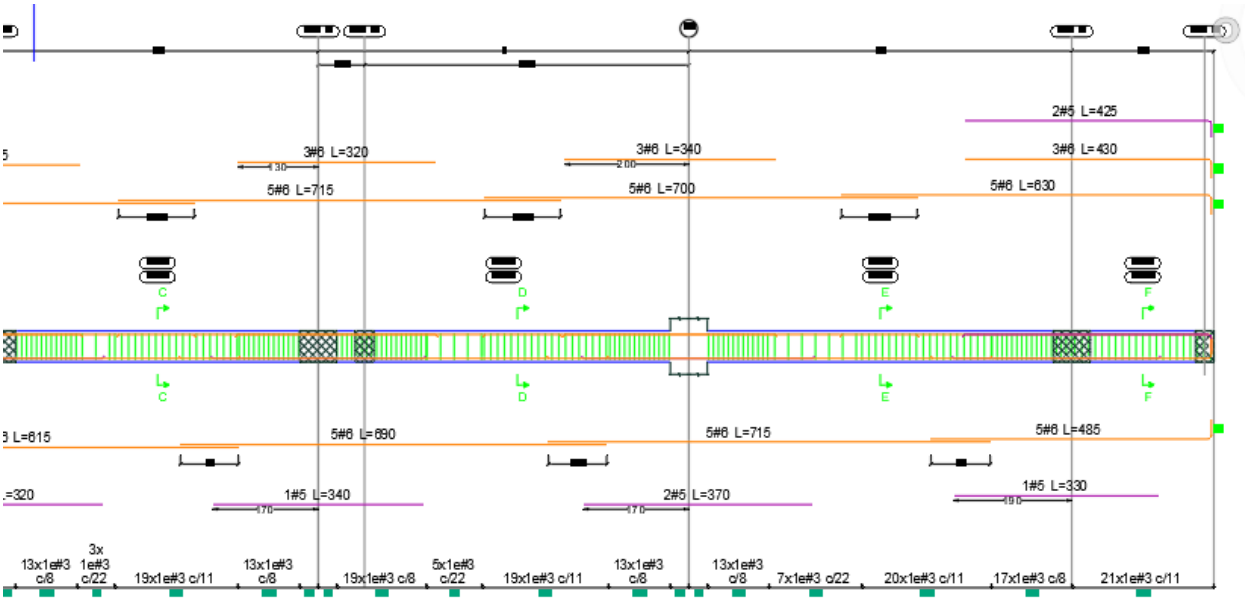
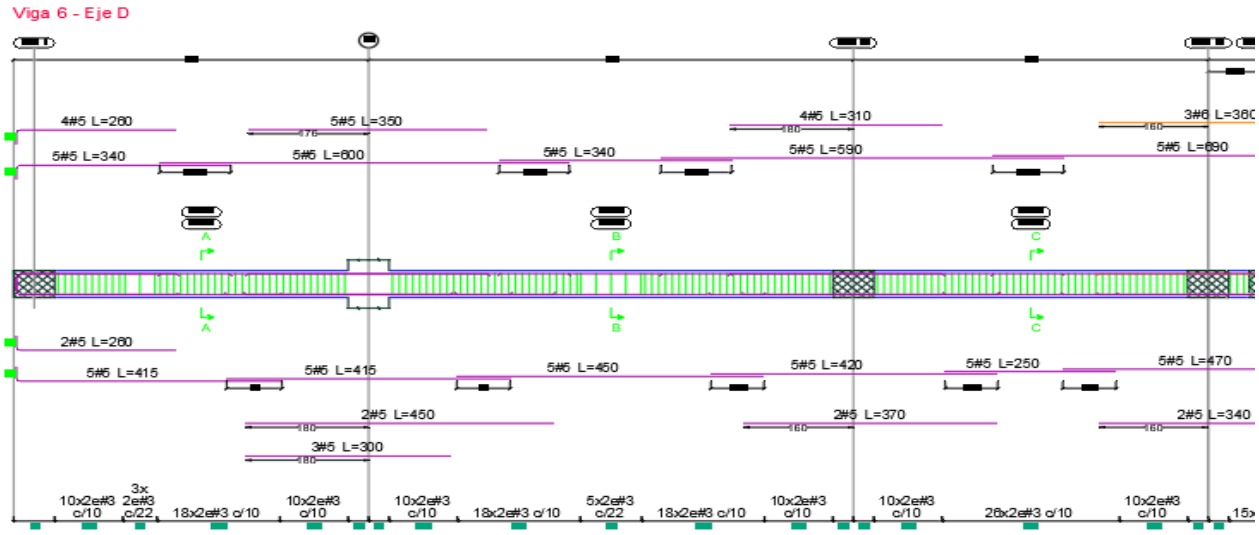


Ilustración 73. Disposición de refuerzo viga C

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2)



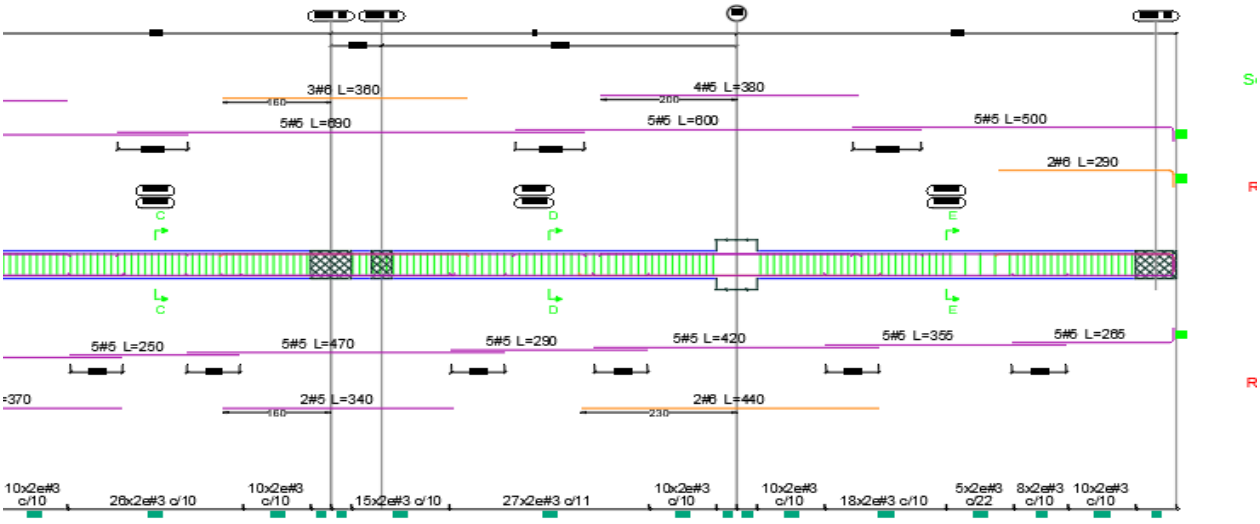


Ilustración 74. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6')

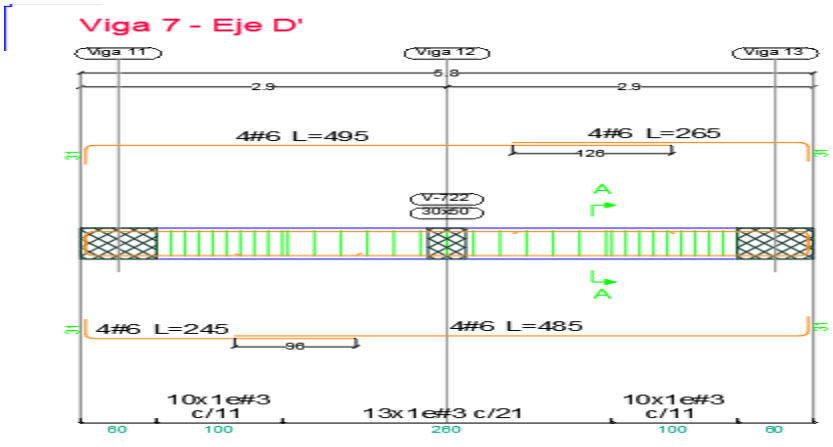


Ilustración 75. Disposición de refuerzo viga D (1'-6')

- DETALLE REFUERZO VIGA E (1- 6)

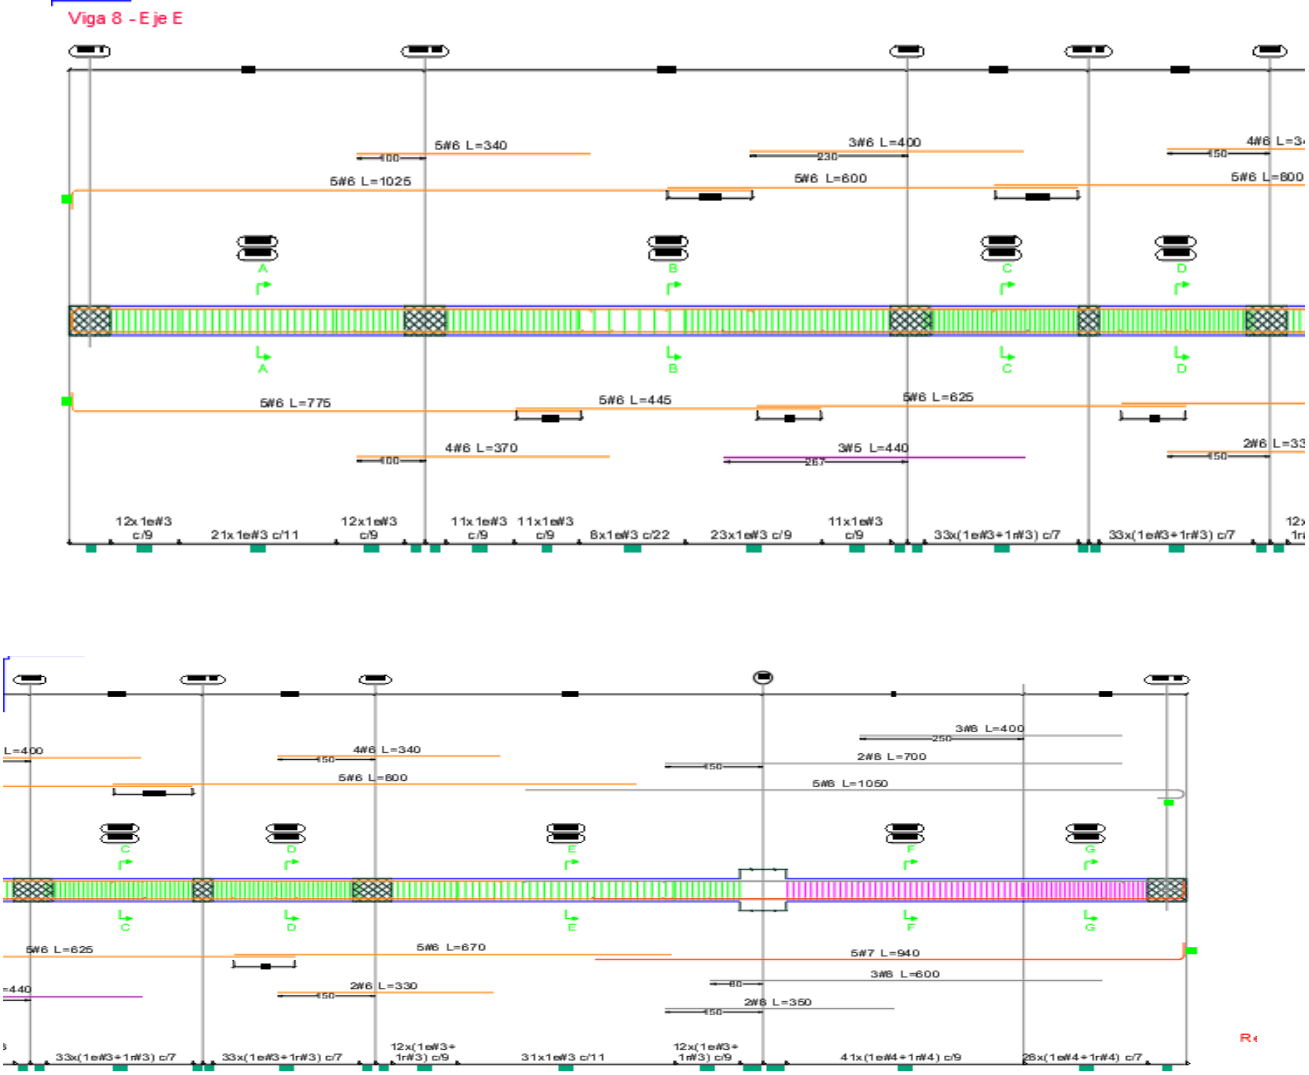


Ilustración 76. Disposición de refuerzo viga E (1-6)

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E)

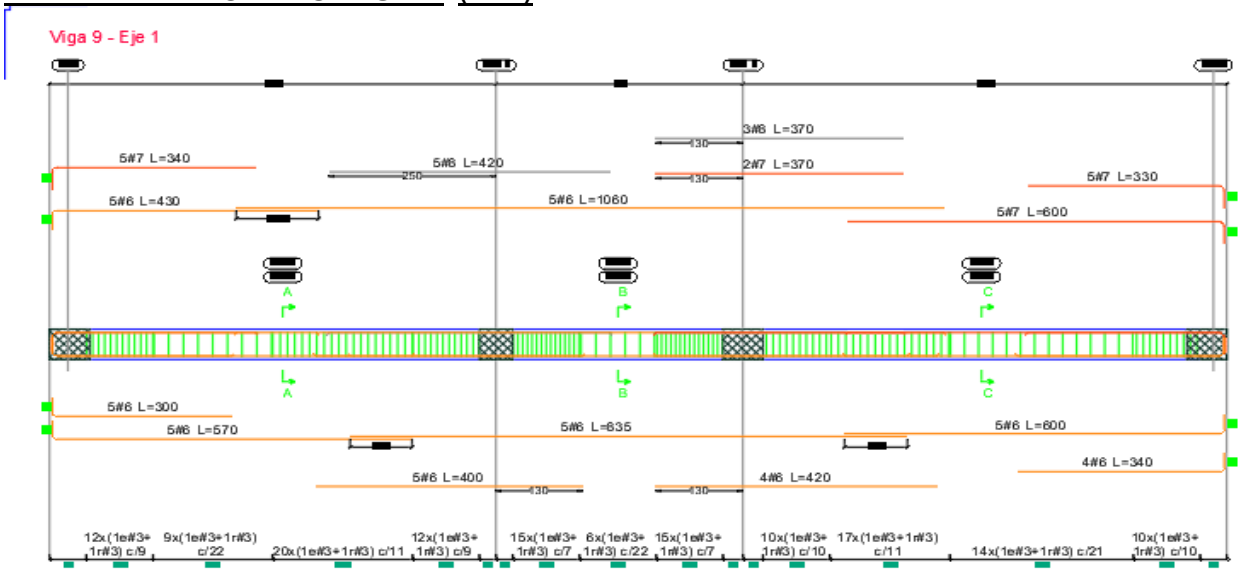


Ilustración 77. Disposición de refuerzo viga E (1-6*)*

- **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E)**

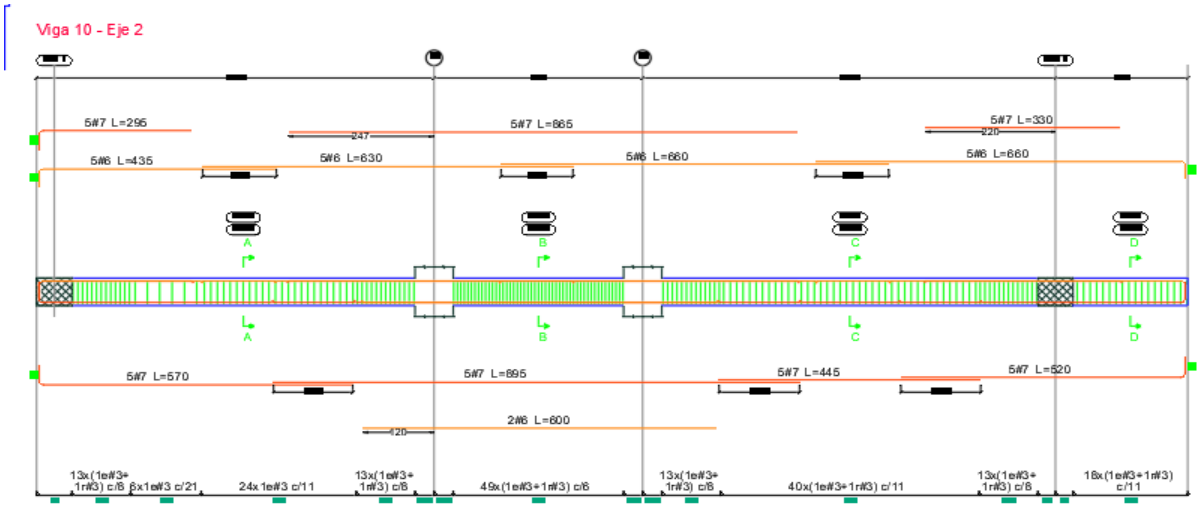


Ilustración 78. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E)

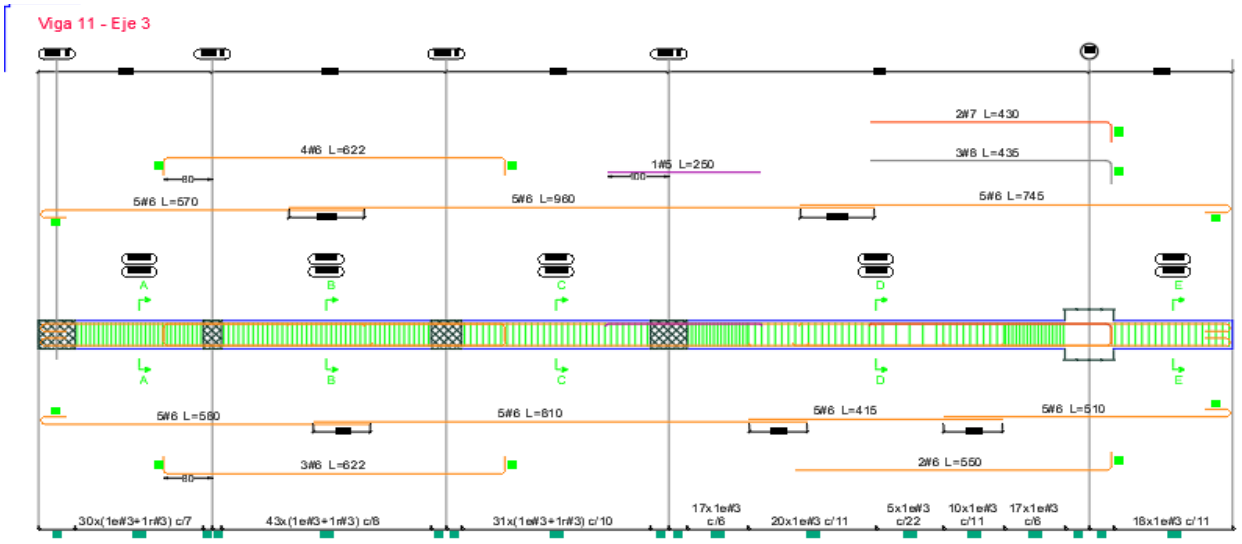


Ilustración 79. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 3* (B-E)

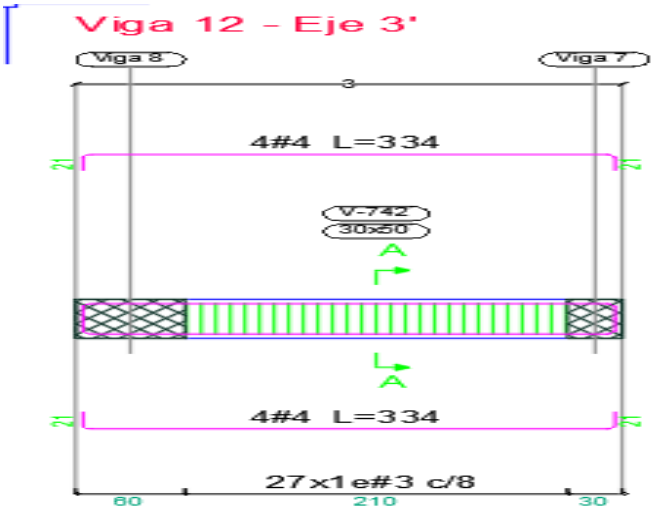


Ilustración 80. Disposición de refuerzo viga 3(B-E)*

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E)

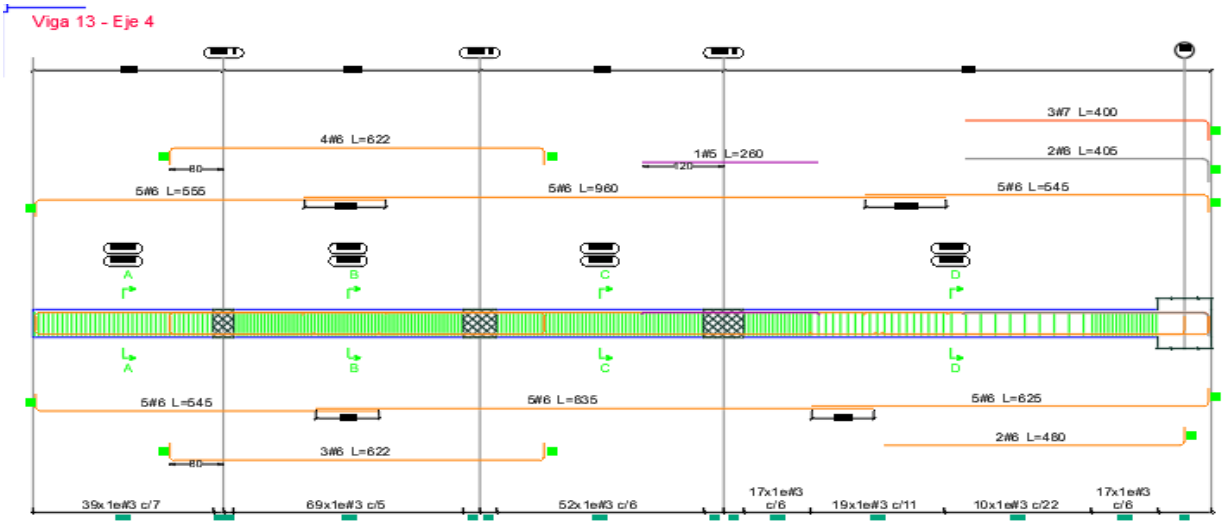


Ilustración 81. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D)

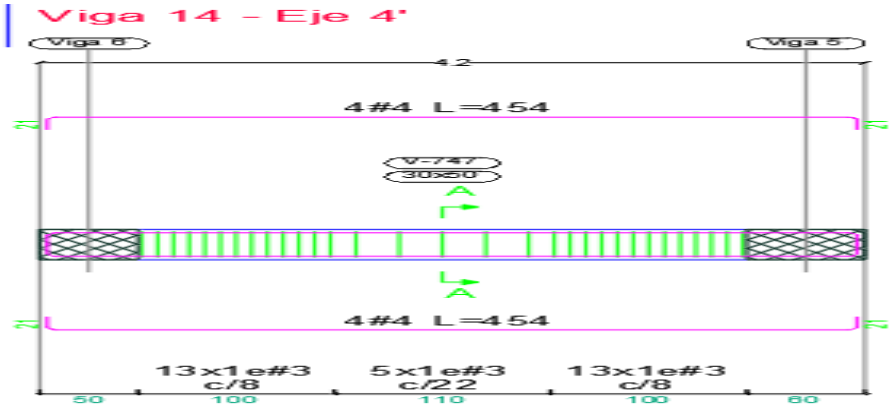


Ilustración 82. Disposición de refuerzo viga 4 (D-C)

- DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E)

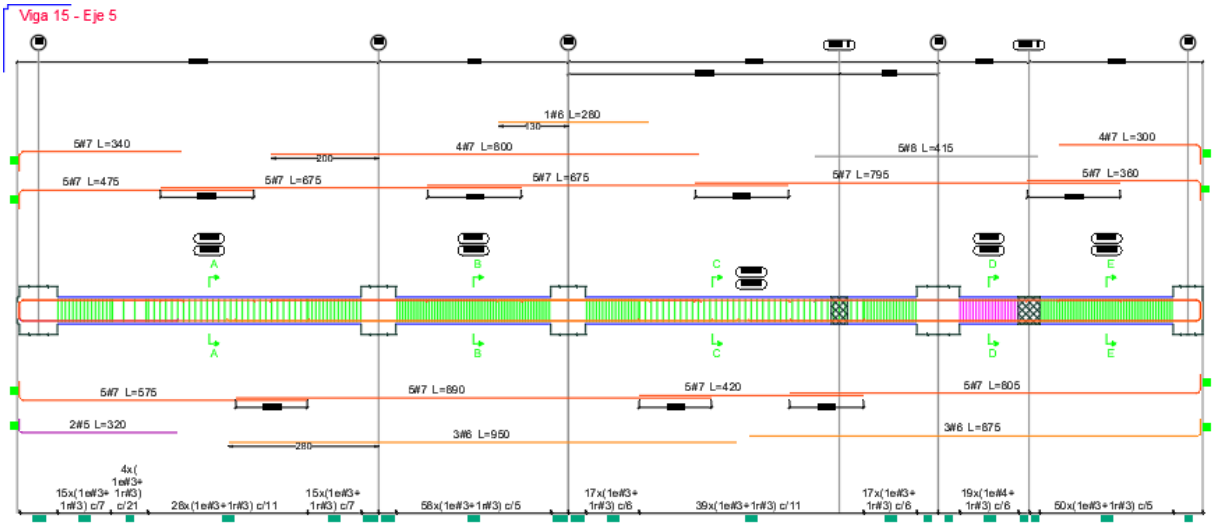


Ilustración 83.Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 5′ (B-E)

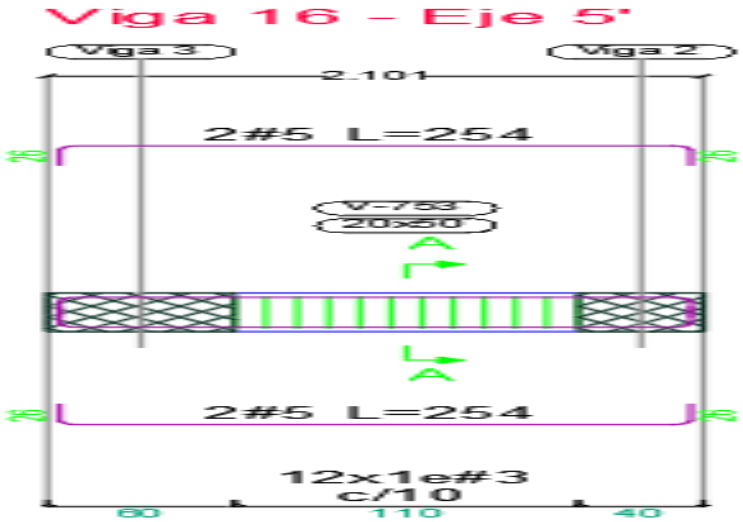


Ilustración 84. Disposición de refuerzo viga 5' (B-E)

- DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E)

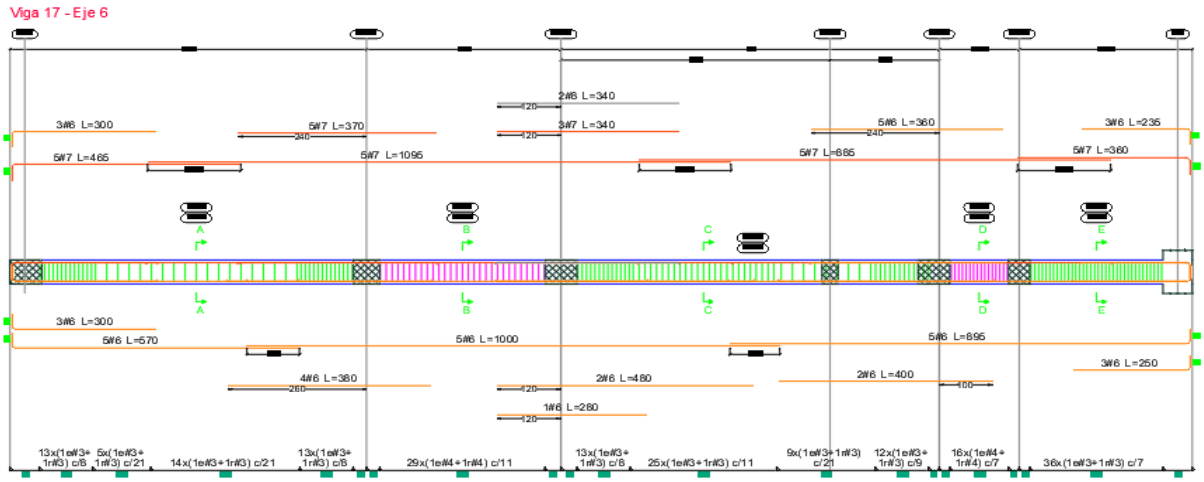


Ilustración 85. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E)

ACERO ESTRUCTURAS

REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 2 filas, acero transversal de varilla No 6 espaciado 0.20 mts dispuesto en dos filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y acero transversal de varilla N°4 dispuesto en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.

- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°5 dispuestas en 2 filas, refuerzo transversal en varilla No 5 espaciados 0.25 mts en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo transversal No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 4 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 4 en 2 filas espaciados 0.25 mts, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 7 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 6 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3 filas, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas con espaciamiento 0.15 mts, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 3, con refuerzo transversal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo transversal varilla No 6 en 2 filas espaciados 0.15 mts, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo transversal varillas No 6 en 3 filas espaciadas 0.12 mt, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la

conforman un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1¨ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO A N+23.20 y N+ 27.10

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5 y 6, en la parte inferior varilla No 5 y 6, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.

REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+23.20 y N+ 27.10

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO N+23.20

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D,D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO N+ 27.10

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D,D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

- **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso 6 N +23.20Y entrepiso 7 N +27.10, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 6.

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 6.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 6.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 6.


La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 6.


La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 6.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 6.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 6.

REGISTRO FOTOGRAFICO

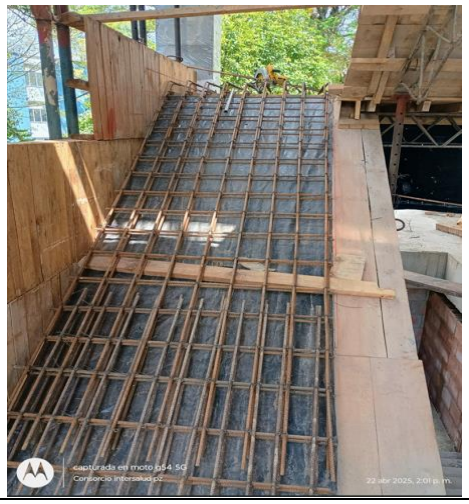

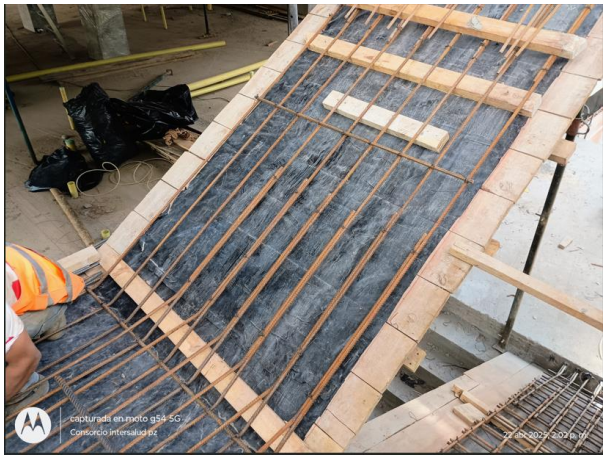

ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa GRADAS DE EMERGENCIA





ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa GRADAS CENTRALES





CONCRETO PARA ESCALERAS DE EMERGENCIAS 3000 PSI





CONCRETO PARA GRADAS CENTRALES 3000 PSI













ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa COLUMNAS

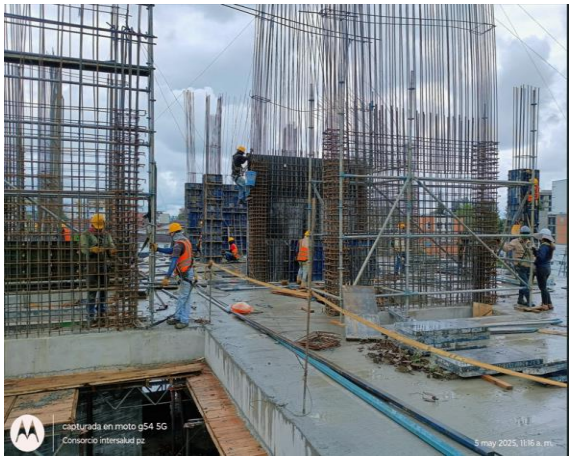


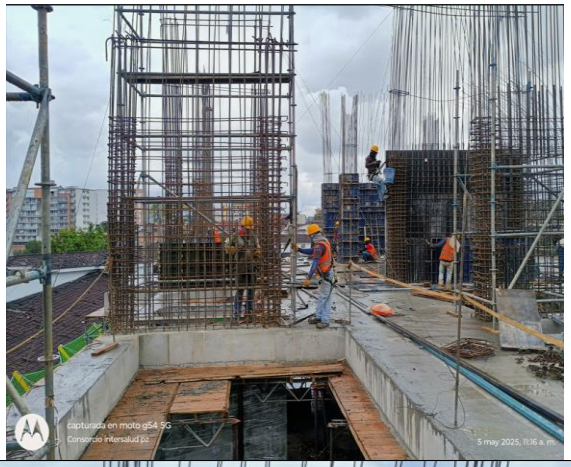


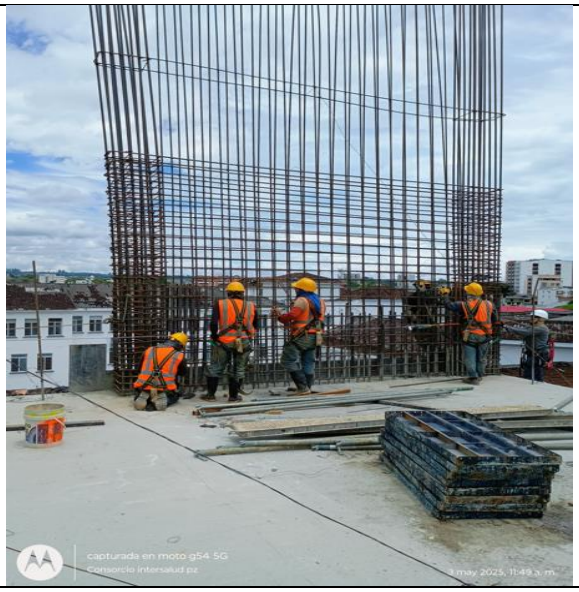

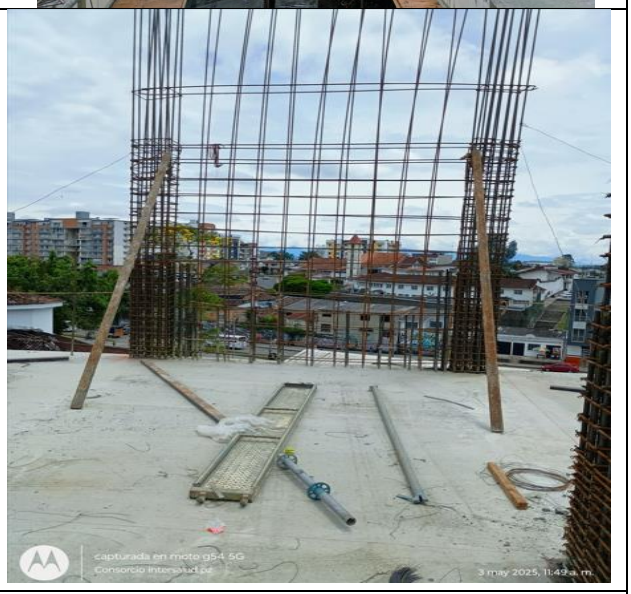

ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa PANTALLAS

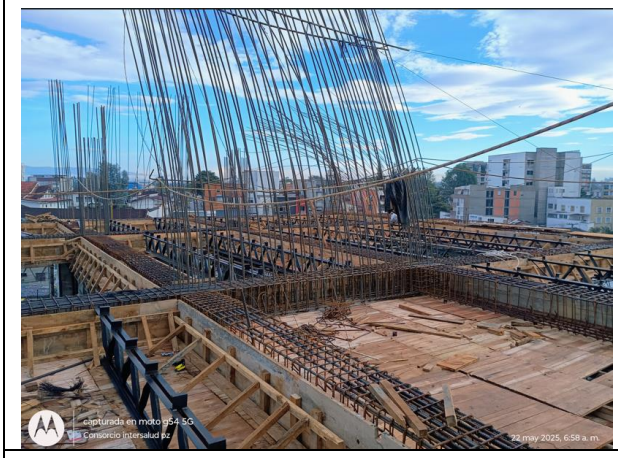

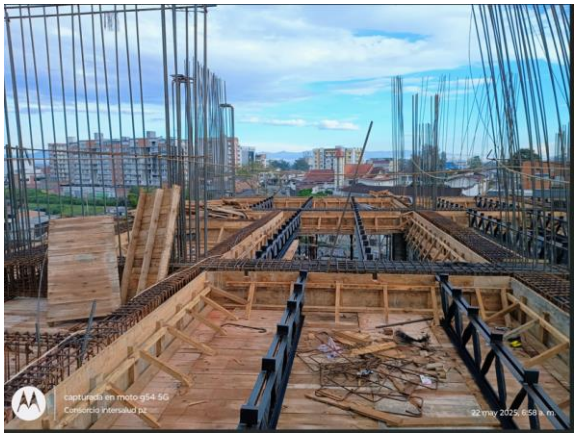

ACERO REFUERZO Fy=420 Mpa VIGAS JOIST










ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa VIGAS ENTREPISO







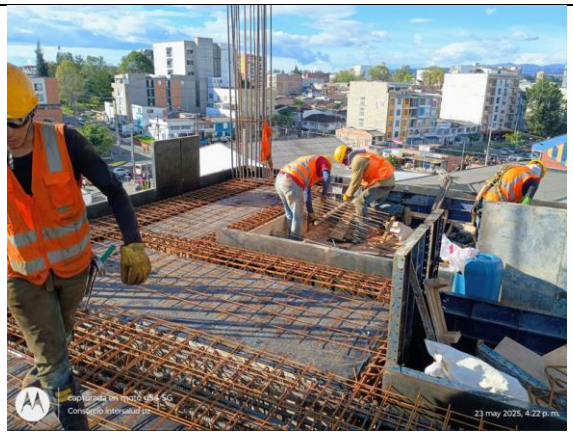


MALLAS ELECTROSOLDADAS 15X15 Fu=550MPa, Sy=485MPa








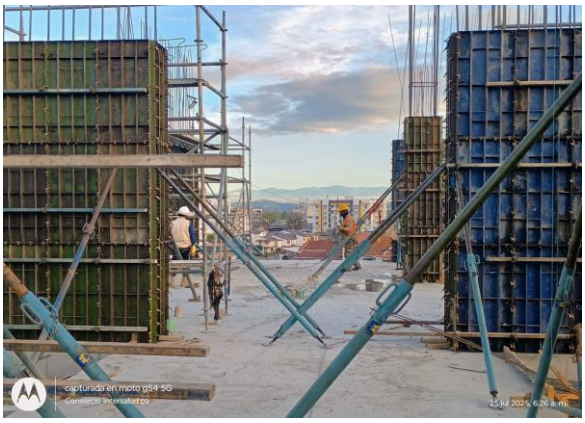

CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS



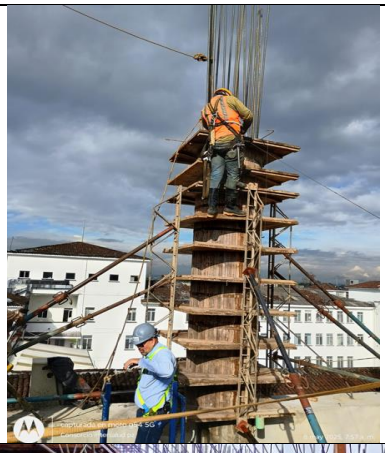






CONCRETO DE 28 Mpa PARA COLUMNAS





VISTA GENERAL



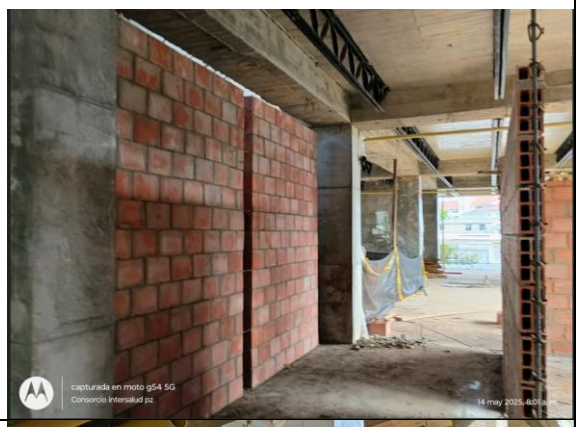






MAMPOSTERIA



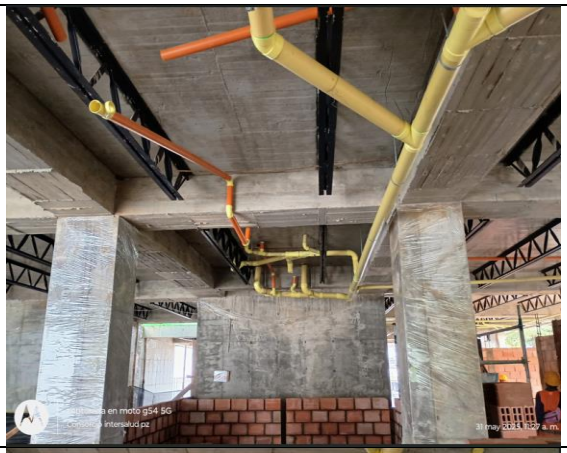





RED SANITARIA

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana N°2, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado en obra y con lo estipulado en dichos documentos.

Para la verificación y seguimiento de lo anterior se hizo uso de flexómetros y calibradores para medir directamente las dimensiones, longitudes, diámetros y espaciamientos de los elementos estructurales y el acero de refuerzo en sitio. Esto incluyó la verificación de las vigas joist, las formaletas de vigas y losas, los aceros de la malla electrosoldada, los aceros de columnas y pantallas, y los aceros de las gradas.


Para realizar el control del concreto en sitio, se realizaron ensayos de asentamiento (Slump) y toma de muestras.

- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de julio de 2025 del 34.58% frente un avance programado acumulado del 34.58%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025 es de 5% frente a un avance programado del 5%.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	$109,503,404	0.33%	$363.707.100	1.12%
30-09-2024	$858,324,856	2.16%	$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	$1.948.435.571	6.00%	$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	$2.636.884.000	8.12%	$3.049.301.893	9.39%

31-12-2024	$3.299.608.964	10.13%	$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	$4.715.214.428	14.52%	$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	$5.260.776.428	16.2%	$5.260.776.428	16.2%
25-3-2025	$6.189.530.785	19.06%	$6.423.343.071	19.78%
25-4-2025	$7.546.940.999	23.24%	$7.579.414.928	23.34%
25-5-2025	$8.917.340.785	27.46%	$8.917.340.785	27.46%
25-6-2025	$9.605.788.071	29.58%	$9.605.788.071	29.58%
25-7-2025	$11,229,484,499	34.58%	$11,229,484,499	34.58%
AVANCE	$688.447.286	5.00%	$688.447.286	5.00%

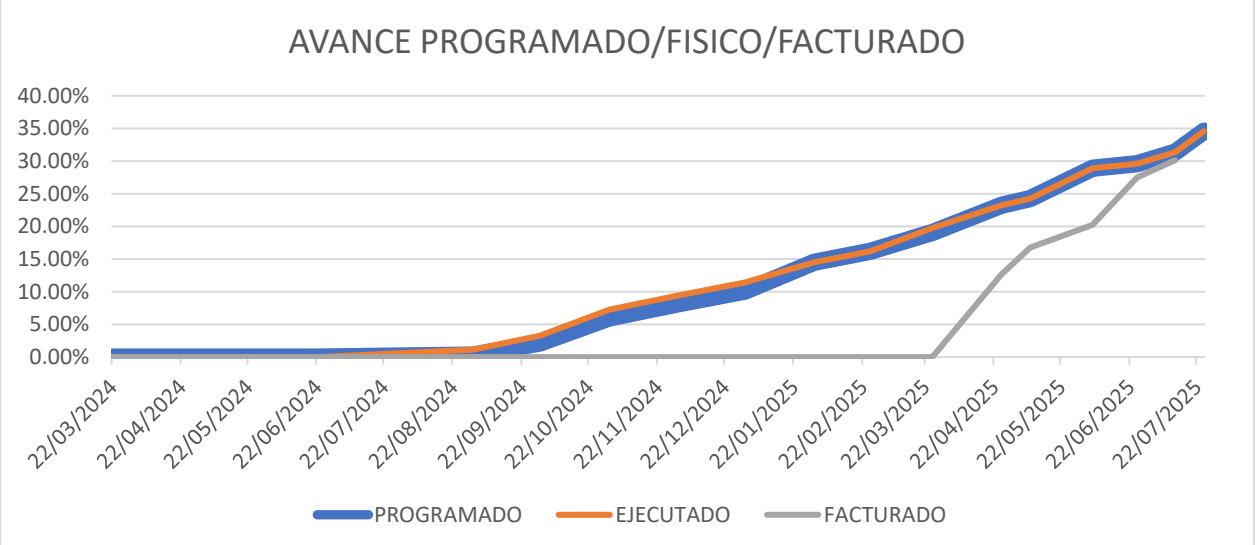

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de julio de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

AUTORIZACIONES DE PAGO		
PROVEEDOR	**VALOR/CONCEPTO**	**ITEM PLAN DE INVERSION**
1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
2. FERRETERÍA GYJ	$315.150.621 m/cte por concepto de anticipo	Materiales
3. URIEL PALTA AMA	$2.138.400 m/cte por concepto de anticipo	Transporte

4. UBANER PEREZ	$6.000.000 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
5. PEDRO ROMO	$2.073.600 m/cte por concepto de anticipo	Alquiler de equipos
6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	$182.907.980 m/cte por concepto de anticipo	Mano de obra
7.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	$521.477.881 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN	$5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo.	Materiales
9.COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S	$577.407.941 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$309.684.722 m/cte por concepto de anticipo.	Mano de obra
11. DIANA CAROLINA VIVAS	$133.865.096 m/cte	Mano de obra
12. SILOGISTICA	$103.240.000 m/cte	Transporte
13. LA ALIANZA GROUP SAS	$309.835.612 m/cte.	Mano de obra

14. UBANER PEREZ	$274.500.061 m/cte. Por concepto de anticipo	Mano de obra
15. UBANER PEREZ	$30.000.000 m/cte	Mano de obra
16. G Y J FERRETERIAS S.A.	$71.110.589 m/cte	Materiales
17. IMCOMERSA LUD SAS	$27.620.616 m/cte	
18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA	$26.064.505 m/cte	
19.EQUIPAR GLEASON	$29.741.279	Alquiler de equipos
20. SILOGISTICA S.A.S	$21.600	Transporte
21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	$1	Mano de obra
22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	$34.228	Materiales

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85,500,000.00	$ 85.500.000.00	0.02%	$ 0
2	TRANSPORTE	$ 105,400,000.00	$ 105.400.000.00	1.08%	$ 0
3	MATERIALES	$ 7,205,599,277.00	$ 7,205.599.277.00	73.23%	$ 0
4	MANO DE OBRA	$ 2,345,679,294.00	$ 2,345,679,293.00	24.08%	$ 0
	TOTAL	$ 9,742,178,571.00	$ 9,742,178,571 .00	100%	$ 0

Actualmente no se cuenta con saldo en fiducia por ningún concepto, es asi como actualmente se está realizando el proceso de liquidación.


Anexo 6. Informe de fiducia N°7


Cabe destacar que, al término del periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°4, con fecha de corte del 18 de junio de 2025, por un valor de $ 2,351,833,475 correspondiente al 7.24% del valor contractual la cual incluye cobro de Nps de la cimentación y losas de entrepiso, un acta parcial de obra No 5 con fecha de corte del 2 de julio de 2025, por un valor de $860,740,433 correspondiente al 2.65%, para un acumulado facturado de $9,788,560,522 correspondiente al 30.14%, quedando un saldo por facturar de $22,685,368,047 correspondiente al 69.86% en la cual se incluye el cobro de mayores cantidades de obra y Nps, las cuales están soportadas con el acta de modificación No 2 de mayores y menores cantidades de obra del 9 de junio de 2025 . Se realiza una

amortización del anticipo por un valor acumulado de $2,936,568,157, quedando pendiente por amortizar $6,805,610,414 del anticipo.



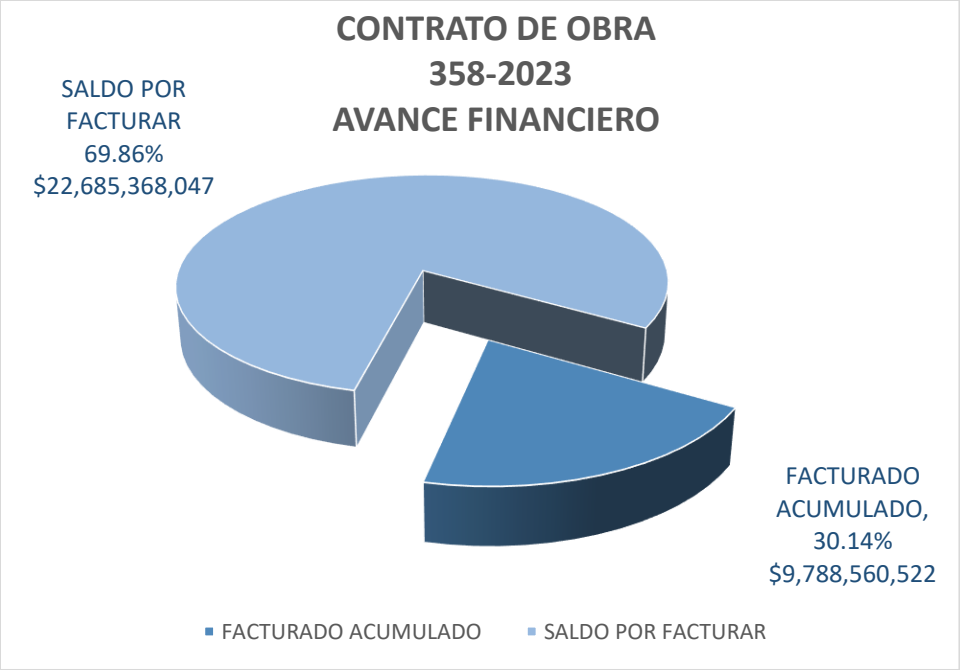


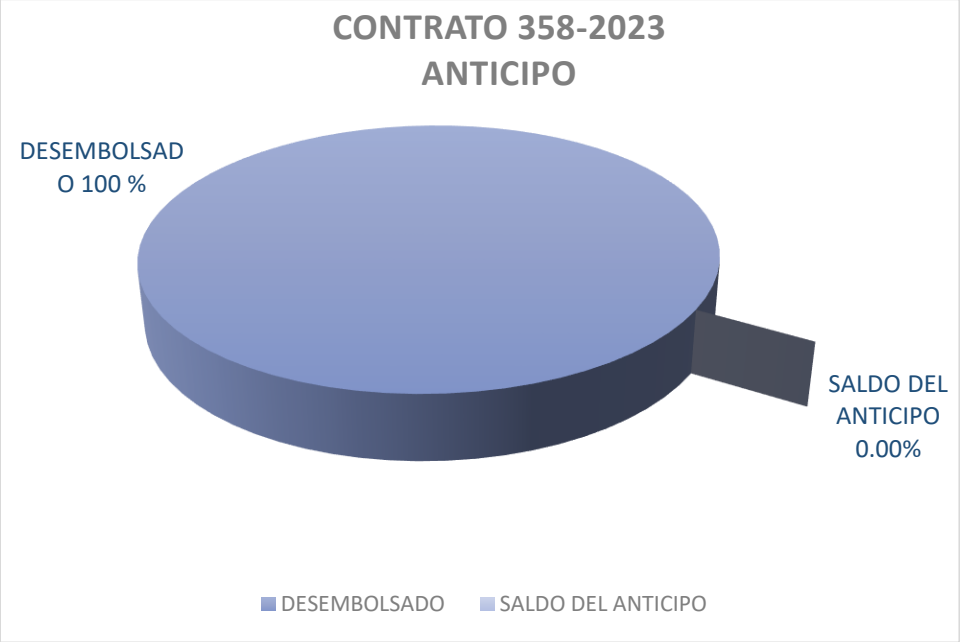

• **Desembolsado: $9,742,178,571.0 m/cte**	**Anticipo $ 9,742,178,571.00 m/cte**

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024

BALANCE A LA FECHA 25-07-2025			BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR CONTRATO PPAL		**$ 1,280,412,030**	VALOR ANTICIPO	-	-
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$ 1,280,412,030**	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	-	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 385,938,068		SALDO POR AMORTIZAR	-	
SALDO POR EJECUTAR	$ 894,459,631				
SUMAS IGUALES	**$ 1,280,412,030**	**$ 1,280,412,030**	**SUMAS IGUALES $**	**-**	**-**

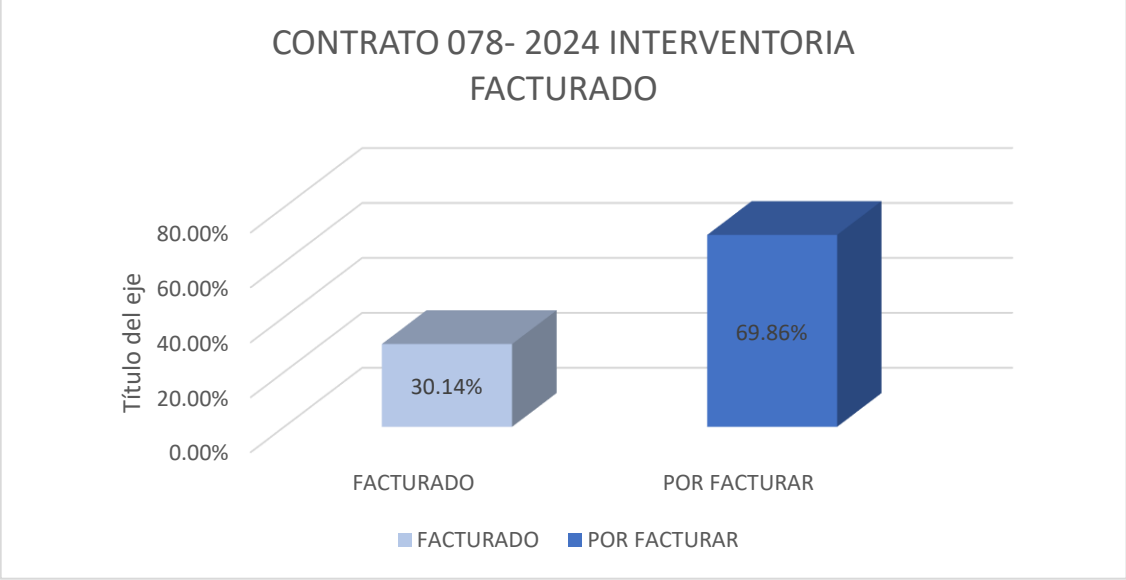

4.4. Gestión Socioambiental

Para el informe del periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025, en el componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos.

PROGRAMA No 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

La ejecución de las actividades forestales correspondientes a la tala de los individuos forestales fue ejecutada al 100% de igual manera las siembras de las plántulas establecidas en la resolución de aprovechamiento emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC.

El contratista realiza jornada de mantenimiento a los individuos forestales sembrados, las que se destacan el plateo y la aplicación de insecticida y fertilizantes para garantizar su crecimiento y defensa en contra de posibles plagas.





PROGRAMA No 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Se evidencia la presencia de recipientes para la separación de residuos sólidos conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El contratista ha dispuesto dos puntos ecológicos en la obra, uno en el sector frontal de la obra y otro es la parte superior buscando una mejora el manejo de los residuos sólidos generados en el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), el generador de residuos está obligado a garantizar una gestión integral de los mismos, lo cual incluye la recolección, separación en la fuente, almacenamiento temporal, transporte y disposición final adecuada. Así mismo, la Ley 9 de 1979 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, obligan al empleador a mantener condiciones sanitarias y ambientales seguras en los lugares de trabajo, incluyendo el manejo y disposición adecuada de residuos que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Registro fotográfico de recipientes





Por otra parte, se evidencia la instalación del nuevo punto de acopio de residuos sólidos en un nuevo punto para tal fin, sin embargo, no se ha señalizado correctamente para su identificación. Se solicitó al contratista mediante oficio CIPZ-078-0360-2025 adelantar la señalización pertinente, así como la socialización del nuevo punto al personal de obra.





En cuanto al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se evidencia la dispersión de este tipo de materiales en varios sectores de la obra, incluyendo zonas de tránsito, áreas de trabajo y espacios próximos a cerramientos provisionales, lo que no solo afecta la organización del frente de obra, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los trabajadores y una posible omisión del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Pese a lo anterior se evidencia un avance en el manejo de los RCD de obra, ya que se evacuaron la mayoría de metros cúbicos dispuesto en diferentes sectores hacia el punto de disposición final autorizado.

En cuanto al manejo de los residuos aprovechables, el contratista realiza entrega de dicho material a un reciclador de profesión, quien realiza la evacuación del material

aprovechable en varias jornadas registrando un volumen total de 15 m^3 de residuos aprovechables.



PROGRAMA No 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Durante los recorridos de seguimiento realizados por la interventoría, se constató un cumplimiento parcial en las actividades relacionadas con la gestión adecuada de los materiales de construcción, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de

Manejo Ambiental (PMA). Si bien se evidenció que gran parte del material pétreo utilizado en la obra se encuentra debidamente cubierto con plásticos o lonas impermeables, también se identificaron sectores donde dicho material permanece expuesto a la intemperie. Esta condición representa un riesgo de contaminación ambiental, ya que puede facilitar el arrastre de partículas por escorrentía superficial o su dispersión por acción del viento, especialmente durante eventos climáticos extremos como lluvias intensas o vientos fuertes.

Asimismo, se observó el almacenamiento temporal de material pétreo en proximidad a residuos de construcción y demolición (RCD), situación que puede dar lugar a contaminación cruzada por mezcla o transferencia de partículas, afectando la calidad del material y dificultando su posible reutilización a lo cual se realizó la respectiva observación y llamado de atención mediante oficio CIPZ-078-0327-2025. Esta práctica contraviene el principio de separación en la fuente establecido en la Resolución 472 de 2017, que regula la gestión integral de los RCD, y puede comprometer la eficacia del manejo diferenciado de residuos y materiales aprovechables, además de representar una omisión en los protocolos de calidad del proceso constructivo.

No obstante, se resalta positivamente la organización observada en el almacenamiento de bloques, acero de refuerzo, formaletas y otros insumos constructivos, los cuales se encuentran dispuestos de manera ordenada en áreas de bajo tránsito peatonal y vehicular dentro del frente de obra. Esta disposición favorece la circulación segura del personal, reduce la posibilidad de accidentes y está alineada con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que exige la implementación de medidas preventivas y condiciones mínimas de seguridad en entornos laborales.


En este sentido, se recomienda al contratista fortalecer las acciones de protección y cobertura de materiales que aún se encuentran expuestos, así como reubicar el material

pétreo en zonas separadas de los puntos de acopio de RCD, garantizando la adecuada segregación según el tipo de material. Estas acciones deben desarrollarse en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 y del PMA del proyecto. Adicionalmente, se sugiere implementar mecanismos de control y seguimiento periódico, señalización clara en las áreas de almacenamiento, y procesos continuos de capacitación al personal sobre buenas prácticas en el manejo, acopio y preservación de materiales de construcción, con el fin de asegurar tanto la eficiencia operativa como el cumplimiento ambiental y normativo.

El contratista realiza capacitación al personal de obra sobre el manejo de ruido al cual manifiestan la participación de 30 colaboradores. La capacitación fue dirigida por Elsa Merlene Osorio con el acompañamiento del equipo de SST del contratista.





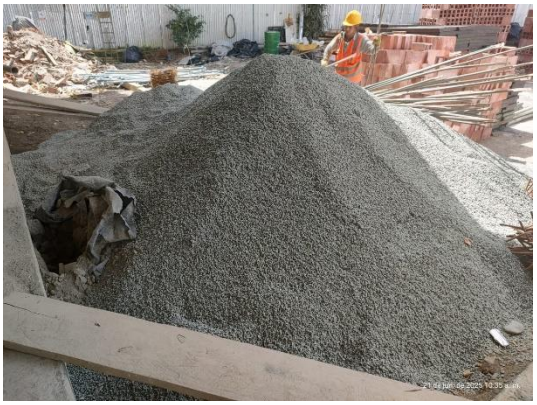








17 de julio de 2025, 7:06:16 a.m.
N 270967 E 322152
128° SE
Carrera 5 13 NORTE-36
Popayán 190002
Cauca
Altitud:1736.6meter
Velocidad:2.6km/h


17 de julio de 2025, 7:05:57 a.m.
N 270967 E 322152
210° SW
Carrera 5 13 NORTE-36
Popayán 190002
Cauca
Altitud:1736.9meter
Velocidad:1.0km/h

PROGRAMA No 4 PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

En cuanto a las acciones orientadas a la protección del recurso suelo, se observó la colocación de material plástico tipo poliuretano en sectores específicos del frente de obra. Esta medida contribuye tanto a la conservación del suelo natural como a la protección de los materiales de construcción frente a condiciones climáticas adversas, lo cual representa una práctica preventiva alineada con las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y constituye una acción efectiva para mitigar impactos sobre el componente edáfico.

De igual manera, durante los recorridos de seguimiento no se identificó presencia ni almacenamiento de residuos peligrosos (RESPEL) que puedan representar posibles riesgos de contaminación del suelo por derrames, lixiviación o manejo inadecuado. Esta situación sugiere que las sustancias peligrosas como aceites, combustibles, pinturas o solventes están siendo gestionadas de forma adecuada, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 99 de 1993, la Ley 1252 de 2008 y el Decreto 1076 de 2015, normativas que regulan la prevención de la contaminación ambiental y el manejo de residuos peligrosos.

Sin embargo, se recomienda al contratista reforzar las acciones preventivas para minimizar cualquier posibilidad de afectación, mediante la impermeabilización de áreas de almacenamiento de productos químicos, la señalización y demarcación clara de zonas críticas, así como la implementación de controles periódicos que permitan verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1362 de 2007 (sobre gestión de RESPEL) y la Resolución 0312 de 2019 (relativa a condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción).





PROGRAMA No 5: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.

Durante el periodo reportado, no se registraron visitas por parte de universidades, centros académicos u otro tipo de personal externo a la obra. No obstante, se constató que el contratista mantiene disponibles los elementos de protección personal (EPP), como cascos, chalecos reflectivos y, en algunos casos, gafas de seguridad, almacenados adecuadamente en un área de fácil acceso y en condiciones óptimas para su utilización inmediata. Esta preparación evidencia un enfoque preventivo y el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos para el ingreso de personas externas, ya sea de manera programada o imprevista.

Esta práctica está en concordancia con lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que establece los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre ellos, la entrega obligatoria de EPP a cualquier persona que ingrese a zonas con posibles riesgos laborales. Asimismo, se ajusta a los principios del Decreto 1072 de 2015, el cual contempla la responsabilidad de proporcionar ambientes seguros para todos los trabajadores y visitantes.

Adicionalmente, se verificó la disponibilidad de un botiquín de primeros auxilios tipo B, dotado con los insumos médicos básicos exigidos por la normativa, una camilla rígida para la movilización de personas lesionadas, un extintor con su carga vigente y señalización correspondiente, y una reserva de EPP para su uso inmediato en situaciones de emergencia.

Se sugiere al contratista continuar con la actualización permanente de los protocolos de ingreso, implementar un sistema de registro de visitantes y fortalecer las inducciones en seguridad dirigidas a terceros. Estas acciones contribuirán al cumplimiento de la normativa aplicable y a la prevención de incidentes en caso de visitas técnicas, académicas o institucionales a la obra.

PROGRAMA No 6. REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto. Sin embargo, continúan en funcionamiento los canales de comunicación previamente establecidos para garantizar la atención oportuna de inquietudes, sugerencias y reclamos de la ciudadanía. Entre estos mecanismos se destaca el correo electrónico habilitado por el contratista, el cual permanece activo para recibir mensajes en cualquier momento, así como el buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), instalado en el acceso principal de la obra, claramente identificado y accesible para los habitantes del sector cercano.

Estas alternativas permiten mantener el vínculo con la comunidad y asegurar el ejercicio del control social y la supervisión sobre el desarrollo del proyecto, incluso en aquellos momentos en los que no se programan espacios de interlocución directa. Es fundamental continuar incentivando la participación ciudadana mediante la difusión constante de estos

canales a través de medios impresos y digitales, con el acompañamiento de las autoridades locales y líderes comunitarios.

Adicionalmente, se sugiere fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de los medios de participación, a través de un registro organizado de las comunicaciones recibidas, la identificación de temas frecuentes, el análisis de las inquietudes manifestadas y la respuesta oportuna, clara y documentada a cada una. Esta práctica no solo da cumplimiento al Plan de Manejo Social y Ambiental del proyecto, sino que también fomenta la confianza comunitaria y el principio de transparencia y rendición de cuentas, en concordancia con la Ley 1757 de 2015 sobre participación ciudadana y el Decreto 1077 de 2015, en lo relativo a la gestión de proyectos de infraestructura con implicaciones sociales.

Finalmente, se sugiere evaluar la posibilidad de reanudar encuentros presenciales o virtuales en los siguientes periodos, siempre y cuando las condiciones logísticas y de seguridad lo permitan, con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la comunidad y promover una gestión social participativa e incluyente. Se ratifica que el canal para la atención de PQRs continúa abierto y disponible para la comunidad.



PROGRAMA No 7. SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el periodo evaluado, se constató la instalación de barreras físicas de seguridad en los niveles 2, 3 y 4 de la estructura, así como la implementación de mallas de protección destinadas a prevenir la caída de objetos desde altura. Estas medidas han sido adoptadas por el contratista como parte de las acciones preventivas orientadas a la reducción de posibles riesgos en actividades de trabajo en altura, protegiendo tanto al personal operativo como a terceros que puedan transitar por zonas cercanas a la obra.

Estas intervenciones corresponden a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y cumplen con los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), particularmente en lo relacionado con la prevención de accidentes laborales y el control de peligros asociados a la ejecución de obras civiles.

Adicionalmente, se observaron cerramientos perimetrales en diferentes áreas del proyecto, los cuales buscan restringir el acceso a zonas de alto riesgo, delimitando

adecuadamente las áreas de intervención activa. Estos cerramientos permiten mantener un entorno más seguro y organizado dentro del frente de trabajo, y evidencian una gestión adecuada del riesgo por parte del contratista.

Se recomienda continuar con la implementación y mantenimiento de estas medidas de seguridad, así como realizar inspecciones periódicas para verificar su efectividad, estabilidad y correcto uso. De igual manera, es pertinente reforzar los procesos de sensibilización y formación del personal en temas de prevención de posibles riesgos, conforme a lo estipulado en la Resolución 1409 de 2012, relacionada con trabajo seguro en alturas, y demás normas aplicables en materia de seguridad industrial.

A continuación, se presenta registro fotográfico que da cuenta de las acciones descritas.









PROGRAMA No 8 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Se observa un avance significativo en la gestión de las aguas estancadas que, en periodos anteriores, se acumulaban en el área lateral contigua al Hospital San José, específicamente en el sector donde se encontraban ubicados los asesores de la torre. La interventoría verificó una reducción notable en el volumen de agua retenida, así como el retiro de residuos sólidos presentes en dicha acumulación, lo cual representa una mejora frente a las condiciones previamente reportadas.

No obstante, se recomienda al contratista intensificar las labores de drenaje en esta zona, con el fin de asegurar el secado completo de la fosa y evitar posibles afectaciones por proliferación de vectores, generación de malos olores o deterioro de las condiciones del terreno. La continuidad en estas acciones contribuirá a mantener condiciones ambientales y sanitarias adecuadas en el entorno de la obra, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en concordancia con la normatividad vigente en materia de salud pública y control de aguas residuales.





SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE JULIO DE 2025

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, es requisito fundamental contar con la aprobación oficial del documento PMA. A la fecha, dicho documento aún se encuentra en proceso de ajustes por parte del contratista, lo que ha impedido su validación final por parte de la interventoría y las autoridades competentes.

Si bien se ha evidenciado la ejecución de varios programas y actividades ambientales en el área del proyecto, la ausencia de un PMA aprobado impide definir con precisión los indicadores, metas y cronogramas oficiales que permitan medir objetivamente el nivel de cumplimiento. En consecuencia, hasta tanto no se cuente con la versión definitiva y avalada del PMA, no es posible establecer porcentajes formales de avance en la ejecución de los compromisos ambientales.

Esta situación resalta la importancia de agilizar el proceso de revisión y ajuste del documento, ya que su aprobación no solo es una exigencia normativa, sino que también

es una herramienta clave para el seguimiento técnico, el control ambiental del proyecto y la toma de decisiones informadas frente a la gestión de impactos.

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 21 mayo al 20 de junio 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL		
No.	**NORMATIVA**	**ASPECTO LEGAL**
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales correponden al pago del mes de Junio 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación,

se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9488037203	JUNIO	01/07/2025	5	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL					
2	9488038973	JUNIO	2025/07/01	9	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION **este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL**					
3	948755120	JUNIO	2025/06/20	1	APORTES EN LINEA
4	9487770775	JUNIO	2025/06/26	1	APORTES EN LINEA
5	9487556220	JUNIO	2025/06/020	1	APORTES EN LINEA
6	7973211451	JUNIO	2025/06/20	1	SOI
7	9486239024	JUNIO	2025/07/1	1	APORTES EN LINEA
8	9488051008	JUNIO	14/07/2025	1	APORTES EN LINEA
9	9486296749	JUNIO	2025/06/26	1	APORTES EN LINEA
10	4606301088	JUNIO	2025/06/26	1	SOI
11	9487787725	JUNIO	2025/07/1	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION					
13	9488098600	JUNIO	3/07/2025	1	APORTES EN LINEA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ					
14	9488144503	JUNIO	2025/07/03	24	APORTES EN LINEA
15	INGRESOS	JUNIO		**0**	
16	RETIRO	JUNIO		3	
CONTRATISTA- TOPOGRAFIA					

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
17	9488033103	JUNIO	2025/07/01	2	
CONTRATIST- TOPOGRAFIA- INDEPENDIENTE					
18	INDEPENDIENTE	JUNIO		0	**SIN NOVEDAD**
19	INGRESOS	JUNIO		0	**SIN NOVEDAD**
20	RETIRO	JUNIO		0	**SIN NOVEDAD**
CONTRATISTA- MAMPOSTERIA1-2-3					
21	TRABAJADORES	JUNIO		9	
22	INGRESO	JUNIO		2	**SIN NOVEDAD**
23	RETIRO	JUNIO		2	**SIN NOVEDAD**
CONTRATISTA- HIDROSANITARIAS					
24	9488311156 - 9488311146	JUNIO	4/07/2025 - 2025/07/04	5	SE PRESENTAN PLANILLAS ARL, PENDIENTES SALUD Y PENSION DE 3 CONTRATISTAS
25	INGRESO	JUNIO		1	**SIN NOVEDAD**
26	RETIRO	JUNIO		2	**SIN NOVEDAD**
TOTAL				**65**	

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
1	WILINSON ANDRES QUILINDO CHARO	1.007.410.693	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

2	HARLEY RUIZ GAVIRIA	76.323.117	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
3	JUAN CARLOS MENESES ARBOLEDA	1.004.248.033	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
4	JOSE REINEL CONEJO SANCHEZ	4789024	AIC	PORVENIR	SURA	
5	DIANA MAGALI ARANGO CORREA	1.144.138.374	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
6	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10.302.884	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
7	CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES	34.328.843	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
8	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
10	LORENA FALLA FALLA	1.019.092.020	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
11	JULIO CESAR MAYA BASTIDAS	98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
12	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
13	ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ	34.533.693	SANITAS	PENS VEJ ACT	SURA	N/A
14	JULIAN ANDRES SANCHEZ SANTACRUZ	76.332.823	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO						
0	SIN NOVEDAD					
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- RETIRO						
0	SIN NOVEDAD					
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP						
15	PEREZ GOMEZ UBANER	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**

16	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
17	LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
18	MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
19	ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES	1081595473	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
20	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
21	WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
22	WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
23	WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
24	DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
25	JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
26	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
27	CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
28	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
29	CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
30	JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
31	ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
32	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
33	OBER FERNEY SANCHEZ SOL	1061761500	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
34	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
35	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
36	JAMES ANDRES ADRADA MARTINEZ	1061017769	SANITAS	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
37	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76334379	SANITAS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
38	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
39	PAULINO ANGULO MUÑOZ	76336476	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS						
40	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
41	RAUL LOZADA BERMEO	1117839679	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

42	KLEIN JAWER CRUZ BURBANO	1061738571	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA TOPOGRAFIA						
43	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
44	FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- INGRESO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA TOPOGRAFIA- RETIRO						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
45	JAIME JUNIAN MUÑOZ GUASAMALLI	4.617.575	SURA	COLPENSIONES	SURA	
46	JOSE CLAUDIO IETER RENGIFO	76.190.347	ASMED SALUD	COLPENSIONES	SURA	
47	LUISA FERNANDA MORENO ORTEGA	1.088.651.098	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	
48	ROLANDO BURBANO CALIBIO	15.571.993	SANITAS	PORVENIR	SURA	
49	FERNANDO ANDRES CHACON CABARICO	1.130.607.657	SANITAS		SURA	
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- INGRESOS						
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA – HIDROSANITARIA- RETIROS						
50	HAROLD EVER ZAPATA VALENCIA	10.593.026	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	HAROLD EVER ZAPATA VALENCIA
51	ARLIN COLLAZOS TROCHEZ	1.060.868.818	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ARLIN COLLAZOS TROCHEZ
CONTRATISTA - MAMPOSTERIA						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA						
52	WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO	76.325.832	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
53	JESUS EDUARDO GUERRERO VIERA	PPT 5403220	NUEVA EPS		POSITIVA	
54	WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO	76.325.832	SANITAS	PORVENIR	SURA	
55	JESUS EDUARDO GUERRERO VIERA	PPT 5403220	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
56	FRANCISCO JAVIER URIBE VALENCIA	1.061.707.344	SANITAS	PORVENIR	SURA	
57	CARLOS ALBERTO SANCHEZ VELASCO	1061705861	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
58	JESUS ALDEMER VELASCO GARZON	1.002.960.492	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
59	JULIO CESAR DORADO MUÑOZ	1061817436	ASMED SALUD	COLPENSIONES	SURA	
60	OLIVER ISAI DORADO MUÑOZ	1118308478	SOS	PORVENIR	SURA	
61	JOSE GUILLERMO GUZMAN OROZCO	10.296.024	SANITAS		POSITIVA	

CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- INGRESO						
62	EDINSON EDUARDO PAZ MENA	10611710033	ASMED SALUD	PORVENIR	SURA	
63	EDWIN OSWALDO VELASCO HURTADO	1.061.693.732	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- RETIRO						
64	JESUS ALBERTO MONCAYO MUÑOZ	1061693041	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	
65	RICHARD ANDRES PIAMBA OSORIO	1058547640	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	
TOTAL 65						

RELACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO

CONTRATISTA – ALKIEQUIPOS DEL CAUCA L&L SAS						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
	SIN NOVEDAD					
CONTRATISTA - FABIO HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ						
	SIN NOVEDAD					
TOTAL 3						

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	7
Antiguo	52
Retiro	5
Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuente para los datos estadísticos)	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	**65**
TOTAL, DE PERSONAL SIN PERSONAL TRANSITORIO	**65**

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ \ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ \ de\ trabajadores\ contratados}\frac{13}{13}\ X100\ \ = \mathbf{100}\%$

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los siguientes ingresos:

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	Consorcio EVOLET	Sin Novedad	0
2	PEREZ GOMEZ UBANER	Sin Novedad	0
3	MAMPOSTERIA- JOSE MELLIZO	Sin Novedad	0
4	MAMPOSTERIA- GUILLERMO GUZMAN	Ingreso no se relaciona exámenes de ingreso	3
5	WILLIAM MUÑOZ	Sin Novedad	3
6	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	Sin Novedad	0
7	HSA INGENIERIA SAS	Sin Novedad	1
8	Personal transitorio		0
TOTAL			**7**

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1, pr-04Fr-02, Entrega de Dotación y Elementos de Protección, relacionados en la carpeta SST. para los trabajadores de los subcontratistas UBANER PEREZ GOMEZ y HSA INGENIERIA SAS del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Entrega de dotación y EPP al personal**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ trabajadores\ dotados\ con\ EPP\ 63}{Numero\ de\ trabajadaores\ contratados\quad 63} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	ACTIVIDAD	No. TOTAL, DE TRABAJADORES	OBSERVACIONES
1	Consorcio EVOLET	ADMINISTRATIVOS	15	
	PEREZ GOMEZ UBANER	ESTRUCTURAL	27	
2	JOSE MELLIZO	MAMPOSTERIA- 1	4	
3	GUILLERMO GUZMAN	MAMPOSTERIA-2	6	
	WIILIAM MUÑOZ	MAMPOSTERIA-3	3	
	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	TOPOGRAFIA	2	
4	HSA INGENIERIA SAS	HIDRAHULICOS	8	
5	TRANSITORIOS	OPERARIOS	0	NO SE TENDRA EN CUENTA PARA CALCULOAR LOS DATOS ESTADISTICOS.
TOTAL			**65**	
TOTAL, SIN PERSONAL TRANSITORIO			**65**	

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, el ingreso de 7 colaboradores, y se evidencia el registró de inducciones en el formato de entrenamiento, correspondientes al periodo del Consorcio EVOLET y sus contratista de 6 colaboradores.

- MAMPOSTERIA- GUILLERMO GUZMAN: 3
- MAMPOSTERIA- WILLIAM MUÑOZ: 3
- HSA INGENIERIA SAS: 1

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Cobertura Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 6}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes } 7} X\ 100 = \mathbf{85}\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ ejecutadas\quad 6+0}{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ programadas\ 7+0} X\ 100 = \mathbf{85}\%$

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 6 actividades de capacitación con el área SST, con el tema asociado a la atencion de emergencias, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacitación del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ trabajadores\ \text{prom asisten capacitación al mes } 23}{No.\,de\ trabajadaores\ \text{en el mes PROMED}\ 23} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ capacitaciones\ ejecutadas\quad 5}{No.\,de\ de\ capacitaciones\ programas\ 5} X\ 100 = 10\mathbf{0}\%$

REGISTRO FOTOGRAFICO







Imagen No. 1, 2, 3 Capacitación Prevención de Caída, Cuidado de la espalda, ruido en el ambiente laboral

FUENTE: CONSORCIO EVOLET

COMITÉ PARITARIO DE SST.

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADORES ASISTENTES	No. TRABAJADORES PROGRAMADOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	26/06/2025	PREVENCION DE CAIDAS- CLASES DE CAIDA	35	35	35/35*100 = 100%
2	26/06/2025	CUIDADO DE LA ESPALDA - EDUCACION POSTURAL- PAUSAS ACTIVAS	9	9	9/9*100 = 100%
3	30/05/2025	RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL- Prevencion EPP AUDITIVA- EFECTOS EN LA SALUD POR LA EXPOSICION AL RUIDO	30	30	30/30*100 = 100%
4	17/07/2025	CUIDADO DEL AGUA EN OBRA - HUELLA HIDRICA	33	33	33/33*100 = 100%
5	12/06/2025	CUIDADO VISUAL - PAUSAS ACTIVAS- PAUSAS COGNITIVAS	6	6	6/6*100 = 100%
PROMEDIO			22.6	22.6	

En el informe presentado para el periodo correspondiente se evidencia el acta de la reunión del COPASST del mes de Julio del 2025 con feche del 26.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

El contratista aclara que por el número de personal dependiente que es inferior a 10 colaboradores, no está obligado a su conformación, se relaciona lo comentado que lo justifica: *"Según la Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo de Colombia, modificada por la Resolución 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral es obligatorio para: • Empresas públicas y privadas con 10 o más trabajadores. Las empresas sí debe cumplir con el deber general de prevenir el acoso laboral y promover un ambiente sano, conforme a la Ley 1010 de 2006"*.

Plan de acción propuesto por el contratista para la intervención en caso de acoso laboral:

Plan de Gestión:

- Se realizarán periódicamente charlas al personal enfocadas en temas como primeros auxilios emocionales, el respeto interpersonal y la importancia de mantener un ambiente laboral sano y equilibrado.
- Para la atención de situaciones relacionadas con la convivencia laboral, se habilitará un canal confidencial mediante un buzón físico ubicado en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual será revisado semanalmente. En caso de presentarse alguna eventualidad, se garantizará la confidencialidad del proceso.
- Se dejará constancia del caso y se realizará el seguimiento correspondiente con el apoyo del prevencionista de SST, el jefe inmediato y la representante legal del consorcio.
- Se documentarán las acciones correctivas adoptadas, los compromisos adquiridos y el seguimiento a su cumplimiento.

El contratista en el periodo no relaciona situaciones presentadas asociadas a acoso laboral.

AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO			
No.	**ORIGEN**	**EMPRESA**	**TIEMPO REPORTADO**
1	ACCIDENTE LABORAL	SIN NOVEDAD	0
2	INCAPACIDAD X A. T	CONSORCIO EVOLET, UBANER	9+14=23
3	ENFERMEDAD LABORAL	SIN NOVEDAD	0
4	INCAPACIDAD X A. L	SIN NOVEDAD	0
5	ENFERMEDAD COMUN	SIN NOVEDAD	0
6	PERMISOS	UBANER PEREZ GOMEZ	19 DIAS
7	INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS	SIN NOVEDAD	0
TOTAL, DE AUSENTISMO			**42 DIAS**

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 21 Junio – 21 Julio 2025	
DESCRIPCIÓN	**RESULTADO**
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	65
Número de accidentes laborales durante el periodo	0
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	23
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 21 Junio – 21 Julio 2025	
DESCRIPCIÓN	**RESULTADO**
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	3
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	193+23=216
Frecuencia de Accidentalidad = = No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 No de trabajadores en el mes	0/65*100 =0%
Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes *100 # de trabajadores en el mes	23+0/65*100=35 %
Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000	0*35/1000 = 0
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	23/23*100 =100

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

Como parte del plan de capacitaciones se evidencia mediante registro fotográfico la realización de pausas activas en las áreas operativas y administrativas.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Relación de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura
- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos

La interventoría verifica que se anexa los permisos de los subcontratistas así:

EMPRESA	REGISTRO	No.
CONSTRUCCIONES PEREZ	SST-FT-01 SST-FT-02	24 AL 28 JULIO 1 AL 5 JULIO 7 AL 12 JULIO
H.S.A INGENIERIA S.A.S	SST-Pr-06-Fr-01	1, 7, 14, DEL JULIO

La interventoría relaciona la gestión presentada por el contratista:

Instalación de la malla contra caídas y de la línea de vida portátil horizontal, junto con las certificaciones técnicas correspondientes. Se recibe la siguiente documentación al respecto:

- Ensayo dinámico norma UNE EN 1263 INSERLIFT SAS
- Memoria de cálculo y certificación soportes sistema mixto tipo T INSERLIFT SAS
- Certificado 1947 redes anticaídas INSERLIFT SAS
- Certificación del lote San José Popayán sellado
- Ficha_tecnica_sistema_tipo_t_mixto_inserlift oficial
- Certificado del conector de anclaje

La intervención envía oficio Radicado No. CIPZ-078-0343-2025 el día 15 de julio del 2025, solicitado la inclusión por parte del consorcio EVOLET de la revisión de las medidas preventivas colectivas mediante inspecciones y estas sean anexadas al informe correspondiente del periodo, la interventoría verifica que aun no se han realizado las inspecciones solicitadas.

En el desarrollo de estas actividades se cuentan con 45 personas certificadas para labor en alturas.

ORDEN Y ASEO

La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden y aseo, se evidencia la realización de jornadas de orden y aseo en los pisos superiores 1,2,3,4, 5.

REGISTRO FOTOGRAFICO
 
Imagen No. 3 y 4. Orden y Aseo en Obra
FUENTE: INFORME CONSORCIO EVOLET- JUNIO 2025

SANEAMIENTO BÁSICO

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

Se verifica la realización de fumigación para el control de plagas realizada en el mes de junio del 2025, el contratista anexa el registro fotográfico en el anexo Control del riesgo carpeta 7. Fumigación.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No. 5, 6 y 7. Disposición de recipientes para recolección de residuos según su clasificación, Servicios de baños para el personal de obra, suministro de agua potable para el personal de obra.

FUENTE: propia -Informe CONSORCIO EVOLET- MAYO 2025

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de emergencia, son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina -administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.
Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos

BRIGADA DE EMERGENCIA

El CONSORCIO EVOLET cuenta con la brigada de emergencia conformación por los siguientes integrantes:

BRIGADA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
JEFE DE BRIGADA	Jesús Ruba	76.334.379	JESUS RUBA
JEFE DE EVACUACIÓN	Guillermo León Escobar	79.395308	
BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	Ubaner Perez.	1061600546	
BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Ricardo Bolaños.	4754652.	
PERSONAL DE APOYO	Jose Revelo	1061725247	

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacidad de respuesta**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ \ emergencias\ atendidas\ oportunamente}{Numero\ de\ emergencias\ presentadas} \frac{0}{0} X\ 100 = N.A.$
INDICADOR	**% de simulacros realizados**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ simulacros\ efectuados}{Numero\ de\ simulacros\ programados} X\ 100 = N.A$

INSPECCIONES.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, la programación del plan de trabajo SG-SST para este año, las inspecciones realizadas fueron:

- Inspección equipos de emergencia camilla y botiquín, con fecha del 9 de julio del 2025 por parte del contratista EVOLET con registro CV-SGSST-63.3 V.1.
- Se relaciona inspección de los equipos eléctricos mediante registro SST-ST-05, con fecha del 1 al 15 y 7 al 12 Julio del 2025, de los equipos DELWALT
- Se verifica el registro del formato SST-FO-33 INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, con fecha de 20 junio, 9 de julio, del 2025. Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- Se verifica inspección de herramientas mediante formato SST-FT-33, con fechas del 16 al 21 de junio del 2025, 1 al 5 de julio del 2025, Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.

- Inspección en obra registro SST-FT-10 INSPECCION DE ACCESO PARA TRABAJOS DE ALTURAS, con fecha 24 al 28 junio del 2025, 1 al 5, y 7 al 12, de julio del 2025. Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.
- Se verifica las inspecciones de los equipos para trabajo en alturas mediante registro SST-FT-03 INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA, con fecha del 24 al 28 junio/1 al 5 de julio / 7 al 12 de julio// 14 al 16 de julio del 2025, de los trabajadores, Alexis Johan Cortes, Klein cruz, Camilo Sánchez Sol, Jonier Alexis, Vidal , Wilmer Geovanny, Ricardo Bolaños, Carlos Alberto Perez, Jhon Erazo Urbano, Juan Carlos Monsalve, Heider Sarria, Edgar Albeiro Acosta, Realizadas por el subcontratista sub contratista UBANER PEREZ GOMEZ.

GESTION DE SEGUIMIENTO SST:

La interventoría relaciona los oficios enviados de requerimientos:

Se envía oficio con radicado No. CIPZ-078-0340-2025, el día 15 de julio, indicando la gestión realizada según lo solicitado el día 21 de marzo del 2025 con radicado No. CIPZ-078-01-2025, Se relaciona la gestión realizada hasta la fecha de las solicitudes **Pendiente 1.:** Ubicación de las Líneas de advertencias en los espacios de trabajo en altura que dan al vacío, que sean identificada y socializada con el personal expuesto en trabajos en alturas, como medida preventiva y correctiva de comportamientos inseguros de estar cerca a los bordes que dan al vacío sin las medidas de seguridad establecidas. quedando así:

Este punto se considera parcialmente cumplido, estas situaciones son muy recurrentes y se presentan en el desarrollo de la obra, por tal razón la interventoría considera no dar el cierre total. El Contratista ubica en el segundo y tercer piso guadua verticalmente con malla poli sombra alrededor y cinta de señalización de peligro en el frente y lados de la obra, esta medida aún sigue pendiente en los demás pisos, se ha continuado con la restricción en los bordes de huecos internos, también en las escaleras a medida que estas avanzan en su construcción, **cabe resaltar que, esta medida se exige sin excepción en la totalidad de los pisos a medida que se avanza la obra, por la condición en que se desarrolla la actividad siendo esta un riesgo de altura muy alto.**

Pendiente 2.:

Documentos solicitados:

- Procedimiento de operación de la pluma.
- Procedimiento de izaje de cargas con pluma.

Al contratista mediante oficio con radicado No. EV-C358-23-0446-25 enviado el 18 de junio del 2025, En ese sentido, la interventoría considera que la solicitud ha sido atendida de manera adecuada y da por cumplida esta observación. No obstante, se continuará con el seguimiento y monitoreo permanente de estas condiciones, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones son recurrentes durante el desarrollo de la obra.

Pendiente 3.:

Asignación del ayudante de seguridad, que impida que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin protección de caídas. El ayudante de seguridad debe estar en la misma superficie de trabajo y en una posición que le permita vigilar a los

trabajadores y con la capacidad de advertirles del riesgo, utilizando los medios que sean necesarios. Según resolución 4272 del 2021.

Este ítem se considera pendiente de cumplimiento, se continuará con la solicitud, además de la actualización que esta implica en la garantía de cumplimiento de la exigencia normativa.

Mediante oficio radicado No. CIPZ CIPZ-078-0343-2025

Se solicita las siguientes medidas para controlar los posibles riesgos existentes:

1. Requerimiento

Se reitera la solicitud de **FORMA PRIORITARIA Y URGENTE** la intervención de la reubicación de la malla anticaída la cual **INCUMPLE LAS RECOMENDACIONES DEL FABICANTE** y las medidas de control de inspecciones por parte del contratista Consorcio EVOLET, solicitadas en las observaciones de informe del periodo Mayo-junio 2025.

La interventoría verifica que la malla instalada ya no cumple con las siguientes recomendaciones dadas por el fabricante:

- Todo el material que caiga en la red deberá ser retirado inmediatamente de la misma.
- Comprobar que todos los materiales están en buen estado y son los adecuados
- La altura máxima de caída permitida desde el plano de trabajo es de 6,00 mts; no es admisible la instalación de las redes más de dos plantas por debajo del mismo.

2. Requerimiento

Hasta la fecha el Consorcio EVOLET mediante los informes presenta las inspecciones de su subcontratista UBANER PEREZ, en ningún momento presenta las inspecciones que evidencie la gestión realizada por el consorcio, siendo la obra adjudicada al mismo.

Por tal razón se solicita fuera de las inspecciones que por cumplimiento y responsabilidad compete a las subcontratistas respectivas de sus sistemas de gestión, se solicita el cumplimiento del programa de inspecciones del consorcio EVOLET, el cual se ha venido exigiendo en las observaciones de los informes, pero sin evidencia del cumplimiento.

Estas inspecciones deben ser de:

- Inspección de los controles generales de riesgos en la obra (incluido Orden y aseo), donde se permita realizar Seguimiento en las actividades de construcción.
- Revisión del cumplimiento de todos los subcontratistas y personal propio de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Revisión de todos los equipos y elementos para la atención de emergencia
- Revisión de todas las medidas preventivas colectivas implementadas para el control de caídas
- Equipos y herramientas utilizadas propias y de los contratistas que cumplan con los controles de seguridad
- EPP su uso y dotación de los trabajadores de los subcontratistas
- Se debe actualizar el programa de inspecciones, entregar un análisis del cumplimiento mes a mes en la presentación del informe, además de los registros de los formatos correspondientes al Consorcio EVOLET, y registros fotográficos fechados.

3. Requerimiento

Se solicita el kit de rescate el cual la interventoría evidencia la falta de este en la obra, este debe cumplir con el requerimiento legal según normatividad 4272 del 2021 y realizar los seguimientos de control fichas de los equipos, e inspección periódica según programa de Inspecciones. Y se debe registrar en los informes mes a mes, en el ítem control de plan de atención y preparación de respuesta ante emergencia.

4. Requerimiento:

Se solicita la revisión y actualización de la matriz de peligro que incluyan las siguientes:

- Actividades izaje de carga con pluma grúa
- Trabajo extralaboral en horarios nocturnos
- Medidas implementadas para el control de caída
- Riesgos y medidas de control para Visitantes
- Actividades realizadas de sub contratistas

5. Requerimiento:

Actualización de la matriz de requisitos legales incluir la normativa vigente hasta la fecha del 2025.

6. Requerimiento:

Actualización del programa prevención para trabajos en alturas incluyendo las medidas implementadas existentes (malla anticaída y Línea de vida horizontal portátil certificada, escaleras portátiles) y los controles propuestos para su mantenimiento por el

fabricante, además relacionar las hojas de vida de cada uno, ajustar el cronograma de actividades con las medidas propuestas.

7. Requerimiento:

Revisión y ajuste de las bases que cotización del personal independiente con las que se manejan en el consorcio EVOLET el cual no son coherentes

En la planilla presentada del pago de aportes por parte del Consorcio EVOLET de los independientes a ARL, se indica IMC que no concuerda con la presentada en la planilla de aportes a salud y pensión de cada Independiente siendo esto un tema de revisión importante para evitar la intervención de la UGPP y posibles multas.

8. Requerimiento:

Se solicita la actualización del documento presentado en el informe correspondiente al mes de mayo 2025 en el anexo 10. Carpeta "Documentos actualizados" reglamento de higiene y seguridad código: SST-DA-05 del subcontratista CONSTRUCCIONES PEREZ contratista, Clasificación de riesgos los cuales no se identifican: **Condiciones de seguridad:** tecnológico, accidentes de tránsito, trabajo en alturas, **Físico:** iluminación, **Químico:** material particulado, líquidos; **Psicológicos:** condiciones de la tarea, interfase persona- tarea, jornada de trabajo; **Biomecánico:** esfuerzos.

9. Requerimiento:

Como desarrollo de la gestión que realiza el contratista EVOLET se solicita los siguientes:

- Documentar las actividades realizadas de las jornadas de orden y aseo, además de su registro fotográfico.

- Actualizar en la gestión del cambio las mejoras implementadas (línea de vida horizontal certificada, escaleras portátiles, malla anticaída, pluma grúa y otras que se puedan implementar) presentar mes a mes en los informes las actividades realizadas y que apliquen según las recomendaciones del fabricante y las propuestas por el contratista en cuanto a inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, entregar a la interventoría los registros actualizados de estos cambios implementados.

10. Requerimiento:

Se requiere mayor presencia en obra del encargado del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del consorcio EVOLETA para control, seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los subcontratistas.

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 26 de junio al 25 de junio de 2025.

Anexo 7. Informe mensual del periodo del 26 junio al 25 de julio de 2025 del contratista de obra

7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

En el periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de columnas, pantallas y losas de piso 6 y entrepiso 7

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión losa de entrepiso N°6 (N+23.20), y entrepiso No 7 (N+27.10) del contratista de obra

Se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para su aceptación.

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión de columnas y pantallas entrepiso N°7 (N+23.20, N+27.10), del contratista de obra.

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (kN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
491	2654	T54	4	19-jun-25	26-jun-25	7	213,1		8171	266	3782	26,1	281	4000	27,6	94,5	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma 10:00 am
491	2655	T54	4	19-jun-25	26-jun-25	7	207,7		8091	262	3723	25,7	281	4000	27,6	93,1	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma 10:00 am
491	2656	T54	4	19-jun-25	26-jun-25	7	204,6		8171	255	3632	25,0	281	4000	27,6	90,8	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma 10:00 am
491	2657	T55	4	19-jun-25	26-jun-25	7	222,4		8171	278	3947	27,2	281	4000	27,6	98,7	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma 12:00 pm
491	2658	T55	4	19-jun-25	26-jun-25	7	215,1		8171	268	3818	26,3	281	4000	27,6	95,4	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma 12:00 pm
491	2659	T55	4	19-jun-25	26-jun-25	7	214,0		8252	264	3762	25,9	281	4000	27,6	94,0	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma 12:00 pm
491	2660	T56	4	19-jun-25	26-jun-25	7	201,5		8091	254	3612	24,9	211	3000	20,7	120,4	N.S	Escalera de emergencia piso 4 Hora de toma 2:00 pm
491	2661	T56	4	19-jun-25	26-jun-25	7	215,1		8252	266	3781	26,1	211	3000	20,7	126,0	N.S	Escalera de emergencia piso 4 Hora de toma 2:00 pm
491	2662	T56	4	19-jun-25	26-jun-25	7	219,0		8332	268	3812	26,3	211	3000	20,7	127,1	N.S	Escalera de emergencia piso 4 Hora de toma 2:00 pm
491	2663	T57	4	19-jun-25	26-jun-25	7	264,3		8012	336	4785	33,0	281	4000	27,6	119,6	N.S	LOSA 6 Hora de toma 1:00 pm
491	2664	T57	4	19-jun-25	26-jun-25	7	273,8		8659	322	4586	31,6	281	4000	27,6	114,6	N.S	LOSA 6 Hora de toma 1:00 pm

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (kN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
491	2665	T57	4	19-jun-25	26-jun-25	7	257,6		8171	321	4572	31,5	281	4000	27,6	114,3	N.S	LOSA 6 Hora de toma 1:00 pm
491	2666	T58	4	19-jun-25	26-jun-25	7	219,9		8252	272	3866	26,7	211	3000	20,7	128,9	N.S	Dovelas piso 1 Hora de toma 2:00 pm
491	2667	T58	4	19-jun-25	26-jun-25	7	230,4		8171	288	4090	28,2	211	3000	20,7	136,3	N.S	Dovelas piso 1 Hora de toma 2:00 pm
491	2668	T58	4	19-jun-25	26-jun-25	7	229,7		8332	281	3997	27,6	211	3000	20,7	133,2	N.S	Dovelas piso 1 Hora de toma 2:00 pm

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA Kg/cm²	RESISTENCIA OBTENIDA PSI	RESISTENCIA OBTENIDA Mpa	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	RESISTENCIA ESPECIFICADA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Mpa	EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
522	2737	T54	4	19-jun-25	03-jul-25	14	227,6	4	8171	284	4040	27,9	281	4000	27,6	101,0	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma: 10:00 am
522	2738	T54	4	19-jun-25	03-jul-25	14	241,6	3	8171	302	4289	29,6	281	4000	27,6	107,2	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma: 10:00 am
522	2739	T54	4	19-jun-25	03-jul-25	14	247,8	4	8332	303	4314	29,7	281	4000	27,6	107,9	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma: 10:00 am
522	2740	T55	4	19-jun-25	03-jul-25	14	232,0	4	8171	289	4117	28,4	281	4000	27,6	102,9	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma: 12:00 pm
522	2741	T55	4	19-jun-25	03-jul-25	14	228,5	3	8171	285	4057	28,0	281	4000	27,6	101,4	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma: 12:00 pm
522	2742	T55	4	19-jun-25	03-jul-25	14	224,0	4	8252	277	3937	27,1	281	4000	27,6	98,4	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma: 12:00 pm

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA Kg/cm²	RESISTENCIA OBTENIDA PSI	RESISTENCIA OBTENIDA Mpa	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	RESISTENCIA ESPECIFICADA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Mpa	EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
534	2750	T60	4	01-jul-25	08-jul-25	7	273,2	4	8332	334	4756	32,8	281	4000	27,6	118,9	60,0	PW1, PW2, PW5, PW7, PW1, C6, PISO 7 Hora de toma: 7:00am
534	2751	T60	4	01-jul-25	08-jul-25	7	262,6	3	8171	328	4661	32,1	281	4000	27,6	116,5	60,0	PW1, PW2, PW5, PW7, PW1, C6, PISO 7 Hora de toma: 7:00am
534	2752	T60	4	01-jul-25	08-jul-25	7	261,4	4	8171	326	4640	32,0	281	4000	27,6	116,0	60,0	PW1, PW2, PW5, PW7, PW1, C6, PISO 7 Hora de toma: 7:00am
534	2753	T61	4	01-jul-25	08-jul-25	7	246,6	4	8252	305	4335	29,9	281	4000	27,6	108,4	62,0	PW3, PW4, SW5, PW8, PW9, C2,C4, C7, C8, C9, C10 PISO 7 Hora de toma: 12:00pm
534	2754	T61	4	01-jul-25	08-jul-25	7	235,8	4	8171	294	4186	28,9	281	4000	27,6	104,7	62,0	PW3, PW4, SW5, PW8, PW9, C2,C4, C7, C8, C9, C10 PISO 7 Hora de toma: 12:00pm
534	2755	T61	4	01-jul-25	08-jul-25	7	237,8	3	8091	300	4263	29,4	281	4000	27,6	106,6	62,0	PW3, PW4, SW5, PW8, PW9, C2,C4, C7, C8, C9, C10 PISO 7 Hora de toma: 12:00pm
534	2756	T62	4	01-jul-25	08-jul-25	7	261,7	4	8171	327	4646	32,0	211	3000	20,7	154,9	8,0	ESCALERA CENTRAL PISO 4 Hora de toma: 1:00pm
534	2757	T62	4	01-jul-25	08-jul-25	7	267,7	3	8171	334	4751	32,8	211	3000	20,7	158,4	8,0	ESCALERA CENTRAL PISO 4 Hora de toma: 1:00pm
534	2758	T62	4	01-jul-25	08-jul-25	7	270,8	3	8252	335	4759	32,8	211	3000	20,7	158,6	8,0	ESCALERA CENTRAL PISO 4 Hora de toma: 1:00pm

Al realizar un análisis los resultados del contratista de obra, se observa que las resistencias de los concretos cumplen por encima de los requisitos para aceptación.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c.–

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c.

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c, sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las apartes .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Anexo 8. Resultados de resistencia concreto CONTRATISTA

- <u>Resultados resistencia concreto interventoría</u>

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
								Mpa	PSI		
1	1	LOSA PISO 6 (N +19,30)	26/05/2025	23/07/2025	58	288,9	8171,3	35,4	5050	126,3	SI
2	2	VIGAS DE ENTREPISO PISO 6 (N +19,30)	26/05/2025	23/07/2025	58	336,6	8251,6	40,8	5827	145,7	SI
3	3	PANTALLAS PISO 6 (N +19,30)	4/06/2025	23/07/2025	49	406,7	8171,3	49,8	7110	177,8	SI
4	4	COLUMNAS PISO 6 (N +19,30)	4/06/2025	23/07/2025	49	429,7	8171,3	52,6	7512	187,8	SI
5	5	LOSA PISO 7 (N +23,20)	19/06/2025	23/07/2025	34	348,5	8251,6	42,2	6033	150,8	SI
6	6	VIGAS DE ENTREPISO PISO 7 (N +23,20)	19/06/2025	23/07/2025	34	340,5	8348,5	40,8	5826	145,7	SI

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE
								Mpa	PSI		
7	7	PANTALLA PISO 7 (N +23,20)	1/07/2025	23/07/2025	22	380,8	8251,6	46,1	6592	164,8	SI
8	8	COLUMNAS PISO 7 (N +23,20)	1/07/2025	23/07/2025	22	374,1	8413,4	44,5	6352	158,8	SI

Anexo 9. Resultados de resistencia concreto INTERVENTORIA

8. CONCLUSIONES

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de julio de 2025 del 34.58 % por valor de $11.229.484.499 frente un avance programado del 34.58%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025 es de 5% frente a un avance programado del 5%.

El contratista de obra presentó un de Acta parcial de obra N°4, con fecha de corte al 18 de junio de 2025, por un valor de $ 2,351,833,475 correspondiente al 7.24% del valor contractual la cual incluye cobro de Nps de la cimentación y losas de entrepiso, un acta parcial de obra No 5 con fecha de corte del 2 de julio de 2025, por un valor de $860,740,433 correspondiente al 2.65%, para un acumulado facturado de $9,788,560,522 correspondiente al 30.14%, quedando un saldo por facturar de $22,685,368,047 correspondiente al 69.86% en la cual se incluye el cobro de mayores cantidades de obra y Nps, las cuales están soportadas con el acta de modificación No 2 de mayores y menores cantidades de obra del 9 de junio de 2025 . Se realiza una amortización del anticipo por un valor acumulado de $2,936,568,157, quedando pendiente por amortizar $6,805,610,414 del anticipo.

El contrato de interventoría, factura en igual porcentaje por lo facturado del contrato de obra, por lo cual el acta parcial No 4 de interventoría es de $92,730,261, con corte al 19 de junio de 2025, y el acta parcial No 5 de $33,938,068 con un valor acumulado facturado del $385,952,399 equivalente al 30.14% del valor del contrato, no se realiza amortización ya que no cuenta con anticipo.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el periodo del 26 de junio de 2025 al 25 de julio de 2025, se realizó el suministro e instalación de aceros para el piso 7 N+23.20 a N+27.10 y piso 7 N+27.10 a N+31.00 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, suministro e instalación de aceros de vigas y losa de entrepiso 6 N+23.20. y entrepiso 7 N+27.10

Se suministró e instaló las vigas joist de la losa de entrepiso 6 N+23.20. y entrepiso 7 N+27.10

Se realizó el suministro e instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, piso 7 N+27.10 y piso 8 N+31.00 y para vigas y losa de entrepiso 6 N+23.20 y entrepiso 7 N+27.10

Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo en cuenta el procedimiento indicado en el aparte C.5.6. EVALUACION Y ACEPTACION DE CONCRETOS DE LA NSR 10

Teniendo en cuenta que se presentó una actualización del PMA a la fecha, se tienen algunas actividades pendientes de seguimiento toda vez que es necesario el periodo de transición para implementarlas.

En general, se presencia la necesidad de capacitaciones y organización de lugares de acopio de residuos puesto que se evidencia desorden en algunos puntos ecológicos, acopio e inadecuada separación en los recipientes.

Se observó adecuada separación de residuos peligrosos, implementación de señalética, provisión y acceso de elementos de protección personal.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. Asimismo, ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

Se realiza la verificación mediante registro CV-SGSST-14-V1, 7 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra, y en el desarrollo del plan de capacitaciones presentado por el contratista EVOLET.

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal.

ANEXO 1. POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA – CONTRATO 358 2023

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA
23 ABR 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	23/03/2026	$6,494,785,713.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	23/11/2028	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/03/2024	23/03/2026	$9,742,178,570.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,247,392,856.90	$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/11/2025	22/11/2030	$3,247,392,856.90

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO

PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERFINANCIERA MIEMBRO DE LA RED DE SEGUROS DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OFICINA JURÍDICA
29 DIC 2023
VISTO BUENO COORDINADOR JURIDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	27/12/2025	$6,494,785,713.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/08/2028	$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	27/12/2025	$9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	* SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *169,046,816.00	$ ******25,000.00	$ **32,123,645.00	$ ********201,195,461.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL:	ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. OFICINA JURIDICA

29 DIC 2023

REVISÓ

PÓLIZA APROBADA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **27,080,142.00	$ ******25,000.00	$ ***5,149,977.00	$ ********32,255,119.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranta B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1. POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA – OTROSI MODIFICATORIO N°01

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-40-101051477**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**13**	**05**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO:	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO	8234508
BENEFICIARIO:	891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,912,847.00	$ *******3,000.00	$ *****364,011.00	$ *********2,279,858.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2025	22	03	2024	00:00	13	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**22/03/2024**	**13/05/2031**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-40-101051477**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**13**	**05**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO:	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO	8234508

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,912,847.00	$ *******3,000.00	$ *****364,011.00	$ *********2,279,858.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009610188095(3900)000002279858(96)20250322

REFERENCIA PAGO:

1100961018809-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2025	22	03	2024	00:00	13	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EVOLET — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.784.507-4**

DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA — **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA — **TELÉFONO:** 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 891.580.002-5**

DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142 — **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA — **TELÉFONO:** 8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101279178**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**22**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	**NIT: 901.784.507-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT: 891.580.002-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/03/2024**	**13/09/2026**	**$6,494,785,713.80**	**$6,494,785,713.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/03/2024**	**13/05/2029**	**$1,623,696,428.45**	**$1,623,696,428.45**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**22/03/2024**	**13/09/2026**	**$9,742,178,570.70**	**$9,742,178,570.70**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$3,247,392,856.90**	**$3,247,392,856.90**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS CALENDARIO.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/05/2026	13/05/2031	$3,247,392,856.90

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **25,503,155.00	$ *******8,000.00	$ ***4,847,119.00	$ ********30,358,274.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101279178**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**04**	**2025**	**22**	**03**	**2024**	**00:00**	**22**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		**NIT: 901.784.507-4**
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO:	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		**NIT: 891.580.002-5**
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO	8234508

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **25,503,155.00	$ *******8,000.00	$ ***4,847,119.00	$ ********30,358,274.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009610188088(3900)000030358274(96)20250322

REFERENCIA PAGO:

1100961018808-8

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2025	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO EVOLET	**NIT: 901.784.507-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA		POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT: 891.580.002-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	KR 6 NRO. 10 N - 142		POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. POLIZAS INTERVENTORIA – CONTRATO 078 2024

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	01	02	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	01	02	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO INTERSALUD PZ — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.794.710-6

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/02/2024	01/04/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/02/2024	01/10/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2024	01/12/2029	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 1532 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA
01 FEB 2024
Sergio
GERENTE O ASESOR JURIDICO

REVISO

PÓLIZA APROBADA

VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ********5,413,500	$ ********4,225,570	$****15,000.00	$ ******805,708	$ ********5,046,279

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
BONILLA DEL SOCORRO TOVAR RODRIGUEZ	5413	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTÉ ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195782

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257986CAFB7650 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	22/05/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	22/11/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	22/11/2030	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL"

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	TOTAL A PAGAR:
$ ***576,185,413.50	$ **********0	$*********0.00	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	5932	100.00			

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. NIT 891.580.002-5
02 MAY 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB25790606F5785B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA APROBADA

ANEXO 2. POLIZAS INTERVENTORIA – OTROSI MODIFICATORIO N°01

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2024

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	28	04	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	15	05	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	10/11/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	10/05/2029	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	13/05/2031	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 172 DÍAS, DE ACUERDO A OTRO SI 001 DE FECHA 15/04/2025 AL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS EN ESTE ANEXO CONTINUAN VIEGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***576,185,413.50	$ **********488,732	$*****5,000.00	$ *******93,809	$ **********587,541

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ROCIO SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	5932	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB257A0E08FC7D57

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3. PLANILLAS INTERVENTORIA JUNIO 2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1644128628	9489111720	Y	2025/07/03	2025/07/21	BANCOLOMBIA	18	$400,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66785383	ANGULO AIXSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	10527864	GUZMAN AUGUSTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1061817104	ORDOÑEZ ANGELICA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	76313467	PERAFAN JESUS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(4)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,694,000	$396,400		$0	$0		$396,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1644128628	9489111720	Y	2025/07/03	2025/07/21	BANCOLOMBIA	18	$400,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$396,400	$4,500	$0	$400,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$396,400	$4,500	$0	$400,900
TOTAL				**4**	**$396,400**	**$4,500**	**$0**	**$400,900**

ANEXO 5. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA CRUZADA

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: jul-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
1/07/2025	CIPZ-078-0330-2025	REMISIÓN BALANCE DE OBRA N°3 , CONTRATO DE OBRA N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO			X	
1/07/2025	CIPZ-078-0331-2025	REMISION INFORMES MENSUALES JUNIO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO			X	
4/07/2025	CIPZ-078-0332-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°4 DE OBRA – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO			X	
4/07/2025	CIPZ-078-0333-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-462-25 DEL 24 DE JUNIO – “PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE PRESIÓN”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-462-25
7/07/2025	CIPZ-078-0334-2025	REMISION INFORMACION ENTIDAD – DISEÑOS ELEC-CCTV-DTI-TORRE HUSJ	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
11/07/2025	CIPZ-078-0335-2025	REMISIÓN OFICIO EV-C358-23-0480-25 “SOLICITUD DE DISEÑOS Y ACLARACIONES TÉCNICAS DEL HELIPUERTO”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO				
9/07/2025	CIPZ-078-0336-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0480-25 “SOLICITUD DE DISEÑOS Y ACLARACIONES TÉCNICAS DEL HELIPUERTO”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0480-25
22/07/2025	CIPZ-078-0337-2025	RESPUESTA CORREO ENTIDAD 3 JULIO 2025 – “REMISIÓN DE DISEÑOS ELEC-CCTV-DTI-TORRE HUSJ”	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO		X		3 DE JULIO 2025

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: jul-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
10/07/2025	CIPZ-078-0338-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°4 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO			X	
10/07/2025	CIPZ-078-0339-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0480-25 – REVISION MEMORIAS DE CANTIDAD CORRESPONDIENTES ACTA DE OBRA N°5 PAQUETE N°1 CON FECHA DE CORTE 2 DE JULIO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0480-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: jul-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
15/07/2025	CIPZ-078-0340-2025	INFORME SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD TEMAS COMPONENTE SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO			X	
10/07/2025	CIPZ-078-0341-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0473-25 – "SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROFESIONAL ELÉCTRICO DEL EQUIPO MÍNIMO CONTRATO 358 DEL 2023."	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0473-25
14/07/2025	CIPZ-078-0342-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0481-25 - SEGUNDA REVISION MEMORIAS DE CANTIDAD ACTA DE OBRA N°5	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0481-25
14/07/2025	CIPZ-078-0343-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
14/07/2025	CIPZ-078-0344-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO SG-SST - VERIFICACION DE DOCUMENTOS JULIO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
14/07/2025	CIPZ-078-0345-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0455-25 Y EV-C358-23-0477-25 DEL 3 DE JULIO DE 2025. PROPUESTA PARA LOSAS DE PISO ÁREAS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0455-25 - EV-C358-23-0477-25
14/07/2025	CIPZ-078-0346-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0480-25 DEL 8 DE JULIO – "SOLICITUD DE APROBACIÓN PLANOS ASCENSOR"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0480-25
14/07/2025	CIPZ-078-0347-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0463-25 DEL 24 DE JUNIO 2025 – "ELEMENTOS DE FACHADA PISOS 2 Y 3"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0463-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: jul-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
15/07/2025	CIPZ-078-0348-2025	REITERACION OFICIO CIPZ-078-0329-2025 "RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0456-25 – REQUERIMIENTOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		CIPZ-078-0329-2025
15/07/2025	CIPZ-078-0349-2025	DISEÑOS AIRE ACONDICIONADO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO		X		
15/07/2025	CIPZ-078-0350-2025	SOLICITUD INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTAS DE COBRO N°3 Y N°4 – CONTRATO 358 2023 Y CONTRATO 078 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
16/07/2025	CIPZ-078-0351-2025	RESPUESTA EV-C358-23-0484-25 – "SOLICITUD PROCESO DE REVISIÓN DE LAS MEMORIAS DE CANTIDADES DE LAS ACTAS DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0484-25
17/07/2025	CIPZ-078-0352-2025	RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 09 Y 17 DE JULIO DE 2025– "SOLICITUD DE INFORME SOBRE EL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO"	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO		X		09 Y 17 DE JULIO DE 2025
21/07/2025	CIPZ-078-0353-2025	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL JULIO 2025 – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		
22/07/2025	CIPZ-078-0354-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°5 DE OBRA – CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
22/07/2025	CIPZ-078-0355-2025	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO -SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
23/07/2025	CIPZ-078-0356-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0488-25 DEL 21 DE JULIO 2025 "INFORME DE OBRA No. 17, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE JUNIO Y 25	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0488-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: jul-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
23/07/2025	CIPZ-078-0357-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0474-25 DEL 02 DE JULIO 2025 “REMISION DE PRESUPUESTO Y APUS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA N°358 DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0474-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	**CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024** **OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"** **CONSORCIO INTERSALUD PZ**	

MES CORRESPONDIENTE: jul-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ESTADO**			**FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION**
					PENDIENTE	**CONTESTADA**	**N/A**	
25/07/2025	CIPZ-078-0358-2025	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL – DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ	X			
25/07/2025	CIPZ-078-0359-2025	ENTREGA ACTA PARCIAL N°5 DE INTERVENTORIA CONTRATO N°078 2024 – CONTRATO DE OBRA N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
28/07/2025	CIPZ-078-0360-2025	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL JULIO 2025 OFICIO EV-C358-23-0488-25 – CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ		X		EV-C358-23-0488-25

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	jul-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
1/07/2025	EV-C358-23-0472-25	1/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de aprobación del balance de obra.			X	
1/07/2025	EV-C358-23-0471-25	1/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta oficio con radicado CIPZ-078-0327-2025 del 26 de junio de 2025, respecto a inspección ambiental a obra 21 de		X		CIPZ-078-0327-2025
2/07/2025	EV-C358-23-0474-25	2/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión presupuesto y APUS Plan de Manejo Ambiental Contrato de obra pública No. 358 de diciembre de 2023.		X		CIPZ-078-0357-2025
2/07/2025	EV-C358-23-0475-25	2/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.			X	
3/07/2025	EV-C358-23-0473-25	3/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio No. CIPZ-078-0310-2025, y solicitud de aprobación del profesional Eléctrico del equipo mínimo Contrato 358 del 2023.		X		CIPZ-078-0310-2025,
3/07/2025	N.A	3/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Remisión de Diseños ELEC-CCTV-DTI-TORRE HUSJ			X	
3/07/2025	EV-C358-23-0477-25	3/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Complemento al oficio EV-C358-23-0455-25/Propuesta para losas de piso áreas perimetrales		X		CIPZ-078-0345-2025
3/07/2025	EV-C358-23-0476-25	3/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Diseños eléctricos y de aire acondicionado				
3/07/2025	N.A	3/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE BALANCE DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA CTO 358 DE 2023 HOSPITAL SAN JOSE POPAYAN			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	jul-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
4/07/2025	EV-C358-23-0478-25	4/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Acta de obra No. 4 firmada			X	
4/07/2025	EV-C358-23-0479-25	4/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Validación para el inicio de actividades no contempladas en presupuesto y diseños.	X			
4/07/2025	EV-C358-23-0480-25	4/07/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Solicitud de diseños y aclaraciones técnicas del Helipuerto		X		CIPZ-078-0346-2025
7/07/2025	EV-C358-23-0479-25	7/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Evidencia de Actividades SST.		X		CIPZ-078-0343-2025
8/07/2025	EV-C358-23-0480-25	8/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de aprobación Planos ascensor.		X		CIPZ-078-0346-2025

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	jul-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
9/07/2025	n.a	9/07/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud equipo minimo de trabajo interventoria		X		CIPZ-078-0352-2025
14/07/2025	EV-C358-23-0483-25	14/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud.			X	
14/07/2025	EV-C358-23-0484-25	14/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud proceso de revisión de las memorias de cantidades de las actas de obra.		X		CIPZ-078-0351-2025
15/07/2025	EV-C358-23-0485-25	15/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de entrepiso No 7.			X	
16/07/2025	n.a	16/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reiteracion solicitud equipo minimo de trabajo interventoria		X		CIPZ-078-0352-2025
16/07/2025	N.A	17/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Diseño de Aire Acondicionado – Contrato N° 358 de 2023.		X		CIPZ-078-0349-2025
16/07/2025	N.A	17/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de especificación sobre la responsabilidad de subsanar incongruencia en plantas estructurales – Contrato de				
17/07/2025	EV-C358-23-0486-25	17/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUETA A OFICIO CIPZ-078-0347-2025		X		CIPZ-078-0347-2025
17/07/2025	N.A	17/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Convocatoria a Comité de Avance de Obra – viernes 19 de julio de 2025			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	jul-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
17/07/2025	N.A	17/07/2025	MINISTERIO DE SALUD ING ANDRES FELIPE SOSSA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - DIDIER	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE BALANCE DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA CTO 358 DE 2023 HOSPITAL SAN JOSE POPAYAN			X	
18/07/2025	EV-C358-23-0487-25	18/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Reporte personal obra.			X	
18/07/2025	N.A	18/07/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Diseño de aires acondicionados			X	
21/07/2025	N.A	21/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTA DE OBRA No. 5 CONSOLIDADA Y SCANEADA CON FIRMAS			X	
21/07/2025	EV-C358-23-0488-25	21/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME DE OBRA No. 17, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE JUNIO Y 25 DE JULIO DEL 2025 Y ATENCIÓN AL		X		CIPZ-078-0356-2025
22/07/2025	n.a	22/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME No. 7 Fiducia			X	
22/07/2025	EV-C358-23-0489-25	22/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA A OFICIO CIPZ-078-0346-2025		X		CIPZ-078-0346-2025
23/07/2025	EV-C358-23-0491-25	23/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	AJUSTES A LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS	X			
23/07/2025	EV-C358-23-0492-25	23/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Ajuste a la reprogramación				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	jul-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
24/07/2025	EV-C358-23-0493-25	24/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud disponibilidad de parqueadero para la actividad de fundición de columnas y pantallas piso No. 8			X	
24/07/2025	EV-C358-23-0494-25	24/07/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al Requerimiento de Interventoría, oficio No. CIPZ-078-0355-2025		X		CIPZ-078-0355-2025

ANEXO 6. INFORME MENSUAL DEL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2025 DEL CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 7. INFORME DE FIDUCIA N°7

INFORME DE FIDUCIA No. 7 Y FINAL

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN

CONTRATO DE OBRA No. 358-2023

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023."

1 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2025

POPAYÁN-CAUCA

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM

TABLA DE CONTENIDOS

I

1. INTRODUCCIÓN. 5
2. INFORMACIÓN GENERAL 5
3. VALOR ANTICIPO 6
4. PROVEEDORES 6
7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES. 14
8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN. 23
9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 23
10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS 24
11. CONCLUSIONES. 26

ANEXOS.

Anexo 1. Informe mensual y estados financieros..... 23
Anexo 2. Soportes de consignación de rendimientos del mes de marzo transferidos en el mes de mayo y junio del 2025. 24

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Información General. 5
Tabla 2. Listado de proveedores. 6
Tabla 3.Relación de órdenes de pago. 7
Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago. 10
Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria. 12
Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo. 13
Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo. 14
Tabla 8. Estado del plan de inversión del anticipo. 15
Tabla 9. Relación de rendimientos. 23
Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión. 25

1. INTRODUCCIÓN.

EL CONSORCIO EVOLET, identificado con Nit No. 901784507-4, contratista de obra del contrato No. 358-2023, suscrito con El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el ejercicio de la ejecución del proyecto y en el marco del cumplimiento de la cláusula tercera- FORMA DE PAGO, del contrato en mención, suscribió el contrato de fiducia mercantil, con la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A., para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo; con el fin de dar a conocer la administración del recurso y la situación financiera durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 10 de junio del 2025 y estado de cuenta, se presenta a continuación, una relación detallada del recurso y los fines del mismo, en concordancia a la naturaleza del contrato principal.

2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se relaciona la información general correspondiente al manejo del anticipo.

Tabla 1. Información General.

CONTRATO DE OBRA No.	358-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	CONSORCIO EVOLET
VALOR ANTICIPO.	$ 9.742.178.571,00
VALOR TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS.	$ 9.742.178.571,00
SALDO EN FIDUCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.	$ -
RENDIMIENTOS 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$ 436.198,09
RENDIMIENTOS 1 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$ 108.324,53
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 10 DE JUNIO 2025	$ 3.513.745,92

3. VALOR ANTICIPO

El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del contrato de obra No. 358-2023.

4. PROVEEDORES

De acuerdo con la programación y priorización de pagos hasta la fecha de corte del presente informe, el consorcio Evolet ha incluido en la programación de pagos por fiducia a los proveedores y/o contratistas detallados en la siguiente tabla. Esta información fue actualizada con base en la última solicitud de ajuste de proveedores, realizada el 13 de febrero de 2025, mediante el oficio No. EV-C358-23-263-25.

Tabla 2. Listado de proveedores.

No.	PROVEEDOR	NIT/CC
1	Concretos y Agregados Geoacopio S.A.S.	900860017-9
2	Elizabeth Cristina Muñoz Escobar	34535384-3
3	G y J Ferreterías S A	800130426-3
4	FJ Construcciones Civiles S.A.S	901057533-8
5	Comercializadora Empresa Temporal De Servicios Y Gestión Del Cauca S.A.S	901803819-1
6	Diana Carolina Vivas Ospina	36668621
7	Ubaner Pérez Gómez	1061600546
8	Pedro Romo	18154715
9	Uriel Ama	1431278
10	Silogística S.A.S	901246498-9
11	Equipar Gleason S.A.S	891502316
12	La Alianza Group SAS	900978431
13	EQUIPAR GLEASON S.A.S	891502316-1
14	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	900648234-3
15	HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	901303016-7

5. ORDENES DE PAGO.

A continuación, se relaciona las órdenes de pago solicitadas a la fiducia desde el 23 de octubre del 2024, fecha en la cual se recaudó el anticipo hasta el 10 de junio del 2025 que corresponde a 22 órdenes, incluyendo fecha, beneficiario, número de identificación, valor solicitado, valor pagado, cuenta destino, estado de la orden, estado del proceso de pago, valor total pagado y saldo en fiducia.

Tabla 3.Relación de órdenes de pago.

Fecha	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia
23/10/2024								**9.742.178.571**
31/10/2024	900.860.017	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	1.525.498.855	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539	APROBADO	PAGADO	1.525.498.855	8.216.679.716
05/11/2024	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	315.150.621	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613	APROBADO	PAGADO	315.150.621	7.901.529.095
05/11/2024	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	6.000.000	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	APROBADO	PAGADO	6.000.000	7.895.529.095
05/11/2024	1431278	AMA PALTA URIEL	2.138.400	BANCOLOMBIA - CH - 86872111028	APROBADO	PAGADO	2.138.400	7.893.390.695
05/11/2024	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2.073.600	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	APROBADO	PAGADO	2.073.600	7.891.317.095
07/11/2024	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182.907.980	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	182.907.980	7.708.409.115
07/11/2024	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521.477.881	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	521.477.881	7.186.931.234
08/11/2024	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5.293.804.984	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	APROBADO	PAGADO	5.293.804.984	1.893.126.250

Fecha	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia
20/11/2024	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577.407.941	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	577.407.941	1.315.718.309
20/11/2024	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309.684.722	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	APROBADO	PAGADO	309.684.722	1.006.033.587
10/12/2024	900552695	REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	133.865.096	BANCOLOMBI A - CH 24230075642	APROBADO	PAGADO	133.865.096	872.168.491
17/02/2025	901.246.498	SILOGISTICA SAS	103.240.000	BBVA COLOMBIA CC-0721000100023885	APROBADO	PAGADO	103.240.000	768.928.491
17/02/2025	900.978.431	LA ALIANZA GROUP SAS	309.835.612	BANCO DE OCCIDENTE CC- 041958752	APROBADO	PAGADO	309.835.612	459.092.879
17/02/2025	1.061.600.546	UBANER PEREZ GOMEZ	274.500.061	BANCOLOMBIA - CH-26128660444	APROBADO	PAGADO	274.500.061	184.592.818
4/04/2025	1.061.600.546	UBANER PEREZ GOMEZ	30.000.000	BANCOLOMBIA - CH-26128660444	APROBADO	PAGADO	30.000.000	154.592.818
2/05/2025	800.130.426	G Y J FERRETERIAS S.A.	71.110.589	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613	APROBADO	PAGADO	71.110.589	83.482.229
2/05/2025	901.576.284	IMCOMERSA LUD SAS	27.620.616	BANCOLOMBI A - CH 26100006567	APROBADO	PAGADO	27.620.616	55.861.613
2/05/2025	900552695	REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	26.064.505	BANCOLOMBI A - CH 24230075642	APROBADO	PAGADO	26.064.505	29.797.108
9/05/2025	901.784.507	CONSORCIO EVOLET-DEVOLUCIÓN GLEASSON	29.741.279	BANCOLOMBI A - CC 86837651208	APROBADO	PAGADO	29.741.279	55.829

Fecha	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia
23/05/2025	900.648.234	CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	34.228	BANCOLOMBI A - CC 26121191085	APROBADO	PAGADO	34.228	21.601
23/05/2025	901.246.498	SILOGISTICA SAS	21.600	BBVA COLOMBIA CC-0721000100023885	APROBADO	PAGADO	21.600	1
23/05/2025	901.303.016	HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	1	BANCO DE BOGOTÁ CC- 9013030167	APROBADO	PAGADO	1	-
		TOTAL	**9.742.178.571**			**TOTAL**	**9.742.178.571**	**-**

Durante el período cubierto por el presente informe, se tramitaron 7 órdenes de pago por concepto de mano de obra, materiales y alquiler de equipos, detallados en el cuadro anterior.

5.1. RELACIÓN DE ORDENES SOLICITADAS, APROBADAS Y ASIGNACIÓN DE ALCANCE.

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las ordenes de giro solicitadas, aprobadas y pagadas con corte al 10 de junio del año 2025, asignando los valores que corresponden a los grupos correspondientes de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, de acuerdo al plan de manejo del anticipo aprobado.

Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago.

PROVEEDOR	ALCANCE	VALOR TOTAL TRANSFERIDO
GEOACOPIO	MATERIALES	1.525.498.855
UBANER PEREZ	MANO DE OBRA	6.000.000
URIEL AMA	TRANSPORTE	2.138.400
FERRETERIA GYJ	MATERIALES	315.150.621
PEDRO ROMO	ALQUILER DE EQUIPOS	2.073.600
I. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	182.907.980
II. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	521.477.881
ELIZABETH MUÑOZ	MATERIALES	5.293.804.984
III. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	577.407.941
FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	MANO DE OBRA	309.684.722
DIANA CAROLINA VIVAS	MANO DE OBRA	133.865.096
SILOGISTICA SAS	TRANSPORTE	103.240.000
LA ALIANZA GROUP SAS	MANO DE OBRA	309.835.612
UBANER PEREZ GOMEZ	MANO DE OBRA	274.500.061
UBANER PEREZ GOMEZ	MANO DE OBRA	30.000.000
G Y J FERRETERIAS S.A.	MATERIALES	71.110.589
REINTEGRO IMCOMERSA LUD SAS, POR PAGO A EQUIPAR-GLEASON-S.A.S	ALQUILER DE EQUIPOS	27.620.616
REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. OR PAGO A EQUIPAR-GLEASON-S.A.S	ALQUILER DE EQUIPOS	26.064.505
EQUIPAR-GLEASON-S.A.S	ALQUILER DE EQUIPOS	29.741.279
CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS	ALQUILER DE EQUIPOS	34.228
SILOGISTICA SAS	TRANSPORTE	21.600
HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	MANO DE OBRA	1
TOTAL		**9.742.178.571**

6. TRANSACCIONES FIDUCIARIAS.

En el marco de la administración del anticipo mediante la fiducia, se han realizado transacciones que corresponden a las órdenes de giro solicitadas, rendimientos financieros en cuenta por el valor recaudado del anticipo y gravamen, respaldados y consignados en los extractos e informes de la fiducia. En las tablas No. 5 y No. 6, presentada a continuación, se registra la consolidación de estas transacciones, evidenciando:

1. Valor recaudo en la cuenta fiduciaria por concepto de anticipo que corresponde a un valor de $9.742.178.571,00 el valor total transferido por concepto de las ordenes de anticipo autorizadas por $9.742.178.571,00 y el saldo del valor recaudado por concepto de anticipo, correspondiente a $ 0,00
2. Valor recaudado en cuenta para gastos de gravamen por $ 39.068.714,28 valor total pagado por concepto de gravamen correspondiente a $ 38.420.722,1 y saldo por gravamen equivalente a $ 647.992,20, reintegrado al consorcio Evolet el pasado 10 de junio.
3. Valor total recaudado por concepto de rendimientos financieros del anticipo por valor de $ 3.513.745,92, valor por concepto de rendimientos financieros transferido a la cuenta autorizada por el Hospital Universitario San José de $ 3.513.745,92 y saldo en cuenta por rendimientos financieros de $ 0,00
4. Valor total recaudado por error en la cuenta bancaria del consorcio y posteriormente transferido a la cuenta de la fiducia, correspondiente al pago del Acta Parcial de Obra No. 1, por un monto de $2.476.206.765. Dicho valor fue transferido para la devolución del rubro asociado a esta acta, dejando un saldo en cuenta de $0,00 por este concepto.
5. Recopilación de todos los recursos recaudados en cuenta correspondientes a $ 9.784.216.508,58 débitos totales registrados por valor de $ 9.628.403.160,77 y saldo total en cuenta equivalente a $ 00,0

Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria.

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS				
Fecha	**Descripción**	**Movimiento Débito**	**Movimiento Crédito**	**SALDO EN CUENTA**
23/10/2024	RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	9.742.178.571,00	0,00	9.742.178.571,00
25/10/2024	RECAUDO PARA GRAVAMEN	39.068.714,28	0,00	9.781.247.285,28
	VALOR TOTAL TRANSFERIDO POR CONCEPTO DE ORDENES DE GIRO CON FECHA DE CORTE A 10 DE JUNIO DEL 2025		9.742.178.571,00	39.068.714,28
	VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADO A 10 DE JUNIO DEL 2025	3.513.745,92		42.582.460,20
16/05/2025	RECAUDO POR ERROR DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A $2.476.206.765, COMO PAGO DEL ACTA DE OBRA No. 001.	2.476.206.765,00		
5/06/2025	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR ERROR CORRESPONDIENTE A $2.476.206.765, COMO PAGO DEL ACTA DE OBRA No. 001.		2476206765	
	CREDITOS POR GRAVAMEN CORTE A 10 DE JUNIO DEL 2025		38.420.722,08	4.161.738,12
	RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS CORTE A 10 DE JUNIO DEL 2025		3.513.745,92	647.992,20
	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CONSORCIO EVOLET 10/06/25		647.992,20	0,00
TOTAL		**12.260.967.796,20**	**12.260.967.796,20**	**0,00**

Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo.

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS					
No.	**Descripción**	**Movimiento Débito (A) Recados**	**Movimiento Crédito (B) Pagos**	**SALDO EN CUENTA (C=A-B)**	**OBSERVACIONES**
1	ANTICIPO	9.742.178.571,00	9.742.178.571,00	0,00	Recaudo por concepto de anticipo (A), Valor total pagado a 10/06/25 por concepto de ordenes de Giro (B) y saldo en cuenta por concepto de anticipo (C).
2	GRAVAMEN	39.068.714,28	38.420.722,08	0,00	Recaudo por concepto de gravamen(A), Valor total pagado por gravamen a 10/06/25 (B) y saldo en cuenta por concepto de gravamen (C).
3	DEVOLUCIÓN SALDO POR GRAVAMEN A LA CUENTA DEL CONSORCIO EVOLET.		647.992,20		
4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.513.745,92	3.513.745,92	0,00	Recaudo por concepto rendimientos financieros(A), creditos por transferencia de rendimientos con corte a 10/06/25 (B) y saldo en cuenta por concepto rendimientos financieros (C).
5	RECURSOS TRANSFERIDOS POR ERROR CORRESPONDIENTE A $2.476.206.765, COMO PAGO DEL ACTA DE OBRA No. 001.	2.476.206.765,00	2.476.206.765,00	0,00	Recaudo por recursos transferidos por error correspondientes al acta parcial de obra No. 1 (A), creditos por devolución del recurso transferido por error, correspondiente al acta parcial de obra No. 1 (B) y saldo en cuenta por el recurso transferido por error del pago parcial de obra No. 1 (C).
TOTAL		**9.784.761.031,20**	**9.784.761.031,20**	**0,00**	Recaudos por concepto anticipo (A), gravamen (B)y y saldo total en fiducia.

7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES.

Hasta la fecha de corte del presente informe, se han realizado un total de veintidós (22) solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte. En las tablas No. 7 y No. 8 se detallan los valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia, que a la fecha de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia, a continuación, se relaciona los valores totales transferidos por ítem de acuerdo al programa de inversiones.

Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VLRO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85.500.000	$ 85.500.000	0,88%	$ 0
2	TRANSPORTE	$ 105.400.000	$ 105.400.000	1,08%	$ 0
3	MATERIALES	$ 7.205.599.277	$ 7.205.599.277	73,96%	$ 0
4	MANO DE OBRA	$ 2.345.679.294	$ 2.345.679.294	24,08%	$ 0
	TOTAL	**$ 9.742.178.571**	**$ 9.742.178.571**	**100,00%**	**$ 0**

Tabla 8. Estado del plan de inversión del anticipo.

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
2	**CIMENTACIÓN**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.073.600,0	PEDRO ROMO	$ 2.073.600,0	$ 2.073.600,0	$ -
		TRANSPORTE	$ 2.138.400,0	URIEL AMA	$ 2.138.400,0	$ 2.138.400,0	$ -
		MATERIALES	$ 435.470.208,0	GEOACOPIO	$ 435.470.208,0	$ 435.470.208,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 764.895.630,0	DIANA CAROLINA VIVAS	$ 133.865.096,0	$ 133.865.096,0	$ -
				I. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 182.907.980,0	$ 182.907.980,0	
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 445.122.551,0	$ 445.122.551,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 3.000.003,0	$ 3.000.003,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.204.577.838,0**		**$ 1.204.577.838,0**	**$ 1.204.577.838,0**	**$ -**
PMA	**PMA**	ALQUILER DE EQUIPOS			$ -		$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 6.325.000,0	GEOACOPIO	$ 6.325.000,0	$ 6.325.000,0	$ -

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 6.325.000,0**		**$ 6.325.000,0**	**$ 6.325.000,0**	**$ -**
3	**ESTRUCTURA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 83.512.800,0	EQUIPAR GLEASON S.A.S	$ 83.512.800,0	$ 83.512.800,0	$ -
		TRANSPORTE	$ 103.261.600,0	SILOGÍSTICA S.A.S	$ 103.261.600,0	$ 103.261.600,0	$ -
		MATERIALES	$ 1.062.917.742,0	GEOACOPIO	$ 1.062.917.742,0	$ 1.062.917.742,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 748.143.018,0	UBANER PEREZ CTO No. 2	$ 274.500.061,0	$ 274.500.061,0	$ -
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 218.467.539,0	$ 218.467.539,0	$ -
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 255.175.418,0	$ 255.175.418,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.997.835.160,0**		**$ 1.997.835.160,0**	**$ 1.997.835.160,0**	**$ -**
4	**ACERO ESTRUCTURA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
		MATERIALES	$ 2.561.167.770,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 2.174.872.332,0	$ 2.174.872.332,0	$ -
				G&J FERRETERIA	$ 71.110.589,0	$ 71.110.589,0	$ -
				CONSTRUNORTE	$ 34.228,0	$ 34.228,0	
				G Y J FERRETERIAS SAS	$ 315.150.621,0	$ 315.150.621,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 290.486.103,0	LA ALIANZA GROUP S.A.S	$ 98.992.607,0	$ 98.992.607,0	$ -
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 76.355.330,0	$ 76.355.330,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 2.999.997,0	$ 2.999.997,0	$ -
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 54.509.304,0	$ 54.509.304,0	$ -
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 57.628.865,0	$ 57.628.865,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 2.851.653.873,0**		**$ 2.851.653.873,0**	**$ 2.851.653.873,0**	**$ -**

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
5	**REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 251.812.851,5	ELIZABETH MUÑOZ	$ 251.812.851,5	$ 251.812.851,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 89.952.536,0	LA ALIANZA GROUP S.A.S	$ 89.952.536,0	$ 89.952.536,0	$ -
				HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS	$ 1,0	$ 1,0	
		SUBTOTAL	**$ 341.765.387,5**		**$ 341.765.387,5**	**$ 341.765.387,5**	**$ -**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES					
		MANO DE OBRA	$ 120.890.469,0	LA ALIANZA GROUP S.A.S	$ 120.890.469,0	$ 120.890.469,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 120.890.469,0**		**$ 120.890.469,0**	**$ 120.890.469,0**	**$ -**
7	**AIRE ACONDICIONADO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 317.711.193,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 317.711.193,0	$ 317.711.193,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				
		SUBTOTAL	**$ 317.711.193,0**		**$ 317.711.193,0**	**$ 317.711.193,0**	**$ -**
8	**MAMPOSTERIA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 288.165.144,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 288.165.144,0	$ 288.165.144,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 129.512.751,0	UBANER PEREZ	$ 30.000.000,0	$ 30.000.000,0	$ -
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 99.512.751,0	$ 99.512.751,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 417.677.895,0**		**$ 417.677.895,0**	**$ 417.677.895,0**	**$ -**
9	**REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 136.845.014,5	GEOACOPIO	$ 12.574.905,0	$ 12.574.905,0	$ -

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 124.270.109,5	$ 124.270.109,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 25.650.942,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 25.650.942,0	$ 25.650.942,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 162.495.956,5**		**$ 162.495.956,5**	**$ 162.495.956,5**	**$ -**
10	**FACHADA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 966.551.318,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 966.551.318,0	$ 966.551.318,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 966.551.318,0**		**$ 966.551.318,0**	**$ 966.551.318,0**	**$ -**
12	**PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 279.250.505,0	GEOACOPIO	$ 8.211.000,0	$ 8.211.000,0	$ -

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 271.039.505,0	$ 271.039.505,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 176.147.844,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 176.147.844,0	$ 176.147.844,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 455.398.349,0**		**$ 455.398.349,0**	**$ 455.398.349,0**	**$ -**
13	**CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 427.592.031,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 427.592.031,0	$ 427.592.031,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 427.592.031,0**		**$ 427.592.031,0**	**$ 427.592.031,0**	**$ -**
I	**EQUIPOS ESPECIALES**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 471.790.500,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 471.790.500,0	$ 471.790.500,0	$ -

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 471.790.500,0**		**$ 471.790.500,0**	**$ 471.790.500,0**	**$ -**
TOTAL			**$ 9.742.264.970,0**		**$ 9.742.264.970,0**	**$ 9.742.264.970,0**	**$ -**

8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

Durante el presente periodo se han recepcionado un (2) informe de gestión, elaborado por la alianza fiduciaria que tiene como fecha de corte 31 de mayo y 10 de junio del 2025, el cual contiene los estados financieros, como soporte y base del presente informe.

Anexo 1. Informe mensual y estados financieros.

9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos acumulados generados por el manejo del anticipo, desde el 23 de octubre hasta el 10 de junio de 2025, ascienden a $ 3.513.745,92. Por otro lado, los rendimientos generados durante el período correspondiente al presente informe (del 1 al 31 de mayo de 2025) suman $436.198,09 y del (1 al 10 de junio) $ 108.324,53. De estos rendimientos, se ha transferido un valor total acumulado de $3.513.745,92 a la cuenta indicada por el Hospital Universitario San José (cuenta de ahorros Davivienda No. 0550196100174933).

Tabla 9. Relación de rendimientos.

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS			
PERIODO RENDIMIENTOS	**VALOR RENDIMIENTOS**	**FECHA CONSIGANACIÓN RENDIMIENTOS**	**RENDIMIENTOS CONSIGANDOS**
23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 2.319.462,32	23/12/2024	$ 2.319.462,32
1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 258.341,14	24/01/2025	$ 258.341,14
1 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$ 223.341,36	12/02/2025	$ 223.341,36
1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	$ 124.434,99	18/03/2025	$ 124.434,99
1 AL 31 DE MARZO DEL 2025	$ 23.690,93	14/04/2025	$ 23.690,93
1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$ 19.952,56	16/05/2025	$ 19.952,56
1 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$ 436.198,09	10/06/2025	$ 436.198,09
1 AL 10 DE JUNIO DEL 2025	$ 108.324,53	10/06/2025	$ 108.324,53
TOTAL RENDIMIENTOS	**$ 3.513.745,92**	**TOTAL CONSIGNADO**	**$ 3.513.745,92**

Anexo 2. Soportes de consignación de rendimientos del mes de mayo y junio del 2025 .

10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS.

Con el fin de legalizar los desembolsos realizados a través de fiducia, se presenta a continuación la relación de ejecución por capítulos con corte a 10 de junio del 2025, adicionalmente los rubros asignados a cada alcance y los rubros desembolsados:

Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión.

CAPITULOS	ASIGNACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RUBROS DEL PLAN DE INVERSIÓN		RELACIÓN DE RUBROS DESEMBOLSADOS (10/06/25)		OBRA EJECUTADA (10/06/25)	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
CIMENTACIÓN	1.204.577.838,00	12,36%	1.204.577.838,00	12,36%	1.610.222.833,70	16,53%
PMA	6.325.000,00	0,06%	6.325.000,00	0,06%	88.270.702,00	0,91%
ESTRUCTURA	2.378.694.961,00	24,42%	2.378.694.961,00	24,42%	2.568.244.825,90	26,36%
ACERO ESTRUCTURA	2.681.550.678,00	27,53%	2.681.550.678,00	27,53%	4.834.164.023,00	49,62%
REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO	251.812.851,50	2,58%	251.812.851,50	2,58%	74.843.198,30	0,77%
INSTALACIÓN ELECTRICA	-	0,00%	-		-	0,00%
AIRE ACONDICIONADO	317.711.193,00	3,26%	317.711.193,00	3,26%	-	0,00%
MAMPOSTERIA	417.677.895,00	4,29%	417.677.895,00	4,29%	90.800.500,00	0,93%
REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	162.495.956,50	1,67%	162.495.956,50	1,67%	-	0,00%
FACHADA	966.551.318,00	9,92%	966.551.318,00	9,92%	-	0,00%
PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	455.398.349,00	4,67%	455.398.349,00	4,67%	-	0,00%
CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	427.592.031,00	4,39%	427.592.031,00	4,39%	-	0,00%
EQUIPOS ESPECIALES	471.790.500,00	4,84%	471.790.500,00	4,84%		0,00%
OTRAS ACTIVIDADES					304.725.001,00	3,13%
TOTAL	**9.742.178.571,00**	**100,00%**	**9.742.178.571,00**	**100,00%**	**$ 9.571.271.084**	**98,25%**

11. CONCLUSIONES.:

- El 23 de octubre del presente año, la firma Alianza Fiduciaria SA recepcionó nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte. ($9,742,178,571), correspondiente al anticipo del contrato de obra No. 358-2023.
- Hasta la fecha de corte del presente informe, se han realizado un total de veintidós (22) solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte.
- Actualmente no se cuenta con saldo en fiducia por ningún concepto, es asi como actualmente se está realizando el proceso de liquidación.
- Los rendimientos acumulados generados por el manejo del anticipo, desde el 23 de octubre hasta el 10 de junio de 2025, ascienden a $3.513.745,92, los cuales han sido transferidos a la entidad en su totalidad.
- Los rendimientos generados durante el período correspondiente al presente informe (del 1 al 31 de mayo de 2025) suman $436.198,09 y del (1 al 10 de junio) $ 108.324,53.

ISABEL GIRALDO PENICHE
Representante Legal
CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4

ANEXO 1. INFORMES MENSUALES Y ESTADOS FINANCIEROS.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE ROBAYAN

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

alianza.com.co

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN	
Periodo Informado:	1 de diciembre 2024 al 31 de mayo 2025
Código del Negocio:	1018130 - 120500
Nombre del Negocio:	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN
Ciudad de atención:	CALI
Director (a) de Gestión a Cargo:	JOHAN AGUDELO ARDILA Tel 602 524 06 59 Correo electrónico : **jagudelo@alianza.com.co**
Director(a) Comercial a Cargo:	MANUELA ARIAS RODRIGUEZ Tel 602 524 06 59 Correo electrónico : **manarias@alianza.com.co**
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	31/05/2024
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

1.2 Duración

El contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, si pasados veinte (20) meses a partir de la suscripción del contrato, no se han transferido los recursos correspondientes al anticipo del Contrato Estatal; ALIANZA podrá terminar automáticamente el contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el Anticipo.

La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad Estatal a la Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realización de los Giros ordenados por el representante Legal del Consorcio con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal. .

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Durante la administración del fideicomiso y con corte a la Rendición de Cuentas no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia.

1.4.1 Descripción

Que el día 27 de diciembre de 2023 entre el Consorcio Evolet (en adelante El Consorcio), integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en este contrato, a través del representante legal de dicho Consorcio, y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA. SOCIALDEL ESTADO (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de obra civil 358 de 2023, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE

INNOVACIONINVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023. se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al mencionado consorcio una suma equivalente al treinta por ciento (30%) de (el valor total del Contrato, es decir la suma de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($32.473.928.569)) a título de anticipo.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	45%
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	10%
ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	45%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	45%
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	10%
ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	45%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario, que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

Nombre Cuenta/Banco	Número
BANCOLOMBIA	4000009276

2.1 Avalúo

Teniendo en cuenta que los bienes recibidos corresponden a recursos en dinero, no se contempla avalúo en este contrato.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta El FIDEICOMITENTE(S) para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, según lo establecido en el contrato.

Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en cuentas de ahorro, mientras se destinan al

cumplimiento del objeto del contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos, en caso de que aplique la administración en fondos.

Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de los mismos serán efectuadas por El FIDEICOMITENTE(S).

Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo, así como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del Anticipo, así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Entidad Estatal.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados

a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el FIDEICOMITENTE(S), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del Patrimonio Autónomo, salvo que la Entidad Estatal hubiese establecido una destinación diferente en los pliegos de condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido en los mismos.

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de Fiducia Mercantil.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El día 11/12/2024 se genero envió del informe mensual noviembre 2024 bajo radicado C1114139.

El día 23/12/2024 se generó envío del informe de la rendición de cuentas semestral 2024 bajo radicado C1114705.

El día 13/01/2025 se genero envió del informe mensual diciembre 2024 bajo radicado C1115274.

El día 07/03/2025 se genero envió del informe mensual febrero 2025 bajo radicado C1116152.

El día 12/05/2025 se genero envió del informe mensual abril 2025 bajo radicado C1116756.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros

vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

120500 - FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
diciembre 2024	901784507	965236	$ 1,547,000.00	Pagada
enero 2025	901784507	974290	$ 1,693,965.00	Pagada
febrero 2025	901784507	982096	$ 1,693,965.00	Pagada
marzo 2025	901784507	990138	$ 1,693,965.00	Pagada
abril 2025	901784507	998156	$ 1,693,965.00	Pagada
mayo 2025	901784507	1006009	$ 1,693,965.00	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de $ 12,337,325.00.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – fichas técnicas.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-2025*
Fondo Abierto Alianza	0.12%	0.10%	0.08%	0.06%	0.07%	0.08%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.09%	0.07%	0.04%	0.04%	0.05%	0.06%
Fondo CXC_1	0.03%	0.03%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%

Fondo CXC_1: Medición de riesgo de mercado del portafolio de activos tradicionales (RNVE).
*Información en proceso de transmisión ante SFC

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

a. Flujo de Caja al 31/05/2025

b. Estados financieros al 31/05/2025

c. Extractos de cuentas asociados al negocio 31/05/2025

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre

del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal “Mi Fiducia” iniciando sesión en el siguiente enlace https://www.alianzaenlinea.com.co/

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección “documentos” y seleccione “Extractos de Fondos de Inversión”. También puede descargarlos en la sección “Movimientos Inversiones” haciendo clic en “Gestionar Extracto”.

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta ‘sección “Documentación Vinculación”, al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, puede remitirla a la Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores SAS. Calle 100 N. 11a – 35 Piso 6, Bogotá, Colombia http://www.pwc.com/co

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN

Cuenta Bancaria 04000009276

Fecha	Movto	Valor	Id,Benefi	Beneficiario	INGRESOS	EGRESOS	ACUMULADO	CUENTA/FONDO
9/12/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$ 99,614.18			$ 99,614.18	$ -	$ 1,012,564,238.27	CUENTA
10/12/2024	GMF	-$ 51.36			$ -	-$ 51.36	$ 1,012,564,186.91	CUENTA
10/12/2024	RETIROS	-$ 133,865,096.00			$ -	-$ 133,865,096.00	$ 878,699,090.91	CUENTA
10/12/2024	VALOR IVA	-$ 2,050.00			$ -	-$ 2,050.00	$ 878,697,040.91	CUENTA
10/12/2024	GASTO BANCARIO	-$ 10,790.10			$ -	-$ 10,790.10	$ 878,686,250.81	CUENTA
22/12/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$ 93,891.59			$ 93,891.59	$ -	$ 878,780,142.40	CUENTA
23/12/2024	GASTO BANCARIO	-$ 1,296.35			$ -	-$ 1,296.35	$ 878,778,846.05	CUENTA
23/12/2024	PAGO RENDIMIENTOS	-$ 2,319,462.32			$ -	-$ 2,319,462.32	$ 876,459,383.73	CUENTA
23/12/2024	GMF	-$ 9,284.01			$ -	-$ 9,284.01	$ 876,450,099.72	CUENTA
23/12/2024	GASTO BANCARIO	-$ 246.31			$ -	-$ 246.31	$ 876,449,853.41	CUENTA
31/12/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$ 64,835.37			$ 64,835.37	$ -	$ 876,514,688.78	CUENTA
23/01/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 165,712.16			$ 165,712.16	$ -	$ 876,680,400.94	CUENTA
24/01/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,370.20			$ -	-$ 1,370.20	$ 876,679,030.74	CUENTA
24/01/2025	PAGO RENDIMIENTOS	-$ 258,341.14			$ -	-$ 258,341.14	$ 876,420,689.60	CUENTA
24/01/2025	GMF	-$ 1,039.88			$ -	-$ 1,039.88	$ 876,419,649.72	CUENTA
24/01/2025	GASTO BANCARIO	-$ 260.34			$ -	-$ 260.34	$ 876,419,389.38	CUENTA
31/01/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 57,629.20			$ 57,629.20	$ -	$ 876,477,018.58	CUENTA
11/02/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 79,246.32			$ 79,246.32	$ -	$ 876,556,264.90	CUENTA
12/02/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,370.20			$ -	-$ 1,370.20	$ 876,554,894.70	CUENTA
12/02/2025	PAGO RENDIMIENTOS	-$ 223,341.36			$ -	-$ 223,341.36	$ 876,331,553.34	CUENTA
12/02/2025	GMF	-$ 899.88			$ -	-$ 899.88	$ 876,330,653.46	CUENTA
12/02/2025	GASTO BANCARIO	-$ 260.34			$ -	-$ 260.34	$ 876,330,393.12	CUENTA
16/02/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 36,014.15			$ 36,014.15	$ -	$ 876,366,407.27	CUENTA
17/02/2025	GASTO BANCARIO	-$ 2,740.40			$ -	-$ 2,740.40	$ 876,363,666.87	CUENTA
17/02/2025	RETIROS	-$ 103,240,000.00			$ -	-$ 103,240,000.00	$ 773,123,666.87	CUENTA
17/02/2025	RETIROS	-$ 309,835,612.00			$ -	-$ 309,835,612.00	$ 463,288,054.87	CUENTA
17/02/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,046.36			$ -	-$ 1,046.36	$ 463,287,008.51	CUENTA
17/02/2025	GMF	-$ 2,750,320.71			$ -	-$ 2,750,320.71	$ 460,536,687.80	CUENTA
17/02/2025	RETIROS	-$ 274,500,061.00			$ -	-$ 274,500,061.00	$ 186,036,626.80	CUENTA
17/02/2025	GASTO BANCARIO	-$ 198.82			$ -	-$ 198.82	$ 186,036,427.98	CUENTA
17/02/2025	GASTO BANCARIO	-$ 520.68			$ -	-$ 520.68	$ 186,035,907.30	CUENTA
28/02/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 9,174.52			$ 9,174.52	$ -	$ 186,045,081.82	CUENTA
16/03/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 12,233.40			$ 12,233.40	$ -	$ 186,057,315.22	CUENTA
17/03/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 764.09			$ 764.09	$ -	$ 186,058,079.31	CUENTA
17/03/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,370.20			$ -	-$ 1,370.20	$ 186,056,709.11	CUENTA
17/03/2025	PAGO RENDIMIENTOS	-$ 124,434.99			$ -	-$ 124,434.99	$ 185,932,274.12	CUENTA
17/03/2025	GMF	-$ 504.26			$ -	-$ 504.26	$ 185,931,769.86	CUENTA
17/03/2025	GASTO BANCARIO	-$ 260.34			$ -	-$ 260.34	$ 185,931,509.52	CUENTA
18/03/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,370.20			$ -	-$ 1,370.20	$ 185,930,139.32	CUENTA
18/03/2025	RENDIMIENTOS MAL GIRADOS	-$ 124,434.99			$ -	-$ 124,434.99	$ 185,805,704.33	CUENTA
18/03/2025	GMF	-$ 504.26			$ -	-$ 504.26	$ 185,805,200.07	CUENTA
18/03/2025	GASTO BANCARIO	-$ 260.34			$ -	-$ 260.34	$ 185,804,939.73	CUENTA
25/03/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 6,108.71			$ 6,108.71	$ -	$ 185,811,048.44	CUENTA
26/03/2025	RENDIMIENTOS MAL GIRADOS	$ 124,434.99			$ 124,434.99	$ -	$ 185,935,483.43	CUENTA
31/03/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 4,584.73			$ 4,584.73	$ -	$ 185,940,068.16	CUENTA
6/04/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 4,584.84			$ 4,584.84	$ -	$ 185,944,653.00	CUENTA
7/04/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,046.36			$ -	-$ 1,046.36	$ 185,943,606.64	CUENTA
7/04/2025	GMF	-$ 120,004.98			$ -	-$ 120,004.98	$ 185,823,601.66	CUENTA
7/04/2025	RETIROS	-$ 30,000,000.00			$ -	-$ 30,000,000.00	$ 155,823,601.66	CUENTA
7/04/2025	GASTO BANCARIO	-$ 198.82			$ -	-$ 198.82	$ 155,823,402.84	CUENTA
13/04/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 4,482.62			$ 4,482.62	$ -	$ 155,827,885.46	CUENTA
14/04/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,370.20			$ -	-$ 1,370.20	$ 155,826,515.26	CUENTA
14/04/2025	PAGO RENDIMIENTOS	-$ 23,690.93			$ -	-$ 23,690.93	$ 155,802,824.33	CUENTA
14/04/2025	GMF	-$ 101.28			$ -	-$ 101.28	$ 155,802,723.05	CUENTA
14/04/2025	GASTO BANCARIO	-$ 260.34			$ -	-$ 260.34	$ 155,802,462.71	CUENTA
30/04/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 10,885.10			$ 10,885.10	$ -	$ 155,813,347.81	CUENTA
4/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 2,561.31			$ 2,561.31	$ -	$ 155,815,909.12	CUENTA
5/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 2,092.72			$ -	-$ 2,092.72	$ 155,813,816.40	CUENTA
5/05/2025	GMF	-$ 51.36			$ -	-$ 51.36	$ 155,813,765.04	CUENTA
5/05/2025	GMF	-$ 394,934.78			$ -	-$ 394,934.78	$ 155,418,830.26	CUENTA
5/05/2025	RETIROS	-$ 71,110,589.00			$ -	-$ 71,110,589.00	$ 84,308,241.26	CUENTA
5/05/2025	RETIROS	-$ 27,620,616.00			$ -	-$ 27,620,616.00	$ 56,687,625.26	CUENTA
5/05/2025	RETIROS	-$ 26,064,505.00			$ -	-$ 26,064,505.00	$ 30,623,120.26	CUENTA
5/05/2025	VALOR IVA	-$ 2,050.00			$ -	-$ 2,050.00	$ 30,621,070.26	CUENTA
5/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 10,790.10			$ -	-$ 10,790.10	$ 30,610,280.16	CUENTA
5/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 397.64			$ -	-$ 397.64	$ 30,609,882.52	CUENTA
13/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 377.37			$ 377.37	$ -	$ 30,610,259.89	CUENTA
14/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,046.36			$ -	-$ 1,046.36	$ 30,609,213.53	CUENTA
14/05/2025	GMF	-$ 118,970.09			$ -	-$ 118,970.09	$ 30,490,243.44	CUENTA
14/05/2025	RETIROS	-$ 29,741,279.00			$ -	-$ 29,741,279.00	$ 748,964.44	CUENTA
14/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 198.82			$ -	-$ 198.82	$ 748,765.62	CUENTA
15/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 2.04			$ 2.04	$ -	$ 748,767.66	CUENTA
16/05/2025	DEVOLUCION DE ACTA CANCELADA POR LA ENTIDAD	$ 2,476,206,765.00			$ 2,476,206,765.00	$ -	$ 2,476,955,532.66	CUENTA
16/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,370.20			$ -	-$ 1,370.20	$ 2,476,954,162.46	CUENTA
16/05/2025	PAGO RENDIMIENTOS	-$ 19,952.56			$ -	-$ 19,952.56	$ 2,476,934,209.90	CUENTA
16/05/2025	GMF	-$ 86.33			$ -	-$ 86.33	$ 2,476,934,123.57	CUENTA
16/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 260.34			$ -	-$ 260.34	$ 2,476,933,863.23	CUENTA
25/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 270,779.46			$ 270,779.46	$ -	$ 2,477,204,642.69	CUENTA
26/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 2,740.40			$ -	-$ 2,740.40	$ 2,477,201,902.29	CUENTA
26/05/2025	RETIROS	-$ 21,600.00			$ -	-$ 21,600.00	$ 2,477,180,302.29	CUENTA
26/05/2025	RETIROS	-$ 1.00			$ -	-$ 1.00	$ 2,477,180,301.29	CUENTA
26/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 1,046.36			$ -	-$ 1,046.36	$ 2,477,179,254.93	CUENTA
26/05/2025	GMF	-$ 241.34			$ -	-$ 241.34	$ 2,477,179,013.59	CUENTA
26/05/2025	RETIROS	-$ 34,228.00			$ -	-$ 34,228.00	$ 2,477,144,785.59	CUENTA
26/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 520.68			$ -	-$ 520.68	$ 2,477,144,264.91	CUENTA
26/05/2025	GASTO BANCARIO	-$ 198.82			$ -	-$ 198.82	$ 2,477,144,066.09	CUENTA
31/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	$ 162,477.91			$ 162,477.91	$ -	$ 2,477,306,544.00	CUENTA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	155,813,347.81	*SALDO PROMEDIO*	$	1,307,512,228
TOTAL ABONOS	$	2,476,642,963.09	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	155,149,766.90	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	436,198.09
SALDO ACTUAL	$	2,477,306,544.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,561.31	155,815,909.12
5/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.72	155,813,816.40
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.36	155,813,765.04
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-394,934.78	155,418,830.26
5/05	PAGO A PROVE G Y J FERRETERI			-71,110,589.00	84,308,241.26
5/05	PAGO A PROVE IMCOMERSALUD SA			-27,620,616.00	56,687,625.26
5/05	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-26,064,505.00	30,623,120.26
5/05	VALOR IVA			-2,050.00	30,621,070.26
5/05	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-10,790.10	30,610,280.16
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	30,609,882.52
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			377.37	30,610,259.89
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.36	30,609,213.53
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-118,970.09	30,490,243.44
14/05	PAGO A PROVE CVS EQUIPAR Y C			-29,741,279.00	748,964.44
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	748,765.62
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.04	748,767.66
16/05	PAGO INTERBANC HOSP UNIVER SAN			2,476,206,765.00	2,476,955,532.66
16/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,370.20	2,476,954,162.46
16/05	PAGO A PROV HOSPITAL UNIVERSIT			-19,952.56	2,476,934,209.90
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86.33	2,476,934,123.57
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.34	2,476,933,863.23
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			270,779.46	2,477,204,642.69
26/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,740.40	2,477,201,902.29
26/05	PAGO A PROV SILOGISTICA SAS			-21,600.00	2,477,180,302.29
26/05	PAGO A PROV HIDRAULICA SANITAR			-1.00	2,477,180,301.29
26/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.36	2,477,179,254.93
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-241.34	2,477,179,013.59
26/05	PAGO A PROVE CONSTRUNORTE CO			-34,228.00	2,477,144,785.59
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.68	2,477,144,264.91
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	2,477,144,066.09
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			162,477.91	2,477,306,544.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. SOPORTES DE CONSIGANCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 22

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 10/06/2025 Fecha de Registro de la Orden: 10/06/2025 Fecha de Pago: 10/06/2025

Proveedor: 891580002 - 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 PI_24092 PAGO RENDIMIENTOS FINALES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PI	24092	10/06/2025	544,522.62

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
544,522.62	0.00	0	544,522.62

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		544,522.62	0.00	0.00
		Totales	544,522.62	0.00	0.00

Valor a Girar: 544,522.62

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 22 Periodo: 202506

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		544,522.62
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	544,522.62	
						544,522.62	544,522.62

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 21

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	1 | 0 | 101 | | | | | | 21	DEVOLUCION EXCEDENTES		544,522.62	-544,522.62
			TOTALES	544,522.62	-544,522.62

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 3. DEVOLUCIÓN DE RUBROS TRANSFERIDO POR ERROR POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ACTA DE OBRA No. 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 21

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 04/06/2025 Fecha de Pago: 05/06/2025

Proveedor: 900552695 - 1 CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: PI_23299 DEVOLUCIÓN DE ACTA CONSIGNADA POR ERRO A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,476,206,765.00	0.00	0	2,476,206,765.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,476,206,765.00	0.00	0.00
	Totales		2,476,206,765.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,476,206,765.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 21 Periodo: 202506

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900552695 - 1	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.		2,476,206,765.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900552695 - 1	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	2,476,206,765.00	
						2,476,206,765.00	2,476,206,765.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO No. 4 OFICIO ACLARATORIO DEL PAGO FINAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

t. (601) 644 7700
Cra. 15 No. 82 - 99 Piso 3 Edificio
Torre Alianza
Bogotá, Colombia

Bogotá, 18 de junio del 2025

Señora:
ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE
Representante legal
Consorcio Evolet
contabilidad@casaodontologica.com.co

REFERENCIA: SOLICITUD ACLARACION SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2025

Respetado señora Giraldo,

En atención a la solicitud recibida por parte de la entidad el día 16 de junio de 2025, nos permitimos indicar lo siguiente:

- Los rendimientos generados durante el mes de mayo de 2025, corresponden a un valor de $436.198.09, los cuales fueron pagados a la cuenta del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, como se indica en la instrucción enviada para la devolución de estos.

- Los rendimientos generados en el mes de junio de 2025 corresponden a un valor de $108.324.53, estos fueron enviados junto a los rendimientos generados en el mes de mayo de 2025, teniendo presente que, el fideicomiso, dio inicio al proceso de liquidación y se realizó la devolución de estos rendimientos finales.

- Por lo anteriormente expuesto, la última operación realizada correspondiente a pagos de rendimientos los cuales ascienden a un valor total de $544.522.62, fueron devueltos el día 10 de junio de 2025.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en los siguientes correos androjas@alianza.com.co o jagudelo@alianza.com.co.

Cordialmente

Johan Agudelo
Firmado digitalmente por Johan Agudelo
Fecha: 2025.06.18 14:38:38 -05'00'

JOHAN AGUDELO ARDILA
Director de Gestión Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A.

Documento Firmado Digitalmente por Alianza Fiduciaria S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 8. RESULTADO RESISTENCIA CONCRETOS CONTRATISTA

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO
NTC 220

FGLR-329
Versión 05

CLIENTE: Consorcio Evolet
ORDEN SERVICIO No.: 491
OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José
LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6#10N-142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: N.A
INTERVENTORÍA: N.A

HOJA No: 3

NUMERACIÓN INTERNA	TIPO DE MUESTRA	ELEMENTO DE TOMA DE LA MUESTRA	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA DE DISEÑO			EVOLUCIÓN %	FLUIDEZ %	OBSERVACIONES
						Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
37	T52	Mampostería piso 2 Mortero tipo S	09-jun-2025	26-jun-2025	17	132,2	1880	13,0	126	1800	12,6	104,9	N.A	En obra Proporción 1:4 Materiales N.S
38	T52		09-jun-2025	26-jun-2025	17	143,0	2034	14,0	126	1800	12,6	113,5	N.A	
39	T52		09-jun-2025	26-jun-2025	17	132,2	1881	13,0	126	1800	12,6	105,0	N.A	
40	T53	Mampostería piso 2 Mortero tipo S	12-jun-2025	26-jun-2025	14	96,7	1376	9,5	126	1800	12,6	76,8	N.A	En obra Proporción 1:4 Materiales N.S
41	T53		12-jun-2025	26-jun-2025	14	91,4	1299	9,0	126	1800	12,6	72,5	N.A	
42	T53		12-jun-2025	26-jun-2025	14	95,2	1354	9,3	126	1800	12,6	75,5	N.A	

OBSERVACIONES: Datos suministrados por el cliente. Muestra tomada por personal del Cliente.

La muestra 38 presenta dispersión.

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASEN TAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
491	**2654**	**T54**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	213,1		8171	266	**3782**	26,1	281	**4000**	27,6	94,5	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma 10:00 am	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2655**	**T54**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	207,7		8091	262	**3723**	25,7	281	**4000**	27,6	93,1	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma 10:00 am	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2656**	**T54**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	204,6		8171	255	**3632**	25,0	281	**4000**	27,6	90,8	N.S	VIGA 1-4 LOSA 6 Hora de toma 10:00 am	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2657**	**T55**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	222,4		8171	278	**3947**	27,2	281	**4000**	27,6	98,7	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma 12:00 pm	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2658**	**T55**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	215,1		8171	268	**3818**	26,3	281	**4000**	27,6	95,4	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma 12:00 pm	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2659**	**T55**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	214,0		8252	264	**3762**	25,9	281	**4000**	27,6	94,0	N.S	VIGA 4-6 LOSA 6 Hora de toma 12:00 pm	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2660**	**T56**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	201,5		8091	254	**3612**	24,9	211	**3000**	20,7	120,4	N.S	Escalera de emergencia piso 4 Hora de toma 2:00 pm	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2661**	**T56**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	215,1		8252	266	**3781**	26,1	211	**3000**	20,7	126,0	N.S	Escalera de emergencia piso 4 Hora de toma 2:00 pm	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2662**	**T56**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	219,0		8332	268	**3812**	26,3	211	**3000**	20,7	127,1	N.S	Escalera de emergencia piso 4 Hora de toma 2:00 pm	Premezclado de Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2663**	**T57**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	264,3		8012	336	**4785**	33,0	281	**4000**	27,6	119,6	N.S	LOSA 6 Hora de toma 1:00 pm	Premezclado de Geoacopio con fibra	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2664**	**T57**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	273,8		8659	322	**4586**	31,6	281	**4000**	27,6	114,6	N.S	LOSA 6 Hora de toma 1:00 pm	Premezclado de Geoacopio con fibra	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
491	**2665**	**T57**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	257,6		8171	321	**4572**	31,5	281	**4000**	27,6	114,3	N.S	LOSA 6 Hora de toma 1:00 pm	Premezclado de Geoacopio con fibra	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2666**	**T58**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	219,9		8252	272	**3866**	26,7	211	**3000**	20,7	128,9	N.S	Dovelas piso 1 Hora de toma 2:00 pm	Proporción 1:2:3	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2667**	**T58**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	230,4		8171	288	**4090**	28,2	211	**3000**	20,7	136,3	N.S	Dovelas piso 1 Hora de toma 2:00 pm	Proporción 1:2:3	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
491	**2668**	**T58**	**4**	19-jun-25	**26-jun-25**	**7**	229,7		8332	281	**3997**	27,6	211	**3000**	20,7	133,2	N.S	Dovelas piso 1 Hora de toma 2:00 pm	Proporción 1:2:3	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO NTC 220	FGLR-329 Versión 05

CLIENTE:	Consorcio Evolet	**ORDEN SERVICIO No.:**	**459**
OBRA:	Nueva Torre Hospital Universitario San José		
LOCALIZACIÓN OBRA:	Carrera 6#10N-142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca		
CONTRATISTA:	N.A		
INTERVENTORÍA:	N.A		

HOJA No: **2**

NUMERACIÓN INTERNA	TIPO DE MUESTRA	ELEMENTO DE TOMA DE LA MUESTRA	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA DE DISEÑO			EVOLUCIÓN %	FLUIDEZ %	OBSERVACIONES
						Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
31	T52	Mampostería piso 2 Mortero tipo S	09-jun-2025	17-jun-2025	8	103,0	**1465**	10,1	126	1800	12,6	81,7	N.A	En obra Proporción 1:4 Materiales N.S
32	T52		09-jun-2025	17-jun-2025	8	104,2	**1482**	10,2	126	1800	12,6	82,7	N.A	
33	T52		09-jun-2025	17-jun-2025	8	103,6	**1473**	10,2	126	1800	12,6	82,2	N.A	
34	T53	Mampostería piso 2 Mortero tipo S	12-jun-2025	19-jun-2025	7	91,1	**1296**	8,9	126	1800	12,6	72,3	N.A	En obra Proporción 1:4 Materiales N.S
35	T53		12-jun-2025	19-jun-2025	7	82,2	**1169**	8,1	126	1800	12,6	65,2	N.A	
36	T53		12-jun-2025	19-jun-2025	7	81,5	**1159**	8,0	126	1800	12,6	64,7	N.A	

OBSERVACIONES: Datos suministrados por el cliente. Muestra tomada por personal del Cliente.

REVISÓ

KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ

FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TÉCNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

ANEXO 9. RESULTADO RESISTENCIA CONCRETO INTERVENTORIA

INGEOTED S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 637

SOLICITADO POR CONSORCIO INTERSALUD PZ **REFERENCIA**

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCES DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

LOCALIZACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE POPAYÁN, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA CONSORCIO INTERSALUD PZ

RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa): 28 ASENTAMIENTO (cm): TOMA REALIZADA POR: CLIENTE

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE	TIPO DE FALLA
								Mpa	PSI			
7	7	PANTALLA PISO 7 (N +23,20)	1/07/2025	23/07/2025	22	380,8	8251,6	46,1	6592	164,8	SI	3
8	8	COLUMNAS PISO 7 (N +23,20)	1/07/2025	23/07/2025	22	374,1	8413,4	44,5	6352	158,8	SI	3

INGENIERIA, GEOTECNIA, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS

REALIZÓ

BAIRON FELIPE MACA GIRÓN
GEOTECNOLOGO M.P. 063016-0693216CAU

REVISÓ

JUAN SEBASTIAN URBANO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGEOTED S.A.S.

INGEOTED S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 637

SOLICITADO POR CONSORCIO INTERSALUD PZ **REFERENCIA**

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCES DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

LOCALIZACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE POPAYÁN, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA CONSORCIO INTERSALUD PZ

RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa): 28 ASENTAMIENTO (cm): TOMA REALIZADA POR: CLIENTE

MUESTRA No	CILINDRO No	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	CARGA (KN)	ÁREA (mm)	ESFUERZO		DESARROLLO (%)	CUMPLE	TIPO DE FALLA
								Mpa	PSI			
1	1	LOSA PISO 6 (N +19,30)	26/05/2025	23/07/2025	58	288,9	8171,3	35,4	5050	126,3	SI	3
2	2	VIGAS DE ENTREPISO PISO 6 (N +19,30)	26/05/2025	23/07/2025	58	336,6	8251,6	40,8	5827	145,7	SI	3
3	3	PANTALLAS PISO 6 (N +19,30)	4/06/2025	23/07/2025	49	406,7	8171,3	49,8	7110	177,8	SI	3
4	4	COLUMNAS PISO 6 (N +19,30)	4/06/2025	23/07/2025	49	429,7	8171,3	52,6	7512	187,8	SI	3
5	5	LOSA PISO 7 (N +23,20)	19/06/2025	23/07/2025	34	348,5	8251,6	42,2	6033	150,8	SI	3
6	6	VIGAS DE ENTREPISO PISO 7 (N +23,20)	19/06/2025	23/07/2025	34	340,5	8348,5	40,8	5826	145,7	SI	3

INGENIERIA, GEOTECNIA, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS

REALIZÓ

BAIRON FELIPE MACA GIRÓN
GEOTECNOLOGO M.P. 063016-0693216CAU

REVISÓ

JUAN SEBASTIAN URBANO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INGEOTED S.A.S.
